平成20年度（2008年度）

ごみ処理事業年報

豊中市伊丹市クリーンランド

目　　次

Ⅰ. 総括

1. 一般廃棄物処理実績フロー図
1－1. 一般廃棄物処理実績フロー図 …… 3
1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉) …… 4
1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート …… 5

2. ごみ搬入量
2－1. ごみ搬入量実績(総括) …… 6
2－2. 月別ごみ搬入量実績(両市合計) …… 8
2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分) …… 12
2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分) …… 16

3. ごみ搬入量の経年変化
3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化 …… 20
3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 22
3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23
3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23

4. ごみ質
4－1. 可燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 24
4－2. 可燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 24
4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 25
4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・DRY基準) …… 25
4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準) …… 26
4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準) …… 26
4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量 …… 27
4－8. ごみの三成分(可燃分・灰分・水分)の経年変化(%) …… 27
4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ/Kg) …… 27
4－10. 不燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 28
4－11. 不燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 28
4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 29

Ⅱ. ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化
1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化 …… 32
1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化 …… 33

2. 焼却関係
2－1. 焼却炉稼働状況(1～4号炉合計) …… 34
2－2. 焼却炉稼働状況(1号炉) …… 36

２－３. 焼却炉稼働状況（2号炉） …… 36
２－４. 焼却炉稼働状況（3号炉） …… 38
２－５. 焼却炉稼働状況（4号炉） …… 38
２－６. ごみ焼却量と低位発熱量（熱精算法）の経年変化 …… 40
２－７. 月別焼却量の経年変化 …… 41

３. 管理薬剤の使用状況
３－１. 管理薬剤使用（購入）実績 …… 42

４. ボイラー・タービン関係
４－１. ボイラー運転状況（1～4号炉合計） …… 43
４－２. ボイラー運転状況（1号炉） …… 44
４－３. ボイラー運転状況（2号炉） …… 44
４－４. ボイラー運転状況（3号炉） …… 45
４－５. ボイラー運転状況（4号炉） …… 45
４－６. タービン稼働状況 …… 46
４－７. 純水及び薬剤使用実績 …… 48

５. 洗煙装置関係
５－１. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計） …… 49
５－２. 洗煙装置稼働実績（1号炉） …… 50
５－３. 洗煙装置稼働実績（2号炉） …… 50
５－４. 洗煙装置稼働実績（3号炉） …… 51
５－５. 洗煙装置稼働実績（4号炉） …… 51
５－６. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績 …… 52
５－７. 洗煙装置暦日数平均稼働率 …… 52

６. 排水処理関係
６－１. 排水処理実績 …… 53
６－２. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績 …… 53

７. 電力関係
７－１. 電力使用実績 …… 54

８. 市水・工水・防臭薬剤関係
８－１. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績 …… 55

９. 焼却残渣（灰）関係
９－１. 飛灰安定化装置稼働実績 …… 56
９－２. 焼却残渣（灰）処分実績 …… 57
９－３. 焼却残渣（灰）測定結果 …… 57

10. 公害関係
10－1. 敷地境界線における臭気測定結果 …… 58
10－2. 排ガス関係測定結果 …… 59
○ばいじん量
○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物
○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量
10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口） …… 62
10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 64
10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化（煙突入口） …… 65
10－8. その他のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 65
10－9. 排水関係測定結果
①原水水質測定結果 …… 66
②放流水水質測定結果 …… 68
③水素イオン濃度の経月変化 …… 69
④水銀濃度の経月変化 …… 69
⑤鉛濃度の経月変化 …… 70
⑥亜鉛濃度の経月変化 …… 70

11. 維持管理経費の状況（ごみ焼却施設）
11－1. 処理経費 …… 71
11－2. 処理経費の経年変化 …… 71
11－3. 修繕料の経年変化 …… 72

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績
1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（両市合計） …… 74
1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分） …… 75
1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分） …… 75

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績
2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績 …… 76
2－2. 用水・電力・蒸気使用量実績 …… 77

3. 不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況
3－1. 不燃・粗大ごみ処理残渣の処分実績 …… 78
3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績 …… 79
3－3. 適正処理困難物処分量実績 …… 80

4. 維持管理経費の状況（粗大ごみ処理施設）
4－1. 処理経費 …… 81
4－2. 処理経費の経年変化 …… 81
4－3. 修繕料の経年変化 …… 82

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績
1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績 …… 84
1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績 …… 84
1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績 …… 85

2. 家電四品目搬入・搬出実績
2－1. 家電四品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン）搬入実績（両市合計） …… 86
2－2. 家電四品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン）搬入実績（豊中市分） …… 87
2－3. 家電四品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン）搬入実績（伊丹市分） …… 88
2－4. 家電四品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン）搬出実績 …… 89

3. その他のリサイクル等の状況
3－1. 逆送電力量経年変化 …… 90
3－2. 搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績 …… 91
3－3. 古紙類の資源化実績 …… 91

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況
1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況 …… 94
1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況 …… 95

2. 歳入歳出決算の状況
2－1. 共通経費勘定 …… 98
2－2. ごみ処理施設勘定 …… 100

Ⅵ. その他

1. 啓発活動の状況
1－1. 施設見学者実績 …… 104
1－2. 体験学習受入れの実績 …… 104
1－3. 出前講座の実績 …… 104
1－4. イベント等の実績 …… 105
1－5. 搬入ごみ検査状況 …… 105

2. 余熱利用施設（クリーンスポーツランド）利用者の状況
2－1. 施設利用者実績 …… 106
2－2. 年間の利用者の割合 …… 107
2－3. 施設利用状況の経年変化 …… 107

3. 組織及び職員数
3－1. 組織図 …… 108
3－2. 職種別人員配置 …… 108

Ⅰ．総　　括

平成20年度一般廃棄物処理実績フロー図（両市）

（単位：t）

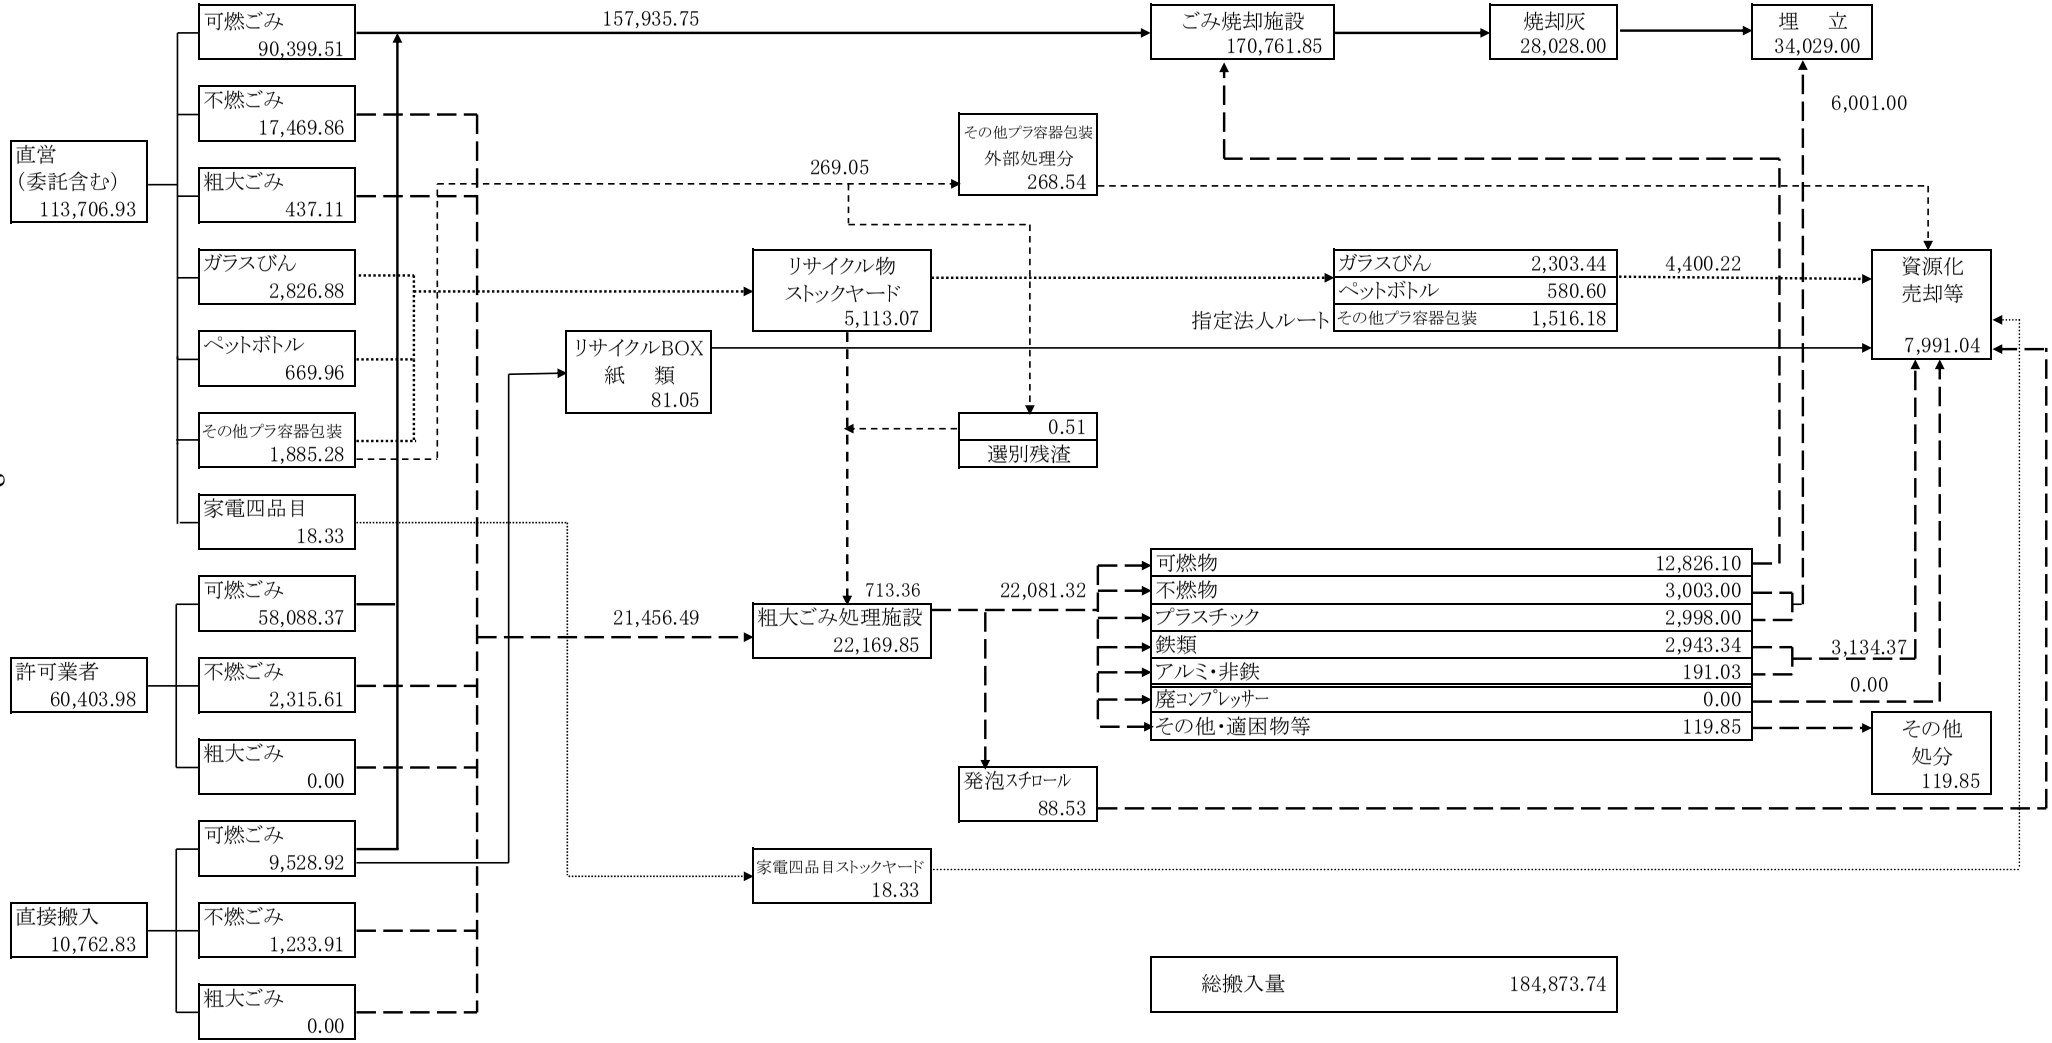

1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉)

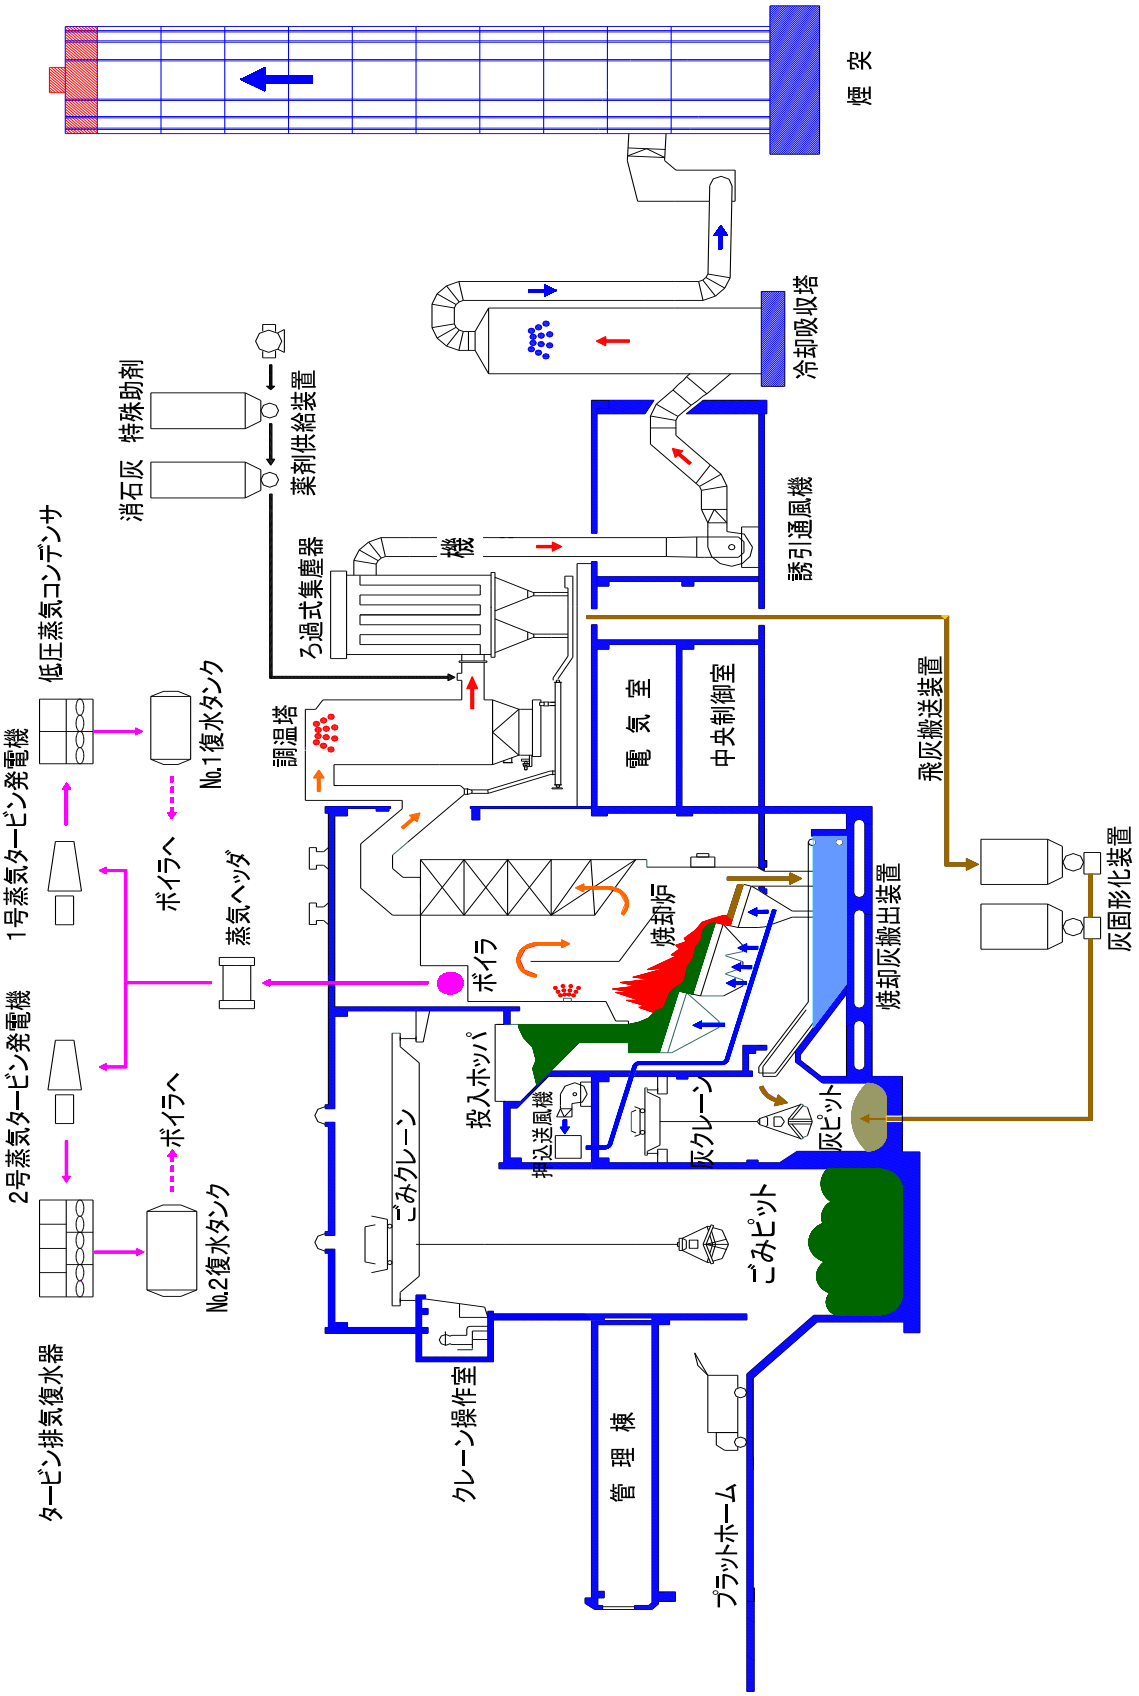

1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート

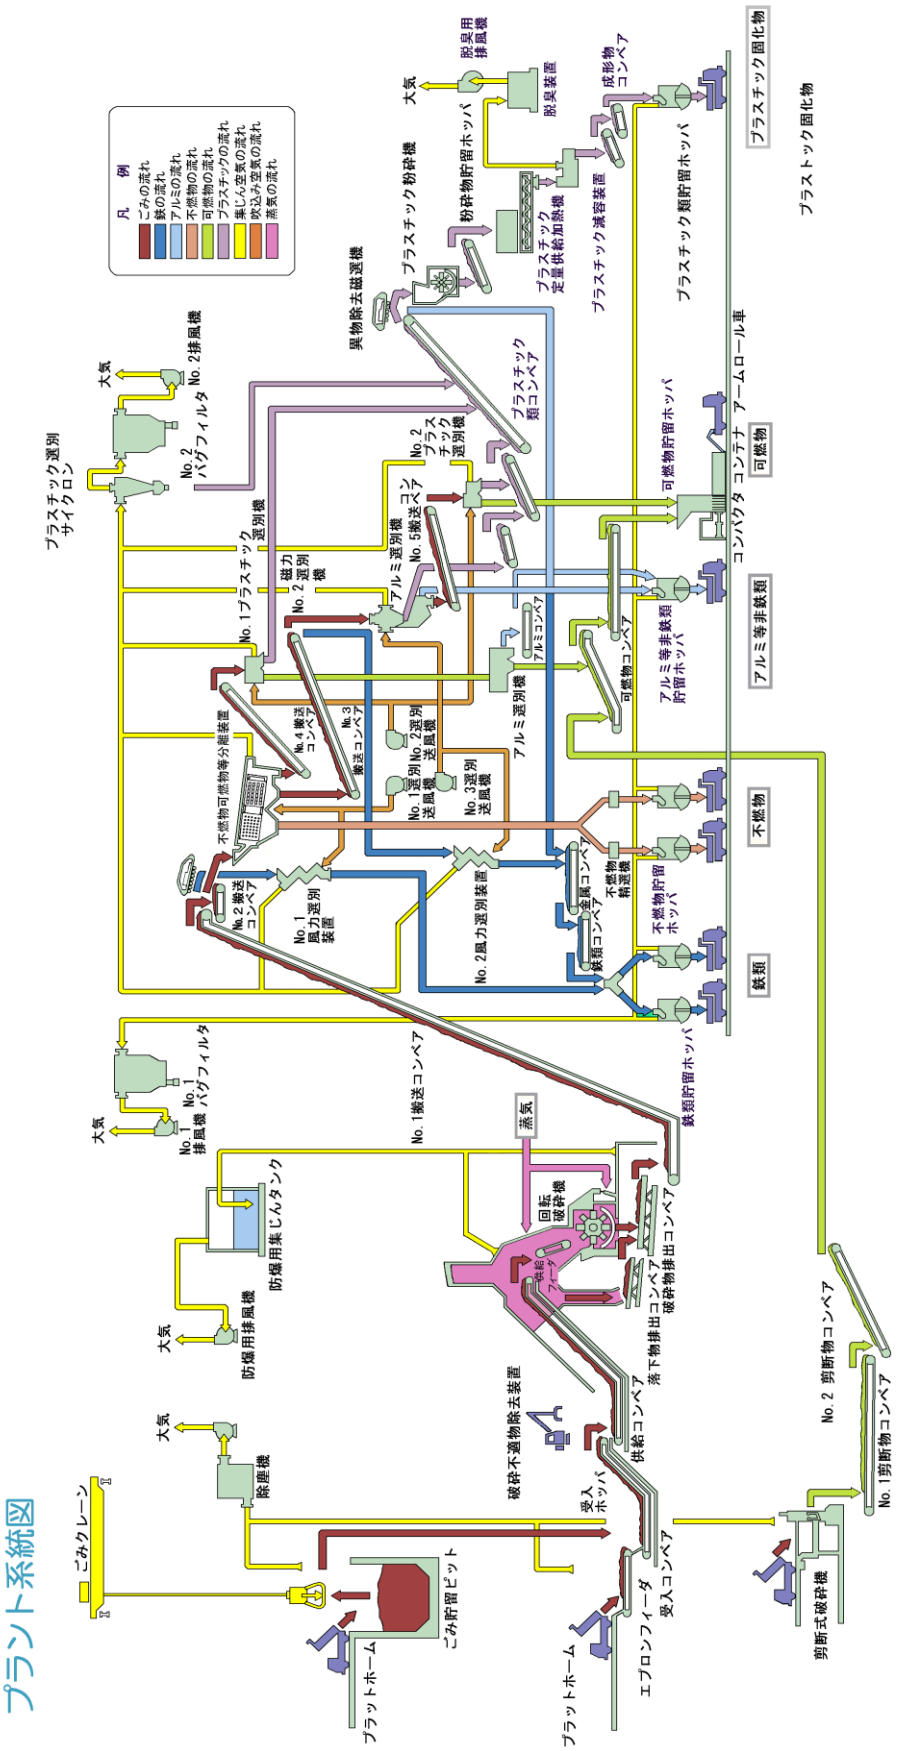

2. ごみ搬入量

2－1. ごみ搬入量実績（総括）

	両市搬入量					豊中市	
	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量
	（台）	（t）	（%）	（%）	（%）	（台）	（t）
可燃ごみ	119,120	158,017	100.00	85.47	100.00	85,557	106,942
市扱い	61,583	90,400	57.21	79.50	100.00	45,078	60,345
許可業者	41,104	58,088	36.76	96.17	100.00	29,166	40,250
直接搬入	16,433	9,529	6.03	88.54	100.00	11,313	6,347
不燃ごみ	44,083	21,019	100.00	11.37	100.00	34,332	14,321
市扱い	26,736	17,470	83.11	15.36	100.00	20,384	12,320
許可業者	9,552	2,316	11.02	3.83	100.00	7,892	1,097
直接搬入	7,795	1,234	5.87	11.46	100.00	6,056	904
粗大ごみ	2,058	437	100.00	0.24	100.00	2,058	437
市扱い	2,058	437	100.00	0.38	100.00	2,058	437
許可業者	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
直接搬入	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
ガラスびん	3,935	2,827	100.00	1.53	100.00	2,892	1,618
市扱い	3,935	2,827	100.00	2.49	100.00	2,892	1,618
ペットボトル	2,606	670	100.00	0.36	100.00	1,540	289
市扱い	2,606	670	100.00	0.59	100.00	1,540	289
その他プラスチック	3,820	1,885	100.00	1.02	100.00	1,383	734
市扱い	3,820	1,885	100.00	1.66	100.00	1,383	734
家電四品目	431	18	100.00	0.01	100.00	344	15
市扱い	431	18	100.00	0.02	100.00	344	15
合　計	176,053	184,874	100.00	100.00	100.00	128,106	124,355
市扱い	101,169	113,707	61.51	100.01	100.00	73,679	75,757
許可業者	50,656	60,404	32.67	100.00	100.00	37,058	41,347
直接搬入	24,228	10,763	5.82	100.01	100.00	17,369	7,251
人口（10月1日現在）		583,295					388,373
一人1日平均排出量（g）		868					877
可燃ごみ		742					754
不燃ごみ		99					101
粗大ごみ		2					3
ガラスびん		13					11
ペットボトル		3					2
その他プラスチック		9					5
家電四品目		0					0

他都市より受入れ（可燃ごみ）

	搬入台数	搬入量
	（台）	（t）
豊能郡	114	269

搬　入　量			伊　丹　市　搬　入　量				
搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合
(%)	(%)	(%)	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)
100.00	86.00	67.68	33,563	51,075	100.00	84.39	32.32
56.42	79.66	66.75	16,505	30,054	58.84	79.19	33.25
37.64	97.35	69.29	11,938	17,838	34.93	93.60	30.71
5.93	87.53	66.60	5,120	3,182	6.23	90.61	33.40
100.00	11.52	68.13	9,751	6,698	100.00	11.07	31.87
86.03	16.26	70.52	6,352	5,149	76.88	13.57	29.48
7.65	2.65	47.36	1,660	1,219	18.20	6.40	52.64
6.31	12.47	73.28	1,739	330	4.92	9.39	26.72
100.00	0.36	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	0.58	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	1.30	57.22	1,043	1,209	100.00	2.00	42.78
100.00	2.14	57.22	1,043	1,209	100.00	3.19	42.78
100.00	0.23	43.06	1066	381	100.00	0.63	56.94
100.00	0.38	43.06	1,066	381	100.00	1.01	56.94
100.00	0.59	38.92	2,437	1,152	100.00	1.90	61.08
100.00	0.97	38.92	2,437	1,152	100.00	3.03	61.08
100.00	0.01	79.21	87	4	100.00	0.01	20.79
100.00	0.02	79.21	87	4	100.00	0.01	20.79
100.00	100.00	67.26	47,947	60,519	100.00	100.00	32.74
60.92	100.00	66.62	27,490	37,950	62.71	100.00	33.38
33.25	100.00	68.45	13,598	19,057	31.49	100.00	31.55
5.83	100.00	67.37	6,859	3,512	5.80	100.00	32.63
				194,922			
				851			
				718			
				94			
				0			
				17			
				5			
				16			
				0			

＊上記数値については他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

２－２. 月別ごみ搬入量実績（両市合計）

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	7,593.80	98.8	8,054.96	95.0	7,652.18	99.4
許可業者	5,157.18	95.2	5,212.79	95.0	5,058.91	93.6
直接搬入	432.43	70.2	721.06	107.3	969.97	102.3
小計(B)	5,589.61	92.7	5,933.85	96.4	6,028.88	94.9
合計(A＋B＝C)	13,183.41	96.1	13,988.81	95.6	13,681.06	97.3
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,499.90	112.9	1,584.79	87.4	1,348.27	93.8
許可業者	169.01	101.8	162.52	91.5	153.22	89.2
直接搬入	128.89	96.2	100.45	107.1	98.39	121.4
小計(E)	297.90	99.3	262.97	96.9	251.61	99.5
合計(D＋E＝F)	1,797.80	110.4	1,847.76	88.6	1,599.88	94.6
粗大ごみ						
市扱い(G)	35.50	94.1	36.03	103.4	35.81	100.8
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	35.50	93.5	36.03	103.4	35.81	100.8
ガラスびん						
市扱い(J)	217.51	107.0	247.54	102.1	227.53	94.8
合計(K)	217.51	107.0	247.54	102.1	227.53	94.8
ペットボトル						
市扱い(L)	48.16	85.4	56.42	72.6	55.28	74.1
合計(M)	48.16	85.4	56.42	72.6	55.28	74.1
その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
市扱い(N)	167.90	110.1	165.96	87.9	154.54	96.6
合計(O)	167.90	110.1	165.96	87.9	154.54	96.6
家電四品目						
市扱い(P)	2.22	169.5	0.83	21.2	1.16	64.8
合計(Q)	2.22	169.5	0.83	21.2	1.16	64.8
総搬入量						
市扱い(R)	9,564.99	101.0	10,146.53	93.6	9,474.77	98.2
許可業者	5,326.19	95.4	5,375.31	94.9	5,212.13	93.4
直接搬入	561.32	74.8	821.51	107.3	1,068.36	103.8
小計(S)	5,887.51	93.0	6,196.82	96.4	6,280.49	95.0
合計(R＋S＝T)	15,452.50	97.8	16,343.35	94.7	15,755.26	96.9
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	25	8,234	27	8,742	26	8,400
許可業者搬入全体	25	4,104	27	4,269	26	4,065
直接搬入全体	25	1,545	27	1,811	26	2,102
小　計		5,649		6,080		6,167
合　計		13,883		14,822		14,567

他都市より受入れ

	4月		5月		6月	
	搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)
可燃ごみ(豊能郡)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

（両市合計）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)
7,866.62	93.1	7,160.58	94.0	7,722.84	112.7	7,641.80	95.8
5,134.56	93.4	4,917.51	92.2	5,106.16	104.1	4,896.59	90.0
1,041.48	94.5	971.99	108.3	970.76	116.0	1,044.52	109.5
6,176.04	93.6	5,889.50	94.5	6,076.92	105.8	5,941.11	92.9
14,042.66	93.3	13,050.08	94.2	13,799.76	109.6	13,582.91	94.5
1,526.70	100.7	1,408.94	86.3	1,442.86	105.5	1,513.21	97.8
185.34	106.4	172.15	95.6	180.39	103.7	209.57	121.3
90.28	120.4	103.88	113.5	96.10	132.5	96.86	131.1
275.62	110.6	276.03	101.6	276.49	112.2	306.43	124.2
1,802.32	102.1	1,684.97	88.5	1,719.35	106.5	1,819.64	101.5
29.41	97.6	32.41	103.1	31.00	88.2	35.44	117.0
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
29.41	97.6	32.41	103.1	31.00	88.2	35.44	117.0
243.15	104.0	256.40	98.0	230.88	94.6	235.25	107.8
243.15	104.0	256.40	98.0	230.88	94.6	235.25	107.8
75.72	91.3	77.18	72.6	70.65	77.1	62.08	78.0
75.72	91.3	77.18	72.6	70.65	77.1	62.08	78.0
165.65	100.3	151.21	84.9	153.97	105.1	165.69	94.3
165.65	100.3	151.21	84.9	153.97	105.1	165.69	94.3
1.40	55.8	1.73	65.8	1.44	118.0	1.18	57.3
1.40	55.8	1.73	65.8	1.44	118.0	1.18	57.3
9,908.65	94.5	9,088.45	92.4	9,653.64	110.5	9,654.65	96.3
5,319.90	93.8	5,089.66	92.3	5,286.55	104.1	5,106.16	90.9
1,131.76	96.2	1,075.87	108.8	1,066.86	117.3	1,141.38	111.1
6,451.66	94.2	6,165.53	94.8	6,353.41	106.1	6,247.54	94.0
16,360.31	94.4	15,253.98	93.4	16,007.05	108.7	15,902.19	95.4
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
26	8,905	27	8,188	25	8,700	27	8,802
26	4,428	28	4,369	25	4,456	27	4,469
26	2,375	27	2,337	25	2,280	27	2,458
	6,803		6,706		6,736		6,927
	15,708		14,894		15,436		15,729

＊上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

7月		8月		9月		10月	
搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)
0	0.00	0	0.00	18	55.10	96	213.48

（両市合計）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量（t）	対前年比率（%）	搬入量（t）	対前年比率（%）	搬入量（t）	対前年比率（%）
可燃ごみ						
市扱い（A）	6,909.10	89.2	8,603.19	106.7	7,289.31	93.4
許可業者	4,480.15	88.4	5,357.27	92.6	4,170.49	91.3
直接搬入	1,105.47	104.0	953.25	97.3	495.16	89.4
小計（B）	5,585.62	91.1	6,310.52	93.3	4,665.65	91.1
合計（A＋B＝C）	12,494.72	90.1	14,913.71	100.6	11,954.96	92.5
不燃ごみ						
市扱い（D）	1,293.03	89.0	1,694.14	101.1	1,484.08	98.2
許可業者	218.83	142.4	270.24	144.4	188.58	121.5
直接搬入	91.10	122.4	107.36	123.7	92.00	123.6
小計（E）	309.93	135.9	377.60	137.8	280.58	122.2
合計（D＋E＝F）	1,602.96	95.3	2,071.74	106.2	1,764.66	101.3
粗大ごみ						
市扱い（G）	45.21	115.7	50.02	118.7	36.39	116.1
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計（H）	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計（G＋H＝I）	45.21	113.3	50.02	118.7	36.39	115.1
ガラスびん						
市扱い（J）	218.73	96.3	254.96	101.1	259.73	104.0
合計（K）	218.73	96.3	254.96	101.1	259.73	104.0
ペットボトル						
市扱い（L）	45.63	79.6	48.32	95.2	44.27	88.9
合計（M）	45.63	79.6	48.32	95.2	44.27	88.9
その他プラスチック						
市扱い（N）	140.14	89.8	164.78	103.1	158.80	92.3
合計（O）	140.14	89.8	164.78	103.1	158.80	92.3
家電四品目						
市扱い（P）	1.46	56.4	2.83	160.8	1.82	123.8
合計（Q）	1.46	56.4	2.83	160.8	1.82	123.8
総搬入量						
市扱い（R）	8,653.30	89.4	10,818.24	105.6	9,274.40	94.5
許可業者	4,698.98	90.0	5,627.51	94.2	4,359.07	92.3
直接搬入	1,196.57	105.1	1,060.61	99.5	587.16	93.5
小計（S）	5,895.55	92.7	6,688.12	95.0	4,946.23	92.5
合計（R＋S＝T）	14,548.85	90.7	17,506.36	101.3	14,220.63	93.8
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	7,841	26	9,235	24	8,159
許可業者搬入全体	26	4,073	27	4,637	24	3,838
直接搬入全体	26	2,398	26	2,382	24	1,455
小　計		6,471		7,019		5,293
合　計		14,312		16,254		13,452

	11月		12月		1月	
	搬入台数（台）	搬入量（t）	搬入台数（台）	搬入量（t）	搬入台数（台）	搬入量（t）
可燃ごみ（豊能郡）	0	0.00	0	0.00	0	0.00

（両市合計）　　［その4］

2月		3月		合計		
搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入日平均 搬入量(t)
6,335.58	93.0	7,569.55	102.9	90,399.51	97.7	291.61
3,932.86	85.7	4,663.90	88.7	58,088.37	92.6	186.18
399.82	85.4	423.01	85.9	9,528.92	99.4	30.74
4,332.68	85.7	5,086.91	88.4	67,617.29	93.5	216.92
10,668.26	89.9	12,656.46	96.6	158,016.80	95.8	508.53
1,213.70	94.8	1,460.24	99.6	17,469.86	96.9	56.35
178.26	138.0	227.50	136.5	2,315.61	115.3	7.42
96.08	152.5	132.52	114.2	1,233.91	119.0	3.98
274.34	142.7	360.02	127.3	3,549.52	116.6	11.40
1,488.04	101.0	1,820.26	104.1	21,019.38	99.7	67.76
35.59	100.6	34.30	108.5	437.11	105.4	1.41
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.0	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.0	0.00
35.59	100.3	34.30	108.5	437.11	105.1	1.41
218.02	90.8	217.18	99.2	2,826.88	99.8	9.12
218.02	90.8	217.18	99.2	2,826.88	99.8	9.12
40.50	96.1	45.75	97.7	669.96	82.1	2.16
40.50	96.1	45.75	97.7	669.96	82.1	2.16
141.05	93.0	155.59	99.1	1,885.28	96.0	6.08
141.05	93.0	155.59	99.1	1,885.28	96.0	6.08
0.76	37.1	1.50	85.2	18.33	73.1	0.06
0.76	37.1	1.50	85.2	18.33	73.1	0.06
7,985.20	93.3	9,484.11	102.3	113,706.93	97.5	366.80
4,111.12	87.1	4,891.40	90.2	60,403.98	93.3	193.60
495.90	93.3	555.53	91.3	10,762.83	101.3	34.72
4,607.02	87.8	5,446.93	90.3	71,166.81	94.4	228.32
12,592.22	91.2	14,931.04	97.5	184,873.74	96.3	595.12
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日平均搬入台数
25	7,602	26	8,361	310	101,169	326
25	3,707	26	4,241	312	50,656	162
25	1,338	26	1,747	310	24,228	78
	5,045		5,988		74,884	241
	12,647		14,349		176,053	567

＊上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

2月		3月		合計	
搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)	搬入台数 (台)	搬入量 (t)
0	0.00	0	0.00	114	268.58

2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	5,125.51	98.9	5,356.78	95.2	5,065.76	99.2
許可業者	3,549.99	95.3	3,590.97	95.7	3,461.95	93.7
直接搬入	272.39	77.0	506.10	115.9	687.77	114.3
小計(B)	3,822.38	93.7	4,097.07	97.8	4,149.72	96.6
合計(A＋B＝C)	8,947.89	96.6	9,453.85	96.3	9,215.48	98.0
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,052.47	114.4	1,119.22	89.2	963.52	95.9
許可業者	89.39	101.6	82.88	96.9	81.47	100.5
直接搬入	97.06	104.1	76.79	117.1	73.65	131.6
小計(E)	186.45	102.8	159.67	105.6	155.12	113.2
合計(D＋E＝F)	1,238.92	112.5	1,278.89	91.0	1,118.64	98.0
粗大ごみ						
市扱い(G)	35.50	94.1	36.03	103.4	35.81	100.8
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	35.50	93.5	36.03	103.4	35.81	100.8
ガラスびん						
市扱い(J)	122.00	98.0	143.28	110.0	129.23	91.8
合計(K)	122.00	98.0	143.28	110.0	129.23	91.8
ペットボトル						
市扱い(L)	19.64	62.7	22.93	61.2	23.08	60.1
合計(M)	19.64	62.7	22.93	61.2	23.08	60.1
その他プラスチック						
市扱い(N)	68.80	102.9	64.41	89.7	61.09	94.2
合計(O)	68.80	102.9	64.41	89.7	61.09	94.2
家電四品目						
市扱い(P)	1.57	119.8	0.69	26.8	0.82	71.3
合計(Q)	1.57	119.8	0.69	26.8	0.82	71.3
総搬入量						
市扱い(R)	6,425.49	100.9	6,743.34	94.2	6,279.31	98.2
許可業者	3,639.38	95.4	3,673.85	95.7	3,543.42	93.9
直接搬入	369.45	82.6	582.89	116.1	761.42	115.8
小計(S)	4,008.83	94.1	4,256.74	98.0	4,304.84	97.1
合計(R＋S＝T)	10,434.32	98.2	11,000.08	95.6	10,584.15	97.8
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	6,107	27	6,378	25	6,069
許可業者搬入全体	26	2,996	27	3,102	25	2,946
直接搬入全体	26	1,119	27	1,314	25	1,545
小　計		4,115		4,416		4,491
合　計		10,222		10,794		10,560

（豊中市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
5,203.42	93.0	4,699.94	93.3	5,138.70	113.1	5,056.46	95.5
3,548.03	93.4	3,330.38	92.1	3,471.90	102.1	3,443.33	91.6
669.15	99.9	656.51	109.9	691.69	122.7	727.87	120.2
4,217.18	94.3	3,986.89	94.6	4,163.59	105.0	4,171.20	95.5
9,420.60	93.6	8,686.83	93.9	9,302.29	109.3	9,227.66	95.5
1,097.46	103.2	1,001.37	88.7	1,026.23	106.8	1,061.40	97.6
99.81	116.0	101.58	113.2	91.99	103.0	94.28	112.7
62.54	115.2	72.20	108.2	67.73	136.5	72.72	133.1
162.35	115.7	173.78	111.1	159.72	114.9	167.00	120.7
1,259.81	104.7	1,175.15	91.4	1,185.95	107.8	1,228.40	100.2
29.41	97.6	32.41	103.1	31.00	88.2	35.44	117.0
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
29.41	97.6	32.41	103.1	31.00	88.2	35.44	117.0
129.32	101.3	152.49	109.6	130.33	89.1	130.92	114.5
129.32	101.3	152.49	109.6	130.33	89.1	130.92	114.5
33.16	77.8	33.91	65.7	30.98	65.7	27.14	69.0
33.16	77.8	33.91	65.7	30.98	65.7	27.14	69.0
64.23	99.5	58.94	85.1	58.50	102.1	64.09	93.7
64.23	99.5	58.94	85.1	58.50	102.1	64.09	93.7
1.18	73.3	1.39	95.2	1.25	108.7	0.72	51.1
1.18	73.3	1.39	95.2	1.25	108.7	0.72	51.1
6,558.18	94.7	5,980.45	92.6	6,416.99	110.8	6,376.17	96.0
3,647.84	93.9	3,431.96	92.6	3,563.89	102.1	3,537.61	92.0
731.69	101.0	728.71	109.7	759.42	123.8	800.59	121.3
4,379.53	95.0	4,160.67	95.2	4,323.31	105.3	4,338.20	96.3
10,937.71	94.8	10,141.12	93.6	10,740.30	108.5	10,714.37	96.1
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	6,387	27	5,901	26	6,354	27	6,302
27	3,266	27	3,183	26	3,238	27	3,298
27	1,698	27	1,652	26	1,659	27	1,777
	4,964		4,835		4,897		5,075
	11,351		10,736		11,251		11,377

※上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

（豊中市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	4,577.18	88.3	5,774.70	105.2	4,915.84	93.3
許可業者	3,150.95	90.6	3,776.51	94.6	2,910.35	92.9
直接搬入	665.51	98.1	624.13	101.2	319.94	79.3
小計(B)	3,816.46	91.9	4,400.64	95.5	3,230.29	91.4
合計(A＋B＝C)	8,393.64	89.9	10,175.34	100.8	8,146.13	92.5
不燃ごみ						
市扱い(D)	897.42	88.0	1,167.86	100.1	1,034.24	99.3
許可業者	85.81	115.8	110.79	111.1	84.17	98.8
直接搬入	63.41	127.0	74.36	123.2	69.55	134.0
小計(E)	149.22	120.4	185.15	115.7	153.72	112.1
合計(D＋E＝F)	1,046.64	91.5	1,353.01	102.0	1,187.96	100.8
粗大ごみ						
市扱い(G)	45.21	115.7	50.02	118.7	36.39	116.1
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	45.21	113.3	50.02	118.7	36.39	115.1
ガラスびん						
市扱い(J)	131.41	101.3	148.18	98.5	148.54	112.8
合計(K)	131.41	101.3	148.18	98.5	148.54	112.8
ペットボトル						
市扱い(L)	20.77	76.6	21.53	85.9	18.66	86.8
合計(M)	20.77	76.6	21.53	85.9	18.66	86.8
その他プラスチック						
市扱い(N)	53.51	92.2	66.05	102.7	61.07	97.4
合計(O)	53.51	92.2	66.05	102.7	61.07	97.4
家電四品目						
市扱い(P)	1.26	57.8	2.09	165.9	1.75	182.3
合計(Q)	1.26	57.8	2.09	165.9	1.75	182.3
総搬入量						
市扱い(R)	5,726.76	88.7	7,230.43	104.2	6,216.49	94.8
許可業者	3,236.76	91.2	3,887.30	95.0	2,994.52	93.1
直接搬入	728.92	100.0	698.49	103.1	389.49	85.5
小計(S)	3,965.68	92.7	4,585.79	96.2	3,384.01	92.1
合計(R＋S＝T)	9,692.44	90.3	11,816.22	100.9	9,600.50	93.9
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱全体	25	5,668	27	6,704	24	5,993
許可業者全体	25	2,992	27	3,427	25	2,785
直接全体	25	1,616	27	1,669	24	1,049
小　計		4,608		5,096		3,834
合　計		10,276		11,800		9,827

（豊中市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
4,287.72	92.4	5,143.25	102.3	60,345.26	97.3	165.33	194.04
2,755.18	87.5	3,260.73	89.4	40,250.27	93.3	110.27	129.01
268.72	91.2	256.92	79.8	6,346.70	103.3	17.39	20.41
3,023.90	87.8	3,517.65	88.6	46,596.97	94.5	127.66	149.41
7,311.62	90.4	8,660.90	96.3	106,942.23	96.1	292.99	343.45
860.92	94.9	1,038.33	100.1	12,320.44	97.9	33.75	39.62
76.68	121.0	97.88	111.7	1,096.73	108.2	3.00	3.52
72.21	163.6	102.03	116.8	904.25	123.2	2.48	2.91
148.89	138.5	199.91	114.3	2,000.98	114.5	5.48	6.42
1,009.81	99.5	1,238.24	102.1	14,321.42	99.9	39.24	46.03
35.59	100.6	34.30	108.5	437.11	105.4	1.20	1.41
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.0	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.0	0.00	0.00
35.59	100.3	34.30	108.5	437.11	105.1	1.20	1.41
130.00	90.1	121.81	98.3	1,617.51	100.9	4.43	5.20
130.00	90.1	121.81	98.3	1,617.51	100.9	4.43	5.20
17.05	90.2	19.65	97.0	288.50	72.0	0.79	0.93
17.05	90.2	19.65	97.0	288.50	72.0	0.79	0.93
54.10	93.3	58.93	97.0	733.72	95.7	2.01	2.36
54.10	93.3	58.93	97.0	733.72	95.7	2.01	2.36
0.58	48.7	1.22	84.7	14.52	82.1	0.04	0.05
0.58	48.7	1.22	84.7	14.52	82.1	0.04	0.05
5,385.96	92.8	6,417.49	101.8	75,757.06	97.4	207.55	243.59
2,831.86	88.2	3,358.61	89.9	41,347.00	93.6	113.28	132.52
340.93	100.6	358.95	87.7	7,250.95	105.4	19.87	23.31
3,172.79	89.4	3,717.56	89.7	48,597.95	95.2	133.15	155.84
8,558.75	91.5	10,135.05	97.0	124,355.01	96.5	340.70	399.43
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	5,626	26	6,190	311	73,679	202	237
24	2,703	26	3,122	312	37,058	102	119
24	980	26	1,291	311	17,369	48	56
	3,683		4,413		54,427	149	175
	9,309		10,603		128,106	351	412

※上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,468.29	98.7	2,698.18	94.7	2,586.42	99.7
許可業者	1,607.19	95.1	1,621.82	93.7	1,596.96	93.2
直接搬入	160.04	61.0	214.96	91.4	282.20	81.5
小計(B)	1,767.23	90.5	1,836.78	93.4	1,879.16	91.3
合計(A＋B＝C)	4,235.52	95.1	4,534.96	94.2	4,465.58	96.0
不燃ごみ						
市扱い(D)	447.43	109.5	465.57	83.3	384.75	88.7
許可業者	79.62	102.1	79.64	86.5	71.75	79.1
直接搬入	31.83	78.1	23.66	83.9	24.74	98.7
小計(E)	111.45	93.9	103.30	85.9	96.49	83.3
合計(D＋E＝F)	558.88	106.0	568.87	83.8	481.24	87.6
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	95.51	121.3	104.26	92.9	98.30	98.9
合計(K)	95.51	121.3	104.26	92.9	98.30	98.9
ペットボトル						
市扱い(L)	28.52	113.7	33.49	83.2	32.20	88.9
合計(M)	28.52	113.7	33.49	83.2	32.20	88.9
その他プラスチック						
市扱い(N)	99.10	115.6	101.55	86.7	93.45	98.2
合計(O)	99.10	115.6	101.55	86.7	93.45	98.2
家電四品目						
市扱い(P)	0.65	-------	0.14	10.4	0.34	53.1
合計(Q)	0.65	-------	0.14	10.4	0.34	53.1
総搬入量						
市扱い(R)	3,139.50	101.3	3,403.19	92.5	3,195.46	98.1
許可業者	1,686.81	95.4	1,701.46	93.3	1,668.71	92.5
直接搬入	191.87	63.3	238.62	90.6	306.94	82.6
小計(S)	1,878.68	90.7	1,940.08	93.0	1,975.65	90.8
合計(R＋S＝T)	5,018.18	97.0	5,343.27	92.7	5,171.11	95.2
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	22	2,127	24	2,364	24	2,331
許可業者搬入全体	26	1,108	27	1,167	25	1,119
直接搬入全体	26	426	27	497	25	557
小　計		1,534		1,664		1,676
合　計		3,661		4,028		4,007

（伊丹市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
2,663.20	93.2	2,460.64	95.3	2,584.14	112.0	2,585.34	96.6
1,586.53	93.6	1,587.13	92.5	1,634.26	108.7	1,453.26	86.4
372.33	86.3	315.48	105.2	279.07	102.1	316.65	90.9
1,958.86	92.1	1,902.61	94.4	1,913.33	107.7	1,769.91	87.2
4,622.06	92.7	4,363.25	94.9	4,497.47	110.1	4,355.25	92.5
429.24	94.7	407.57	81.0	416.63	102.5	451.81	98.5
85.53	97.1	70.57	78.0	88.40	104.5	115.29	129.3
27.74	133.8	31.68	127.7	28.37	123.8	24.14	125.3
113.27	104.1	102.25	88.7	116.77	108.6	139.43	128.6
542.51	96.5	509.82	82.4	533.40	103.8	591.24	104.2
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
113.83	107.1	103.91	84.7	100.55	102.8	104.33	100.5
113.83	107.1	103.91	84.7	100.55	102.8	104.33	100.5
42.56	105.5	43.27	97.1	39.67	89.0	34.94	86.8
42.56	105.5	43.27	79.1	39.67	89.0	34.94	86.8
101.42	100.9	92.27	84.8	95.47	107.0	101.60	94.7
101.42	100.9	92.27	84.8	95.47	107.0	101.60	94.7
0.22	24.4	0.34	29.1	0.19	271.4	0.46	70.8
0.22	24.4	0.34	29.1	0.19	271.4	0.46	70.8
3,350.47	94.1	3,108.00	92.1	3,236.65	109.9	3,278.48	96.8
1,672.06	93.8	1,657.70	91.8	1,722.66	108.5	1,568.55	88.6
400.07	88.4	347.16	106.9	307.44	103.8	340.79	92.7
2,072.13	92.7	2,004.86	94.1	2,030.10	107.8	1,909.34	89.3
5,422.60	93.6	5,112.86	92.9	5,266.75	109.1	5,187.82	93.9
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
26	2,518	23	2,287	25	2,346	25	2,500
27	1,162	26	1,186	26	1,218	27	1,171
27	677	26	685	26	621	27	681
	1,839		1,871		1,839		1,852
	4,357		4,158		4,185		4,352

※上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

（伊丹市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,331.92	91.1	2,828.49	109.9	2,373.47	93.6
許可業者	1,329.20	83.5	1,580.76	88.1	1,260.14	87.9
直接搬入	439.96	114.2	329.12	90.8	175.22	116.5
小計(B)	1,769.16	89.5	1,909.88	88.6	1,435.36	90.6
合計(A＋B＝C)	4,101.08	90.4	4,738.37	100.2	3,808.83	92.5
不燃ごみ						
市扱い(D)	395.61	91.2	526.28	103.4	449.84	95.6
許可業者	133.02	167.1	159.45	182.3	104.41	149.2
直接搬入	27.69	112.9	33.00	124.7	22.45	99.7
小計(E)	160.71	154.3	192.45	168.9	126.86	137.1
合計(D＋E＝F)	556.32	103.4	718.73	115.4	576.70	102.4
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	87.32	89.6	106.78	104.8	111.19	94.2
合計(K)	87.32	89.6	106.78	104.8	111.19	94.2
ペットボトル						
市扱い(L)	24.86	82.3	26.79	104.4	25.61	90.6
合計(M)	24.86	82.3	26.79	104.4	25.61	90.6
その他プラスチック						
市扱い(N)	86.63	88.4	98.73	103.4	97.73	89.4
合計(O)	86.63	88.4	98.73	103.4	97.73	89.4
家電四品目						
市扱い(P)	0.20	48.8	0.74	148.0	0.07	13.7
合計(Q)	0.20	48.8	0.74	148.0	0.07	13.7
総搬入量						
市扱い(R)	2,926.54	90.9	3,587.81	108.5	3,057.91	93.8
許可業者	1,462.22	87.5	1,740.21	92.5	1,364.55	90.7
直接搬入	467.65	114.2	362.12	93.2	197.67	114.3
小計(S)	1,929.87	92.7	2,102.33	92.6	1,562.22	93.2
合計(R＋S＝T)	4,856.41	91.6	5,690.14	102.0	4,620.13	93.6
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	24	2,173	27	2,531	22	2,166
許可業者搬入全体	25	1,081	27	1,210	25	1,053
直接搬入全体	25	782	27	713	24	406
小　計		1,863		1,923		1,459
合　計		4,036		4,454		3,625

（伊丹市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
2,047.86	94.4	2,426.30	104.3	30,054.25	98.4	82.34	103.99
1,177.68	81.7	1,403.17	87.1	17,838.10	91.0	48.87	57.36
131.10	75.5	166.09	97.5	3,182.22	92.5	8.72	10.27
1,308.78	81.1	1,569.26	88.1	21,020.32	91.2	57.59	67.62
3,356.64	88.7	3,995.56	97.3	51,074.57	95.3	139.93	171.61
352.78	94.4	421.91	98.5	5,149.42	94.7	14.11	17.82
101.58	154.4	129.62	164.0	1,218.88	122.5	3.34	3.92
23.87	126.4	30.49	106.0	329.66	108.8	0.90	1.06
125.45	148.1	160.11	148.5	1,548.54	119.3	4.24	4.98
478.23	104.3	582.02	108.5	6,697.96	99.4	18.35	22.80
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
88.02	91.9	95.37	100.4	1,209.37	98.4	3.31	4.18
88.02	91.9	95.37	100.4	1,209.37	98.4	3.31	4.18
23.45	100.9	26.10	98.2	381.46	91.8	1.05	1.32
23.45	100.9	26.10	98.2	381.46	91.8	1.05	1.32
86.95	92.8	96.66	100.4	1,151.56	96.3	3.15	3.98
86.95	92.8	96.66	100.4	1,151.56	96.3	3.15	3.98
0.18	20.9	0.28	87.5	3.81	51.6	0.01	0.01
0.18	20.9	0.28	87.5	3.81	51.6	0.01	0.01
2,599.24	94.3	3,066.62	103.2	37,949.87	97.8	103.97	131.31
1,279.26	84.9	1,532.79	90.7	19,056.98	92.5	52.21	61.28
154.97	80.5	196.58	98.7	3,511.88	93.9	9.62	11.33
1,434.23	84.4	1,729.37	91.6	22,568.86	92.7	61.83	72.61
4,033.47	90.5	4,795.99	98.7	60,518.73	95.8	165.80	203.92
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
23	1,976	24	2,171	289	27,490	75	95
24	1,004	26	1,119	311	13,598	37	44
24	358	26	456	310	6,859	19	22
	1,362		1,575		20,457	56	66
	3,338		3,746		47,947	131	161

※上記数値については、他都市よりの受入れ可燃ごみの搬入量及び搬入台数を除く。

3. ごみ搬入量の経年変化

3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	196,673.53	100.0	20,993.09	100.0	217,666.62	100.0	
2	200,664.82	102.0	21,731.83	103.5	222,396.65	102.2	102.2
3	202,102.51	102.8	22,097.34	105.3	224,199.85	103.0	100.8
4	199,934.65	101.7	24,309.23	115.8	224,243.88	103.0	100.0
5	195,923.07	99.6	28,705.85	136.7	224,628.92	103.2	100.2
6	196,008.19	99.7	33,261.16	158.4	229,269.35	105.3	102.1
7	225,769.12	114.8	33,704.89	160.6	259,474.01	119.2	113.2
8	208,147.11	105.8	31,573.80	150.4	239,720.91	110.1	92.4
9	210,295.27	106.9	30,854.57	147.0	241,149.84	110.8	100.6
10	208,417.72	106.0	30,594.55	145.7	239,012.27	109.8	99.1
11	207,933.60	105.7	30,421.13	144.9	238,354.73	109.5	99.7
12	208,327.37	105.9	32,266.45	153.7	240,593.82	110.5	100.9
13	205,876.02	104.7	30,415.19	144.9	236,291.21	108.6	98.2
14	202,921.78	103.2	30,044.98	143.1	232,966.76	107.0	98.6
15	196,259.56	99.8	30,546.30	145.5	226,805.86	104.2	97.4
16	188,327.73	95.8	30,252.67	144.1	218,580.40	100.4	96.4
17	182,419.59	92.8	29,731.66	141.6	212,151.25	97.5	97.1
18	181,105.87	92.1	29,672.75	141.3	210,778.62	96.8	99.4
19	164,926.69	83.9	27,111.39	129.1	192,038.08	88.2	91.1
20	158,016.80	80.3	26,838.61	127.8	184,855.41	84.9	96.3

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

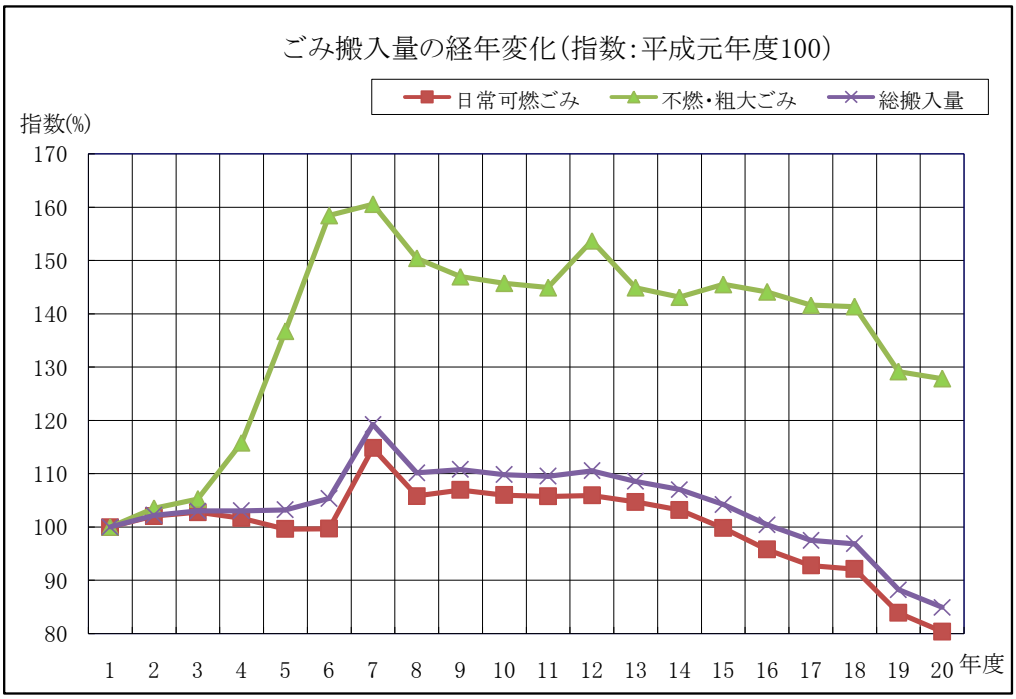

3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	143,008.31	100.0	14,277.99	100.0	157,286.30	100.0	
2	146,155.94	102.2	14,741.23	103.2	160,897.17	102.3	102.3
3	146,403.74	102.4	14,678.13	102.8	161,081.87	102.4	100.1
4	143,935.92	100.6	16,042.69	112.4	159,978.61	101.7	99.3
5	134,521.37	94.1	19,466.82	136.3	153,988.19	97.9	96.3
6	131,355.56	91.9	20,226.30	141.7	151,581.86	96.4	98.4
7	151,115.43	105.7	22,617.14	158.4	173,732.57	110.5	114.6
8	138,932.10	97.1	20,738.13	145.2	159,670.23	101.5	91.9
9	138,592.87	96.9	20,629.87	144.5	159,222.74	101.2	99.7
10	134,674.09	94.2	20,678.54	144.8	155,352.63	98.8	97.6
11	134,126.31	93.8	20,515.01	143.7	154,641.32	98.3	99.5
12	135,020.02	94.4	21,603.43	151.3	156,623.45	99.6	101.3
13	131,613.42	92.0	20,138.88	141.0	151,752.30	96.5	96.9
14	129,415.11	90.5	19,532.08	136.8	148,947.19	94.7	98.2
15	126,448.74	88.4	19,511.08	136.7	145,959.82	92.8	98.0
16	120,562.01	84.3	19,406.90	135.9	139,968.91	89.0	95.9
17	118,892.73	83.1	19,044.58	133.4	137,937.31	87.7	98.5
18	120,462.38	84.2	19,364.22	135.6	139,826.60	88.9	101.4
19	111,338.98	77.9	17,530.50	122.8	128,869.48	81.9	92.2
20	106,942.23	74.8	17,398.26	121.9	124,340.49	79.1	96.5

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

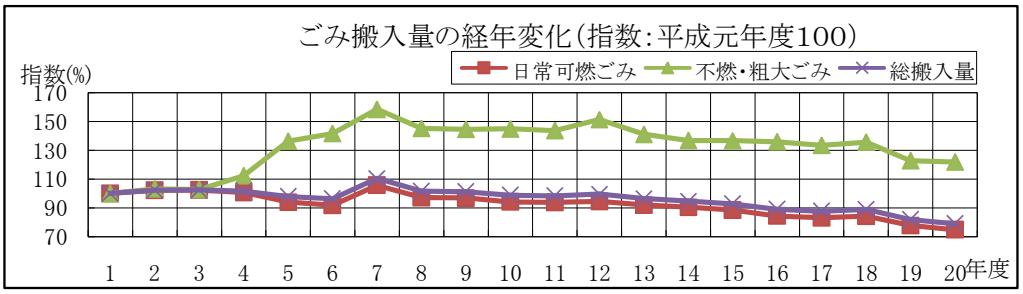

3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	53,665.22	100.0	6,715.10	100.0	60,380.32	100.0	
2	54,508.88	101.6	6,990.60	104.1	61,499.48	101.9	101.9
3	55,698.77	103.8	7,419.21	110.5	63,117.98	104.5	102.6
4	55,998.73	104.3	8,266.54	123.1	64,265.27	106.4	101.8
5	61,401.70	114.4	9,239.03	137.6	70,640.73	117.0	109.9
6	64,652.63	120.5	13,034.86	194.1	77,687.49	128.7	110.0
7	74,653.69	139.1	11,087.75	165.1	85,741.44	142.0	110.4
8	69,215.01	129.0	10,835.67	161.4	80,050.68	132.6	93.4
9	71,702.40	133.6	10,224.70	152.3	81,927.10	135.7	102.3
10	73,743.63	137.4	9,916.01	147.7	83,659.64	138.6	102.1
11	73,807.29	137.5	9,906.12	147.5	83,713.41	138.6	100.1
12	73,307.35	136.6	10,663.02	158.8	83,970.37	139.1	100.3
13	74,262.60	138.4	10,276.31	153.0	84,538.91	140.0	100.7
14	73,506.67	137.0	10,512.90	156.6	84,019.57	139.2	99.4
15	69,810.82	130.1	11,035.22	164.3	80,846.04	133.9	96.2
16	67,765.72	126.3	10,845.77	161.5	78,611.49	130.2	97.2
17	63,526.86	118.4	10,687.08	159.1	74,213.94	122.9	94.4
18	60,643.49	113.0	10,308.53	153.5	70,952.02	117.5	95.6
19	53,587.71	99.9	9,580.89	142.7	63,168.60	104.6	89.0
20	51,074.57	95.2	9,440.35	140.6	60,514.92	100.2	95.8

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

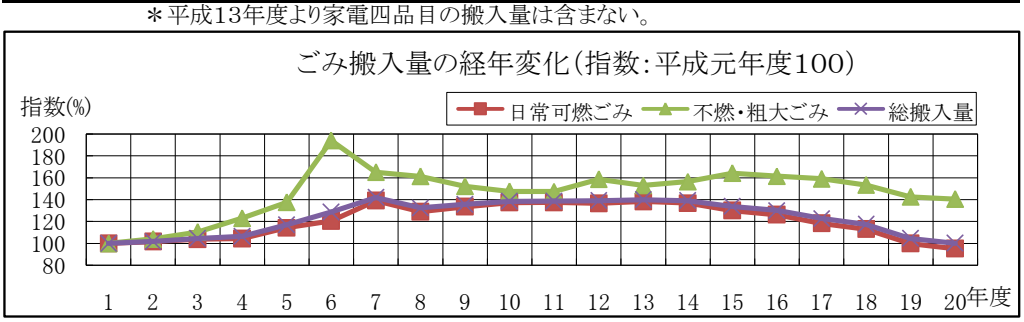

3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

A. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	148,269.28	100.0	59,876.44	100.0	9,520.90	100.0	217,666.62	100.0
2	149,493.76	100.8	64,235.96	107.3	8,666.93	91.0	222,396.65	102.2
3	148,502.70	100.2	65,862.97	110.0	9,834.18	103.3	224,199.85	103.0
4	149,304.31	100.7	66,024.43	110.3	8,915.14	93.6	224,243.88	103.0
5	147,406.15	99.4	68,334.63	114.1	8,888.14	93.4	224,628.92	103.2
6	148,768.96	100.3	72,392.06	120.9	8,108.33	85.2	229,269.35	105.3
7	175,064.05	118.1	75,661.21	126.4	8,748.75	91.9	259,474.01	119.2
8	152,231.45	102.7	77,755.48	129.9	9,733.98	102.2	239,720.91	110.1
9	150,501.64	101.5	80,313.59	134.1	10,334.61	108.5	241,149.84	110.8
10	147,630.23	99.6	80,509.50	134.5	10,872.54	114.2	239,012.27	109.8
11	147,290.41	99.3	80,157.14	133.9	10,907.18	114.6	238,354.73	109.5
12	148,598.01	100.2	82,389.97	137.6	9,605.84	100.9	240,593.82	110.5
13	144,438.65	97.4	81,534.28	136.2	10,318.28	108.4	236,291.21	108.6
14	139,502.39	94.1	82,918.69	138.5	10,545.68	110.8	232,966.76	107.0
15	130,377.85	87.9	84,057.55	140.4	12,370.46	129.9	226,805.86	104.2
16	125,664.38	84.8	80,960.90	135.2	11,955.12	125.6	218,580.40	100.4
17	123,476.36	83.3	76,142.32	127.2	12,532.57	131.6	212,151.25	97.5
18	123,197.61	83.1	71,474.82	119.4	16,106.19	169.2	210,778.62	96.8
19	116,586.98	78.6	64,763.28	108.2	10,687.82	112.3	192,038.08	88.2
20	113,688.60	76.7	60,403.98	100.9	10,762.83	113.0	184,855.41	84.9

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

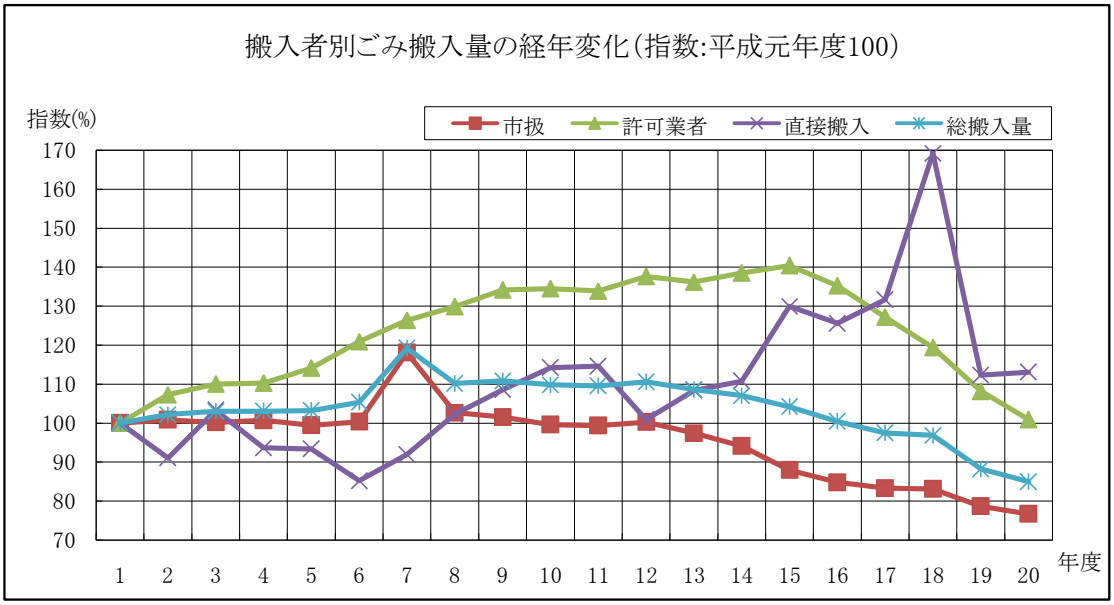

B. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	103,631.95	100.0	47,540.05	100.0	6,114.30	100.0	157,286.30	100.0
2	104,522.46	100.9	50,740.44	106.7	5,634.27	92.1	160,897.17	102.3
3	102,695.94	99.1	51,870.67	109.1	6,515.26	106.6	161,081.87	102.4
4	101,721.38	98.2	52,130.78	109.7	6,126.45	100.2	159,978.61	101.7
5	97,748.53	94.3	50,406.93	106.0	5,832.73	95.4	153,988.19	97.9
6	95,408.20	92.1	50,922.55	107.1	5,251.11	85.9	151,581.86	96.4
7	116,017.41	112.0	52,064.27	109.5	5,650.89	92.4	173,732.57	110.5
8	100,382.17	96.9	53,058.75	111.6	6,229.31	101.9	159,670.23	101.5
9	99,378.13	95.9	53,404.54	112.3	6,440.07	105.3	159,222.74	101.2
10	97,509.41	94.1	51,223.02	107.7	6,620.20	108.3	155,352.63	98.8
11	96,841.31	93.4	50,935.49	107.1	6,864.52	112.3	154,641.32	98.3
12	97,178.01	93.8	53,631.97	112.8	5,813.47	95.1	156,623.45	99.6
13	93,689.03	90.4	52,048.43	109.5	6,014.84	98.4	151,752.30	96.5
14	90,044.33	86.9	52,864.65	111.2	6,038.21	98.8	148,947.19	94.7
15	87,442.15	84.4	51,906.85	109.2	6,610.82	108.1	145,959.82	92.8
16	83,114.98	80.2	49,883.11	104.9	6,970.82	114.0	139,968.91	89.0
17	81,499.74	78.6	48,003.06	101.0	8,434.51	137.9	137,937.31	87.7
18	82,083.96	79.2	46,618.32	98.1	11,124.32	181.9	139,826.60	88.9
19	77,776.53	75.1	44,167.11	92.9	6,925.84	113.3	128,869.48	81.9
20	75,742.54	73.1	41,347.00	87.0	7,250.95	118.6	124,340.49	79.1

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

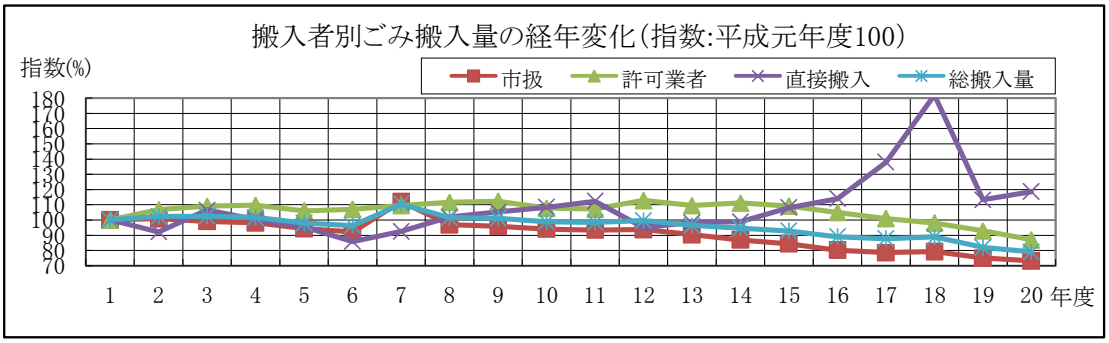

C. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	44,637.33	100.0	12,336.39	100.0	3,406.60	100.0	60,380.32	100.0
2	44,971.30	100.7	13,495.52	109.4	3,032.66	89.0	61,499.48	101.9
3	45,806.76	102.6	13,992.30	113.4	3,318.92	97.4	63,117.98	104.5
4	47,582.93	106.6	13,893.65	112.6	2,788.69	81.9	64,265.27	106.4
5	49,657.62	111.2	17,927.70	145.3	3,055.41	89.7	70,640.73	117.0
6	53,360.76	119.5	21,469.51	174.0	2,857.22	83.9	77,687.49	128.7
7	59,046.64	132.3	23,596.94	191.3	3,097.86	90.9	85,741.44	142.0
8	51,849.28	116.2	24,696.73	200.2	3,504.67	102.9	80,050.68	132.6
9	51,123.51	114.5	26,909.05	218.1	3,894.54	114.3	81,927.10	135.7
10	50,120.82	112.3	29,286.48	237.4	4,252.34	124.8	83,659.64	138.6
11	50,449.10	113.0	29,221.65	236.9	4,042.66	118.7	83,713.41	138.6
12	51,420.00	115.2	28,758.00	233.1	3,792.37	111.3	83,970.37	139.1
13	50,749.62	113.7	29,485.85	239.0	4,303.44	126.3	84,538.91	140.0
14	49,458.06	110.8	30,054.04	243.6	4,507.47	132.3	84,019.57	139.2
15	42,935.70	96.2	32,150.70	260.6	5,759.64	169.1	80,846.04	133.9
16	42,549.40	95.3	31,077.79	251.9	4,984.30	146.3	78,611.49	130.2
17	41,976.62	94.0	28,139.26	228.1	4,098.06	120.3	74,213.94	122.9
18	41,113.65	92.1	24,856.50	201.5	4,981.87	146.2	70,952.02	117.5
19	38,810.45	86.9	20,596.17	167.0	3,761.98	110.4	63,168.60	104.6
20	37,946.06	85.0	19,056.98	154.5	3,511.88	103.1	60,514.92	100.2

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

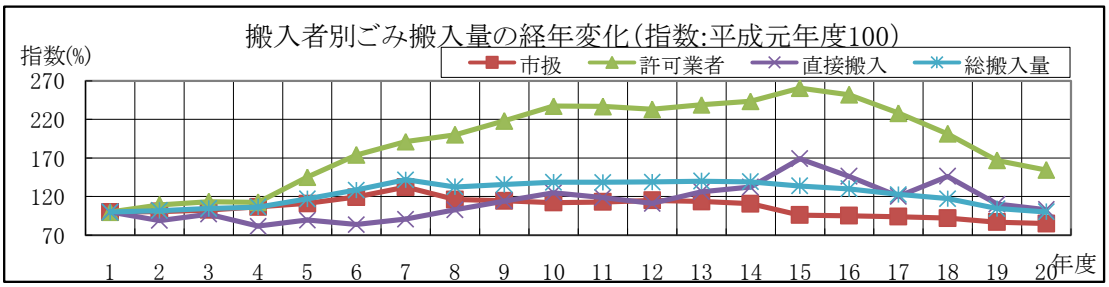

4. ご　み　質

4－1. 可燃ごみの物理組成（重量％・WET基準）

（WET：％）

物理組成 ＼ 月日		5月8日	7月7日	10月6日	1月26日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	37.3	32.0	35.7	41.8	36.5
	植物性厨芥	24.1	34.4	36.6	25.7	30.2
	動物性厨芥	5.8	2.5	1.2	6.3	4.0
	卵殻・骨類	0.1	1.1	0.7	0.7	0.7
	木・竹類	3.3	1.4	1.6	1.7	2.0
	草・わら類	2.3	10.8	8.0	0.5	5.4
	繊維類	1.3	3.0	3.7	3.0	2.8
	その他（細塵）	2.9	0.8	1.8	0.8	1.6
可燃物計		77.1	86.0	89.3	80.5	83.2
焼却不適物	プラスチック類	19.2	12.9	10.1	17.1	14.8
	ゴム類	0.7	0.0	0.0	0.8	0.4
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		19.9	12.9	10.1	17.9	15.2
焼却不適物＋可燃物合計		97.0	98.9	99.4	98.4	98.4
不燃物	金属類	1.0	0.5	0.3	0.9	0.7
	ガラス・陶器類	1.9	0.2	0.0	0.7	0.7
	土・石塊類	0.1	0.4	0.3	0.0	0.2
不燃物合計		3.0	1.1	0.6	1.6	1.6
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－2. 可燃ごみの物理組成（重量％・DRY基準）

（DRY:％）

物理組成 ＼ 月日		5月8日	7月7日	10月6日	1月26日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	38.1	37.8	47.5	49.9	43.2
	植物性厨芥	16.1	21.1	19.7	10.8	16.9
	動物性厨芥	2.3	1.4	1.2	6.1	2.8
	卵殻・骨類	0.1	1.6	1.2	1.1	1.0
	木・竹類	4.3	2.4	2.2	1.9	2.7
	草・わら類	1.3	6.6	5.3	0.2	3.4
	繊維類	1.7	4.7	6.1	4.0	4.1
	その他（細塵）	2.6	1.1	2.4	0.8	1.7
可燃物計		66.5	76.7	85.6	74.8	75.8
焼却不適物	プラスチック類	26.7	21.3	13.0	20.4	20.4
	ゴム類	1.2	0.0	0.1	1.6	0.7
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		27.9	21.3	13.1	22.0	21.1
焼却不適物＋可燃物合計		94.4	98.0	98.7	96.8	96.9
不燃物	金属類	1.8	0.7	0.8	1.7	1.3
	ガラス・陶器類	3.6	0.5	0.0	1.4	1.4
	土・石塊類	0.2	0.8	0.5	0.1	0.4
不燃物合計		5.6	2.0	1.3	3.2	3.1
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

（WET：%）

物理組成 ＼ 年度		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
可燃物	紙・セロファン類	52.5	41.5	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5
	植物性厨芥	12.8	18.9	24.3	29.3	23.6	19.8	27.6	28.9	27.1	26.4	30.2
	動物性厨芥	3.1	2.0	0.6	1.9	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.5	4.0
	卵殻・骨類	0.5	0.9	0.2	0.7	0.7	0.5	0.9	1.2	0.5	1.1	0.7
	木・竹類	4.1	3.8	0.7	1.1	2.6	5.6	1.7	1.9	2.8	1.0	2.0
	草・わら類	1.8	11.1	11.7	2.8	3.5	2.3	2.8	2.0	2.8	2.3	5.4
	繊維類	3.4	3.9	4.3	6.6	5.1	7.2	4.7	5.1	7.8	3.6	2.8
	その他（細塵）	1.4	1.2	0.5	2.0	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	0.9	1.6
可燃物計		79.6	83.3	83.3	86.0	86.1	85.4	85.3	84.1	86.4	84.1	83.2
不焼適却物	プラスチック類	16.8	13.9	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8
	ゴム類	0.8	0.2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.5	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.4
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	＜0.1	0.0	0.6	0.0	0.0
焼却不適物計		17.6	14.1	13.5	12.9	12.2	13.1	13.7	14.8	11.0	14.0	15.2
焼却不適物＋可燃物合計		97.2	97.4	96.8	98.9	98.3	98.5	99.0	98.9	97.4	98.1	98.4
不燃物	金属類	2.0	1.2	0.5	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	1.6	1.2	0.7
	ガラス・陶器類	0.6	0.3	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	1.0	0.5	0.7
	土・石塊類	0.2	1.1	2.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
不燃物合計		2.8	2.6	3.2	1.1	1.7	1.5	1.0	1.1	2.6	1.9	1.6
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・DRY基準）

（DRY:%）

物理組成 ＼ 年度		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
可燃物	紙・セロファン類	59.5	48.6	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2
	植物性厨芥	6.4	6.4	13.5	8.4	10.3	8.3	13.0	12.7	9.8	11.6	16.9
	動物性厨芥	1.9	1.2	0.4	1.4	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	2.8
	卵殻・骨類	0.5	1.0	0.3	0.9	0.9	0.5	1.2	1.7	0.5	1.4	1.0
	木・竹類	3.1	5.8	0.8	1.6	2.5	5.6	2.3	2.5	3.1	1.4	2.7
	草・わら類	1.0	9.7	8.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	2.2	1.6	3.4
	繊維類	3.7	5.6	6.2	10.2	6.9	10.1	7.3	7.0	10.5	5.1	4.1
	その他（細塵）	1.2	1.0	0.6	2.2	1.4	1.7	1.1	1.0	0.9	0.8	1.7
可燃物計		77.3	79.3	78.8	80.6	82.6	81.2	79.4	78.3	79.8	78.5	75.8
不焼適却物	プラスチック類	18.0	16.5	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4
	ゴム類	1.0	0.3	＜0.1	0.1	＜0.1	0.8	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.7
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	＜0.1	0.0	1.0	0.0	0.0
焼却不適物計		19.0	16.8	16.6	17.6	14.7	16.2	18.9	19.8	15.7	18.3	21.1
焼却不適物＋可燃物合計		96.3	96.1	95.4	98.2	97.3	97.4	98.3	98.1	95.5	96.8	96.9
不燃物	金属類	2.6	1.8	0.9	0.8	1.2	1.4	1.0	0.8	2.8	1.9	1.3
	ガラス・陶器類	0.9	0.4	0.7	0.3	1.1	0.8	0.4	0.7	1.7	1.0	1.4
	土・石塊類	0.2	1.7	3.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.1	0.3	0.4
不燃物合計		3.7	3.9	4.6	1.8	2.7	2.6	1.7	1.9	4.5	3.2	3.1
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準)

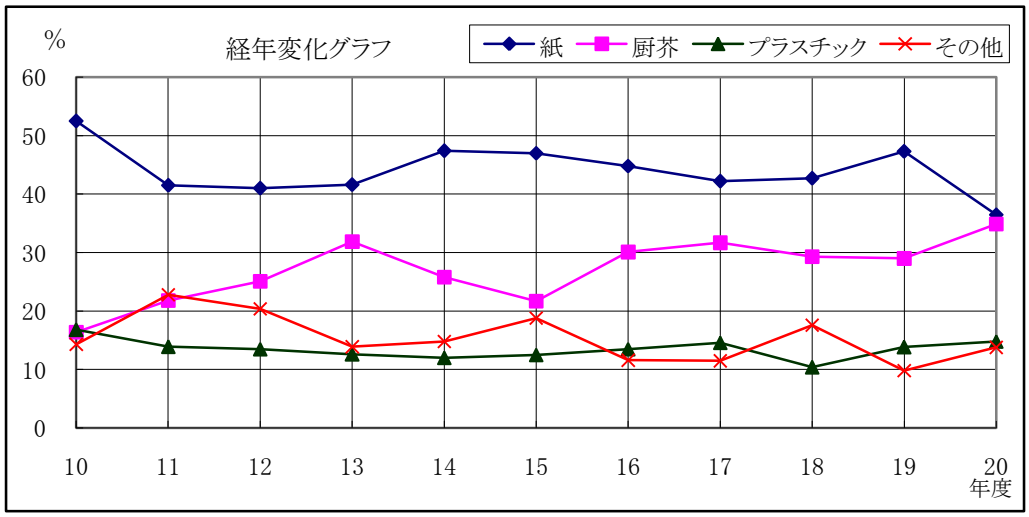

項目＼年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
紙	52.5	41.5	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5
厨　芥	16.4	21.8	25.1	31.9	25.8	21.7	30.1	31.7	29.3	29.0	34.9
プラスチック	16.8	13.9	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8
そ　の　他	14.3	22.8	20.4	13.9	14.8	18.8	11.6	11.5	17.6	9.8	13.8

4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準)

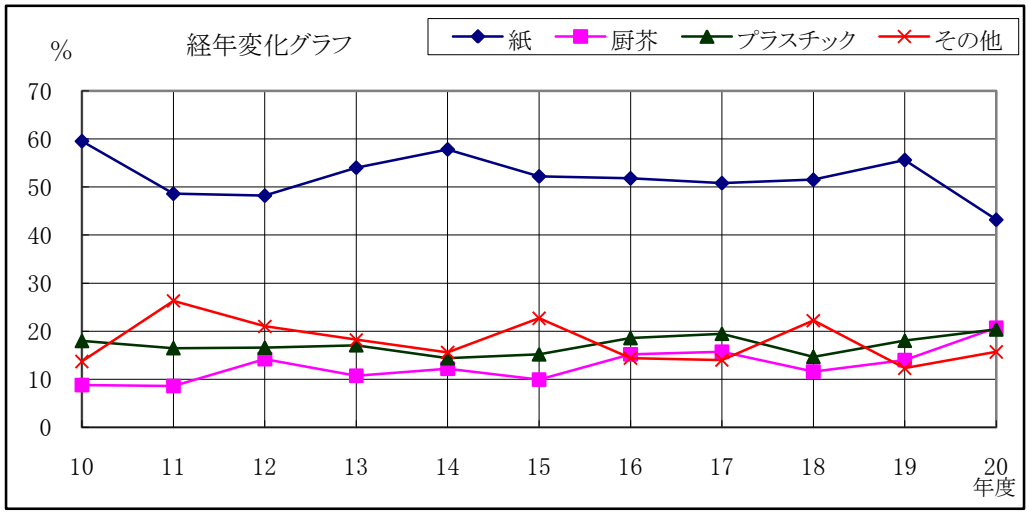

項目＼年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
紙	59.5	48.6	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2
厨　芥	8.8	8.6	14.2	10.7	12.2	9.9	15.2	15.7	11.6	14.0	20.7
プラスチック	18.0	16.5	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4
そ　の　他	13.7	26.3	21.0	18.2	15.6	22.7	14.4	14.0	22.2	12.3	15.7

4－7. 可燃ごみの見掛比重･ごみ質･低位発熱量

項目 ＼ 月日			5月8日	7月7日	10月6日	1月26日	平均値
見掛比重 t/m³			0.201	0.226	0.214	0.210	0.213
ごみ質	可燃分(B) %	プラスチック(Xpl)%	29.7	21.9	13.3	22.7	21.9
		プラスチック以外(Xpa)%	70.3	78.1	86.7	77.3	78.1
			42.3	35.9	38.4	41.5	39.5
	灰分(a)%		7.7	5.3	5.1	5.2	5.8
	水分(W)%		50.0	58.8	56.5	53.3	54.7
低位発熱量 MJ／kg	(1)三成分法による発熱量		6.70	5.27	5.82	6.49	6.07
	(2)ボンブ法による発熱量		7.33	5.78	6.07	7.28	6.62
	(3)四成分法による発熱量		9.00	6.70	6.74	8.20	7.66
	(4)熱精算法による発熱量		12.01	10.34	10.78	10.56	10.92

＊ (1)4. 18605(4500×B－600×W)／1000
(2)実測発熱量
(3)4. 18605{(8845×Xpl＋4500×Xpa)×B－600×W}／1000
(4)1～4号炉における熱精算法による日平均(運転状況)

4－8. ごみの三成分(可燃分･灰分･水分)の経年変化(%)

区分 ＼ 年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
可燃分	52.0	48.8	48.5	49.0	47.9	43.1	47.8	48.5	48.0	46.3	39.5
灰分	12.6	7.3	6.1	5.7	5.5	9.0	5.3	5.1	7.7	5.8	5.8
水分	35.4	43.9	45.4	45.3	46.6	47.9	46.9	46.4	44.3	47.9	54.7

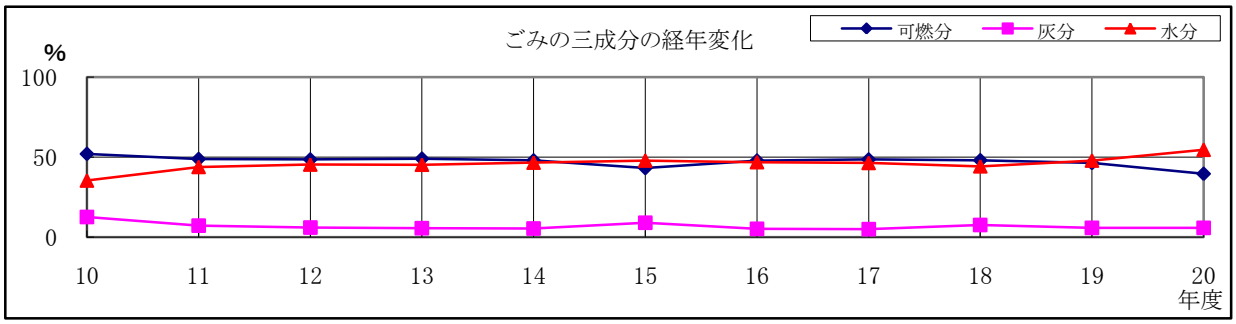

4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ／kg)

区分 ＼ 年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ボンブ法	10.59	9.38	9.60	9.50	8.77	9.08	9.36	9.84	9.09	8.73	6.62
三成分法	8.92	8.10	8.01	8.10	7.86	6.93	7.82	7.98	7.92	7.52	6.07

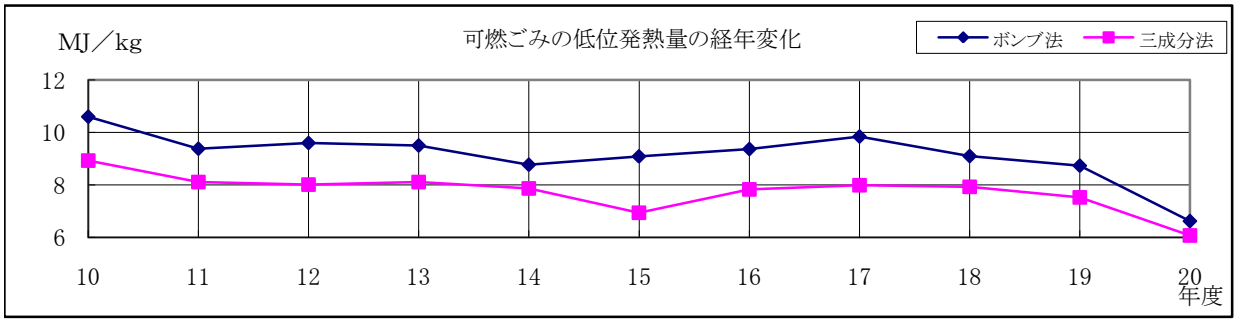

4－10. 不燃ごみの物理組成（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月7日	7月8日	10月7日	1月27日	平均値
可燃物	プラスチック類	53.1	41.8	42.5	49.8	46.6
	ゴム・皮革類	0.3	12.5	10.2	1.6	6.2
	紙類・その他可燃物	5.1	12.5	14.0	10.6	10.6
	細塵・その他	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3
可燃物計		58.9	67.2	67.1	62.1	63.7
不燃物	鉄類	9.5	5.3	18.3	13.7	11.7
	非鉄金属類	2.6	1.8	1.4	3.7	2.4
	ガラス類	25.5	18.1	11.4	8.4	15.9
	陶磁器・土・石塊	3.5	7.6	1.8	12.1	6.3
不燃物計		41.1	32.8	32.9	37.9	36.3
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

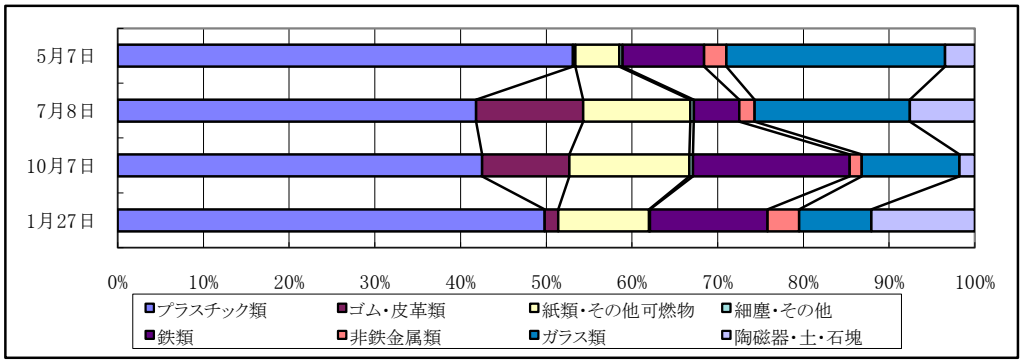

4－11. 不燃ごみの物理組成（重量%・DRY基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月7日	7月8日	10月7日	1月27日	平均値
可燃物	プラスチック類	51.5	42.5	42.2	50.3	46.6
	ゴム・皮革類	0.3	12.9	10.1	1.6	6.2
	紙類・その他可燃物	5.0	10.0	13.5	8.6	9.3
	細塵・その他	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3
可燃物計		57.2	65.8	66.2	60.6	62.4
不燃物	鉄類	9.9	5.6	18.9	14.2	12.2
	非鉄金属類	2.6	1.8	1.4	3.8	2.4
	ガラス類	26.7	18.9	11.7	8.8	16.5
	陶磁器・土・石塊	3.6	7.9	1.8	12.6	6.5
不燃物計		42.8	34.2	33.8	39.4	37.6
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

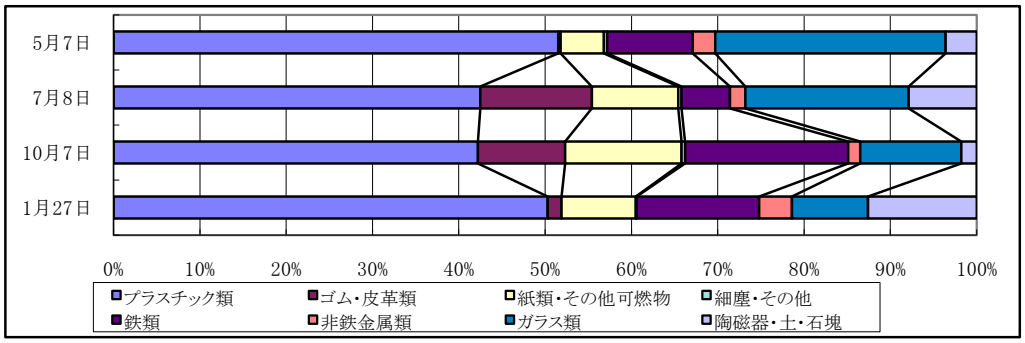

4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 年度		16	17	18	19	20
可燃物	プラスチック類	53.4	54.5	56.0	57.5	46.6
	ゴム・皮革類	1.6	1.7	4.8	1.6	6.2
	紙類・その他可燃物	11.9	10.4	4.6	9.9	10.6
	細塵・その他	0.7	0.5	2.1	0.5	0.3
可燃物計		67.6	67.1	67.5	69.5	63.7
不燃物	鉄類	11.9	9.5	9.7	10.6	11.7
	非鉄金属類	4.2	4.5	6.1	3.2	2.4
	ガラス類	11.9	13.0	12.7	13.5	15.9
	陶磁器・土・石塊	4.4	5.9	4.0	3.2	6.3
不燃物計		32.4	32.9	32.5	30.5	36.3
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

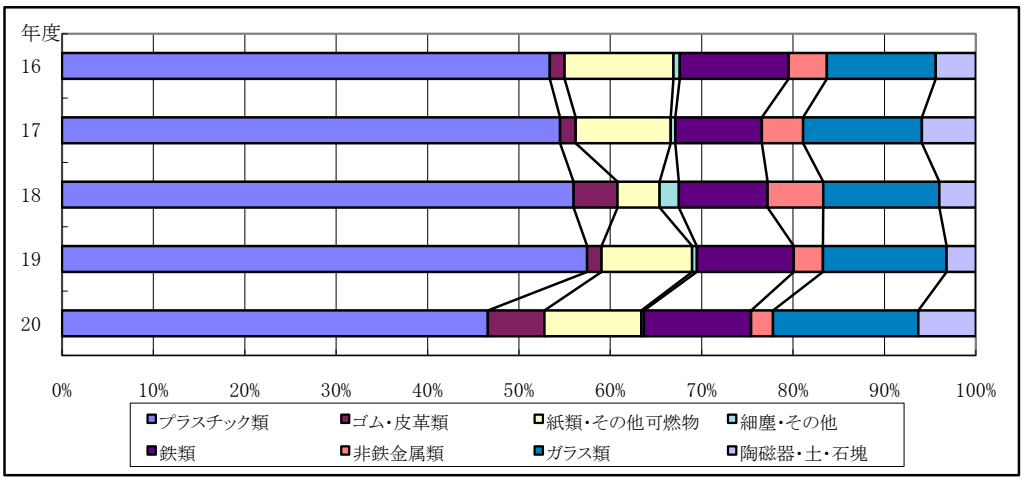

Ⅱ．ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化

1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化

区分	焼却対象ごみ量					焼却量		
	可燃ごみ搬入量	粗大選別可燃物	計	暦日平均	指数	焼却実績量	暦日平均	指数
年度	(t)	(t)	(t)	(t)	(%)	(t)	(t)	(%)
2	200,664.82		200,664.82	550	100.0	194,795.06	534	100.0
3	202,102.51		202,102.51	552	100.4	193,805.62	530	99.2
4	199,934.65	3,866.40	203,801.05	558	101.6	191,374.40	524	98.2
5	195,923.07	10,697.00	206,620.07	566	103.0	200,208.18	549	102.8
6	196,008.19	11,889.00	207,897.19	570	103.6	196,418.27	538	100.8
7	225,769.12	13,065.90	238,835.02	653	118.7	225,481.22	616	115.4
8	208,147.11	13,364.20	221,511.31	607	110.4	211,344.65	579	108.5
9	210,295.27	13,117.00	223,412.27	612	111.3	216,633.90	594	111.3
10	208,339.32	12,372.20	220,711.52	605	110.0	219,147.59	600	112.5
11	207,858.02	13,383.20	221,241.22	604	110.0	216,929.84	593	111.1
12	208,259.28	14,492.90	222,752.18	610	111.0	218,100.91	598	112.0
13	205,803.06	13,491.90	219,294.96	601	109.3	215,930.21	592	110.8
14	202,855.84	12,640.50	215,496.34	590	107.4	210,631.86	577	108.1
15	196,203.76	12,028.70	208,232.46	569	103.5	207,471.75	567	106.2
16	188,276.59	12,007.70	200,284.29	549	99.8	204,441.12	560	105.0
17	182,363.91	12,668.30	195,032.21	534	97.2	195,784.52	536	100.5
18	181,037.35	13,460.80	194,498.15	533	96.9	196,246.13	538	100.7
19	164,860.19	12,627.20	177,487.39	485	88.2	180,523.54	493	92.4
20	157,935.75	12,826.10	170,761.85	468	85.1	173,770.96	476	89.2

※平成10年度からリサイクルボックスに投入された紙類は可燃ごみ搬入量に含まない。

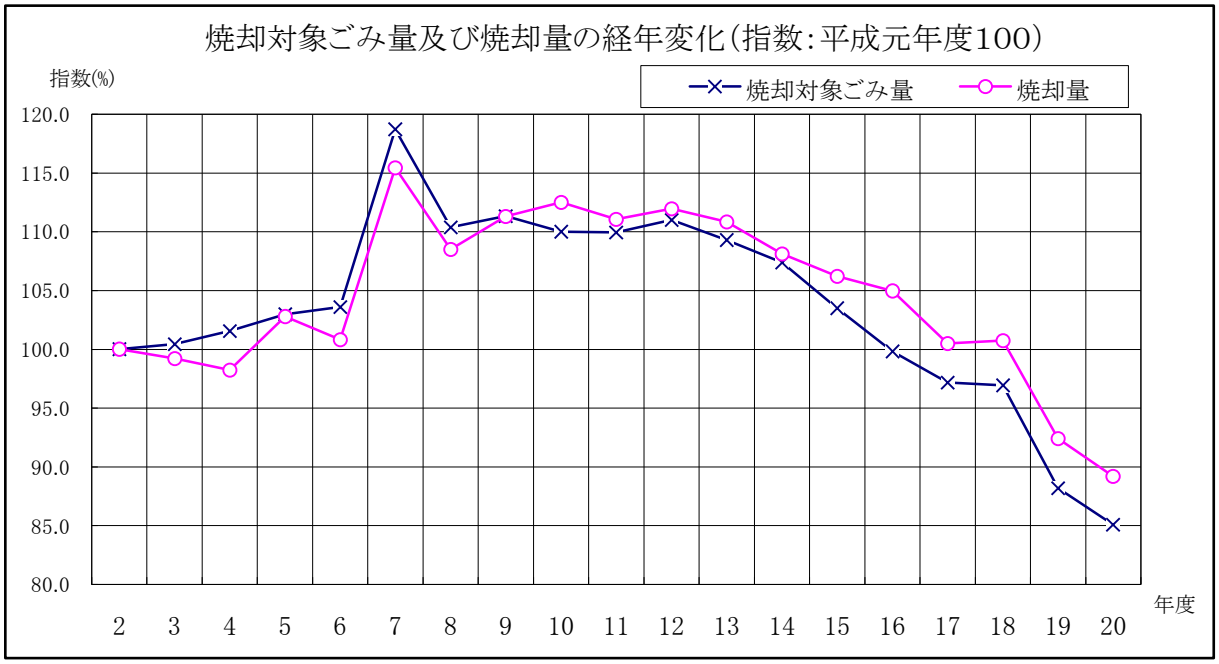

1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化

年度 / 月別	20年度		19年度		18年度		17年度		16年度	
	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)
4	14,196.60	473	14,663.12	489	15,369.32	539	16,170.27	512	17,125.05	571
5	15,206.98	491	15,989.71	516	17,705.86	550	17,041.13	571	17,211.86	555
6	14,680.31	489	14,987.86	500	17,282.19	548	16,453.33	576	17,332.93	578
7	15,133.72	488	16,161.86	521	17,348.35	530	16,432.27	560	17,429.10	562
8	14,041.06	453	14,969.89	483	17,622.85	554	17,176.42	568	17,265.36	557
9	14,818.24	494	13,605.50	454	16,276.35	543	16,280.65	543	16,823.26	561
10	14,716.95	475	15,389.21	496	16,414.24	528	16,368.50	529	16,419.48	530
11	13,399.43	447	14,891.96	496	15,641.50	546	16,393.19	521	17,439.29	581
12	16,157.26	521	15,984.98	516	17,511.37	572	17,739.23	565	18,264.31	589
1	13,047.02	421	13,924.09	449	14,790.99	488	15,123.87	485	15,060.96	486
2	11,622.37	415	12,808.85	442	13,324.83	494	13,818.58	476	13,503.54	482
3	13,741.91	443	14,110.36	455	15,210.30	517	16,034.77	491	16,409.15	529
計	170,761.85	569	177,487.39	485	194,498.15	534	195,032.21	534	200,284.29	548

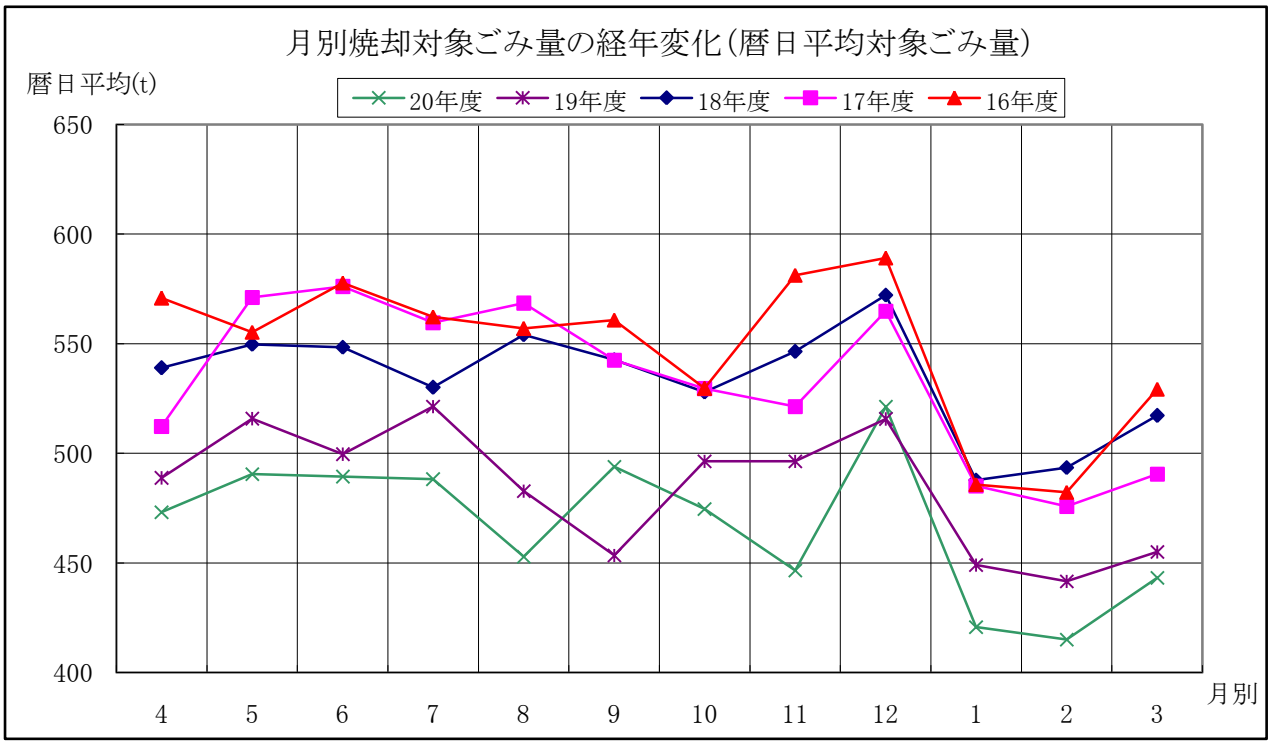

2. 焼 却 関 係

2－1. 焼却炉稼働状況（1～4号炉合計）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均	(最大値)	炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分		分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	13,095.03	503.66	26	1,734	19	0	0	1,734	19	80	0	20	31	0	0
5	17,050.03	550.00	31	2,232	11	0	0	2,232	11	18	58	9	57	0	0
6	15,195.03	506.50	30	0	0	2,133	12	2,133	12	52	52	21	58	0	0
7	15,011.69	484.25	31	0	0	2,230	7	2,230	7	19	58	6	58	1	38
8	14,890.29	480.33	31	0	0	2,231	54	2,231	54	0	0	0	0	0	6
9	13,662.44	455.41	30	0	0	2,140	7	2,140	7	56	37	12	59	0	0
10	15,016.99	484.42	31	0	0	2,231	40	2,231	40	19	48	7	29	0	0
11	14,241.03	474.70	30	936	0	1,079	28	2,015	28	19	52	9	32	0	0
12	16,312.27	543.74	30	1,954	10	288	44	2,242	54	38	23	24	8	0	0
1	13,826.60	493.81	28	792	52	1,061	53	1,854	45	62	37	6	10	0	0
2	11,003.29	392.97	28	1,381	37	0	0	1,381	37	39	5	4	56	0	0
3	14,466.27	466.65	31	1,176	0	792	11	1,968	11	19	44	5	56	0	0
計	173,770.96	－	357	10,207	9	14,189	16	24,396	25	427	54	130	34	1	44
平均	14,480.91	486.75	30	850	36	1,182	26	2,033	2	35	39	10	53	0	9
最大	17,050.03	550.00	31	2,232	11	2,231	54	2,242	54	80	0	24	8	1	38
最小	11,003.29	392.97	26	0	0	0	0	1,381	37	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24*4
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
100	31	1,834	50	629	37	0	0	415	33	1,045	10	4	4	0	63.7
28	55	2,261	6	279	39	0	0	435	15	714	54	1	1	0	76.0
74	50	2,208	2	246	48	0	0	425	10	671	58	3	3	0	76.7
28	34	2,258	41	717	19	0	0	0	0	717	19	1	1	2	75.9
0	6	2,232	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	1	75.0
69	36	2,209	43	183	17	0	0	487	0	670	17	2	2	0	76.7
27	17	2,258	57	389	15	0	0	327	48	717	3	1	1	0	75.9
29	24	2,044	52	447	34	0	0	387	34	835	8	1	1	0	71.0
62	31	2,305	25	0	0	0	0	670	35	670	35	2	5	0	77.5
68	47	1,923	32	0	0	0	0	1,052	28	1,052	28	3	1	0	64.6
44	1	1,425	38	0	0	0	0	1,262	22	1,262	22	2	1	0	53.0
25	40	1,993	51	0	0	0	0	982	9	982	9	1	1	0	67.0
560	12	24,956	37	3,637	29	0	0	6,445	54	10,083	23	21	21	3	—
46	41	2,079	43	303	7	0	0	537	9	840	17	2	2	0	71.2
100	31	2,305	25	744	0	0	0	1,262	22	1,262	22	4	5	2	77.5
0	6	1,425	38	0	0	0	0	0	0	670	17	0	0	0	53.0

2－2. 焼却炉稼働状況（1号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	4,196.75	161.41	26	579	37	0	0	579	37	19	49	4	23	0	0
5	5,261.25	169.72	31	744	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	2,173.96	135.87	16	0	0	336	20	336	20	19	36	10	46	0	0
7	4,563.71	147.22	31	0	0	742	47	742	47	0	0	0	0	1	13
8	4,576.97	147.64	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	4,420.09	147.34	30	0	0	719	3	719	3	0	0	0	0	0	0
10	2,145.79	143.05	15	0	0	347	16	347	16	0	0	7	29	0	0
11	1,589.02	132.42	12	0	0	252	34	252	34	19	52	0	0	0	0
12	4,988.22	166.27	30	610	26	96	0	706	26	0	0	5	34	0	0
1	4,437.10	158.47	28	265	45	374	0	639	45	20	33	0	0	0	0
2	474.85	158.28	3	59	12	0	0	59	12	0	0	4	56	0	0
3	1,113.64	123.74	9	0	0	180	54	180	54	19	44	0	0	0	0
計	39,941.35	－	262	2,259	0	3,792	54	6,051	54	99	34	33	8	1	13
平均	3,328.45	152.45	22	188	15	316	5	504	20	8	18	2	46	0	6
最大	5,261.25	169.72	31	744	0	744	0	744	0	20	33	10	46	1	13
最小	474.85	123.74	3	0	0	0	0	59	12	0	0	0	0	0	0

2－3. 焼却炉稼働状況（2号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,769.34	157.06	24	490	41	0	0	490	41	40	20	4	45	0	0
5	2,201.00	169.31	13	298	48	0	0	298	48	0	0	9	57	0	0
6	4,233.27	151.19	28	0	0	636	38	636	38	19	43	0	0	0	0
7	4,428.73	147.62	30	0	0	707	19	707	19	0	0	6	58	0	0
8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3,151.22	137.01	23	0	0	515	2	515	2	20	24	0	0	0	0
10	4,573.38	147.53	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
11	4,793.94	159.80	30	360	0	360	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	5,021.97	167.40	30	611	16	96	0	707	16	0	0	4	6	0	0
1	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4,806.50	178.02	27	612	59	0	0	612	59	19	51	0	0	0	0
3	5,181.08	167.13	31	432	0	312	0	744	0	0	0	0	0	0	0
計	42,160.43	－	267	2,805	44	3,370	59	6,176	43	100	18	25	46	0	0
平均	3,513.37	157.90	22	233	49	280	55	514	44	8	22	2	9	0	0
最大	5,181.08	178.02	31	612	59	744	0	744	0	40	20	9	57	0	0
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率(C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
24	12	603	49	0	0	0	0	116	11	116	11	1	1	0	83.9
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
30	22	366	42	0	0	0	0	353	18	353	18	1	1	0	50.9
1	13	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	719	3	0	0	0	0	0	57	0	57	0	0	0	99.9
7	29	354	45	389	15	0	0	0	0	389	15	0	1	0	47.7
19	52	272	26	447	34	0	0	0	0	447	34	1	0	0	37.8
5	34	712	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	1	0	95.7
20	33	660	18	0	0	0	0	83	42	83	42	1	0	0	88.8
4	56	64	8	0	0	0	0	607	52	607	52	0	1	0	9.5
19	44	200	38	0	0	0	0	543	22	543	22	1	0	0	27.0
133	55	6,185	49	836	49	0	0	1,737	22	2,574	11	5	5	1	―
11	10	515	29	69	44	0	0	144	47	214	31	0	0	0	70.6
30	22	744	0	447	34	0	0	607	52	607	52	1	1	1	100.0
0	0	64	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.5

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率(C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
45	5	535	46	0	0	0	0	184	14	184	14	2	1	0	74.4
9	57	308	45	0	0	0	0	435	15	435	15	0	1	0	41.5
19	43	656	21	0	0	0	0	63	39	63	39	1	0	0	91.2
6	58	714	17	29	43	0	0	0	0	29	43	0	1	0	96.0
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
20	24	535	26	183	17	0	0	1	17	184	34	1	0	0	74.4
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
4	6	711	22	0	0	0	0	32	38	32	38	0	1	0	95.6
0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0.0
19	51	632	50	0	0	0	0	39	10	39	10	1	0	0	94.2
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
126	4	6,302	47	957	0	0	0	1,500	13	2,457	13	5	4	0	―
10	30	525	14	79	45	0	0	125	1	204	46	0	0	0	71.9
45	5	744	0	744	0	0	0	744	0	744	0	2	1	0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－4. 焼却炉稼働状況（3号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	4,501.81	173.15	26	580	18	0	0	580	18	19	51	4	43	0	0
5	5,844.46	188.53	31	744	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	3,147.70	157.39	20	0	0	468	14	468	14	0	0	4	58	0	0
7	249.39	83.13	3	0	0	36	26	36	26	19	58	0	0	0	0
8	4,707.32	151.85	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	3,828.24	147.24	26	0	0	609	40	609	40	0	0	7	33	0	0
10	2,542.90	141.27	18	0	0	396	24	396	24	19	48	0	0	0	0
11	2,179.30	155.66	14	216	0	106	54	322	54	0	0	9	32	0	0
12	4,690.21	167.51	28	610	30	12	35	623	5	19	15	3	24	0	0
1	4,703.76	167.99	28	263	39	374	0	637	39	22	17	0	0	0	0
2	5,399.40	192.84	28	672	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	2,185.60	168.12	13	144	0	155	17	299	17	0	0	5	56	0	0
計	43,980.09	－	266	3,230	27	2,903	30	6,133	57	101	9	36	6	0	0
平均	3,665.01	165.34	22	269	12	241	58	511	10	8	26	3	0	0	0
最大	5,844.46	192.84	31	744	0	744	0	744	0	22	17	9	32	0	0
最小	249.39	83.13	3	0	0	0	0	36	26	0	0	0	0	0	0

2－5. 焼却炉稼働状況（4号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	627.13	156.78	4	83	43	0	0	83	43	0	0	6	40	0	0
5	3,743.32	187.17	20	445	23	0	0	445	23	18	58	0	0	0	0
6	5,640.10	188.00	30	0	0	692	0	692	0	13	33	6	14	0	0
7	5,769.86	186.12	31	0	0	743	35	743	35	0	0	0	0	0	25
8	5,606.00	180.84	31	0	0	743	54	743	54	0	0	0	0	0	6
9	2,262.89	150.86	15	0	0	296	22	296	22	36	13	5	26	0	0
10	5,754.92	185.64	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
11	5,678.77	189.29	30	360	0	360	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	1,611.87	146.53	11	121	58	84	9	206	7	19	8	11	4	0	0
1	4,685.74	180.22	26	263	28	313	53	577	21	19	47	6	10	0	0
2	322.54	107.51	3	37	26	0	0	37	26	19	14	0	0	0	0
3	5,985.95	193.10	31	600	0	144	0	744	0	0	0	0	0	0	0
計	47,689.09	－	263	1,911	58	4,121	53	6,033	51	126	53	35	34	0	31
平均	3,974.09	181.33	22	159	20	343	29	502	49	10	34	2	57	0	3
最大	5,985.95	193.10	31	600	0	744	0	744	0	36	13	11	4	0	25
最小	322.54	107.51	3	0	0	0	0	37	26	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
24	34	604	52	0	0	0	0	115	8	115	8	1	1	0	84.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
4	58	473	12	246	48	0	0	0	0	246	48	0	1	0	65.7
19	58	56	24	687	36	0	0	0	0	687	36	1	0	0	7.6
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
7	33	617	13	0	0	0	0	102	47	102	47	0	1	0	85.7
19	48	416	12	0	0	0	0	327	48	327	48	1	0	0	55.9
9	32	332	26	0	0	0	0	387	34	387	34	0	1	0	46.2
22	39	645	44	0	0	0	0	98	16	98	16	1	1	0	86.8
22	17	659	56	0	0	0	0	84	4	84	4	1	0	0	88.7
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
5	56	305	13	0	0	0	0	438	47	438	47	0	1	0	41.0
137	15	6,271	12	934	24	0	0	1,554	24	2,488	48	5	6	0	―
11	26	522	36	77	52	0	0	129	32	207	24	0	1	0	71.6
24	34	744	0	687	36	0	0	438	47	687	36	1	1	0	100.0
0	0	56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
6	40	90	23	629	37	0	0	0	0	629	37	0	1	0	12.6
18	58	464	21	279	39	0	0	0	0	279	39	1	0	0	62.4
19	47	711	47	0	0	0	0	8	13	8	13	1	1	0	98.9
0	25	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
0	6	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
41	39	338	1	0	0	0	0	381	59	381	59	1	1	0	46.9
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
30	12	236	19	0	0	0	0	507	41	507	41	1	2	0	31.8
25	57	603	18	0	0	0	0	140	42	140	42	1	1	0	81.1
19	14	56	40	0	0	0	0	615	20	615	20	1	0	0	8.4
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
162	58	6,196	49	909	16	0	0	1,653	55	2,563	11	6	6	2	―
13	35	516	24	75	46	0	0	137	50	213	36	1	1	0	70.7
41	39	744	0	629	37	0	0	615	20	629	37	1	2	1	100.0
0	0	56	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.4

2－6. ごみ焼却量と低位発熱量(熱精算法)の経年変化

項目 / 年度	焼却量 (t)	焼却量 指数	焼却量 前年比	低位発熱量 (MJ／kg)	低位発熱量 指数	低位発熱量 前年比
2	194,795	100.0		9.25	100.0	
3	193,806	99.5	99.5	9.46	102.3	102.3
4	191,374	98.2	98.7	9.91	107.1	104.8
5	200,208	102.8	104.6	9.70	104.9	97.9
6	196,418	100.8	98.1	10.28	111.1	106.0
7	225,481	115.8	114.8	10.47	113.2	101.8
8	211,345	108.5	93.7	10.55	114.1	100.8
9	216,634	111.2	102.5	10.45	113.0	99.1
10	219,148	112.5	101.2	10.55	114.1	101.0
11	216,930	111.4	99.0	10.63	114.9	100.8
12	218,101	112.0	100.5	11.08	119.8	104.2
13	215,930	110.8	99.0	11.28	121.9	101.8
14	210,632	108.1	97.5	11.37	122.9	100.8
15	207,471	106.5	98.5	11.31	122.3	99.5
16	204,441	105.0	98.5	10.96	118.5	96.9
17	195,785	100.5	95.8	11.41	123.4	104.1
18	196,246	100.7	100.2	11.39	123.1	99.8
19	180,524	92.7	92.0	10.97	118.6	96.3
20	173,771	89.2	96.3	10.77	116.4	98.2

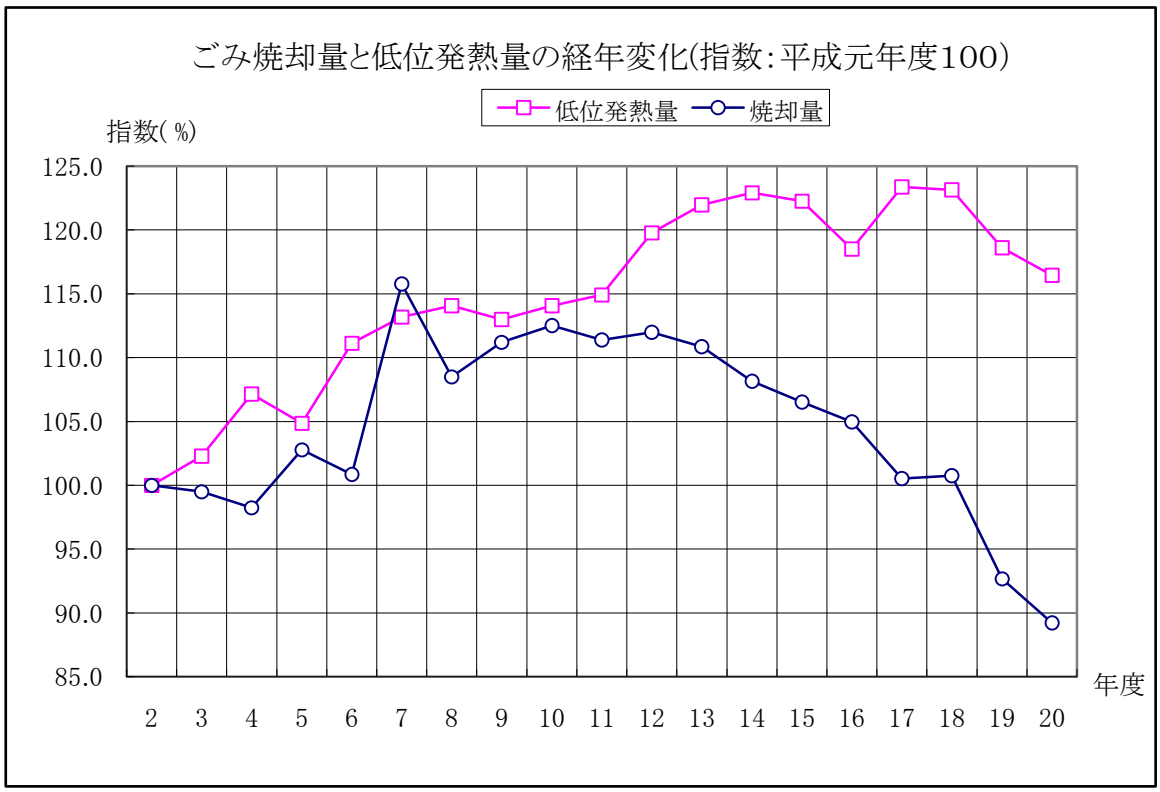

2－7. 月別焼却量の経年変化

年度 / 月別	20年度		19年度		18年度		17年度		16年度	
	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)
4	13,095	437	12,621	421	12,067	464	12,164	405	12,828	428
5	17,050	550	18,075	583	19,438	627	19,094	616	21,390	690
6	15,195	507	15,504	517	19,255	642	17,855	595	18,012	600
7	15,012	484	15,604	503	17,579	567	17,146	553	16,334	527
8	14,890	480	15,758	508	16,307	526	16,745	540	17,735	572
9	13,662	455	14,583	486	17,901	597	16,095	537	17,765	592
10	15,017	484	15,267	492	17,154	553	17,340	559	18,026	581
11	14,241	475	14,705	490	15,525	518	16,565	552	17,637	588
12	16,312	526	16,817	542	16,582	535	16,707	539	17,562	567
1	13,827	446	14,478	467	15,734	508	15,784	509	17,341	559
2	11,003	393	12,076	416	11,953	427	14,236	508	13,612	486
3	14,466	467	15,035	485	16,750	540	16,053	518	16,200	523
計	173,771	476	180,524	493	196,246	538	195,785	536	204,441	560

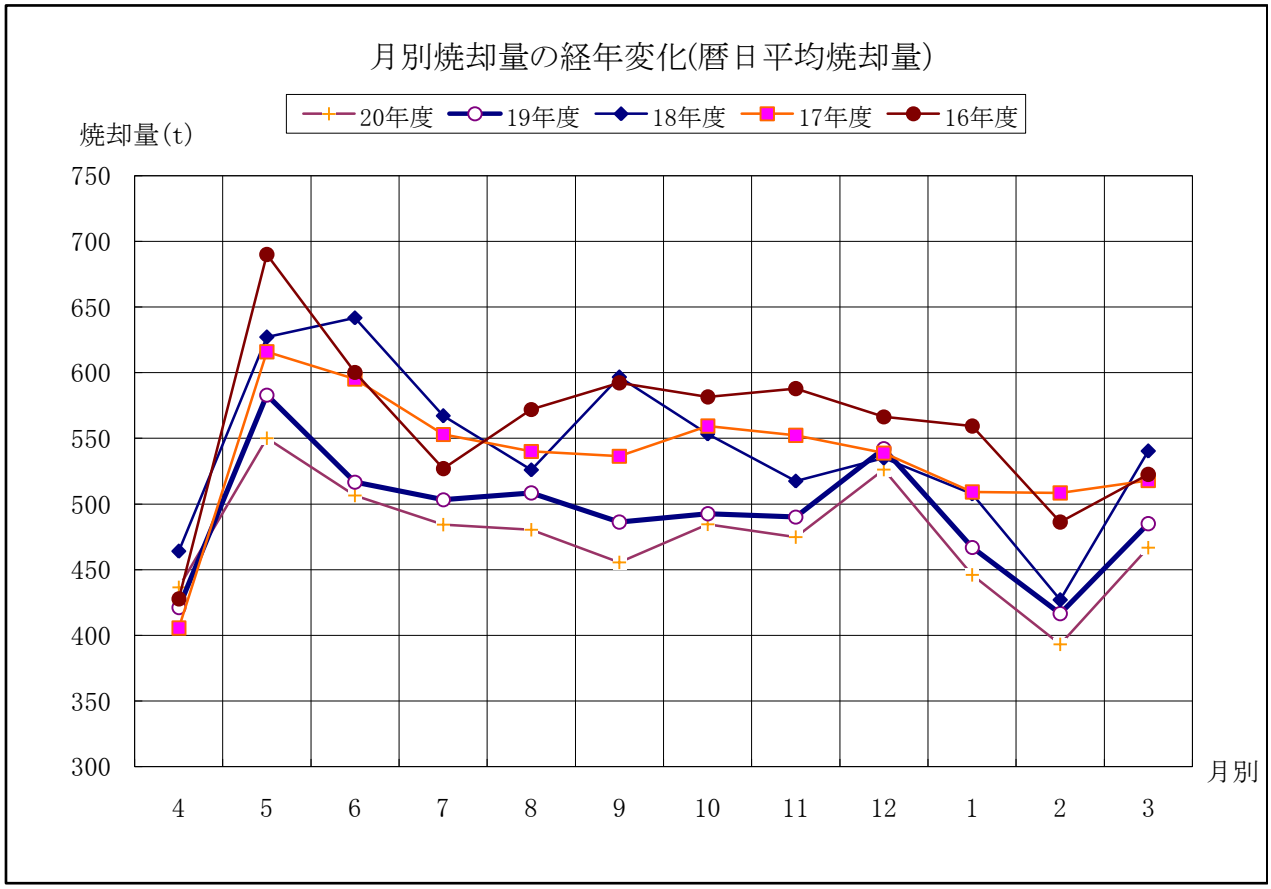

3. 管理薬剤の使用状況

3－1. 管理薬剤使用(購入)実績

項目 / 月別	液体 苛性ソーダ 48% (kg)	塩化 第二鉄 (kg)	次亜塩素 酸ソーダ (kg)	硫酸 (kg)	ヘラミン 90H-T (kg)	重金属捕集剤 エポフロック L1 (kg)	塩酸 35% (kg)
4	11,586	3,480	1,520	3,530	100	0	43,630
5	18,121	6,970	1,520	3,590	150	0	57,230
6	16,670	3,500	2,930	0	100	200	44,660
7	18,153	7,050	1,470	3,450	0	400	54,010
8	11,588	3,030	4,510	3,530	100	0	47,270
9	11,610	6,990	1,520	0	150	0	40,110
10	13,126	3,570	1,460	3,600	0	400	40,960
11	11,609	7,040	1,470	3,550	0	0	48,050
12	16,664	3,510	3,000	0	100	0	55,560
1	11,633	3,520	1,470	3,580	0	0	46,130
2	11,538	3,010	3,000	0	0	0	39,800
3	13,606	6,150	1,470	3,600	0	400	50,910
計	165,904	57,820	25,340	28,430	700	1,400	568,320
月平均	13,825	4,818	2,112	2,369	58	117	47,360

項目 / 月別	塩酸 35% 20ℓ缶 (kg)	凝集助剤 EDPﾌﾛｯｸ 351 (kg)	塩素除去剤 ダイクリーン F504 (kg)	防食剤 タワークリン S-112 (kg)	次亜塩素酸 ナトリウム 溶液 (kg)	防食剤 タワークリン パックマルチ (個)
4	0	50	0	0	0	0
5	0	0	20	0	40	0
6	0	50	0	0	0	0
7	0	50	0	0	0	0
8	0	0	20	0	0	0
9	0	50	20	0	0	0
10	0	50	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	50	20	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	50	20	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
計	0	350	100	0	40	0
月平均	0	29	8	0	3	0

項目 / 月別	飛灰装置用 ポルトランド セメント (kg)	飛灰用 キレート剤 エポルバ810 (kg)	尿素水 40% (kg)	消石灰 (kg)	特殊反応剤 バグエース S1500 (kg)	重金属捕集剤 ジオスタ L-310 (kg)
4	30,530	14,100	20,280	76,940	25,020	16,400
5	22,010	21,120	40,800	112,120	35,220	24,730
6	40,250	17,650	30,380	106,140	35,100	16,610
7	41,600	14,140	40,520	103,240	34,730	24,630
8	28,690	17,650	40,660	91,480	35,120	16,180
9	30,330	14,070	30,340	103,840	35,040	24,770
10	41,100	17,550	50,690	107,500	29,800	24,940
11	27,650	13,990	30,360	107,000	33,790	16,710
12	39,030	21,030	30,430	123,320	36,580	25,030
1	41,440	14,080	40,610	80,260	29,320	16,700
2	30,520	10,540	10,290	61,240	29,340	8,400
3	21,300	21,040	40,410	107,160	44,120	24,970
計	394,450	196,960	405,770	1,180,240	403,180	240,070
月平均	32,871	16,413	33,814	98,353	33,598	20,006

4. ボイラー・タービン関係

4－1. ボイラー運転状況（1～4号炉合計）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数（最大値）	起動回数	停止回数	灯油使用量	
											助燃バーナー	温水ボイラー
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)	(ℓ)
4	13,095.03	11.193	37,860.4	65.1	51.0	1,803	32	26	4	4	13,310	1,431
5	17,050.03	11.040	51,274.8	65.2	66.8	2,250	37	31	1	1	5,020	3,007
6	15,195.03	10.360	47,042.2	70.6	63.4	2,194	10	30	3	3	10,159	473
7	15,011.69	10.845	48,785.0	72.5	63.6	2,251	50	31	1	1	3,606	0
8	14,890.29	10.689	49,229.8	73.0	64.2	2,232	0	31	0	0	0	0
9	13,662.44	10.587	43,955.6	72.3	59.2	2,195	25	30	2	2	9,186	0
10	15,016.99	10.675	48,898.5	71.8	63.7	2,255	17	31	1	1	2,233	0
11	14,241.03	10.424	45,772.9	72.5	61.7	2,060	20	30	1	1	3,092	0
12	16,312.27	11.019	48,936.7	65.8	63.8	2,287	56	30	2	5	7,536	134
1	13,826.60	10.860	43,187.5	68.7	56.3	1,904	21	28	3	1	11,990	661
2	11,003.29	10.766	30,742.9	63.8	44.4	1,410	20	28	2	1	9,081	0
3	14,466.27	10.735	45,578.5	68.8	59.4	2,007	0	31	1	1	3,084	0
計	173,770.96	―	541,264.8	―	―	24,852	48	357	21	21	78,297	5,706
平均	14,480.91	10.766	45,105.4	69.2	59.79	2,071	4	30	2	2	6,525	476

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（1～3号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（4号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－2. ボイラー運転状況（1号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	4,196.75	11.097	12,295.0	62.7	69.99	596	22	26	1	1	3,519
5	5,261.25	11.145	15,733.3	63.5	86.67	744	0	31	0	0	0
6	2,173.96	10.326	6,819.9	72.4	38.82	359	10	16	1	1	2,788
7	4,563.71	10.595	14,796.5	72.6	81.51	744	0	31	0	0	0
8	4,576.97	10.609	14,854.5	72.3	81.83	744	0	31	0	0	0
9	4,420.09	10.590	14,177.6	71.7	80.70	720	0	30	0	0	0
10	2,145.79	10.672	6,959.6	71.7	38.34	357	59	15	0	1	0
11	1,589.02	9.969	4,918.7	74.3	28.00	287	35	12	1	0	3,092
12	4,988.22	11.004	14,991.0	64.8	82.50	711	50	30	0	1	0
1	4,437.10	10.781	13,389.7	66.8	73.76	667	0	28	1	0	3,213
2	474.85	10.866	1,358.7	62.0	8.00	66	35	3	0	1	0
3	1,113.64	10.687	3,567.4	71.5	19.65	214	40	9	1	0	3,084
計	39,941.35	―	123,861.9	―	―	6,213	11	262	5	5	15,696
平均	3,328.45	10.695	10,321.8	68.9	57.48	517	46	22	0	0	1,308

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－3. ボイラー運転状況（2号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,769.34	11.160	10,587.0	60.3	60.26	521	53	24	2	1	6,326
5	2,201.00	11.624	6,615.8	60.7	36.44	308	35	13	0	1	0
6	4,233.27	10.423	12,505.2	67.7	71.18	649	40	28	1	0	3,331
7	4,428.73	10.630	13,511.0	67.8	74.43	714	35	30	0	1	0
8	0.00	0.000	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
9	3,151.22	10.346	9,803.4	71.4	55.80	529	15	23	1	0	2,676
10	4,573.38	10.448	14,279.3	70.7	78.66	744	0	31	0	0	0
11	4,793.94	10.332	14,736.0	70.4	83.88	720	0	30	0	0	0
12	5,021.97	10.898	14,608.4	60.3	80.47	711	45	30	0	1	0
1	0.00	0.000	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	4,806.50	10.871	13,300.5	60.3	78.32	645	36	27	1	0	3,313
3	5,181.08	10.749	15,318.1	65.3	84.38	744	0	31	0	0	0
計	42,160.43	―	125,264.7	―	―	6,289	19	267	5	4	15,646
平均	3,513.37	8.957	10,438.7	54.6	58.65	524	7	22	0	0	1,304

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－4. ボイラー運転状況（3号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	4,501.81	10.951	12,632.4	61.2	71.91	596	26	26	1	1	3,465
5	5,844.46	10.860	16,294.7	60.8	89.76	744	0	31	0	0	0
6	3,147.70	10.277	9,080.3	66.5	51.69	476	40	20	0	1	0
7	249.39	11.496	835.4	73.8	4.60	49	15	3	1	0	3,606
8	4,707.32	10.762	15,284.8	71.4	84.20	744	0	31	0	0	0
9	3,828.24	10.792	12,384.2	70.8	70.49	621	30	26	0	1	5
10	2,542.90	10.847	8,107.8	70.1	44.66	409	18	18	1	0	2,233
11	2,179.30	10.750	7,015.6	70.3	39.93	332	45	14	0	1	0
12	4,690.21	11.074	13,654.2	62.5	75.21	661	35	28	1	1	3,000
1	4,703.76	10.919	13,853.8	64.4	76.31	667	55	28	1	0	3,308
2	5,399.40	11.035	15,064.9	59.9	88.71	672	0	28	0	0	0
3	2,185.60	10.682	6,316.6	64.0	34.80	304	20	13	0	1	0
計	43,980.09	―	130,524.7	―	―	6,279	44	266	5	6	15,617
平均	3,665.01	10.870	10,877.1	66.3	61.02	523	19	22	0	1	1,301

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－5. ボイラー運転状況（4号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	627.13	11.563	2,346.0	76.0	10.90	88	51	4	0	1	0
5	3,743.32	10.530	12,631.0	75.9	56.78	454	2	19	1	0	5,020
6	5,640.10	10.413	18,636.8	75.6	86.57	708	40	30	1	1	4,040
7	5,769.86	10.660	19,642.1	75.6	88.30	744	0	31	0	0	0
8	5,606.00	10.695	19,090.5	75.4	85.82	744	0	31	0	0	0
9	2,262.89	10.621	7,590.4	75.2	35.26	324	40	14	1	1	6,505
10	5,754.92	10.731	19,551.8	74.8	87.89	744	0	31	0	0	0
11	5,678.77	10.644	19,102.6	74.8	88.73	720	0	30	0	0	0
12	1,611.87	11.101	5,683.1	75.7	25.55	202	46	10	1	2	4,536
1	4,685.74	10.879	15,944.0	75.0	71.90	569	26	25	1	1	5,469
2	322.54	10.292	1,018.8	72.8	4.90	26	9	3	1	0	5,768
3	5,985.95	10.820	20,376.4	74.4	91.60	744	0	31	0	0	0
計	47,689.09	―	161,613.5	―	―	6,070	34	259	6	6	31,338
平均	3,974.09	10.746	13,467.8	75.1	61.18	505	53	22	1	1	2,612

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－6. タービン稼働状況

項目	蒸　気	蒸気発生量	1号タービン（2000KW）						2号タ		
	発生量	――――	運転	運転時間		タービン	発生蒸気	発電量	運転	運転時間	
		焼却量	日数			入口蒸気量	利用率		日数		
	(A)					(ア)	(ア／A)	(B)			
月別	(t)	(t)	(日)	(時間)	(分)	(t)	(%)	(kwh)	(日)	(時間)	(分)
4	37,860.4	2.89	25	574	59	12,145.8	32.08	761,982	15	331	6
5	51,274.8	3.01	31	744	0	10,682.0	20.83	587,974	31	744	0
6	47,042.2	3.10	5	106	11	1,473.5	3.13	80,866	30	720	0
7	48,785.0	3.25	4	83	1	992.0	2.03	46,489	31	744	0
8	49,229.8	3.31	22	494	27	6,440.2	13.08	331,433	31	726	11
9	43,955.6	3.22	3	61	38	758.5	1.73	37,815	30	717	52
10	48,898.5	3.26	1	8	30	113.5	0.23	5,998	31	744	0
11	45,772.9	3.21	10	226	28	3,177.4	6.94	173,677	30	720	0
12	48,936.7	3.00	6	116	53	3,301.1	6.75	220,820	30	708	7
1	43,187.5	3.12	12	260	29	4,578.7	10.60	268,535	27	635	23
2	30,742.9	2.79	2	35	57	472.1	1.54	24,377	28	672	0
3	45,578.5	3.15	6	130	30	1,662.7	3.65	84,321	31	744	0
計	541,264.8	37.30	127	2,843	3	45,797.5	―	2,624,287	345	8,206	39
月平均	45,105.4	3.11	11	236	55	3,816.5	8.46	218,691	29	683	53
最大	51,274.8	3.31	31	744	0	12,145.8	32.08	761,982	31	744	0
最小	30,742.9	2.79	1	8	30	113.5	0.23	5,998	15	331	6

ービン（5000KW）			合計（7000KW）			蒸気	1kwh	
タービン 入口蒸気量 （イ）	発生蒸気 利用率 （イ／A）	発電量 （C）	タービン 入口蒸気量 （ア＋イ）＝（ウ）	発生蒸気 利用率 （ウ／A）	発電量 （B＋C）	1トン 当り 発電量	当り 蒸気 消費量	発電量 ——— 焼却量
(t)	(%)	(kwh)	(t)	(%)	(kwh)	(kwh／t)	(kg／kwh)	(kwh／t)
13,750.7	36.32	1,076,024.0	25,896.5	68.40	1,838,006	71.0	14.09	140.4
33,701.2	65.73	2,709,408.0	44,383.2	86.56	3,297,382	74.3	13.46	193.4
39,019.2	82.95	3,267,771.0	40,492.7	86.08	3,348,637	82.7	12.09	220.4
40,745.8	83.52	3,423,411.0	41,737.8	85.55	3,469,900	83.1	12.03	231.1
35,079.9	71.26	2,867,777.0	41,520.1	84.34	3,199,210	77.1	12.98	214.9
36,930.5	84.02	3,068,088.0	37,689.0	85.74	3,105,903	82.4	12.13	227.3
41,483.2	84.84	3,493,903.0	41,596.7	85.07	3,499,901	84.1	11.89	233.1
36,112.1	78.89	2,977,163.0	39,289.5	85.84	3,150,840	80.2	12.47	221.3
38,062.2	77.78	3,196,957.0	41,363.3	84.52	3,417,777	82.6	12.10	209.4
31,725.1	73.46	2,607,041.0	36,303.8	84.06	2,875,576	79.2	12.62	208.0
24,868.7	80.89	1,885,731.0	25,340.8	82.43	1,910,108	75.4	13.27	173.6
36,825.3	80.80	3,025,770.0	38,488.0	84.44	3,110,091	80.8	12.38	215.0
408,303.9	—	33,599,044	454,101.4	—	36,223,331	—	—	—
34,025.3	75.04	2,799,920	37,841.8	83.90	3,018,611	79.8	12.54	208.4
41,483.2	84.84	3,493,903	44,383.2	86.56	3,499,901	84.1	14.09	233.1
13,750.7	36.32	1,076,024	25,340.8	68.40	1,838,006	71.0	11.89	140.4

4－7. 純水及び薬剤使用実績

項目 / 月別	純水使用量	暦日平均	苛性ソーダ(24%)	塩酸	亜硫酸ソーダ	オキシノンM608(防食剤)	オキシノンH104(脱酸素剤)	カルゲンL－327(清缶剤)	ヘラミン90H-T
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	2,020.1	67.34	3.15	2.45	8	14.28	10.10	192.15	48
5	2,284.0	73.68	4.05	3.15	10	―	―	―	68
6	1,859.3	61.98	4.05	3.15	8	―	―	―	64
7	1,912.8	61.70	4.05	3.15	8	―	―	―	62
8	2,065.9	66.64	3.60	2.80	10	―	―	―	60
9	1,872.8	62.43	4.05	3.15	8	―	―	―	39
10	1,907.7	61.54	4.05	3.15	10	―	―	―	51
11	1,922.8	64.09	3.60	2.80	8	―	―	―	41
12	2,024.9	65.32	4.05	3.15	8	―	―	―	43
1	1,848.1	59.62	3.15	2.45	10	―	―	―	38
2	1,460.8	52.17	2.25	1.75	8	―	―	―	29
3	1,818.7	58.67	3.60	2.80	8	―	―	―	42
計	22,997.9	―	43.65	33.95	104	14.28	10.10	192.15	585.00
月平均	1,916.5	62.84	3.64	2.83	9	14.28	10.10	10.10	192.15

*4月途中より防食剤、脱酸素剤、清缶剤を1液性ボイラ水処理薬品(ヘラミン)に変更

5. 洗煙装置関係

5－1. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計）

項目	1～4号炉合計													
	洗煙装置稼働時焼却量（A）	稼働日数（最大値）	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	13,095.03	26	1,834	50	1,045	10	1,045	10	0	0	0	0	0	0
5	17,050.03	31	2,261	6	714	54	714	54	0	0	0	0	0	0
6	15,195.03	30	2,208	2	671	58	671	58	0	0	0	0	0	0
7	15,011.69	31	2,258	41	717	19	717	19	0	0	0	0	0	0
8	14,890.29	31	2,232	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	13,662.44	30	2,209	43	670	17	670	17	0	0	0	0	0	0
10	15,016.99	31	2,258	57	717	3	717	3	0	0	0	0	0	0
11	14,241.03	30	2,044	52	835	8	835	8	0	0	0	0	0	0
12	16,312.27	30	2,305	25	670	35	670	35	0	0	0	0	0	0
1	13,826.60	28	1,923	32	1,052	28	1,052	28	0	0	0	0	0	0
2	11,003.29	28	1,425	38	1,262	22	1,262	22	0	0	0	0	0	0
3	14,466.27	31	1,993	51	982	9	982	9	0	0	0	0	0	0
計	173,770.96	357	24,956	37	10,083	23	10,083	23	0	0	0	0	0	0
月平均	14,480.91	30	2,079	43	840	17	840	17	0	0	0	0	0	0

5－2. 洗煙装置稼働実績(1号炉)

項目	1　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	4,196.75	26	603	49	116	11	116	11	0	0	0	0	0	0
5	5,261.25	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2,173.96	16	366	42	353	18	353	18	0	0	0	0	0	0
7	4,563.71	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4,576.97	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4,420.09	30	719	3	0	57	0	57	0	0	0	0	0	0
10	2,145.79	15	354	45	389	15	389	15	0	0	0	0	0	0
11	1,589.02	12	272	26	447	34	447	34	0	0	0	0	0	0
12	4,988.22	30	712	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0
1	4,437.10	28	660	18	83	42	83	42	0	0	0	0	0	0
2	474.85	3	64	8	607	52	607	52	0	0	0	0	0	0
3	1,113.64	9	200	38	543	22	543	22	0	0	0	0	0	0
計	39,941.35	262	6,185	49	2,574	11	2,574	11	0	0	0	0	0	0
月平均	3,328.45	22	515	29	214	31	214	31	0	0	0	0	0	0

5－3. 洗煙装置稼働実績(2号炉)

項目	2　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,769.34	24	535	46	184	14	184	14	0	0	0	0	0	0
5	2,201.00	13	308	45	435	15	435	15	0	0	0	0	0	0
6	4,233.27	28	656	21	63	39	63	39	0	0	0	0	0	0
7	4,428.73	30	714	17	29	43	29	43	0	0	0	0	0	0
8	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	3,151.22	23	535	26	184	34	184	34	0	0	0	0	0	0
10	4,573.38	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4,793.94	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5,021.97	30	711	22	32	38	32	38	0	0	0	0	0	0
1	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
2	4,806.50	27	632	50	39	10	39	10	0	0	0	0	0	0
3	5,181.08	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	42,160.43	267	6,302	47	2,457	13	2,457	13	0	0	0	0	0	0
月平均	3,513.37	22	525	14	204	46	204	46	0	0	0	0	0	0

5－4. 洗煙装置稼働実績(3号炉)

項目	3　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	4,501.81	26	604	52	115	8	115	8	0	0	0	0	0	0
5	5,844.46	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3,147.70	20	473	12	246	48	246	48	0	0	0	0	0	0
7	249.39	3	56	24	687	36	687	36	0	0	0	0	0	0
8	4,707.32	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3,828.24	26	617	13	102	47	102	47	0	0	0	0	0	0
10	2,542.90	18	416	12	327	48	327	48	0	0	0	0	0	0
11	2,179.30	14	332	26	387	34	387	34	0	0	0	0	0	0
12	4,690.21	28	645	44	98	16	98	16	0	0	0	0	0	0
1	4,703.76	28	659	56	84	4	84	4	0	0	0	0	0	0
2	5,399.40	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2,185.60	13	305	13	438	47	438	47	0	0	0	0	0	0
計	43,980.09	266	6,271	12	2,488	48	2,488	48	0	0	0	0	0	0
月平均	3,665.01	22	522	36	207	24	207	24	0	0	0	0	0	0

5－5. 洗煙装置稼働実績(4号炉)

項目	4　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	627.13	4	90	23	629	37	629	37	0	0	0	0	0	0
5	3,743.32	20	464	21	279	39	279	39	0	0	0	0	0	0
6	5,640.10	30	711	47	8	13	8	13	0	0	0	0	0	0
7	5,769.86	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5,606.00	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2,262.89	15	338	1	381	59	381	59	0	0	0	0	0	0
10	5,754.92	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5,678.77	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,611.87	11	236	19	507	41	507	41	0	0	0	0	0	0
1	4,685.74	26	603	18	140	42	140	42	0	0	0	0	0	0
2	322.54	3	56	40	615	20	615	20	0	0	0	0	0	0
3	5,985.95	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	47,689.09	263	6,196	49	2,563	11	2,563	11	0	0	0	0	0	0
月平均	3,974.09	22	516	24	213	36	213	36	0	0	0	0	0	0

5－6. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績

項目	3% 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量 FS－710	焼却量 1ﾄﾝ当り 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量	稼働率 洗煙装置稼働時間／焼却炉稼働時間					稼働率 洗煙装置稼働時焼却量／総焼却量				
	(B)	(B／A)	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(㎥)	(㎥)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	351.44	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	496.50	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
6	386.37	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7	396.45	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8	333.73	0.02	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0
9	279.66	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	328.16	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11	295.72	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12	338.63	0.02	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	272.91	0.02	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0
2	158.67	0.01	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	286.01	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
計	3,924.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	327.02	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

5－7. 洗煙装置暦日数平均稼働率

項目	稼働率 洗煙装置稼働日数／暦日数					稼働率 洗煙装置稼働時間／暦日数×24時間				
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	86.7	80.0	86.7	13.3	66.7	83.9	74.4	84.0	12.6	63.7
5	100.0	41.9	100.0	64.5	76.6	100.0	41.5	100.0	62.4	76.0
6	53.3	93.3	66.7	100.0	78.3	50.9	91.2	65.7	98.9	76.7
7	100.0	96.8	9.7	100.0	76.6	100.0	96.0	7.6	100.0	75.9
8	100.0	0.0	100.0	100.0	75.0	100.0	0.0	100.0	100.0	75.0
9	100.0	76.7	86.7	50.0	78.3	99.9	74.4	85.7	46.9	76.7
10	48.4	100.0	58.1	100.0	76.6	47.7	100.0	55.9	100.0	75.9
11	40.0	100.0	46.7	100.0	71.7	37.8	100.0	46.2	100.0	71.0
12	96.8	96.8	90.3	35.5	79.8	95.7	95.6	86.8	31.8	77.5
1	90.3	0.0	90.3	83.9	66.1	88.8	0.0	88.7	81.1	64.6
2	10.7	96.4	100.0	10.7	54.5	9.5	94.2	100.0	8.4	53.0
3	29.0	100.0	41.9	100.0	67.7	27.0	100.0	41.0	100.0	67.0
計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	71.8	73.2	72.9	72.1	72.5	70.6	71.9	71.6	70.7	71.2

6. 排水処理関係

6－1. 排水処理実績

項目	放流水量						排水処理関係薬剤使用量					
	総放流水量 FRS-708	暦日平均	プラント放流水量 FRS-707	暦日平均	生活排水等(余熱利用施設排水量含)	暦日平均	苛性ソーダ 3%	硫酸	塩化第二鉄	凝集助剤EDP 351	次亜塩素酸ソーダ	重金属捕集剤 L－1
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	16,926.4	564.2	8,363.3	278.8	8,563.1	285.4	30,904	1,390	3,110	19,600	1,500	2,490
5	21,057.8	679.3	10,777.3	347.7	10,280.5	331.6	35,890	1,650	3,900	22,400	1,760	3,170
6	20,935.0	697.8	10,349.5	345.0	10,585.5	352.9	46,075	1,710	3,590	22,400	1,670	2,830
7	22,924.7	739.5	10,828.4	349.3	12,096.3	390.2	52,165	1,360	3,670	22,400	2,020	2,840
8	22,019.9	710.3	10,672.3	344.3	11,347.6	366.1	60,552	1,400	3,350	21,000	2,880	2,900
9	19,703.2	656.8	10,283.1	342.8	9,420.1	314.0	38,018	1,450	3,490	21,000	1,345	1,930
10	20,826.2	671.8	11,300.6	364.5	9,525.6	307.3	40,731	2,080	3,680	22,400	1,450	2,440
11	17,615.7	587.2	10,049.0	335.0	7,566.7	252.2	40,826	1,010	3,410	19,600	1,900	2,040
12	16,133.4	520.4	10,443.6	336.9	5,689.8	183.5	35,617	1,290	3,390	19,600	1,980	2,030
1	14,969.6	482.9	9,677.2	312.2	5,292.4	170.7	29,989	960	2,950	18,200	1,310	1,880
2	14,993.5	535.5	9,331.3	333.3	5,662.2	202.2	35,544	1,300	2,890	18,200	2,070	1,900
3	20,922.1	674.9	11,090.0	357.7	9,832.1	317.2	37,546	1,430	3,250	19,600	1,290	2,170
計	229,027.5	―	123,165.6	―	105,861.9	―	483,857	17,030	40,680	246,400	21,175	28,620
月平均	19,085.6	625.8	10,263.8	336.5	8,821.8	289.2	40,321	1,419	3,390	20,533	1,765	2,385

6－2. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績

項目	脱水機				処理薬剤
	汚泥供給量 FS-709	脱水機運転時間		脱水汚泥排出量	ジオスタ L-310
月別	(㎥)	(時間)	(分)	(kg)	(kg)
4	9.24	2	11	1,400	15,390.0
5	20.97	5	8	2,220	20,250.0
6	7.03	1	31	1,040	19,980.0
7	12.99	3	3	2,590	22,275.0
8	2.59	0	29	0	22,410.0
9	0.97	0	22	760	20,520.0
10	4.74	2	6	0	20,655.0
11	11.71	3	51	5,140	19,642.5
12	0.39	0	9	1,090	21,330.0
1	6.51	1	20	1,040	17,550.0
2	26.43	6	36	7,370	13,500.0
3	13.95	4	23	3,780	19,035.0
計	117.52	31	9	26,430	232,537.5
月平均	9.79	2	36	2,203	19,378.1

7. 電力関係

7－1. 電力使用実績

項目 / 月別	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	発電量 DCS B (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 A＋B＝C (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	（売電）取引メータ D (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)
4	490,800	682	1,838,006	2,553	2,328,806	3,234	350,533	487
5	12,130	16	3,297,382	4,432	3,309,512	4,448	973,028	1,308
6	4,830	7	3,348,637	4,651	3,353,467	4,658	1,125,158	1,563
7	11,070	15	3,469,900	4,664	3,480,970	4,679	1,169,740	1,572
8	34,740	47	3,199,210	4,300	3,233,950	4,347	972,008	1,306
9	18,270	25	3,105,903	4,314	3,124,173	4,339	909,673	1,263
10	3,920	5	3,499,901	4,704	3,503,821	4,709	1,203,662	1,618
11	11,320	16	3,150,840	4,376	3,162,160	4,392	1,025,533	1,424
12	62,190	84	3,417,777	4,594	3,479,967	4,677	1,073,647	1,443
1	164,970	222	2,875,576	3,865	3,040,546	4,087	881,180	1,184
2	120,550	179	1,910,108	2,842	2,030,658	3,022	191,646	285
3	14,510	20	3,110,091	4,180	3,124,601	4,200	893,514	1,201
計	949,300	－	36,223,331	－	37,172,631	－	10,769,322	－
月平均	79,108	108	3,018,611	4,135	3,097,719	4,243	897,444	1,229

項目 / 月別	総需要電力量								電力自給率 B－D / C－D
	ごみ焼却施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	粗大ごみ処理施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	余熱利用施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	(%)
4	1,728,100	2,400	185,268	257	35,662	50	1,949,030	2,707	75.2
5	1,995,467	2,682	205,756	277	87,696	118	2,288,919	3,077	99.5
6	1,888,727	2,623	187,188	260	99,538	138	2,175,453	3,021	99.8
7	1,940,425	2,608	194,000	261	119,680	161	2,254,105	3,030	99.5
8	1,918,528	2,579	179,175	241	115,159	155	2,212,862	2,974	98.5
9	1,884,807	2,618	184,345	256	95,608	133	2,164,760	3,007	99.2
10	1,943,502	2,612	192,581	259	105,543	142	2,241,626	3,013	99.8
11	1,819,606	2,527	170,258	236	95,771	133	2,085,635	2,897	99.5
12	2,086,418	2,804	197,434	265	69,449	93	2,353,301	3,163	97.4
1	1,872,848	2,517	178,400	240	64,900	87	2,116,148	2,844	92.4
2	1,652,398	2,459	158,342	236	5,304	8	1,816,044	2,702	93.4
3	1,926,327	2,589	180,328	242	75,899	102	2,182,554	2,934	99.3
計	22,657,153	－	2,213,075	－	970,209	－	25,840,437	－	－
月平均	1,888,096	2,586	184,423	253	80,851	111	2,153,370	2,950	96.4

8. 市水・工水・防臭薬剤関係

8－1. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績

項目	市水					
	使用水量		認定使用水量			
	(管理月報)	暦日平均	伊丹市水道局	暦日平均	豊中市水道局	暦日平均
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	9,251.2	308.4	19,981.0	327.6	42.6	1.4
5	10,944.8	353.1		—	44.4	1.4
6	9,300.2	310.0	18,919.0	310.1	53.5	1.8
7	9,597.9	309.6		—	71.9	2.3
8	9,061.1	292.3	18,355.0	300.9	69.0	2.2
9	8,252.8	275.1		—	54.9	1.8
10	10,139.1	327.1	20,151.0	330.3	63.6	2.1
11	8,906.6	296.9		—	42.6	1.4
12	9,279.6	299.3	16,707.0	269.5	34.0	1.1
1	8,540.8	275.5		—	43.8	1.4
2	7,861.5	280.8	18,010.0	300.2	42.7	1.5
3	8,820.0	284.5		—	40.2	1.3
計	109,955.6	—	112,123.0	—	603.2	—
月平均	9,163.0	301.2	18,687.2	307.2	50.3	1.7

*伊丹市水道局の認定市水量は、2ヶ月分です。(例) 4・5月は3/10～5/10の使用量です。

項目	工水						
	使用水量		認定使用水量		基本使用水量		超過水量
	(管理月報)	暦日平均	(伊丹市水道局)	暦日平均	(伊丹市水道局)	暦日平均	(伊丹市水道局)
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	18,623.0	620.8	19,972.00	665.73	48,000	1,600	0
5	23,089.0	744.8	24,579.00	792.87	49,600	1,600	0
6	17,181.0	572.7	17,750.00	591.67	48,000	1,600	0
7	17,799.0	574.2	19,955.00	643.71	49,600	1,600	0
8	17,434.0	562.4	17,016.00	548.90	49,600	1,600	0
9	16,940.0	564.7	18,666.00	622.20	48,000	1,600	0
10	17,635.0	568.9	17,979.00	579.97	49,600	1,600	0
11	15,739.0	524.6	15,039.00	501.30	48,000	1,600	0
12	22,193.0	715.9	19,400.00	625.81	49,600	1,600	0
1	16,349.0	527.4	19,914.00	642.39	49,600	1,600	0
2	17,260.0	616.4	15,762.00	562.93	44,800	1,600	0
3	17,796.0	574.1	17,840.00	575.48	49,600	1,600	0
計	218,038.0	—	223,872.00	—	584,000	—	0
月平均	18,169.8	597.4	18,656.00	613.35	48,667	1,600	0

項目	防臭薬剤			
	ﾗﾊﾞﾄﾘｱﾝ PS(粉末)	ﾗﾊﾞﾄﾘｱﾝ KY(香料)	オフナック VP(殺虫剤)	強力無臭元 T
月別	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
計	0	0	0	0
月平均	0	0	0	0

9. 焼却残渣(灰)関係

9－1. 飛灰安定化装置稼働実績

(東)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	166.8	11.1	39.9	6,437	92	33
5	349.1	23.3	80.1	13,273	194	3
6	185.4	12.4	42.2	7,102	103	2
7	186.3	12.4	43.7	7,199	103	30
8	192.2	12.8	44.1	7,350	106	49
9	175.3	11.8	41.0	6,805	97	39
10	150.2	9.8	36.5	5,956	83	37
11	180.7	11.9	42.6	6,995	100	30
12	219.0	15.7	47.1	8,403	121	50
1	48.4	3.2	10.7	1,924	27	6
2	130.9	8.9	27.9	5,364	73	2
3	169.8	11.3	40.1	6,828	94	28
計	2,154.1	144.6	495.9	83,636	1,198	9
月平均	179.5	12.1	41.3	6,970	99	51

(西)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	136.6	9.6	49.6	6,054	92	30
5	54.1	3.8	19.5	2,384	37	28
6	148.7	10.4	54.1	6,660	102	9
7	142.3	10.1	51.0	6,279	99	19
8	144.2	10.1	51.8	6,339	100	5
9	134.7	10.0	48.3	5,878	93	22
10	173.4	11.9	61.6	7,549	119	59
11	129.7	8.8	45.6	5,689	90	47
12	158.0	10.4	55.7	6,895	110	3
1	246.6	18.5	80.6	10,565	169	44
2	130.8	8.2	39.5	5,571	88	55
3	173.0	12.0	58.8	7,241	116	11
計	1,772.1	123.8	616.1	77,104.0	1,220	32
月平均	147.7	10.3	51.3	6,425.3	101	43

9－2. 焼却残渣(灰)処分実績

項目	焼却残渣(灰)処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	176	1,665	67.4	85	804	32.6	261	2,469	100	2,665	92.6
5	196	1,799	67.5	93	865	32.5	289	2,664	100	3,033	87.8
6	165	1,464	61.3	101	925	38.7	266	2,389	100	2,513	95.1
7	190	1,701	68.1	89	798	31.9	279	2,499	100	2,349	106.4
8	162	1,499	67.8	77	711	32.2	239	2,210	100	2,536	87.1
9	161	1,484	67.8	77	705	32.2	238	2,189	100	2,183	100.3
10	185	1,695	68.9	85	765	31.1	270	2,460	100	2,493	98.7
11	163	1,478	70.1	71	631	29.9	234	2,109	100	2,437	86.5
12	202	1,839	68.6	93	843	31.4	295	2,682	100	2,629	102.0
1	178	1,602	68.1	85	752	31.9	263	2,354	100	2,459	95.7
2	121	1,105	65.8	63	574	34.2	184	1,679	100	1,912	87.8
3	139	1,266	54.5	116	1,058	45.5	255	2,324	100	1,963	118.4
計	2,038	18,597		1,035	9,431		3,073	28,028		29,172	
月平均	170	1,550	66.4	86	786	33.6	256	2,336	100	2,431	96.5

9－3. 焼却残渣(灰)測定結果

項目	焼却残渣(灰)測定結果											
	1号炉		2号炉		3号炉		4号炉		全体		灰ﾋﾟｯﾄ	
	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	1.4	24.2	3.8	49.1	3.8	44.8	—	—	3.0	39.4	4.9	30.9
5	5.2	56.0	4.4	49.8	7.5	56.3	—	—	5.7	54.0	3.7	24.7
6	—	—	2.7	41.7	3.7	43.2	1.5	34.1	2.6	39.7	7.6	30.4
7	7.1	60.0	4.5	41.9	—	—	4.1	48.1	5.2	50.0	2.7	34.4
8	2.8	40.6	—	—	3.0	40.2	4.2	46.7	3.3	42.5	5.7	31.1
9	2.4	40.6	3.9	41.5	2.7	41.5	3.8	41.2	3.2	41.2	5.0	30.9
10	3.3	45.0	2.1	36.7	—	—	2.1	37.6	2.5	39.8	8.1	36.0
11	2.0	22.6	3.7	39.2	3.6	46.9	5.1	50.5	3.6	39.8	—	—
12	2.1	37.2	1.5	36.5	2.6	41.1	—	—	2.1	38.3	6.5	27.9
1	5.3	53.2	—	—	3.7	48.2	5.0	55.6	4.7	52.3	3.9	30.1
2	—	—	2.7	41.0	2.9	41.4	—	—	2.8	41.2	2.6	29.4
3	1.9	34.3	5.0	56.0	3.0	41.7	2.5	44.6	3.1	44.2	3.9	31.6
平均	3.4	41.4	3.4	43.3	3.7	44.5	3.5	44.8	3.5	43.5	5.0	30.7
最大	7.1	60.0	5.0	56.0	7.5	56.3	5.1	55.6	5.7	54.0	8.1	36.0
最小	1.4	22.6	1.5	36.5	2.6	40.2	1.5	34.1	2.1	38.3	2.6	24.7

10. 公害関係

10－1. 敷地境界線における臭気測定結果(悪臭防止法に基づく)

(単位:ppm)

測定項目＼測定点	測定日:10月10日(金)				
	東 側	西 側	南 側	北 側	基準値
アンモニア	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
メチルメルカプタン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.002
硫化水素	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.01
二硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
トリメチルアミン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.005
アセトアルデヒド	0.019	0.007	0.009	0.016	0.05
プロピオンアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	0.0010	0.0009	0.0009	0.0011	0.009
イソブチルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
イソバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.003
イソブタノール	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.9
酢酸エチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	3
メチルイソブチルケトン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
トルエン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	10
スチレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.4
キシレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
プロピオン酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.03
ノルマル酪酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.001
ノルマル吉草酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.0009
イソ吉草酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.001
臭気指数	＜10	＜10	＜10	＜10	―

※臭気指数の単位:希釈倍数で無次元
※定量下限値未満はNDとした。

測定箇所概略図

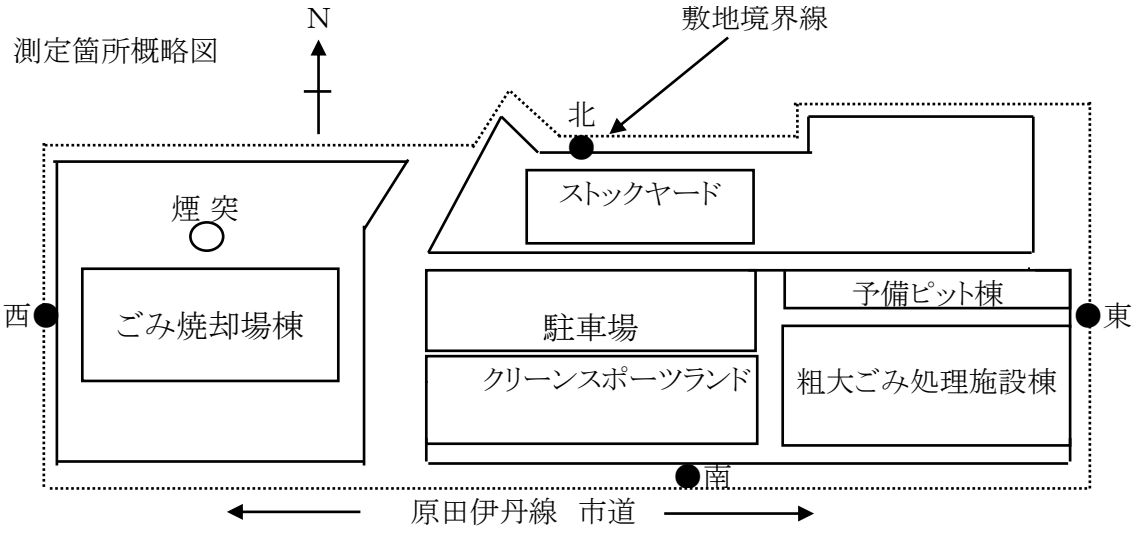

10－2. 排ガス関係測定結果　　（大気汚染防止法に基づく）

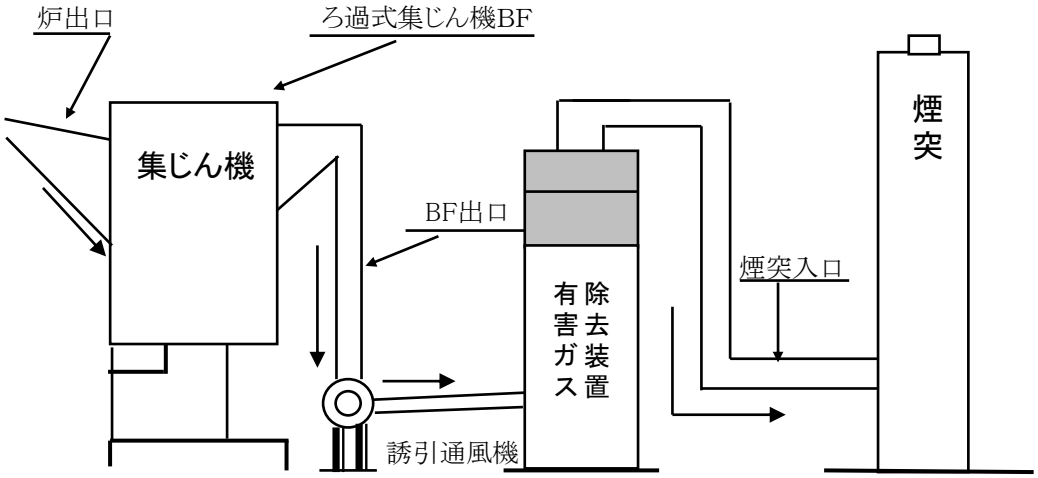

○ばいじん量

炉出口　　(g/Nm³)

測定炉	1月
1号炉	1.3
2号炉	0.78
3号炉	2.7
4号炉	0.91

BF出口　　(g/Nm³)

測定炉	7月	1月
1号炉	<0.001	<0.001
2号炉	<0.001	<0.001
3号炉	<0.001	<0.001
4号炉	<0.001	<0.001

煙突入口　　(g/Nm³)

測定炉	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
1号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08
2号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
3号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
4号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

※　3号炉7月記入分は8月測定結果、2号炉1月記入分は2月測定結果

（全炉、年平均）



◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物

1号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	61,900
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,400
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	360
いおう酸化物	Nm³／h	1.3
	cm³／Nm³	29

1号炉集じん機出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	47,600	62,600
排ガス量(dry)	Nm³／h	37,500	46,900
塩化水素	※ mg／Nm³	3.1	26
いおう酸化物	Nm³／h	0.41	1.2
	cm³／Nm³	11	26

1号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	71,900	62,700	68,200	61,700	78,900	62,900	
排ガス量(dry)	Nm³／h	53,400	45,600	48,600	44,200	56,100	45,700	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.8	4.3	4.4	4.9	6.2	4.1	
	※cm³／Nm³	70	87	91	100	100	100	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	1.6	<0.5	<0.5	0.6	1.1	1.1	700
いおう酸化物	Nm³／h	<0.03	<0.02	<0.02	0.05	0.04	<0.02	8.73 ～ 9.65
	cm³／Nm³	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	0.7	<0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

2号炉炉出口

項	目	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	77,400
排ガス量(dry)	Nm³／h	58,500
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	270
いおう酸化物	Nm³／h	2.1
	cm³／Nm³	36

2号炉集じん機出口

項	目	7月	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	56,900	69,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,300	54,900
塩化水素	※ mg／Nm³	7.3	7.8
いおう酸化物	Nm³／h	0.29	0.82
	cm³／Nm³	6.3	15

2号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	2月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	78,000	71,200	64,700	66,300	73,300	63,700	
排ガス量(dry)	Nm³／h	56,500	52,500	46,800	47,600	51,800	46,000	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	6.8	5.2	4.2	4.8	5.2	3.4	
	※cm³／Nm³	100	100	95	130	92	100	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.8	0.8	＜0.5	700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.03	＜0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.03	＜0.02	8.76～ 9.75
	cm³／Nm³	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

3号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	50,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	41,200
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	390
いおう酸化物	Nm³／h	0.66
	cm³／Nm³	16

3号炉集じん機出口

項	目	8月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	47,400	56,300
排ガス量(dry)	Nm³／h	40,700	47,900
塩化水素	※ mg／Nm³	2.1	3.4
いおう酸化物	Nm³／h	0.18	0.08
	cm³／Nm³	4.5	1.6

3号炉煙突入口

項	目	5月	8月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	77,200	58,000	55,800	68,600	62,800	69,800	
排ガス量(dry)	Nm³／h	55,100	42,000	40,300	49,300	45,500	49,800	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.5	3.4	3.5	4.6	3.5	4.2	
	※cm³／Nm³	87	85	85	88	80	73	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	0.6	＜0.5	＜0.5	0.5	1.3	1.3	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.03	＜0.02	＜0.02	0.02	＜0.02	0.02	8.38～9.78
	cm³／Nm³	0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

4号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	55,000
排ガス量(dry)	Nm³／h	45,700
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	58
いおう酸化物	Nm³／h	1.7
	cm³／Nm³	37

4号炉集じん機出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	52,400	55,300
排ガス量(dry)	Nm³／h	41,100	47,500
塩化水素	※ mg／Nm³	15	33
いおう酸化物	Nm³／h	3.1	1.4
	cm³／Nm³	76	29

4号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	67,000	64,100	59,600	68,900	60,800	66,200	
排ガス量(dry)	Nm³／h	49,000	47,200	42,700	49,200	44,300	47,400	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.9	6.6	4.0	5.4	5.8	5.2	
	※cm³／Nm³	100	100	76	86	93	86	250
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.4	0.6	700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.03	0.04	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	3.47 ～ 3.68
	cm³／Nm³	＜0.5	0.8	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

（全炉、年平均）

排ガス量
wet 56,000 Nm³/h
dry 45,400 Nm³/h

塩化水素 12 mg/Nm³
SOx 21 cm³/Nm³

有害ガス除去装置

（洗 煙 塔 ）

除去率
塩化水素 95.2 %
SOx 98.3 %

排ガス量
wet 66,800 Nm³/h
dry 48,200 Nm³/h

◎塩化水素 0.58 mg/Nm³
◎SOx 0.36 cm³/Nm³

◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量

項目（稼働炉数）		5月(4)	7月(3)	9月(4)
窒素酸化物（NOx）	Nm³／h	23.0	16.1	16.1
いおう酸化物（SOx）	Nm³／h	＜0.12	＜0.09	＜0.08

項目（稼働炉数）		11月 (4)	1月(3)	3月(3)	総量規制値
NOx	Nm³／h	19.7	15.5	16.9	39.28
SOx	Nm³／h	＜0.11	＜0.08	＜0.08	19.35

10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化 （煙突入口）

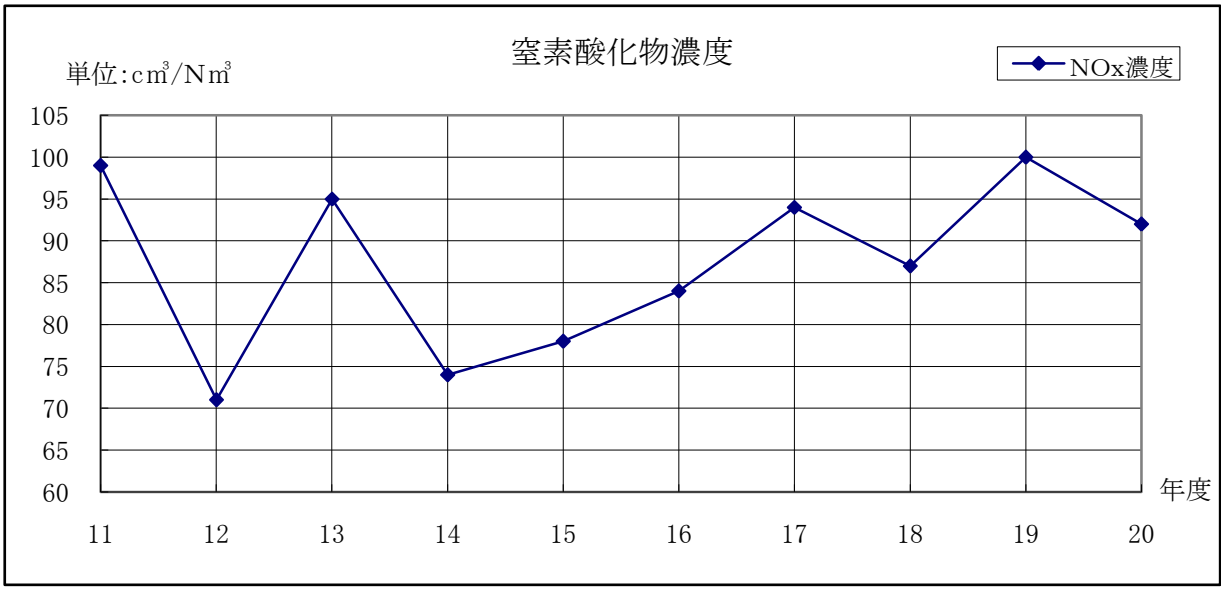

年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NOx 濃度	99	71	95	74	78	84	94	87	100	92

10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

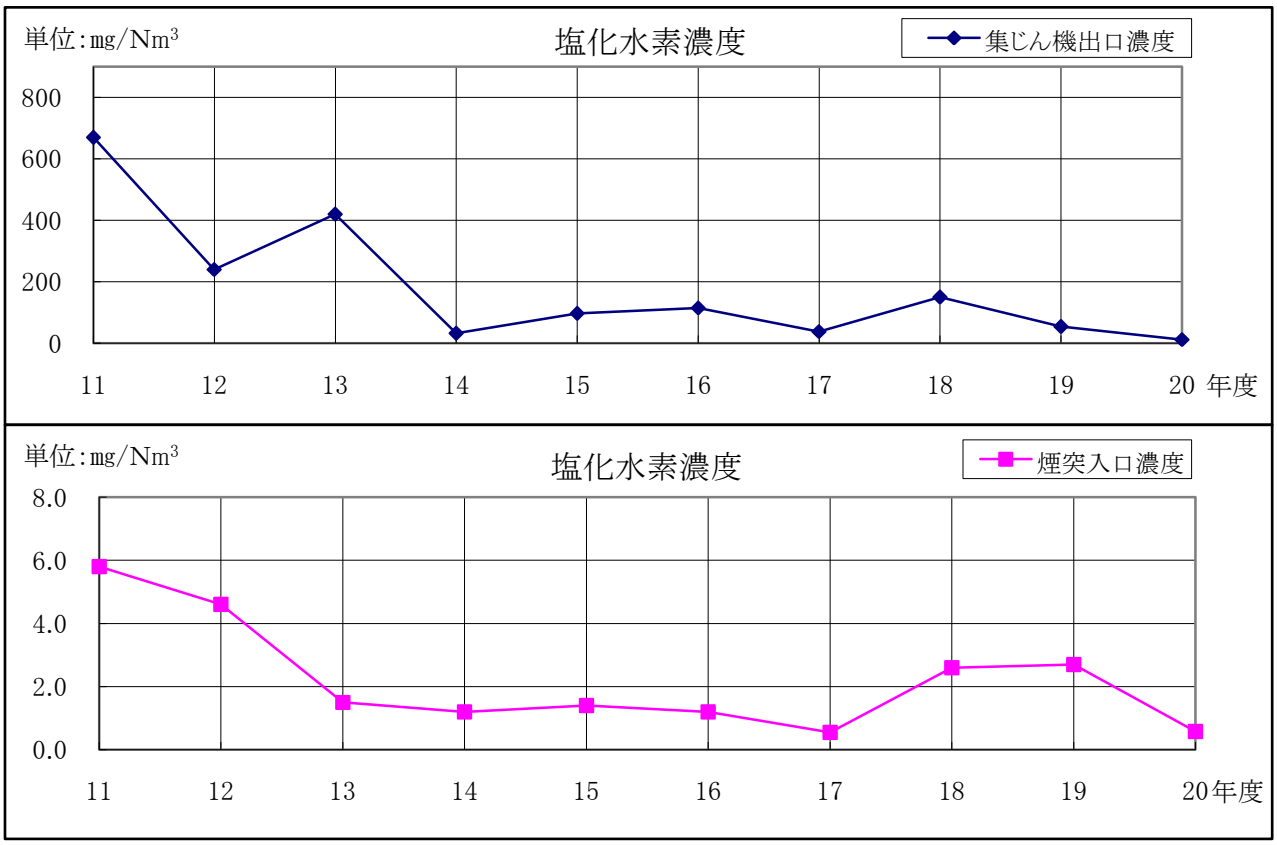

年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
集じん機出口濃度	670	240	420	32	97	115	38	150	54	12
煙突入口濃度	5.8	4.6	1.5	1.2	1.4	1.2	0.55	2.6	2.7	0.58
除去率（％）	99.1	98.1	99.6	96.3	98.6	99.0	98.6	98.3	95.0	95.2

10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

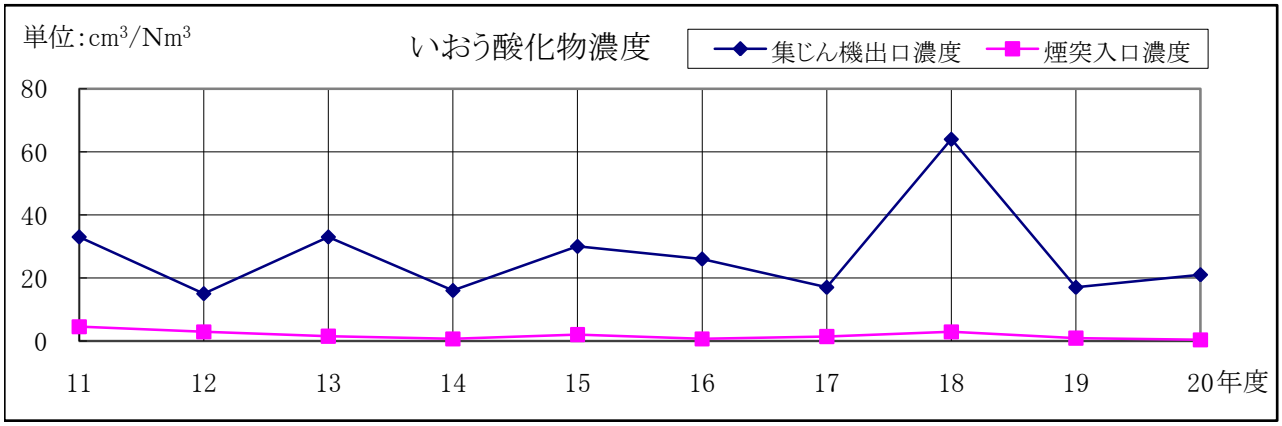

年　　度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
集じん機出口濃度	33	15	33	16	30	26	17	64	17	21
煙突入口濃度	4.5	2.9	1.5	0.66	2.0	0.66	1.4	2.9	0.89	0.36
除　去　率	86.4	80.7	95.5	95.9	93.3	97.5	91.7	95.5	94.8	98.3

10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む)

(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく)

		1 号 炉	2 号 炉
測 定 日		9月25日	9月25日
当日分	焼 却 量 t／日	144.70	138.11
	炉出口温度 ℃	905	900
	集じん機入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	66	60
	湿り排ガス量 Nm³/h	68,200	64,700
	乾き排ガス量 Nm³/h	48,600	46,800
	平均水分量 %	28.7	27.7
	酸素濃度 (4時間平均値) %	11.7	12.5
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	8	<5
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.001	<0.001
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.060	0.023

		3 号 炉	4 号 炉
測 定 日		9月3日	9月3日
当日分	焼 却 量 t／日	135.07	158.75
	炉出口温度 ℃	924	1022
	集じん機入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	62	65
	湿り排ガス量 Nm³/h	55,800	59,600
	乾き排ガス量 Nm³/h	40,300	42,700
	平均水分量 %	27.7	28.4
	酸素濃度 (4時間平均値) %	12.8	10.5
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	18	7
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.001	<0.001
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.018	0.037

● 基準値 (ng-TEQ/Nm³)

	1, 2, 3号炉	4 号 炉
大気汚染防止法 平成10年12月 1日～平成14年11月30日	80	80
〃 平成14年12月 1日～	1	1
ガイドライン恒久対策	1	0.5

10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化 （煙突入口）

基準値:1ng-TEQ/Nm³

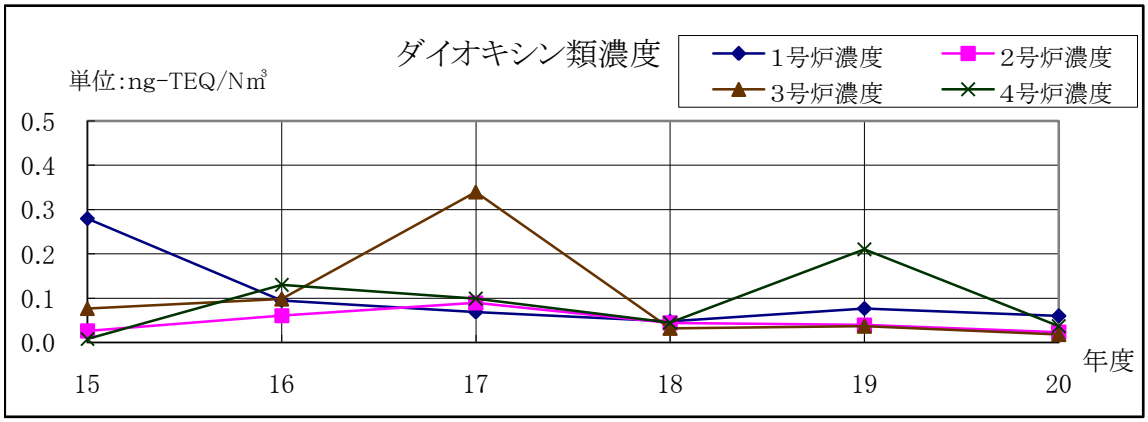

年 度	15	16	17	18	19	20
1 号 炉 濃 度	0.28	0.095	0.069	0.048	0.077	0.060
2 号 炉 濃 度	0.026	0.061	0.090	0.044	0.040	0.023
3 号 炉 濃 度	0.077	0.098	0.34	0.032	0.037	0.018
4 号 炉 濃 度	0.0083	0.13	0.099	0.045	0.21	0.037

※毒性等価係数について、平成20年度よりWHO（2006）－TEFを適用

10－8. その他のダイオキシン類測定結果（コプラナーPCB含む）

（ダイオキシン類対策特別措置法に基づく）

①ばいじん及び焼却灰関係

サンプル	測定日	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 ng-TEQ/g	基準値
1 号 炉 焼 却 灰	9月25日	0.0040	3ng-TEQ/g
2 号 炉 焼 却 灰	9月25日	0.011	
3 号 炉 焼 却 灰	9月 3日	0.0063	
4 号 炉 焼 却 灰	9月 3日	0.0086	
東 側 バ グ 灰 固 化 物	9月 3日	0.21	
西 側 バ グ 灰 固 化 物	10月10日	0.26	
脱 水 ケ ー キ	9月 3日	0.12	
ピ ッ ト 残 灰	9月 3日	0.015	

②排水関係

サンプル	測定日	浮遊物質量 mg/ℓ	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 pg-TEQ/ℓ	基準値
※下水放流水	9月17日	7.5	0.38	10pg-TEQ/ℓ
西側放流水	9月17日	3.0	0.58	
東側放流水	9月17日	N. D.	0.13	

※下水放流水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時の流量、1系10m³/h、2系3m³/h、総放流22m³/h

10－9. 排水関係測定結果　　（下水道法に基づく）

①原水水質測定結果

●洗灰処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	24.7	27.4	29.7	30.8	33.8	31.7	26.3	19.9	21.4	19.3	17.5	19.1
水素イオン濃度	11.3	11.4	11.0	10.9	10.9	11.3	11.3	11.1	11.3	11.3	11.5	11.0
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	56	86	33	68	98	63	70	56	68	90	72	78
化学的酸素要求量 (〃)	57	78	50	55	53	47	58	50	69	100	82	78
浮遊物質量 (〃)	63	78	43	13	20	99	56	67	40	88	1,200	270
全蒸発残留物 (〃)	4,700	9,100	7,000	9,900	7,400	7,100	7,600	5,500	7,200	6,500	6,100	6,800
よう素消費量 (〃)	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム含有量 (〃)	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.005
鉛含有量 (〃)	0.06	0.04	0.02	0.02	ND	0.03	ND	0.04	0.02	0.06	0.6	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.001	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
クロム含有量 (〃)	0.3	0.3	0.4	0.3	ND	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4
銅含有量 (〃)	0.1	0.2	0.1	0.09	0.09	0.1	0.1	0.09	0.1	0.1	0.4	0.2
亜鉛含有量 (〃)	0.2	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	1.9	0.6
鉄含有量 (〃)	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	5.3	0.8
マンガン含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	0.1
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素含有量 (〃)	ND	0.38	0.40	0.29	0.30	ND	ND	0.24	0.27	ND	ND	0.33

●洗煙処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	25.5	25.7	30.5	32.4	36.3	31.2	30.0	24.5	28.6	21.0	20.8	22.8
水素イオン濃度	7.7	7.7	7.8	8.4	7.6	8.5	7.8	7.8	7.7	8.2	7.7	8.1
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	10	10	11	10	9.0	10	43	3.0	20	6.0	7.0	12
化学的酸素要求量 (〃)	19	16	16	15	14	14	21	16	16	18	15	12
浮遊物質量 (〃)	29	13	18	13	7.3	6.4	37	31	17	26	68	7.6
全蒸発残留物 (〃)	8,000	9,000	6,400	7,100	6,400	5,800	8,000	5,900	7,800	7,700	2,800	6,400
よう素消費量 (〃)	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
鉛含有量 (〃)	0.1	0.04	ND	0.04	ND	ND	0.03	0.1	0.02	0.04	0.07	0.03
総水銀含有量 (〃)	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
クロム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅含有量 (〃)	0.02	0.03	ND	0.02	0.09	ND	0.03	0.03	0.01	0.02	0.06	ND
亜鉛含有量 (〃)	0.3	0.2	ND	0.2	ND	ND	0.2	0.4	0.1	0.2	0.9	0.2
鉄含有量 (〃)	1.1	1.6	1.2	2.4	ND	0.4	5.0	2.7	1.8	3.5	6.7	1.1
マンガン含有量 (〃)	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	0.1
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素含有量 (〃)	ND	1.5	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	2.5	2.5	1.1	1.5

②放流水水質測定結果

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
温　度　(℃)	23.8	25.7	28.5	32.6	33.1	31.0	27.1	24.0	21.8	23.7	19.1	19.2	45
水素イオン濃度	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.4	7.2	7.1	5～9
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	54	70	51	57	73	67	37	53	54	21	28	41	600
化学的酸素要求量 (〃)	44	44	34	47	39	33	37	42	44	30	25	48	—
浮遊物質量 (〃)	7.2	12	10	14	6.0	12	ND	13	8.5	23	16	6.7	600
全蒸発残留物 (〃)	4,600	8,200	6,500	6,900	7,300	7,500	7,000	5,300	7,000	3,600	4,700	5,900	—
ようそ消費量 (〃)	5.1	ND	ND	ND	ND	3.8	ND	2.5	ND	ND	ND	ND	220
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
カドミウム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
鉛含有量 (〃)	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.001	ND	ND	0.0008	0.0007	0.0006	0.001	0.001	0.001	0.0009	ND	0.0006	0.005
クロム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2
銅含有量 (〃)	ND	0.02	ND	0.01	ND	0.01	ND	0.01	ND	ND	ND	ND	3
亜鉛含有量 (〃)	0.1	0.3	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2
鉄含有量 (〃)	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	ND	0.4	0.4	0.3	0.2	ND	(溶) 10
マンガン含有量 (〃)	ND	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	(溶) 10
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30
ほう素含有量 (〃)	0.67	0.67	0.41	0.29	0.50	0.45	0.46	0.44	0.67	0.65	0.29	0.48	10

③水素イオン濃度の経月変化

放流水の基準値:5～9

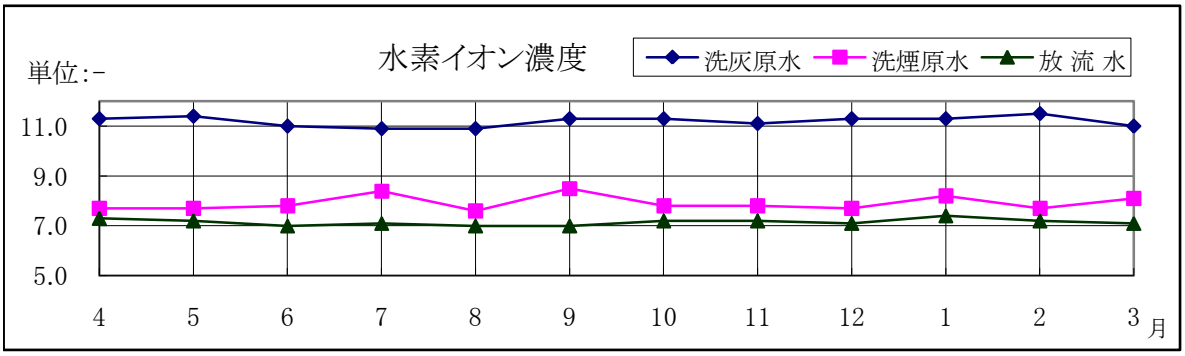

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	11.3	11.4	11.0	10.9	10.9	11.3	11.3	11.1	11.3	11.3	11.5	11.0
洗煙原水	7.7	7.7	7.8	8.4	7.6	8.5	7.8	7.8	7.7	8.2	7.7	8.1
放 流 水	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.4	7.2	7.1

④水銀濃度の経月変化

放流水の基準値0.005mg/ℓ

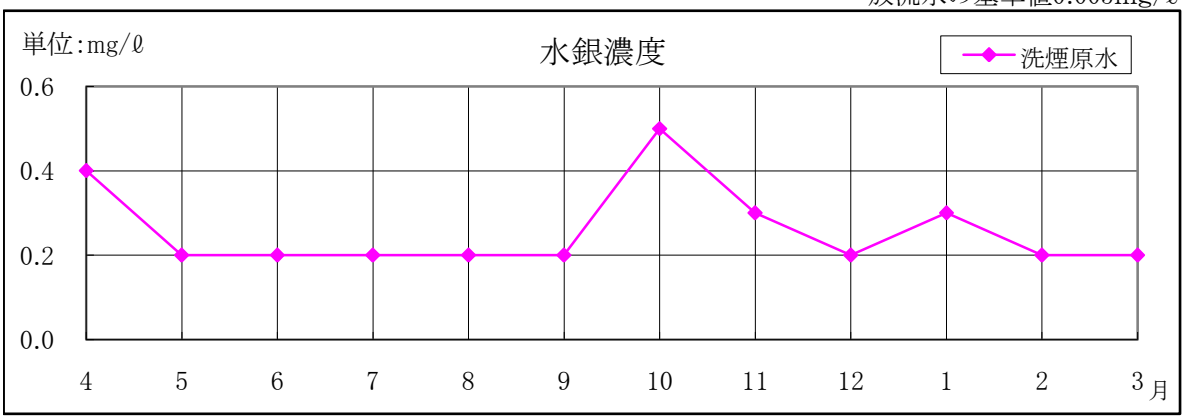

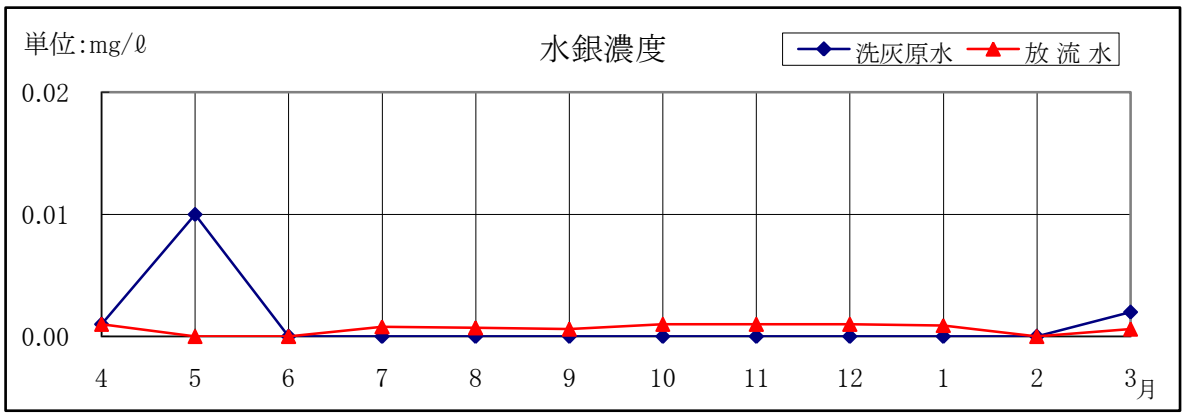

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.001	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
洗煙原水	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
放 流 水	0.001	ND	ND	0.0008	0.0007	0.0006	0.001	0.001	0.001	0.0009	ND	0.0006

⑤鉛濃度の経月変化

放流水の基準値0.1mg/ℓ

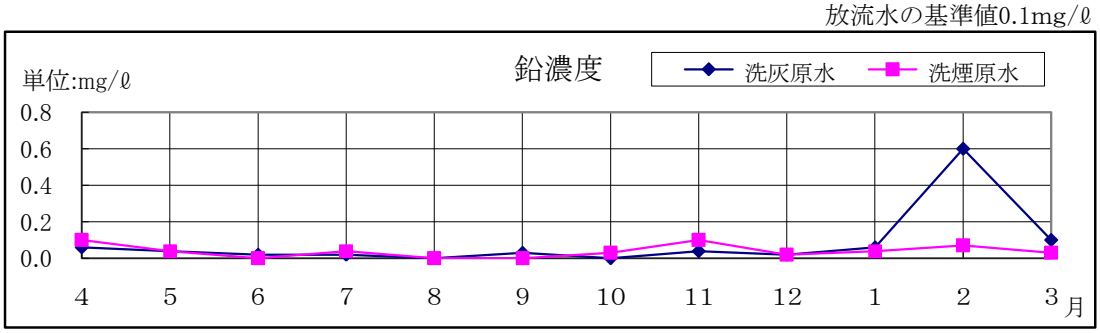

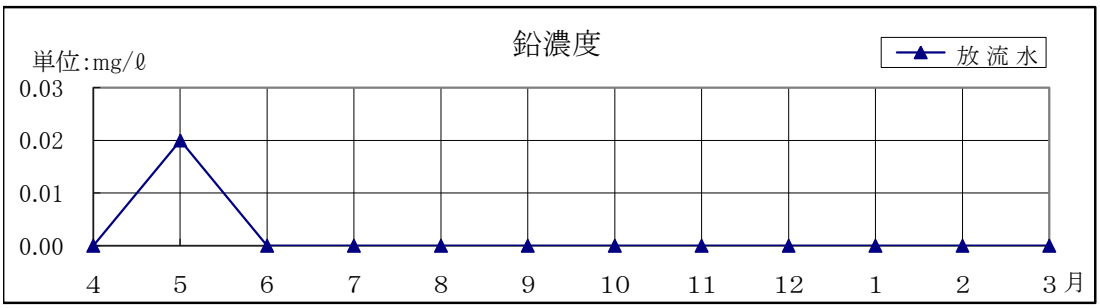

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.06	0.04	0.02	0.02	ND	0.03	ND	0.04	0.02	0.06	0.6	0.1
洗煙原水	0.1	0.04	ND	0.04	ND	ND	0.03	0.1	0.02	0.04	0.07	0.03
放 流 水	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

⑥亜鉛濃度の経月変化

放流水の基準値2mg/ℓ

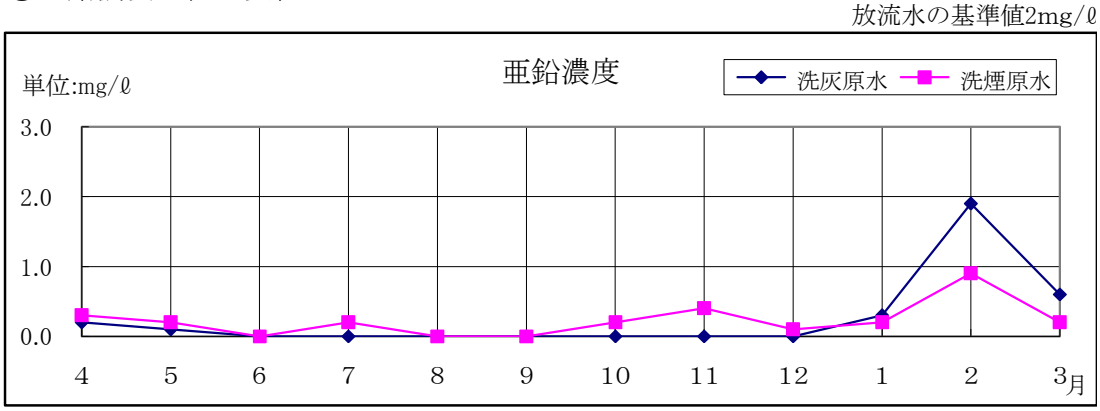

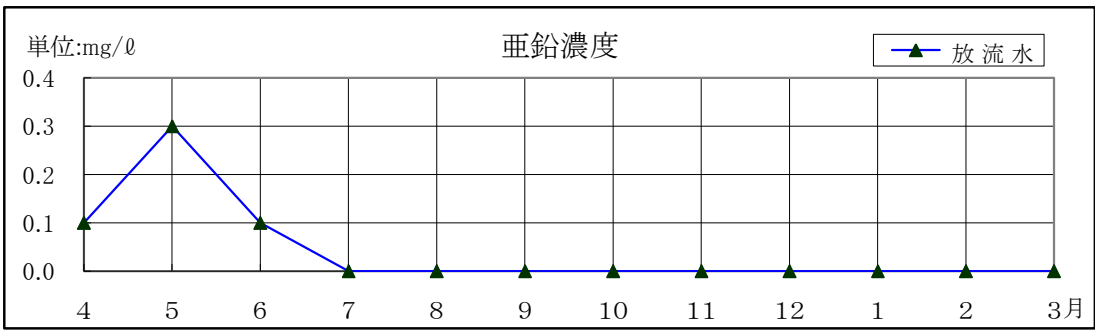

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.2	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	1.9	0.6
洗煙原水	0.3	0.2	ND	0.2	ND	ND	0.2	0.4	0.1	0.2	0.9	0.2
放 流 水	0.1	0.3	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

11. 維持管理経費の状況(ごみ焼却施設)

11－1. 処理経費

(単位:円)

区分 ＼ 年度			平成20度	平成19年度	前年比(%)
	人件費		881,289,880	921,638,375	95.6
	物件費		1,050,889,802	1,092,084,685	96.2
	内訳	消耗品費	195,282,115	201,936,984	96.7
		光熱水費	88,637,769	90,110,149	98.4
		工事・修繕料	471,492,805	506,591,657	93.1
		下水道使用料	25,743,200	26,360,113	97.7
		残灰処分委託料	187,667,020	195,490,742	96.0
		その他	82,066,893	71,595,040	114.6
合計			1,932,179,682	2,013,723,060	96.0
処理経費	総可燃ごみ搬入量(t)		158,017	164,927	95.8
	トン当り処理経費(円)		12,228	12,210	100.1
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,188	1,185	100.2
	焼却量(t)		173,771	180,524	96.3
	トン当り処理経費(円)		11,119	11,155	99.7
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,080	1,083	99.7
人口(10月1日現在)			583,295	581,173	100.4
市民一人当り負担額			3,313	3,465	95.6

11－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費(円)	可燃ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費(円)	焼却量(t)	焼却量トン当り処理経費(円)
9	2,519,867,176	210,295	11,983	216,634	11,632
10	2,533,845,618	208,417	12,158	219,148	11,562
11	2,334,019,645	207,934	11,225	216,930	10,759
12	2,279,856,950	208,327	10,944	218,101	10,453
13	2,363,998,879	205,876	11,483	215,930	10,948
14	2,312,448,257	202,922	11,396	210,632	10,979
15	2,247,159,678	196,260	11,450	207,472	10,831
16	1,953,146,295	188,328	10,371	204,441	9,554
17	1,925,753,315	182,420	10,557	195,785	9,836
18	2,084,674,962	181,106	11,511	196,246	10,623
19	2,013,723,060	164,927	12,210	180,524	11,155
20	1,932,179,682	158,017	12,228	173,771	11,119

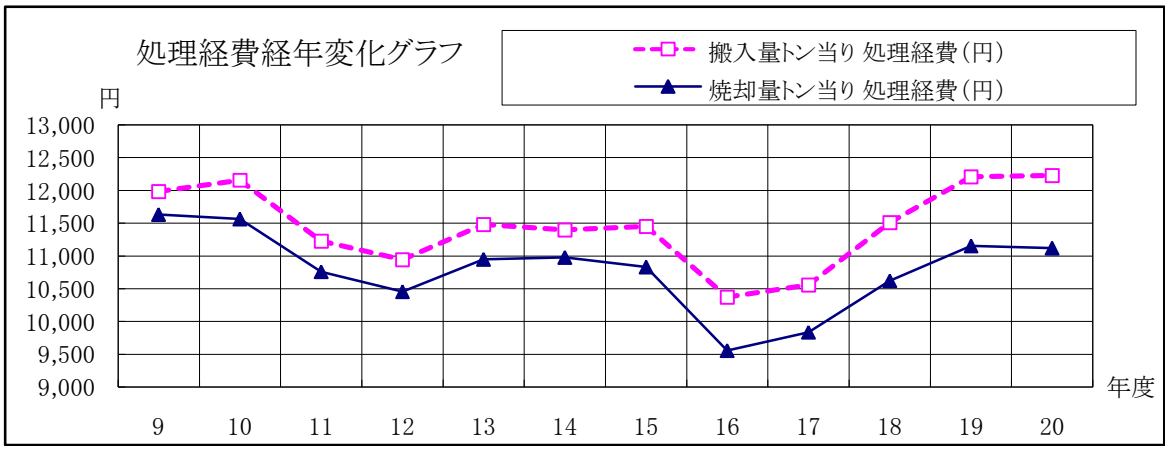

11－3. 修繕料の経年変化

区分 年度	修繕料(円)	前年比(%)	指数(%)
9	617,091,156	－	100.0
10	660,378,459	107.0	107.0
11	549,656,195	83.2	89.1
12	558,294,242	101.6	90.5
13	571,833,485	102.4	92.7
14	520,627,478	91.0	84.4
15	558,362,527	107.2	90.5
16	356,914,627	63.9	57.8
17	394,649,216	110.6	64.0
18	470,531,626	119.2	76.2
19	475,863,827	101.1	77.1
20	469,434,805	99.8	76.1

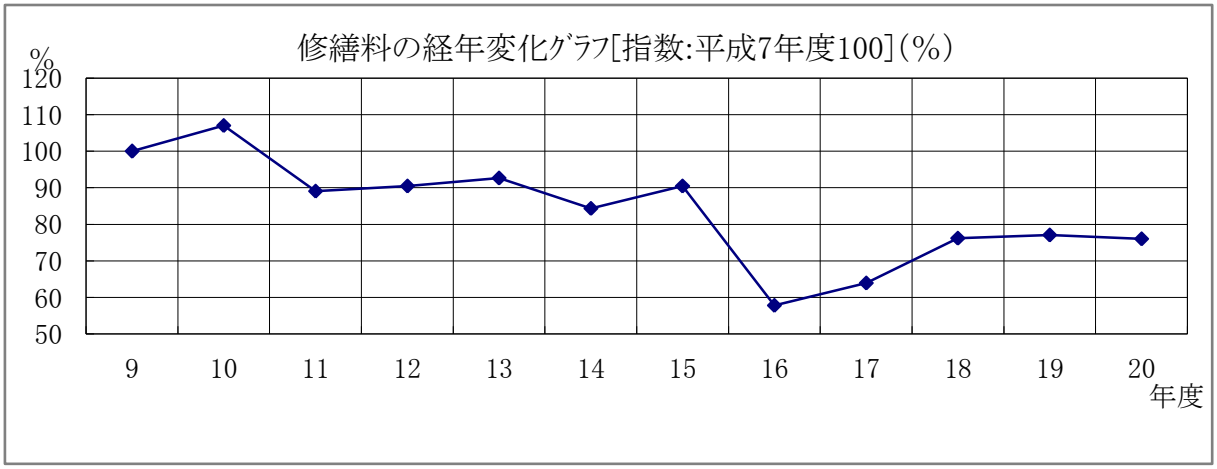

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績

1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（両市合計）

項目 / 月別	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	3,521	1,797.80	180	35.50	3,701	1,833.30
5	3,652	1,847.76	187	36.03	3,839	1,883.79
6	3,377	1,599.88	179	35.81	3,556	1,635.69
7	3,784	1,802.32	168	29.41	3,952	1,831.73
8	3,641	1,684.97	160	32.41	3,801	1,717.38
9	3,689	1,719.35	166	31.00	3,855	1,750.35
10	3,917	1,819.64	171	35.44	4,088	1,855.08
11	3,418	1,602.96	173	45.21	3,591	1,648.17
12	4,105	2,071.74	182	50.02	4,287	2,121.76
1	3,506	1,764.66	160	36.39	3,666	1,801.05
2	3,432	1,488.04	168	35.59	3,600	1,523.63
3	4,041	1,820.26	164	34.30	4,205	1,854.56
計	44,083	21,019.38	2,058	437.11	46,141	21,456.49
月平均	3,674	1,751.62	172	36.43	3,845	1,788.04

1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	2,759	1,238.92	180	35.50	2,939	1,274.42
5	2,855	1,278.89	187	36.03	3,042	1,314.92
6	2,635	1,118.64	179	35.81	2,814	1,154.45
7	2,983	1,259.81	168	29.41	3,151	1,289.22
8	2,855	1,175.15	160	32.41	3,015	1,207.56
9	2,899	1,185.95	166	31.00	3,065	1,216.95
10	3,028	1,228.40	171	35.44	3,199	1,263.84
11	2,635	1,046.64	173	45.21	2,808	1,091.85
12	3,135	1,353.01	182	50.02	3,317	1,403.03
1	2,690	1,187.96	160	36.39	2,850	1,224.35
2	2,679	1,009.81	168	35.59	2,847	1,045.40
3	3,179	1,238.24	164	34.30	3,343	1,272.54
計	34,332	14,321.42	2,058	437.11	36,390	14,758.53
月平均	2,861	1,193.45	172	36.43	3,033	1,229.88

1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	762	558.88	0	0.00	762	558.88
5	797	568.87	0	0.00	797	568.87
6	742	481.24	0	0.00	742	481.24
7	801	542.51	0	0.00	801	542.51
8	786	509.82	0	0.00	786	509.82
9	790	533.40	0	0.00	790	533.40
10	889	591.24	0	0.00	889	591.24
11	783	556.32	0	0.00	783	556.32
12	970	718.73	0	0.00	970	718.73
1	816	576.70	0	0.00	816	576.70
2	753	478.23	0	0.00	753	478.23
3	862	582.02	0	0.00	862	582.02
計	9,751	6,697.96	0	0	9,751	6,697.96
月平均	813	558.16	0.00	0.00	813	558.16

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績

2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績

項目	処理実績			回転破砕機稼働時間		処理運転時間（試運転含む）		せん断破砕機稼働時間		稼働日数
	クレーン投入量	直接投入量	計							
月別	(t)	(t)	(t)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(日)
4	1,637.77	186.64	1,824.41	139	42	82	45	0	12	17
5	1,957.11	184.59	2,141.70	159	20	94	45	0	0	21
6	1,649.64	126.65	1,776.29	129	53	80	21	0	0	18
7	1,804.56	164.51	1,969.07	139	51	87	46	0	0	19
8	1,600.92	123.39	1,724.31	125	55	75	57	0	0	19
9	1,674.99	152.29	1,827.28	129	30	80	26	0	0	18
10	1,830.08	139.40	1,969.48	146	7	90	33	0	0	20
11	1,550.87	134.14	1,685.01	113	51	72	14	0	0	15
12	2,048.23	115.68	2,163.91	149	55	94	26	0	0	19
1	1,755.53	138.45	1,893.98	136	25	81	56	0	0	18
2	1,538.88	71.46	1,610.34	124	5	78	57	0	0	17
3	1,741.45	219.71	1,961.16	131	29	83	3	0	0	18
計	20,790.03	1,756.91	22,546.94	1,626	3	1003	9	0	12	219
月平均	1,732.50	146.41	1,878.91	135	30	83	36	0	1	18
実日平均	94.93	8.02	102.95	7	25	4	35	0	0	

項目	処理選別物搬出量									
	可燃物	台数	不燃物	台数	鉄類	台数	非鉄類	台数	プラスチック類	台数
月別	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	1,021.80	391	260.49	53	232.80	87	14.43	25	294.89	62
5	1,222.10	495	297.17	58	256.39	97	20.89	27	345.15	70
6	1,003.60	401	258.92	59	210.37	83	13.59	18	289.81	57
7	1,096.10	438	274.50	57	223.22	80	13.40	20	361.85	65
8	996.00	402	243.18	51	202.13	80	13.89	21	269.11	51
9	1,023.30	403	261.97	54	215.35	85	14.09	20	312.57	61
10	1,140.80	468	287.51	59	239.42	87	14.67	21	287.08	54
11	914.30	357	239.95	51	217.99	73	11.84	15	300.93	53
12	1,255.00	496	316.36	63	299.00	103	15.07	20	278.48	57
1	1,097.70	439	269.65	56	228.96	82	11.92	19	285.75	59
2	959.70	409	268.16	55	212.84	77	10.81	17	158.83	52
3	1,095.70	415	279.01	57	241.69	84	11.82	18	332.94	109
計	12,826.10	5,114	3,256.87	673	2,780.16	1,018	166.42	241	3,517.39	750
月平均	1,068.84	426	271.41	56	231.68	85	13.87	20	293.12	63
実日平均	57.26	23	14.54	3	12.41	5	0.74	1	15.70	3
構成比	56.89 %		14.44 %		12.33 %		0.74 %		15.61 %	

2－2. 用水・電力・蒸気使用量実績

項目 / 月別	処理量	工水使用量		上水使用量		蒸気使用量		電力使用量	
			トン当り使用量		トン当り使用量		トン当り使用量		トン当り使用量
	(t)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(t)	(t)	(kwh)	(kwh)
4	1,824.41	210.72	0.12	431.77	0.24	281.65	0.15	185,268	101.55
5	2,141.70	281.24	0.13	428.06	0.20	315.29	0.15	205,756	96.07
6	1,776.29	241.88	0.14	469.65	0.26	252.66	0.14	187,188	105.38
7	1,969.07	301.05	0.15	716.42	0.36	283.04	0.14	194,000	98.52
8	1,724.31	208.85	0.12	651.56	0.38	254.62	0.15	179,175	103.91
9	1,827.28	283.99	0.16	578.68	0.32	285.46	0.16	184,345	100.88
10	1,969.48	242.28	0.12	501.54	0.25	341.62	0.17	192,581	97.78
11	1,685.01	246.09	0.15	381.18	0.23	250.74	0.15	170,258	101.04
12	2,163.91	246.90	0.11	342.51	0.16	319.58	0.15	197,434	91.24
1	1,893.98	223.53	0.12	349.71	0.18	293.72	0.16	178,400	94.19
2	1,610.34	127.40	0.08	405.55	0.25	268.40	0.17	398,850	247.68
3	1,960.56	300.11	0.15	381.10	0.19	268.79	0.14	180,328	91.98
計	22,546.34	2,914.04		5,637.73		3,415.57		2,453,583	
月平均	1,878.86	242.84		469.81		284.63		204,465	
暦日平均	61.77	7.98		15.45		9.36		6,722	
実日平均	112.17	14.50		28.05		16.99		12,207	

３．不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況

３－１．不燃・粗大ごみの処理残渣等の処分実績

項目 / 月別	不燃・粗大ごみの処理残渣処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
	(台)	(ｔ)	(%)	(台)	(ｔ)	(%)	(台)	(ｔ)	(%)	(ｔ)	(%)
4	26	215	52	22	196	48	48	411	100	339	121.2
5	41	340	49	37	349	51	78	689	100	598	115.2
6	25	205	46	30	241	54	55	446	100	465	95.9
7	42	354	56	34	276	44	76	630	100	535	117.8
8	27	224	52	25	209	48	52	433	100	597	72.5
9	30	255	51	30	243	49	60	498	100	407	122.4
10	32	251	48	33	275	52	65	526	100	568	92.6
11	31	253	50	31	249	50	62	502	100	550	91.3
12	26	218	46	29	257	54	55	475	100	516	92.1
1	31	257	45	36	320	55	67	577	100	584	98.8
2	17	134	31	35	297	69	52	431	100	461	93.5
3	36	292	76	11	91	24	47	383	100	489	78.3
計	364	2,998	50	353	3,003	50	717	6,001	100	6,109	
月平均	30	250		29	250		60	500		509	99.3

3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績

項目	鉄類			非鉄(アルミ)類			発泡スチロール		
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)
4	20	240.85	91.1	5	14.85	5.6	5	8.75	3.3
5	28	304.01	90.5	7	25.29	7.5	3	6.49	2.0
6	19	209.75	90.0	3	14.46	6.2	4	8.80	3.8
7	21	234.97	89.4	7	19.28	7.3	4	8.71	3.3
8	22	183.96	91.4	4	12.90	6.4	2	4.41	2.2
9	29	254.02	91.0	5	17.92	6.4	3	7.27	2.6
10	27	252.55	92.3	4	14.29	5.2	3	6.71	2.5
11	13	128.62	84.2	4	15.16	9.9	4	9.00	5.9
12	41	378.03	93.2	5	18.69	4.6	4	8.83	2.2
1	28	257.48	92.6	4	14.30	5.1	3	6.37	2.3
2	25	235.56	92.7	3	11.93	4.7	3	6.63	2.6
3	29	263.54	93.4	3	11.96	4.2	3	6.56	2.4
計	302	2,943.34	91.3	54	191.03	5.9	41	88.53	2.8
月平均	25	245.28		5	15.92				

項目	コンプレッサー			合計			前年度	前年比
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	処分量	
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	0	0.00	0.0	30	264.45	100	245.55	107.7
5	0	0.00	0.0	38	335.79	100	349.64	96.0
6	0	0.00	0.0	26	233.01	100	242.42	96.1
7	0	0.00	0.0	32	262.96	100	284.48	92.4
8	0	0.00	0.0	28	201.27	100	314.91	63.9
9	0	0.00	0.0	37	279.21	100	234.98	118.8
10	0	0.00	0.0	34	273.55	100	306.32	89.3
11	0	0.00	0.0	21	152.78	100	255.24	59.9
12	0	0.00	0.0	50	405.55	100	304.64	133.1
1	0	0.00	0.0	35	278.15	100	267.50	104.0
2	0	0.00	0.0	31	254.12	100	256.70	99.0
3	0	0.00	0.0	35	282.06	100	222.87	126.6
計	0	0.00	0.0	397	3,222.90	100	3,285.25	
月平均	0	0.00		30	261.20		451.44	57.9

３－３．適正処理困難物処分量実績

項目 / 月別	バッテリー		消火器	塗料・廃液	マットレス	金属・プラスチック類	プロパンボンベ	その他ボンベ	単車類
	（ｋｇ）	（個）	（本）	（缶）	（㎥）	（㎥）	（本）	（本）	（台）
4	0	0	0	0	66	13	0	0	30
5	0	0	0	0	66	13	0	0	0
6	0	0	0	0	44	13	0	0	29
7	440	60	0	0	66	13	0	0	0
8	0	0	0	0	66	0	0	0	0
9	0	0	0	0	44	13	0	0	27
10	310	41	55	0	66	26	0	0	0
11	0	0	0	0	44	0	0	0	0
12	0	0	0	0	88	13	0	0	0
1	0	0	0	0	44	13	0	0	35
2	510	62	0	0	44	13	0	0	0
3	0	0	40	32	66	13	0	0	0
計	1,260	163	95	32	704	143	0	0	121
月平均	194	14	8	3	59	12	0	0	10

4. 維持管理経費の状況（粗大ごみ処理施設）

4－1. 処理経費

（単位：円）

区分 ＼ 年度			平成20年度	平成19年度	前年比（%）
	人件費		111,492,685	115,251,934	96.7
	物件費		363,031,280	362,751,661	100.1
	内訳	消耗品費	20,709,974	7,539,507	274.7
		光熱水費	19,890,636	19,393,008	102.6
		工事・修繕料	148,348,346	168,111,995	88.2
		下水道使用料	1,237,427	1,202,749	102.9
		不燃物等処分委託料	47,039,016	47,077,532	99.9
		その他	125,805,881	119,426,870	105.3
合計			474,523,965	478,003,595	99.3
処理経費	不燃・粗大ごみ搬入量（t）　※1		26,857	27,136	99.0
	トン当り処理経費（円）		17,669	17,615	100.3
	トン当り最終処分経費［再掲］（円）		1,751	1,735	101.0
	粗大ごみ処理施設処理量（t）		22,547	22,348	100.9
	トン当り処理経費（円）		21,046	21,389	98.4
	トン当り最終処分経費［再掲］（円）		2,086	2,107	99.0
人口（10月1日現在）			583,295	581,173	100.4
市民一人当り負担額			814	822	98.9

※1　不燃・粗大ごみ搬入量はガラス、ペット、その他プラ、家電四品目（換算値）の搬入量を含んでいます。

4－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費（円）	不燃・粗大ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費（円）	粗大ごみ処理施設処理量(t)	処理量トン当り処理経費（円）
9	560,474,566	30,855	18,165	28,355	19,766
10	544,109,885	30,595	17,784	27,123	20,061
11	535,890,773	30,421	17,616	26,948	19,886
12	458,261,024	32,266	14,202	28,291	16,198
13	455,689,752	30,439	14,971	26,898	16,941
14	489,680,208	30,075	16,282	26,248	18,656
15	487,731,850	30,578	15,950	25,197	19,357
16	444,934,966	30,288	14,690	23,543	18,899
17	455,316,866	29,788	15,285	24,126	18,872
18	443,243,380	29,707	14,920	24,876	17,818
19	478,003,595	27,136	17,615	22,348	21,389
20	474,523,965	26,857	17,669	22,547	21,046

※平成9年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はガラス・ペットの搬入量を含んでいます。
※平成13年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はその他プラ、家電四品目（換算値）の搬入量を含んでいます。

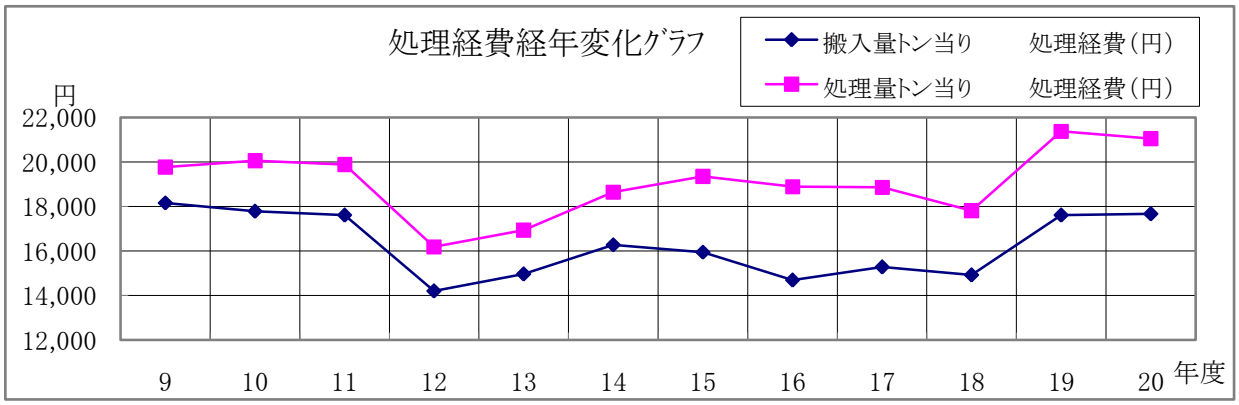

4－3. 修繕料の経年変化

区分 年度	修繕料(円)	前年比(%)	指数(%)
9	157,036,668	－	100.0
10	170,000,065	108.3	108.3
11	112,720,639	66.3	71.8
12	125,118,022	111.0	79.7
13	115,207,575	92.1	73.4
14	136,870,134	118.8	87.2
15	117,113,777	85.6	74.6
16	85,955,719	73.4	54.7
17	105,600,523	122.9	67.2
18	112,963,347	107.0	71.9
19	168,111,995	148.8	107.1
20	148,348,346	131.3	94.5

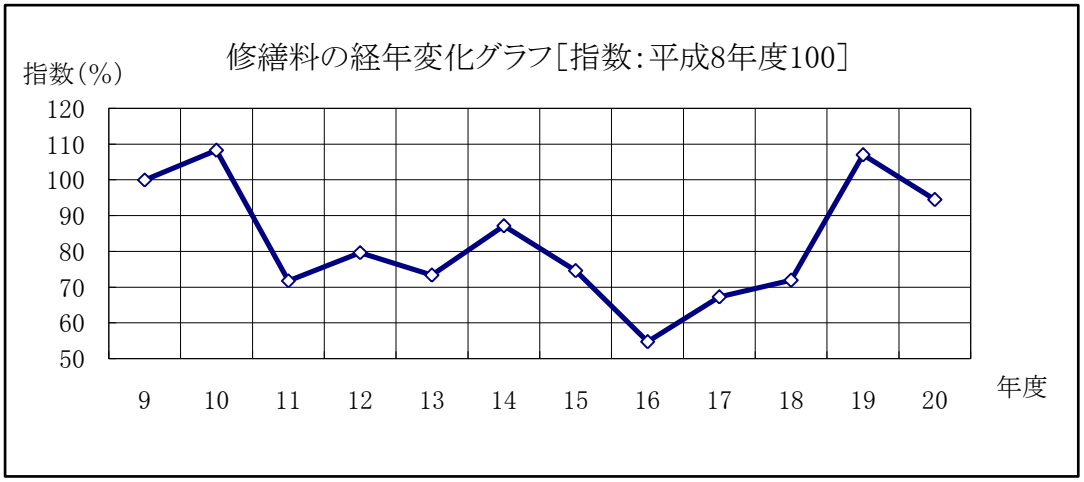

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績

1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績

項目	搬入量 (t)								
	豊中市			伊丹市			両市合計		
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ
4	122.00	19.64	68.80	95.51	28.52	99.10	217.51	48.16	167.90
5	143.28	22.93	64.41	104.26	33.49	101.55	247.54	56.42	165.96
6	129.23	23.08	61.09	98.30	32.20	93.45	227.53	55.28	154.54
7	129.32	33.16	64.23	113.83	42.56	101.42	243.15	75.72	165.65
8	152.49	33.91	58.94	103.91	43.27	92.27	256.40	77.18	151.21
9	130.33	30.98	58.50	100.55	39.67	95.47	230.88	70.65	153.97
10	130.92	27.14	64.09	104.33	34.94	101.60	235.25	62.08	165.69
11	131.41	20.77	53.51	87.32	24.86	86.63	218.73	45.63	140.14
12	148.18	21.53	66.05	106.78	26.79	98.73	254.96	48.32	164.78
1	148.54	18.66	61.07	111.19	25.61	97.73	259.73	44.27	158.80
2	130.00	17.05	54.10	88.02	23.45	86.95	218.02	40.50	141.05
3	121.81	19.65	58.93	95.37	26.10	96.66	217.18	45.75	155.59
計	1,617.51	288.50	733.72	1,209.37	381.46	1,151.56	2,826.88	669.96	1,885.28
月平均	134.79	24.04	61.14	100.78	31.79	95.96	235.57	55.83	157.11

項目	搬出量 (t)						
	ガラスびん			ペットボトル		その他プラスチック	
月別	再商品化	残渣	計	再商品化	残渣	再商品化	残渣
4	171.53	19.42	190.95	46.12	2.26	140.36	9.79
5	199.71	22.26	221.97	51.37	2.13	170.45	14.25
6	192.11	21.40	213.51	47.04	2.04	142.29	11.83
7	194.12	21.67	215.79	63.79	2.12	148.9	14.41
8	212.85	23.78	236.63	69.26	1.63	142.12	13.77
9	186.01	20.81	206.82	69.45	1.81	143.88	12.58
10	190.73	21.27	212.00	57.33	2.05	164.67	12.03
11	180.67	20.20	200.87	44.30	1.69	132.43	9.53
12	191.77	21.44	213.21	38.42	1.90	147.12	11.47
1	227.72	25.46	253.18	43.88	1.69	155.86	9.95
2	178.97	19.99	198.96	32.98	1.86	147.48	8.11
3	177.25	19.82	197.07	16.66	1.63	149.16	10.79
計	2,303.44	257.52	2,560.96	580.60	22.81	1,784.72	138.51
月平均	191.95	21.46	213.41	48.38	1.90	148.73	11.54

1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績

項目	搬入台数(台)									搬出台数(台)		
	豊中市			伊丹市			両市合計			ガラスびん	ペットボトル	その他プラスチッ
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ			
4	246	96	124	80	74	180	326	170	304	33	8	53
5	248	131	113	88	89	211	336	220	324	31	9	54
6	242	130	110	87	85	201	329	215	311	26	8	50
7	235	160	120	95	112	227	330	272	347	28	11	60
8	242	158	112	85	109	203	327	267	315	33	12	52
9	236	155	110	86	98	202	322	253	312	26	12	51
10	239	139	127	94	96	224	333	235	351	27	10	63
11	254	119	104	80	79	190	334	198	294	30	8	51
12	256	122	132	90	84	209	346	206	341	35	7	53
1	222	111	109	92	80	196	314	191	305	39	8	56
2	240	106	109	80	76	188	320	182	297	25	6	53
3	232	113	113	86	84	206	318	197	319	22	3	53
計	2,892	1,540	1,383	1,043	1,066	2,437	3,935	2,606	3,820	355	102	649
月平均	241	128	115	87	89	203	328	217	318	30	9	54

1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績

項目	容器包装の種類					
	無色ガラスびん	茶色ガラスびん	その他ガラスびん	ガラスびん合計	ペットボトル	その他プラスチック
月別	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4	64.60	47.73	59.20	171.53	46.12	140.36
5	75.34	55.53	68.84	199.71	51.37	170.45
6	72.55	53.31	66.25	192.11	47.04	142.29
7	73.37	53.59	67.16	194.12	63.79	148.90
8	80.44	58.96	73.45	212.85	69.26	142.12
9	70.30	51.49	64.22	186.01	69.45	143.88
10	72.08	52.87	65.78	190.73	57.33	164.67
11	68.27	50.01	62.39	180.67	44.30	132.43
12	72.46	53.12	66.19	191.77	38.42	147.12
1	86.06	63.06	78.60	227.72	43.88	155.86
2	67.64	49.60	61.73	178.97	32.98	147.48
3	67.00	49.08	61.17	177.25	16.66	149.16
計	870.11	638.35	794.98	2,303.44	580.60	1784.72
月平均	72.51	53.20	66.25	191.95	48.38	148.73
色別混入率(%)	37.77	27.71	34.51	100.00		

2. 家電四品目搬入・搬出実績

2－1. 家電四品目(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン)搬入実績(両市合計)

両市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値 (0.05t/台)		換算値 (0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値 (0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	2	7	6	3	12	5	5	15	25	40	1.84	2
5	1	0	5	9	1	2	1	0	8	11	19	0.71	0
6	1	1	1	2	1	7	2	2	5	12	17	0.87	1
7	0	0	3	9	3	5	1	3	7	17	24	1.04	0
8	0	0	2	11	6	6	0	3	8	20	28	1.32	0
9	0	1	5	6	2	4	1	1	8	12	20	0.86	0
10	0	0	3	7	1	5	1	3	5	15	20	0.84	0
11	0	0	0	10	2	5	1	3	3	18	21	0.91	0
12	0	1	11	21	2	12	0	5	13	39	52	2.14	0
1	0	1	8	12	3	3	1	1	12	17	29	1.13	0
2	0	0	6	11	1	1	0	1	7	13	20	0.68	0
3	0	0	6	14	2	1	0	2	8	17	25	0.87	0
合計	2	6	57	118	27	63	13	29	99	216	315	13.21	3

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

両市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	3	0	2	1	1	1	0	2	6	8	0.38
5	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	4	0.12
6	0	0	0	2	0	2	1	1	1	5	6	0.26
7	1	1	1	1	2	0	1	1	5	3	8	0.36
8	1	0	2	1	2	1	2	0	7	2	9	0.41
9	1	0	0	2	0	5	2	2	3	9	12	0.58
10	0	1	1	2	0	2	1	1	2	6	8	0.34
11	2	2	1	4	0	2	1	1	4	9	13	0.55
12	1	3	1	4	1	3	1	1	4	11	15	0.69
1	0	0	3	3	4	2	3	0	10	5	15	0.69
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0.08
3	0	1	3	2	1	3	2	3	6	9	15	0.63
合計	6	12	13	25	11	21	16	11	46	69	115	5.09

両市　総搬入実績

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値 (0.05t/台)		換算値 (0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値 (0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	5	7	8	4	13	6	5	17	31	48	2.22	2
5	1	0	6	10	1	2	2	1	10	13	23	0.83	0
6	1	1	1	4	1	9	3	3	6	17	23	1.13	1
7	1	1	4	10	5	5	2	4	12	20	32	1.40	0
8	1	0	4	12	8	7	2	3	15	22	37	1.73	0
9	1	1	5	8	2	9	3	3	11	21	32	1.44	0
10	0	1	4	9	1	7	2	4	7	21	28	1.18	0
11	2	2	1	14	2	7	2	4	7	27	34	1.46	0
12	1	4	12	25	3	15	1	6	17	50	67	2.83	0
1	0	1	11	15	7	5	4	1	22	22	44	1.82	0
2	0	1	6	12	1	1	0	1	7	15	22	0.76	0
3	0	1	9	16	3	4	2	5	14	26	40	1.50	0
合計	8	18	70	143	38	84	29	40	145	285	430	18.30	3

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－2. 家電四品目(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン)搬入実績(豊中市分)

豊中市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	1	6	2	2	9	3	3	11	15	26	1.24	1
5	0	0	5	7	1	2	0	0	6	9	15	0.57	0
6	0	0	1	2	1	4	2	2	4	8	12	0.56	1
7	0	0	0	7	3	4	1	3	4	14	18	0.82	0
8	0	0	1	10	4	4	0	3	5	17	22	0.98	0
9	0	0	5	6	1	3	1	1	7	10	17	0.67	0
10	0	0	2	6	0	3	0	1	2	10	12	0.48	0
11	0	0	0	8	1	4	1	3	2	15	17	0.71	0
12	0	1	8	13	1	10	0	3	9	27	36	1.54	0
1	0	1	8	12	3	2	1	1	12	16	28	1.06	0
2	0	0	2	9	1	1	0	1	3	11	14	0.50	0
3	0	0	5	11	1	1	0	2	6	14	20	0.68	0
合計	0	3	43	93	19	47	9	23	71	166	237	9.81	2

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

豊中市　リサイクル券搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	2	0	2	1	1	1	0	2	5	7	0.33
5	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	4	0.12
6	0	0	0	2	0	2	1	1	1	5	6	0.26
7	1	1	1	1	2	0	1	1	5	3	8	0.36
8	1	0	2	1	2	1	2	0	7	2	9	0.41
9	1	0	0	2	0	5	2	2	3	9	12	0.58
10	0	1	1	2	0	1	1	0	2	4	6	0.24
11	2	2	1	4	0	2	1	1	4	9	13	0.55
12	1	3	1	4	1	1	1	1	4	9	13	0.55
1	0	0	3	3	4	2	3	0	10	5	15	0.69
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0.08
3	0	1	1	2	1	3	2	2	4	8	12	0.54
合計	6	11	11	25	11	18	16	9	44	63	107	4.71

豊中市　総搬入実績

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	3	6	4	3	10	4	3	13	20	33	1.57	1
5	0	0	6	8	1	2	1	1	8	11	19	0.69	0
6	0	0	1	4	1	6	3	3	5	13	18	0.82	1
7	1	1	1	8	5	4	2	4	9	17	26	1.18	0
8	1	0	3	11	6	5	2	3	12	19	31	1.39	0
9	1	0	5	8	1	8	3	3	10	19	29	1.25	0
10	0	1	3	8	0	4	1	1	4	14	18	0.72	0
11	2	2	1	12	1	6	2	4	6	24	30	1.26	0
12	1	4	9	17	2	11	1	4	13	36	49	2.09	0
1	0	1	11	15	7	4	4	1	22	21	43	1.75	0
2	0	1	2	10	1	1	0	1	3	13	16	0.58	0
3	0	1	6	13	2	4	2	4	10	22	32	1.22	0
合計	6	14	54	118	30	65	25	32	115	229	344	14.52	2

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－3. 家電四品目(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン)搬入実績(伊丹市分)

伊丹市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	1	1	4	1	3	2	2	4	10	14	0.60	1
5	1	0	0	2	0	0	1	0	2	2	4	0.14	0
6	1	1	0	0	0	3	0	0	1	4	5	0.31	0
7	0	0	3	2	0	1	0	0	3	3	6	0.22	0
8	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	6	0.34	0
9	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	3	0.19	0
10	0	0	1	1	1	2	1	2	3	5	8	0.36	0
11	0	0	0	2	1	1	0	0	1	3	4	0.20	0
12	0	0	3	8	1	2	0	2	4	12	16	0.60	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0.07	0
2	0	0	4	2	0	0	0	0	4	2	6	0.18	0
3	0	0	1	3	1	0	0	0	2	3	5	0.19	0
合計	2	3	14	25	8	16	4	6	28	50	78	3.40	1

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

伊丹市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.05
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0.10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0.14
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1	3	0.09
合計	0	1	2	0	0	3	0	2	2	6	8	0.38

伊丹市　総搬入実績

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗　濯　機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値(0.05t/台)		換算値(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値(0.03t/台)		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	2	1	4	1	3	2	2	4	11	15	0.65	1
5	1	0	0	2	0	0	1	0	2	2	4	0.14	0
6	1	1	0	0	0	3	0	0	1	4	5	0.31	0
7	0	0	3	2	0	1	0	0	3	3	6	0.22	0
8	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	6	0.34	0
9	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	3	0.19	0
10	0	0	1	1	1	3	1	3	3	7	10	0.46	0
11	0	0	0	2	1	1	0	0	1	3	4	0.20	0
12	0	0	3	8	1	4	0	2	4	14	18	0.74	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0.07	0
2	0	0	4	2	0	0	0	0	4	2	6	0.18	0
3	0	0	3	3	1	0	0	1	4	4	8	0.28	0
合計	2	4	16	25	8	19	4	8	30	56	86	3.78	1

注)粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－4. 家電四品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、エアコン）搬出実績

家電リサイクル　Aグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	3	0	1	0	2	0	7	0	6	13	0.63
5	0	0	0	1	0	7	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	11	0	3	14	0.52
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	0	0	0	1	0	4	0	1	0	4	0	0	0	3	0	0	0	11	0	2	13	0.57
9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0	7	0	4	11	0.61
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	7	0	5	12	0.44
12	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	5	0	5	10	0.46
1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	13	0.43
2	6	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	14	0	0	0	40	0	0	0	40	1.72
3	0	0	0	0	0	6	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	13	0.51
合計	6	0	0	2	10	41	0	14	10	20	0	9	14	9	0	4	40	70	0	29	139	5.89

家電リサイクル　Bグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	1	0	0	0	6	0	3	0	11	0	2	0	2	0	2	0	20	0	7	27	1.35
5	0	0	0	1	0	13	0	6	0	4	0	1	0	1	0	0	0	18	0	8	26	1.00
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	0	0	0	1	0	9	0	0	0	8	0	4	0	5	0	0	0	22	0	5	27	1.31
9	4	0	1	0	11	14	0	3	13	6	4	2	7	4	0	0	35	24	5	5	69	3.17
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	0	0	0	1	0	16	0	1	0	4	0	3	0	1	0	2	0	21	0	7	28	1.14
12	0	0	0	0	0	7	0	5	0	12	0	1	0	5	0	0	0	24	0	6	30	1.42
1	0	1	0	0	0	14	0	5	0	2	0	2	0	1	0	2	0	18	0	9	27	0.99
2	7	0	0	0	15	0	0	0	10	0	3	0	4	0	1	0	36	0	4	0	40	1.86
3	0	1	0	0	0	18	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	0	24	0	3	27	0.99
合計	11	3	1	3	26	97	0	25	23	50	7	16	11	21	1	6	71	171	9	50	301	13.23

家電リサイクル　総搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	1	0	0	0	9	0	4	0	14	0	5	0	3	0	4	0	27	0	13	40	1.98
5	0	0	0	2	0	20	0	7	0	6	0	1	0	3	0	1	0	29	0	11	40	1.52
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	0	0	0	2	0	13	0	1	0	12	0	4	0	8	0	0	0	33	0	7	40	1.88
9	4	0	1	0	11	16	0	5	13	11	4	4	7	4	0	0	35	31	5	9	80	3.78
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	0	0	0	1	0	22	0	3	0	4	0	5	0	2	0	3	0	28	0	12	40	1.58
12	0	0	0	0	0	9	0	8	0	14	0	3	0	6	0	0	0	29	0	11	40	1.88
1	0	1	0	0	0	25	0	5	0	3	0	2	0	2	0	2	0	31	0	9	40	1.42
2	13	0	0	0	25	0	0	0	20	0	3	0	18	0	1	0	76	0	4	0	80	3.58
3	0	1	0	0	0	24	0	6	0	6	0	1	0	2	0	0	0	33	0	7	40	1.50
合計	17	3	1	5	36	138	0	39	33	70	7	25	25	30	1	10	111	241	9	79	440	19.12

3. その他のリサイクル等の状況

3－1. 逆送電力量経年変化

項目 / 年度	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	発電量 DCS B (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 A＋B＝C (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	（売電）取引メータ D (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)
6	4,778,420	545	19,622,129	2,240	24,400,549	2,785	4,884,386	1,682
7	405,851	46	45,085,311	5,133	45,491,162	5,179	21,149,284	2,408
8	361,513	41	41,856,006	4,778	42,217,519	4,819	18,580,353	2,121
9	409,925	47	42,281,716	4,827	42,691,641	4,873	18,380,734	2,098
10	496,744	57	42,571,772	4,860	43,068,516	4,916	17,506,450	1,998
11	323,664	37	43,120,481	4,909	43,444,145	4,946	17,589,645	2,002
12	487,752	56	43,406,606	4,955	43,894,358	5,011	17,593,062	2,008
13	686,469	78	44,004,813	5,023	44,691,282	5,102	15,685,688	1,791
14	900,856	103	43,473,907	4,963	44,374,763	5,066	14,760,644	1,685
15	784,492	89	42,625,080	4,853	43,409,572	4,942	12,714,266	1,447
16	597,960	68	42,369,054	4,837	42,967,014	4,905	14,180,628	1,619
17	619,240	71	41,533,755	4,741	42,152,995	4,812	13,785,531	1,574
18	729,890	83	41,194,963	4,703	41,924,853	4,786	13,610,873	1,554
19	621,150	71	38,402,326	4,384	39,023,476	4,455	11,781,284	1,345
20	949,300	108	36,223,331	4,135	37,172,631	4,243	10,769,322	1,229

※平成6年度の12月より売電実施。6年度の逆送電力量の暦日は121日。

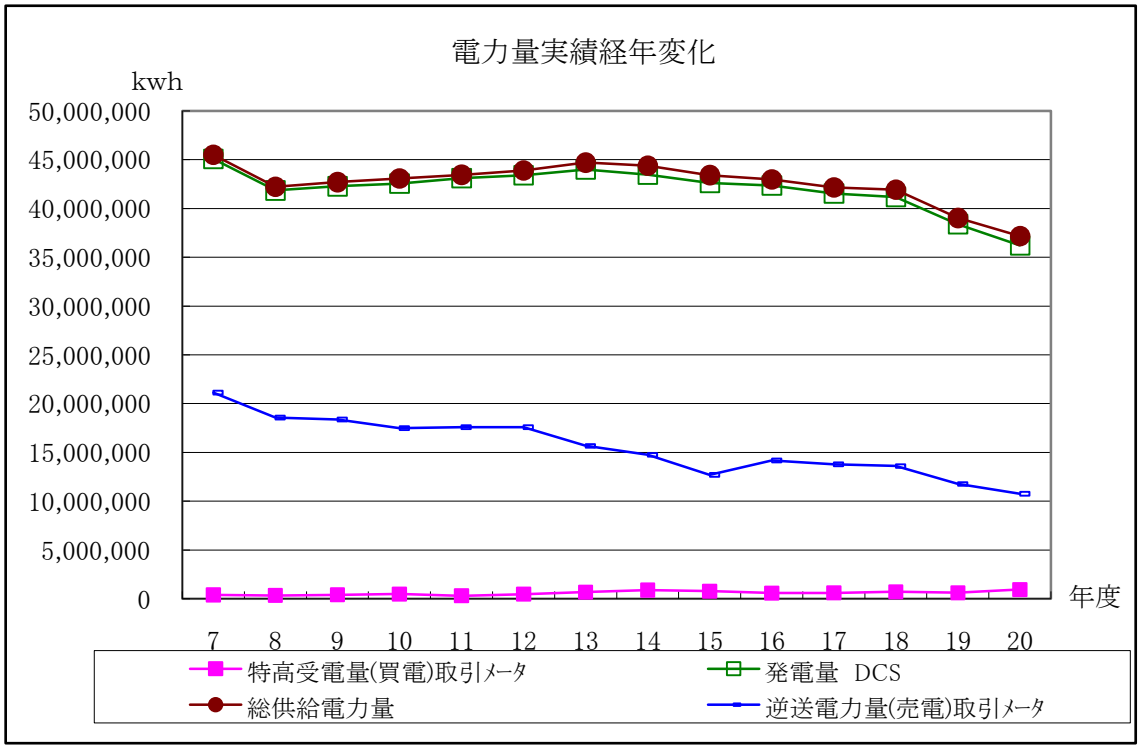

3－2. 搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績

区分 月別	申込件数(件)	薪リサイクル量(kg)
4	2	50
5	3	80
6	8	410
7	5	280
8	0	0
9	1	50
10	4	240
11	9	450
12	6	230
1	2	90
2	0	0
3	0	0
計	40	1,880
月平均	3	157

3－3. 古紙類の資源化実績

区分 月別	新聞(kg)	雑誌(kg)	ダンボール(kg)	合計(kg)	前年度合計(kg)	前年比(%)
4	410	4,920	3,280	8,610	6,500	132.5
5	420	1,550	1,960	3,930	8,460	46.5
6	730	1,810	1,810	4,350	5,610	77.5
7	910	1,780	2,350	5,040	3,700	136.2
8	540	2,230	2,250	5,020	7,020	71.5
9	440	2,180	2,200	4,820	4,190	115.0
10	830	3,040	2,890	6,760	4,950	136.6
11	1,110	5,960	2,520	9,590	4,210	227.8
12	780	7,210	3,460	11,450	6,120	187.1
1	450	3,300	1,890	5,640	5,800	97.2
2	380	2,980	2,230	5,590	4,420	126.5
3	1,260	5,490	3,500	10,250	5,520	185.7
計	8,260	42,450	30,340	81,050	66,500	121.9
月平均	688	3,538	2,528	6,754	5,542	

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況

1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況

[歳入]

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（%）	残額（円）
分担金及び負担金	561,541,000	561,541,000	100.0	0
豊中市負担金	327,912,000	327,912,000	100.0	0
伊丹市負担金	233,629,000	233,629,000	100.0	0
使用料及び手数料	97,030,000	80,199,180	82.7	△ 16,830,820
余熱利用施設使用料	95,070,000	78,235,220	82.3	△ 16,834,780
総務管理使用料	1,960,000	1,963,960	100.2	3,960
繰越金	1,000	12,416,225	1,241,622.5	12,415,225
諸収入	6,146,000	7,418,314	120.7	1,272,314
組合預金利子	10,000	559,413	5594.1	549,413
雑入	6,136,000	6,858,901	111.8	722,901
組合債	0	0	0.0	0
歳入合計	664,718,000	661,574,719	99.5	△ 3,143,281

[歳出]

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（%）	残額（円）
議会費	2,162,000	2,007,431	92.9	154,569
議会費	2,162,000	2,007,431	92.9	154,569
議会費	2,162,000	2,007,431	92.9	154,569
報酬	1,053,000	1,038,000	98.6	15,000
職員手当等	333,000	310,200	93.2	22,800
旅費	715,000	636,110	89.0	78,890
交際費	30,000	0	0.0	30,000
需用費	7,879	0	0.0	7,879
役務費	2,121	2,121	100.0	0
使用料及び賃借料	21,000	21,000	100.0	0
総務費	319,877,000	313,116,595	97.9	6,760,405
総務管理費	152,527,000	147,596,823	96.8	4,930,177
一般管理費	144,972,000	141,521,487	97.6	3,450,513
報酬	969,736	900,000	92.8	69,736
給料	61,679,000	60,246,021	97.7	1,432,979
職員手当等	49,676,264	49,676,264	100.0	0
共済費	18,529,000	18,452,363	99.6	76,637
賃金	1,761,250	1,761,250	100.0	0
旅費	443,000	223,730	50.5	219,270
交際費	50,000	0	0.0	50,000
需用費	708,750	455,763	64.3	252,987
役務費	1,631,935	1,631,935	100.0	0
委託料	3,128,781	2,755,148	88.1	373,633
使用料及び賃借料	5,167,284	5,160,494	99.9	6,790
備品購入費	849,000	0	0.0	849,000
負担金補助及び交付金	378,000	258,519	68.4	119,481
公課費	0	0	－	0
総務管理退職負担金	7,555,000	6,075,336	80.4	1,479,664
負担金補助及び交付金	7,555,000	6,075,336	80.4	1,479,664

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（%）	残額（円）
監査委員費	26,000	24,000	92.3	2,000
公平委員会費	39,000	36,000	92.3	3,000
余熱利用施設費	167,285,000	165,459,772	98.9	1,825,228
管理費	167,285,000	165,459,772	98.9	1,825,228
報酬	0	0	0.0	0
給料	10,301,000	10,300,800	99.9	200
職員手当等	4,139,000	3,800,442	91.8	338,558
共済費	2,074,000	1,905,880	91.9	168,120
賃金	0	0	－	0
需用費	40,300,000	39,554,707	98.2	745,293
役務費	1,678,000	1,639,009	97.7	38,991
委託料	100,796,000	100,414,900	99.6	381,100
使用料及び賃借料	7,997,000	7,844,034	98.1	152,966
余熱利用施設整備費	0	0	－	0
工事請負費	0	0	－	0
余熱利用施設退職負担金	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0
公債費	342,579,000	330,892,400	96.6	11,686,600
公債費	342,579,000	330,892,400	96.6	11,686,600
元金	307,480,000	307,479,929	99.9	71
利子	35,099,000	23,412,471	66.7	11,686,529
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	664,718,000	646,016,426	97.2	18,701,574

［歳入歳出差引額　　15,558,293 円］

1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（%）	残額（円）
分担金及び負担金	2,953,991,000	2,953,991,000	100.0	0
豊中市負担金	1,966,324,000	1,966,324,000	100.0	0
伊丹市負担金	987,667,000	987,667,000	100.0	0
使用料及び手数料	452,284,000	415,208,120	91.8	△ 37,075,880
国庫支出金	22,605,000	20,084,000	88.8	△ 2,521,000
財産収入	203,103,000	153,991,883	75.8	△ 49,111,117
繰越金	91,606,000	174,315,203	190.3	82,709,203
諸収入	116,078,000	91,266,248	78.6	△ 24,811,752
売電収入	91,188,000	78,802,395	86.4	△ 12,385,605
雑入	24,890,000	12,463,853	50.1	△ 12,426,147
組合債	52,900,000	45,400,000	85.8	△ 7,500,000
一般廃棄物処理事業債	52,900,000	45,400,000	85.8	△ 7,500,000
ごみ処理施設整備債	0	0	－	0
歳入合計	3,892,567,000	3,854,256,454	99.0	△ 38,310,546

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	2,846,117,000	2,662,092,114	93.5	184,024,886
ごみ処理施設費	2,312,404,000	2,172,257,059	93.9	140,146,941
管理費	2,003,136,000	1,932,179,682	96.5	70,956,318
報酬	9,113,000	7,431,294	81.5	1,681,706
給料	418,439,000	399,815,142	95.5	18,623,858
職員手当等	362,876,000	351,097,152	96.8	11,778,848
共済費	125,510,000	122,946,292	98.0	2,563,708
賃金	17,555,601	17,555,601	100.0	0
報償費	219,000	12,980	5.9	206,020
旅費	1,933,000	1,102,110	57.0	830,890
需用費	771,054,000	759,603,560	98.5	11,450,440
消耗品費	198,183,095	195,282,115	98.5	2,900,980
燃料費	6,040,268	6,040,268	100.0	0
食糧費	68,000	45,360	66.7	22,640
印刷製本費	256,000	163,243	63.8	92,757
光熱水費	91,310,000	88,637,769	97.1	2,672,231
修繕料	475,196,637	469,434,805	98.8	5,761,832
役務費	10,470,000	8,768,731	83.8	1,701,269
委託料	244,463,399	228,865,143	93.6	15,598,256
灰最終処分委託料	136,479,399	135,375,240	99.2	1,104,159
灰搬送委託料	56,436,000	52,291,780	92.7	4,144,220
その他	51,548,000	41,198,123	79.9	10,349,877
使用料及び賃借料	33,067,000	28,563,593	86.4	4,503,407
工事請負費	2,058,000	2,058,000	100.0	0
原材料費	160,000	154,160	96.4	5,840
備品購入費	2,271,000	877,180	38.6	1,393,820
負担金補助及び交付金	3,711,200	3,093,544	83.4	617,656
補償補填及び賠償金	58,800	58,800	100.0	0
公課費	177,000	176,400	99.7	600
ごみ処理施設退職負担金	132,202,000	98,496,547	74.5	33,705,453
負担金補助及び交付金	132,202,000	98,496,547	74.5	33,705,453
ごみ処理整備費	58,982,000	50,576,000	85.7	8,406,000
負担金補助及び交付金	58,982,000	50,576,000	85.7	8,406,000
ごみ処理施設整備費	0	0	－	0
工事請負費	0	0	－	0
新ごみ処理施設整備費	118,084,000	91,004,830	77.1	27,079,170
報償費	2,208,000	1,146,600	51.9	1,061,400
旅費	232,650	232,650	100.0	0
需用費	128,000	19,520	15.3	108,480
役務費	90,000	23,050	25.6	66,950
委託料	87,356,350	75,917,100	86.9	11,439,250
使用料及び賃借料	602,000	593,410	98.6	8,590
工事請負費	27,447,000	13,072,500	47.6	14,374,500
備品購入費	20,000	0	0.0	20,000

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（%）	残額（円）
粗大ごみ処理施設費	533,713,000	489,835,055	91.8	43,877,945
管理費	503,077,000	474,523,965	94.3	28,553,035
報酬	9,680,122	9,680,122	100.0	0
給料	47,378,880	47,378,880	100.0	0
職員手当等	40,528,000	39,471,987	97.4	1,056,013
共済費	15,032,998	14,961,696	99.5	71,302
賃金	0	0	－	0
旅費	87,000	77,180	88.7	9,820
需用費	204,850,000	189,546,655	92.5	15,303,345
消耗品費	24,711,976	20,709,974	83.8	4,002,002
燃料費	573,024	573,024	100.0	0
印刷製本費	53,000	24,675	46.6	28,325
光熱水費	19,890,636	19,890,636	100.0	0
修繕料	159,621,364	148,348,346	92.9	11,273,018
役務費	2,515,144	2,515,144	100.0	0
委託料	175,493,747	163,887,588	93.4	11,606,159
不燃物処分委託料	6,720,000	4,887,564	72.7	1,832,436
不燃物最終処分委託料	30,845,000	28,984,830	94.0	1,860,170
不燃物搬送委託料	14,466,000	13,166,622	91.0	1,299,378
諸委託料	116,999,000	112,027,865	95.8	4,971,135
その他	6,463,747	4,820,707	74.6	1,643,040
使用料及び賃借料	1,551,109	1,439,748	92.8	111,361
原材料費	118,000	77,542	65.7	40,458
備品購入費	75,000	49,140	65.5	25,860
負担金補助及び交付金	5,641,000	5,312,283	94.2	328,717
公課費	126,000	126,000	100.0	0
粗大ごみ処理施設退職負担金	30,636,000	15,311,090	50.0	15,324,910
負担金補助及び交付金	30,636,000	15,311,090	50.0	15,324,910
粗大ごみ処理施設整備費	0	0	－	0
工事請負費	0	0	－	0
備品購入費	0	0	－	0
公債費	1,046,350,000	1,045,607,907	99.9	742,093
公債費	1,046,350,000	1,045,607,907	99.9	742,093
元金	991,298,000	991,297,073	99.9	927
利子	55,052,000	54,310,834	98.7	741,166
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	3,892,567,000	3,707,700,021	95.3	184,866,979

［歳入歳出差引額 146,556,433円］

2. 歳入歳出決算の状況

2－1. 共通経費勘定

[歳入]

項目＼年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	561,541,000	502,144,000	111.8	59,397,000
豊中市負担金	327,912,000	293,227,000	111.8	34,685,000
伊丹市負担金	233,629,000	208,917,000	111.8	24,712,000
使用料及び手数料	80,199,180	83,444,440	96.1	△ 3,245,260
余熱利用施設使用料	78,235,220	81,480,480	96.0	△ 3,245,260
総務管理使用料	1,963,960	1,963,960	100.0	0
繰越金	12,416,225	7,737,322	160.5	4,678,903
諸収入	7,418,314	6,830,713	108.6	587,601
組合預金利子	559,413	258,678	216.3	300,735
雑入	6,858,901	6,572,035	104.4	286,866
組合債	0	1,331,000,000	皆減	△ 1,331,000,000
歳入合計	661,574,719	1,931,156,475	34.3	△ 1,269,581,756

[歳出]

項目＼年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
議会費	2,007,431	1,271,900	157.8	735,531
議会費	2,007,431	1,271,900	157.8	735,531
議会費	2,007,431	1,271,900	157.8	735,531
報酬	1,038,000	955,000	108.7	83,000
職員手当等	310,200	315,900	98.2	△ 5,700
旅費	636,110	0	皆増	636,110
交際費	0	0	－	0
需用費	0	0	－	0
役務費	2,121	0	皆増	2,121
使用料及び賃借料	21,000	1,000	2,100.0	20,000
総務費	313,116,595	338,215,396	92.6	△ 25,098,801
総務管理費	147,596,823	174,346,627	84.7	△ 26,749,804
一般管理費	141,521,487	141,812,127	99.8	△ 290,640
報酬	900,000	1,065,600	84.5	△ 165,600
給料	60,246,021	62,212,174	96.8	△ 1,966,153
職員手当等	49,676,264	49,578,260	100.2	98,004
共済費	18,452,363	18,699,837	98.7	△ 247,474
賃金	1,761,250	0	皆増	1,761,250
旅費	223,730	72,990	306.5	150,740
交際費	0	0	－	0
需用費	455,763	498,006	91.5	△ 42,243
役務費	1,631,935	1,505,514	108.4	126,421
委託料	2,755,148	2,247,459	122.6	507,689
使用料及び賃借料	5,160,494	5,923,487	87.1	△ 762,993

項目 ＼ 年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	258,519	0	皆増	258,519
公課費	0	8,800	皆減	△ 8,800
総務管理退職負担金	6,075,336	32,534,500	18.7	△ 26,459,164
負担金補助及び交付金	6,075,336	32,534,500	18.7	△ 26,459,164
監査委員費	24,000	22,000	109.1	2,000
公平委員会費	36,000	36,000	100.0	0
余熱利用施設費	165,459,772	163,810,769	101.0	1,649,003
管理費	165,459,772	162,183,269	102.0	3,276,503
報酬	0	2,438,400	皆減	△ 2,438,400
給料	10,300,800	6,159,876	167.2	4,140,924
職員手当等	3,800,442	2,225,664	170.8	1,574,778
共済費	1,905,880	1,943,599	98.1	△ 37,719
賃金	0	2,555,100	皆減	△ 2,555,100
需用費	39,554,707	38,762,974	102.0	791,733
役務費	1,639,009	1,999,334	82.0	△ 360,325
委託料	100,414,900	95,019,040	105.7	5,395,860
使用料及び賃借料	7,844,034	11,079,282	70.8	△ 3,235,248
余熱利用施設整備費	0	1,627,500	皆減	△ 1,627,500
工事請負費	0	1,627,500	皆減	△ 1,627,500
余熱利用施設退職負担金	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0
公債費	330,892,400	1,579,252,954	21.0	△ 1,248,360,554
公債費	330,892,400	1,579,252,954	21.0	△ 1,248,360,554
元金	307,479,929	1,544,910,399	19.9	△ 1,237,430,470
償還金利子及び割引料	307,479,929	1,544,910,399	19.9	△ 1,237,430,470
利子	23,412,471	34,342,555	68.2	△ 10,930,084
償還金利子及び割引料	23,412,471	34,342,555	68.2	△ 10,930,084
歳出合計	646,016,426	1,918,740,250	33.7	△ 1,272,723,824

２－2.ごみ処理施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	2,953,991,000	3,257,828,000	90.7	△ 303,837,000
豊中市負担金	1,966,324,000	2,147,071,000	91.6	△ 180,747,000
伊丹市負担金	987,667,000	1,110,757,000	88.9	△ 123,090,000
使用料及び手数料	415,208,120	395,661,526	104.9	19,546,594
国庫支出金	20,084,000	8,680,000	231.4	11,404,000
財産収入	153,991,883	177,221,945	86.9	△ 23,230,062
繰越金	174,315,203	195,652,554	89.1	△ 21,337,351
諸収入	91,266,248	87,328,560	104.5	3,937,688
売電収入	78,802,395	84,193,026	93.6	△ 5,390,631
雑入	12,463,853	3,135,534	397.5	9,328,319
組合債	45,400,000	113,500,000	40.0	△ 68,100,000
一般廃棄物処理事業債	45,400,000	68,400,000	66.4	△ 23,000,000
ごみ処理施設整備債	0	45,100,000	皆減	△ 45,100,000
歳入合計	3,854,256,454	4,235,872,585	91.0	△ 381,616,131

[歳出]

項目＼年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	2,662,092,114	2,883,065,351	92.3	△ 220,973,237
ごみ処理施設費	2,172,257,059	2,322,856,899	93.5	△ 150,599,840
管理費	1,932,179,682	2,013,723,060	96.0	△ 81,543,378
報酬	7,431,294	8,032,665	92.5	△ 601,371
給料	399,815,142	415,918,547	96.1	△ 16,103,405
職員手当等	351,097,152	367,070,979	95.6	△ 15,973,827
共済費	122,946,292	130,616,184	94.1	△ 7,669,892
賃金	17,555,601	20,463,279	85.8	△ 2,907,678
報償費	12,980	508,670	2.6	△ 495,690
旅費	1,102,110	322,770	341.5	779,340
需用費	759,603,560	774,758,634	98.0	△ 15,155,074
消耗品費	195,282,115	201,936,984	96.7	△ 6,654,869
燃料費	6,040,268	6,588,209	91.7	△ 547,941
食糧費	45,360	37,800	120.0	7,560
印刷製本費	163,243	221,665	73.6	△ 58,422
光熱水費	88,637,769	90,110,149	98.4	△ 1,472,380
修繕料	469,434,805	475,863,827	98.6	△ 6,429,022

項目 ＼ 年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
役務費	8,768,731	8,323,842	105.3	444,889
委託料	228,865,143	223,553,832	102.4	5,311,311
灰最終処分委託料	135,375,240	140,900,760	96.1	△ 5,525,520
灰搬送委託料	52,291,780	54,589,982	95.8	△ 2,298,202
その他	41,198,123	28,063,090	146.8	13,135,033
使用料及び賃借料	28,563,593	28,598,814	99.9	△ 35,221
工事請負費	2,058,000	30,727,830	6.7	△ 28,669,830
原材料費	154,160	38,062	405.0	116,098
備品購入費	877,180	1,327,997	66.1	△ 450,817
負担金補助及び交付金	3,093,544	3,020,870	102.4	72,674
補償補填及び賠償金	58,800	287,685	20.4	△ 228,885
公課費	176,400	152,400	115.7	24,000
ごみ処理施設退職負担金	98,496,547	107,019,098	92.0	△ 8,522,551
負担金補助及び交付金	98,496,547	107,019,098	92.0	△ 8,522,551
ごみ処理整備費	50,576,000	76,331,000	66.3	△ 25,755,000
負担金補助及び交付金	50,576,000	76,331,000	66.3	△ 25,755,000
ごみ処理施設整備費	0	60,304,000	皆減	△ 60,304,000
職員手当等	0	0	－	0
報償費	0	0	－	0
旅費	0	0	－	0
需用費	0	0	－	0
役務費	0	0	－	0
委託料	0	0	－	0
使用料及び賃借料	0	0	－	0
工事請負費	0	60,304,000	皆減	△ 60,304,000
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0
新ごみ処理施設整備費	91,004,830	65,479,741	139.0	25,525,089
報償費	1,146,600	1,035,500	110.7	111,100
旅費	232,650	0	皆増	232,650
需用費	19,520	20,352	95.9	△ 832
役務費	23,050	72,260	31.9	△ 49,210
委託料	75,917,100	64,070,769	118.5	11,846,331
使用料及び賃借料	593,410	280,860	211.3	312,550
工事請負費	13,072,500	0	皆増	13,072,500
備品購入費	0	0	－	0

項目 ＼ 年度	平成20年度 決算額（円）	平成19年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
粗大ごみ処理施設費	489,835,055	560,208,452	87.4	△ 70,373,397
管理費	474,523,965	478,003,595	99.3	△ 3,479,630
報酬	9,680,122	5,016,006	193.0	4,664,116
給料	47,378,880	49,343,340	96.0	△ 1,964,460
職員手当等	39,471,987	44,159,080	89.4	△ 4,687,093
共済費	14,961,696	16,733,508	89.4	△ 1,771,812
賃金	0	6,940,861	皆減	△ 6,940,861
旅費	77,180	32,920	234.4	44,260
需用費	189,546,655	195,913,420	96.8	△ 6,366,765
消耗品費	20,709,974	7,539,507	274.7	13,170,467
燃料費	573,024	868,910	65.9	△ 295,886
印刷製本費	24,675	0	皆増	24,675
光熱水費	19,890,636	19,393,008	102.6	497,628
修繕料	148,348,346	168,111,995	88.2	△ 19,763,649
役務費	2,515,144	2,574,694	97.7	△ 59,550
委託料	163,887,588	150,827,879	108.7	13,059,709
不燃物処分委託料	4,887,564	4,445,264	109.9	442,300
不燃物最終処分委託料	28,984,830	29,506,470	98.2	△ 521,640
不燃物搬送委託料	13,166,622	13,125,798	100.3	40,824
諸委託料	112,027,865	99,701,012	112.4	12,326,853
その他	4,820,707	4,049,335	119.0	771,372
使用料及び賃借料	1,439,748	1,439,053	99.9	695
原材料費	77,542	38,981	198.9	38,561
備品購入費	49,140	55,650	88.3	△ 6,510
負担金補助及び交付金	5,312,283	4,663,603	113.9	648,680
公課費	126,000	264,600	47.6	△ 138,600
粗大ごみ処理施設退職金	15,311,090	82,204,857	18.6	△ 66,893,767
負担金補助及び交付金	15,311,090	82,204,857	18.6	△ 66,893,767
粗大ごみ処理施設整備費	0	0	－	0
工事請負費	0	0	－	0
備品購入費	0	0	－	0
公債費	1,045,607,907	1,178,492,031	88.7	△ 132,884,124
公債費	1,045,607,907	1,178,492,031	88.7	△ 132,884,124
元金	991,297,073	1,089,501,921	91.0	△ 98,204,848
償還金利子及び割引料	991,297,073	1,089,501,921	91.0	△ 98,204,848
利子	54,310,834	88,990,110	61.0	△ 34,679,276
償還金利子及び割引料	54,310,834	88,990,110	61.0	△ 34,679,276
歳出合計	3,707,700,021	4,061,557,382	91.3	△ 353,857,361

VI. その他

1. 啓発活動の状況

1－1. 施設見学者実績

区分 / 月別	小・中学校		自治会・市民等		他市等		その他		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	3	218	1	21	0	0	0	0	4	239
5	27	1,960	1	7	0	0	0	0	28	1,967
6	28	1,938	0	0	0	0	3	13	31	1,951
7	16	1,087	3	63	0	0	1	6	20	1,156
8	0	0	5	155	0	0	2	30	7	185
9	3	170	3	50	0	0	0	0	6	220
10	4	350	2	14	1	35	0	0	7	399
11	1	25	4	71	0	0	0	0	5	96
12	0	0	2	38	0	0	0	0	2	38
1	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3
2	0	0	2	32	0	0	4	35	6	67
3	0	0	6	161	0	0	0	0	6	161
計	82	5,748	29	612	2	38	10	84	123	6,482
月平均	7	479	2	51	0	3	1	7	10	540

※「自治会・市民等」は、老人クラブ・婦人会・PTA・個人見学者等、「その他」は、両市議会議員・職員・両市内の企業等の見学者である。小学校の見学の下見は含まない。

1－2. 体験学習受入れの実績

実施日	団体名	日数	人数	内容	備考
5月19日～23日	伊丹市立北中学校	5	2	○保全業務作業 ○ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾔｰﾄﾞ作業 ○粗大業務 ○ｸﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ作業 ○薪割り作業	トライやるウイーク
5月26日～30日	伊丹市立天王寺川中学校	5	5		トライやるウイーク
7月8日～10日	豊中市立第11中学校	3	6		CUL地域体験
10月21日～23日	豊中市立第4中学校	3	3		CUL地域体験
10月28日～30日	豊中市立第3中学校	3	4		CUL地域体験
10月28日～30日	豊中市立第6中学校	3	2		CUL地域体験
11月11日～13日	豊中市立第2中学校	3	2		CUL地域体験
11月11日～13日	豊中市立第15中学校	3	2		CUL地域体験
11月18日～20日	豊中市立第10中学校	3	6		CUL地域体験
計 9 校	延べ日数	31	日	人数計	32 人

1－3. 出前講座の実績

実施日	事業名 テーマ	会場	人数	主催
5月23日	クリーンランドってどんなところ？	豊中市立上野小学校	173	クリーンランド NPO花と緑のネットワーク
12月3日	わたしたちが暮らす街をいつまでもきれいな街にするために	豊中市立第2中学校	466	クリーンランド
計	2 件		639 人	

1－4. イベント等の実績

実施日	事業名 目的	内容	人数	主催
8月3・4日	豊中まつり2008 PR活動を展開し、市民との協働イベントをとおして、持続可能な地域社会づくりをめざしていくことを目的とした。	ごみ分別輪投げ チラシ配布 パネル展示	来店者 1,100人	豊中まつり実行委員会
10月12日	第3回クリーンランドフェスティバル 「3R考えるから実践へ～もったいないをひろげよう！～」をテーマにクリーンランドから3R推進を発信することを目的とした。	ごみ分別輪投げ、パネル展示、リユースコーナー、施設見学会、紙芝居、ガレージセール	来場者 996人	クリーンランドフェスティバル実行委員会
10月18日	第3回とよっぴーまつり 市民との協働をとおして、「クリーンランドのPR」を推進することを目的とした。	ごみ分別輪投げ	来店者 280人	NPO花と緑のネットワーク
12月12・13日	とよなか市民環境展2008 パネル内容を一新し、クリーンランドでの市民協働の取組をPRすることを目的とした。	パネル展示		NPOとよなか市民環境会議アジェンダ21

1－5. 搬入ごみ検査状況

検査日	検査結果	処置
6月19日 9月19日 12月24日 3月6日	検査対象を両市許可業者の全社とすることを目標に4回／年実施した。搬入物の内容では、可燃物の中にダンボール等の資源化物の混入が多く見受けられた。	鉄類やプラスチック類の産業廃棄物は、持ち帰らせ適正な処理をするよう指導をした。排出先の特定ができた不適正搬入物においては、両市を通じて指導・啓発へとつなげてく。

2. 余熱利用施設（クリーンスポーツランド）利用者の状況

2－1. 施設利用者実績

月	大人					小人				高齢者			
	一回使用	回数券	定期券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計
4	1,462	479	2,599	0	4,540	636	67	0	703	213	698	0	911
5	2,545	642	3,209	0	6,396	1,271	153	0	1,424	312	951	0	1,263
6	2,974	629	3,154	0	6,757	1,457	197	0	1,654	301	986	0	1,287
7	4,109	659	3,072	0	7,840	2,519	215	0	2,734	411	1,002	0	1,413
8	6,394	871	3,093	0	10,358	4,223	261	0	4,484	712	971	0	1,683
9	2,545	641	3,256	0	6,442	851	197	0	1,048	326	1,018	0	1,344
10	1,825	508	3,095	0	5,428	421	190	0	611	252	990	0	1,242
11	1,636	487	2,795	0	4,918	468	180	0	648	225	878	0	1,103
12	1,289	409	2,647	0	4,345	315	97	0	412	173	836	0	1,009
1	1,442	433	2,481	0	4,356	404	128	0	532	179	777	0	956
2	1,641	442	2,830	0	4,913	492	117	0	609	192	891	0	1,083
3	1,744	462	3,198	0	5,404	617	113	0	730	219	998	0	1,217
計	29,606	6,662	35,429	0	71,697	13,674	1,915	0	15,589	3,515	10,996	0	14,511

月	障害者大人			障害者小人			幼児	介助者	合計
	一回使用	回数券	計	一回使用	回数券	計			
4	75	114	189	26	3	29	439	168	6,979
5	76	142	218	41	4	45	808	210	10,364
6	102	165	267	31	5	36	916	248	11,165
7	125	161	286	44	9	53	1,558	273	14,157
8	134	156	290	65	26	91	2,753	328	19,987
9	96	155	251	51	8	59	926	282	10,352
10	70	165	235	30	8	38	640	224	8,418
11	84	138	222	34	9	43	608	209	7,751
12	62	108	170	18	6	24	459	131	6,550
1	64	106	170	20	6	26	452	133	6,625
2	62	120	182	8	5	13	542	163	7,505
3	63	151	214	29	5	34	654	197	8,450
計	1,013	1,681	2,694	397	94	491	10,755	2,566	118,303

2－2. 年間の利用者の割合

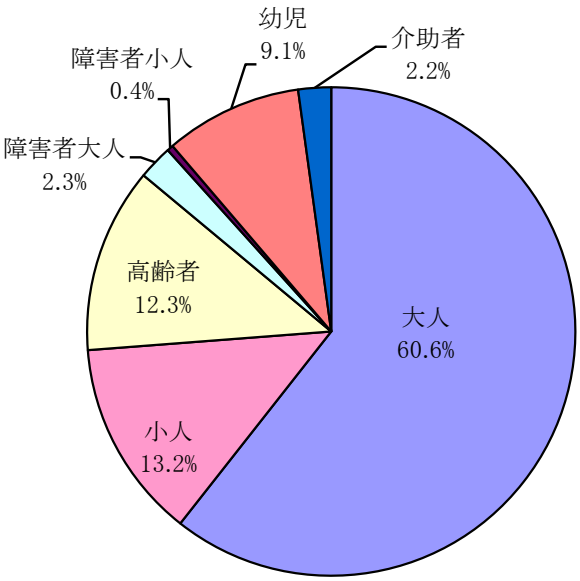

2－3. 施設利用状況の経年変化

年	大人		小人		高齢者		障害者大人		障害者小人		幼児		介助者		合計	
		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数
10	87,524	100.0	16,145	100.0	5,716	100.0	1,122	100.0	196	100.0	10,873	100.0	659	100.0	122,235	100.0
11	107,470	122.8	15,624	96.8	8,726	152.7	1,903	169.6	261	133.2	11,212	103.1	1,083	164.3	146,279	119.7
12	100,149	114.4	13,657	84.6	10,275	179.8	1,802	160.6	170	86.7	10,141	93.3	1,114	169.0	137,308	112.3
13	96,297	110.0	14,227	88.1	10,194	178.3	1,729	154.1	170	86.7	10,310	94.8	1,118	169.7	134,045	109.7
14	95,243	108.8	15,101	93.5	11,206	196.0	2,370	211.2	149	76.0	11,907	109.5	1,462	221.9	137,438	112.4
15	94,700	108.2	16,350	101.3	12,395	216.8	2,815	250.9	341	174.0	11,769	108.2	2,065	313.4	140,435	114.9
16	91,233	104.2	14,726	91.2	11,235	196.6	2,934	261.5	433	220.9	10,203	93.8	2,341	355.2	133,105	108.9
17	84,270	96.3	14,228	88.1	11,325	198.1	2,939	261.9	643	328.1	8,501	78.2	2,719	412.6	124,625	102.0
18	81,394	93.0	13,760	85.2	13,587	237.7	2,921	260.3	621	316.8	8,182	75.3	2,805	425.6	123,270	100.8
19	76,085	86.9	14,587	90.3	13,588	237.7	2,826	251.9	630	321.4	9,939	91.4	2,807	425.9	120,462	98.5
20	71,697	81.9	15,589	96.6	14,511	253.9	2,694	240.1	491	250.5	10,755	98.9	2,566	389.4	118,303	96.8

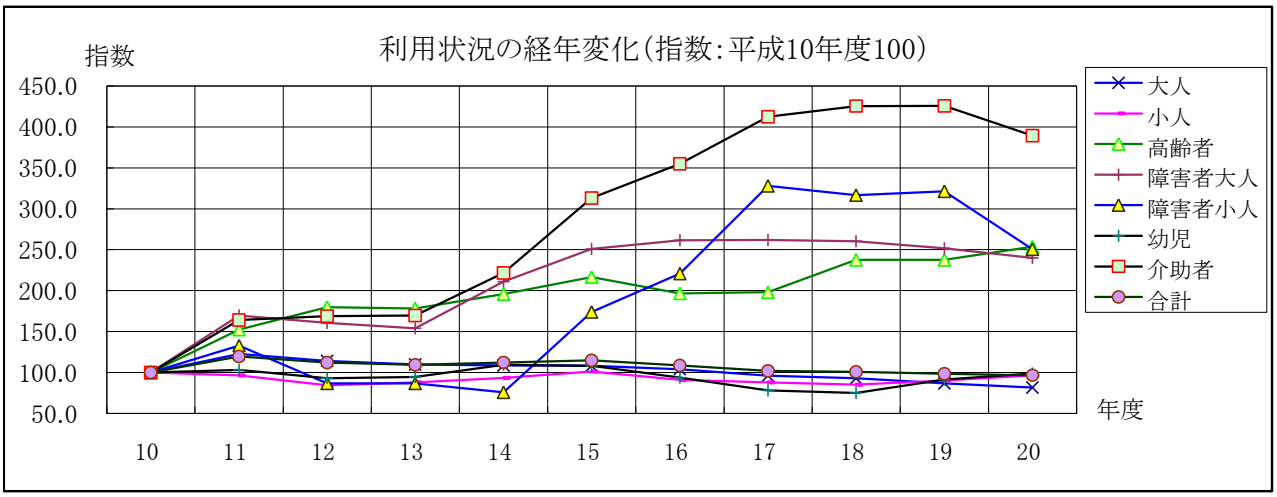

3. 組織及び職員数

3－1. 組織図(平成21年4月1日現在)

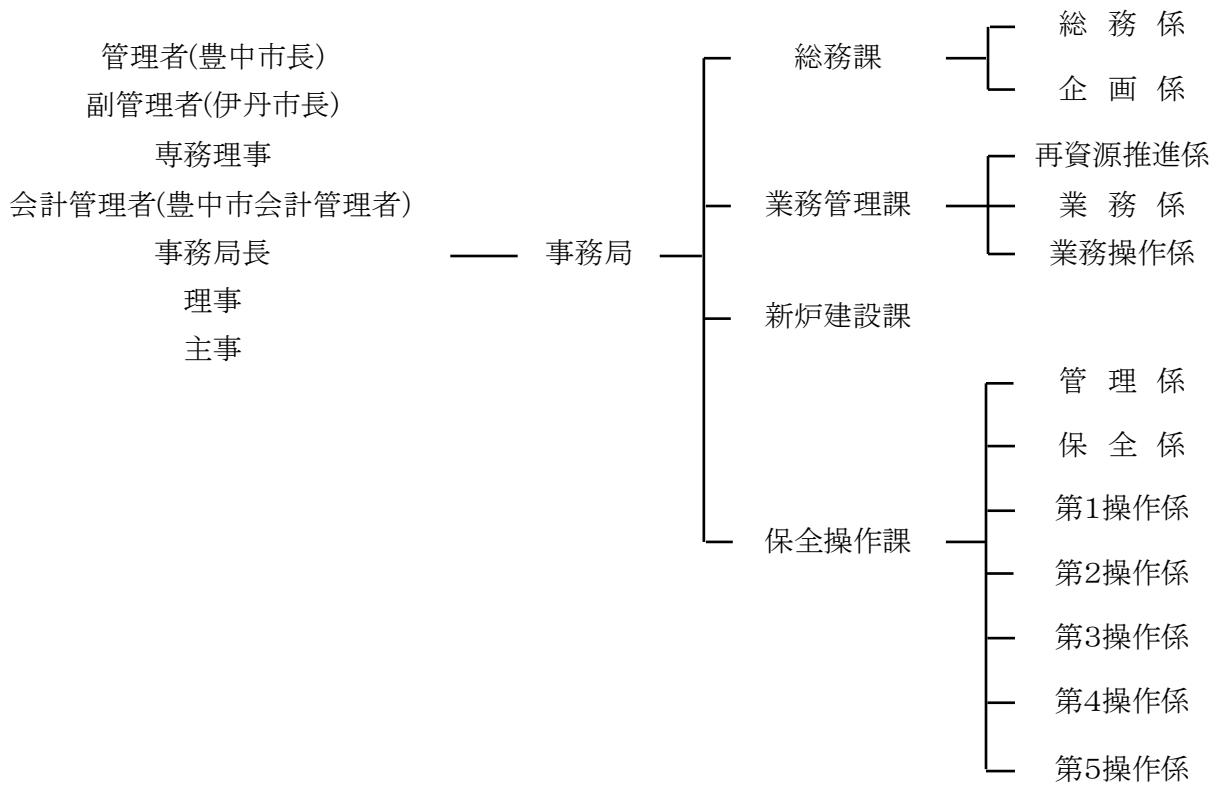

3－2. 職種別人員配置(平成21年4月1日現在)

単位(人)

	事務職員	技術職員	技能職員	計	再任用	任期付	嘱託他	計
総務課	7	5	1	13	5	0	1	19
総務係	5	3	1	9			1	10
企画係	2	2		4	5			9
業務管理課	3	5	5	13	3	2	15	33
再資源推進係	3	1	3	7			9	16
業務係		1		1	3		5	9
業務操作係		3	2	5		2	1	8
新炉建設課	2	6	1	9	0	0	1	10
保全操作課	1	39	34	74	2	0	3	79
管理係	1	6	1	8				8
保全係		8	6	14			2	16
第1操作係		5	5	10			1	11
第2操作係		5	5	10	1			11
第3操作係		4	6	10	1			11
第4操作係		6	5	11				11
第5操作係		5	6	11				11
合計	13	55	41	109	10	2	20	141

平成20年度(2008年度)ごみ処理事業年報

平成21年(2009年)9月発行

豊中市伊丹市クリーンランド
〒561-0806　豊中市原田西町２－１
TEL　06-6841-5395

編集　　総務課　企画係

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
