平成21年度（2009年度）

ごみ処理事業年報

豊中市伊丹市クリーンランド

目　　次

Ⅰ. 総括

1. 一般廃棄物処理実績フロー図
1－1. 一般廃棄物処理実績フロー図 …… 3
1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉) …… 4
1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート …… 5

2. ごみ搬入量
2－1. ごみ搬入量実績(総括) …… 6
2－2. 月別ごみ搬入量実績(両市合計) …… 8
2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分) …… 12
2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分) …… 16

3. ごみ搬入量の経年変化
3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化 …… 20
3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 22
3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23
3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23

4. ごみ質
4－1. 可燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 24
4－2. 可燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 24
4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 25
4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・DRY基準) …… 25
4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準) …… 26
4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準) …… 26
4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量 …… 27
4－8. ごみの三成分(可燃分・灰分・水分)の経年変化(%) …… 27
4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ/Kg) …… 27
4－10. 不燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 28
4－11. 不燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 28
4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 29

Ⅱ. ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化
1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化 …… 32
1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化 …… 33

2. 焼却関係
2－1. 焼却炉稼働状況(1～4号炉合計) …… 34
2－2. 焼却炉稼働状況(1号炉) …… 36

２－３. 焼却炉稼働状況（2号炉） …… 36
２－４. 焼却炉稼働状況（3号炉） …… 38
２－５. 焼却炉稼働状況（4号炉） …… 38
２－６. ごみ焼却量と低位発熱量（熱精算法）の経年変化 …… 40
２－７. 月別焼却量の経年変化 …… 41

３. 管理薬剤の使用状況
３－１. 管理薬剤使用（購入）実績 …… 42

４. ボイラー・タービン関係
４－１. ボイラー運転状況（1～4号炉合計） …… 43
４－２. ボイラー運転状況（1号炉） …… 44
４－３. ボイラー運転状況（2号炉） …… 44
４－４. ボイラー運転状況（3号炉） …… 45
４－５. ボイラー運転状況（4号炉） …… 45
４－６. タービン稼働状況 …… 46
４－７. 純水及び薬剤使用実績 …… 48

５. 洗煙装置関係
５－１. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計） …… 49
５－２. 洗煙装置稼働実績（1号炉） …… 50
５－３. 洗煙装置稼働実績（2号炉） …… 50
５－４. 洗煙装置稼働実績（3号炉） …… 51
５－５. 洗煙装置稼働実績（4号炉） …… 51
５－６. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績 …… 52
５－７. 洗煙装置暦日数平均稼働率 …… 52

６. 排水処理関係
６－１. 排水処理実績 …… 53
６－２. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績 …… 53

７. 電力関係
７－１. 電力使用実績 …… 54

８. 市水・工水・防臭薬剤関係
８－１. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績 …… 55

９. 焼却残渣（灰）関係
９－１. 飛灰安定化装置稼働実績 …… 56
９－２. 焼却残渣（灰）処分実績 …… 57
９－３. 焼却残渣（灰）測定結果 …… 57

10. 公害関係
10－1. 敷地境界線における臭気測定結果 …… 58
10－2. 排ガス関係測定結果 …… 59
○ばいじん量
○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物
○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量
10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口） …… 62
10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 64
10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化（煙突入口） …… 65
10－8. その他のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 65
10－9. 排水関係測定結果
①原水水質測定結果 …… 66
②放流水水質測定結果 …… 68
③水素イオン濃度の経月変化 …… 69
④水銀濃度の経月変化 …… 69
⑤鉛濃度の経月変化 …… 70
⑥亜鉛濃度の経月変化 …… 70

11. 維持管理経費の状況（ごみ焼却施設）
11－1. 処理経費 …… 71
11－2. 処理経費の経年変化 …… 71

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績
1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（両市合計） …… 74
1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分） …… 75
1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分） …… 75

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績
2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績 …… 76
2－2. 用水・電力・蒸気使用量実績 …… 77

3. 不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況
3－1. 不燃・粗大ごみ処理残渣の処分実績 …… 78
3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績 …… 79
3－3. 適正処理困難物処分量実績 …… 80

4. 維持管理経費の状況（粗大ごみ処理施設）
4－1. 処理経費 …… 81
4－2. 処理経費の経年変化 …… 81

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績
1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績 …… 84
1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績 …… 84
1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績 …… 85

2. 家電四品目搬入・搬出実績
2－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（両市合計） …… 86
2－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（豊中市分） …… 87
2－3. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（伊丹市分） …… 88
2－4. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬出実績 …… 89

3. その他のリサイクル等の状況
3－1. 逆送電力量経年変化 …… 90
3－2. 搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績 …… 91
3－3. 古紙類の資源化実績 …… 91

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況
1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況 …… 94
1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況 …… 95
1－3. リサイクル施設勘定の予算・決算状況 …… 97

2. 歳入歳出決算の状況
2－1. 共通経費勘定 …… 99
2－2. ごみ処理施設勘定 …… 101
2－3. リサイクル施設勘定 …… 104

Ⅵ. その他

1. 啓発活動の状況
1－1. 施設見学者実績 …… 106
1－2. 体験学習受入れの実績 …… 106
1－3. 出前講座の実績 …… 107
1－4. イベント等の実績 …… 107
1－5. 搬入ごみ検査状況 …… 107

2. 余熱利用施設（クリーンスポーツランド）利用者の状況
2－1. 施設利用者実績 …… 108
2－2. 年間の利用者の割合 …… 109
2－3. 施設利用状況の経年変化 …… 109

3. 組織及び職員数
3－1. 組織図 …… 110
3－2. 職種別人員配置 …… 110

Ⅰ．総　　括

平成21年度一般廃棄物処理実績フロー図（両市）

（単位：t）

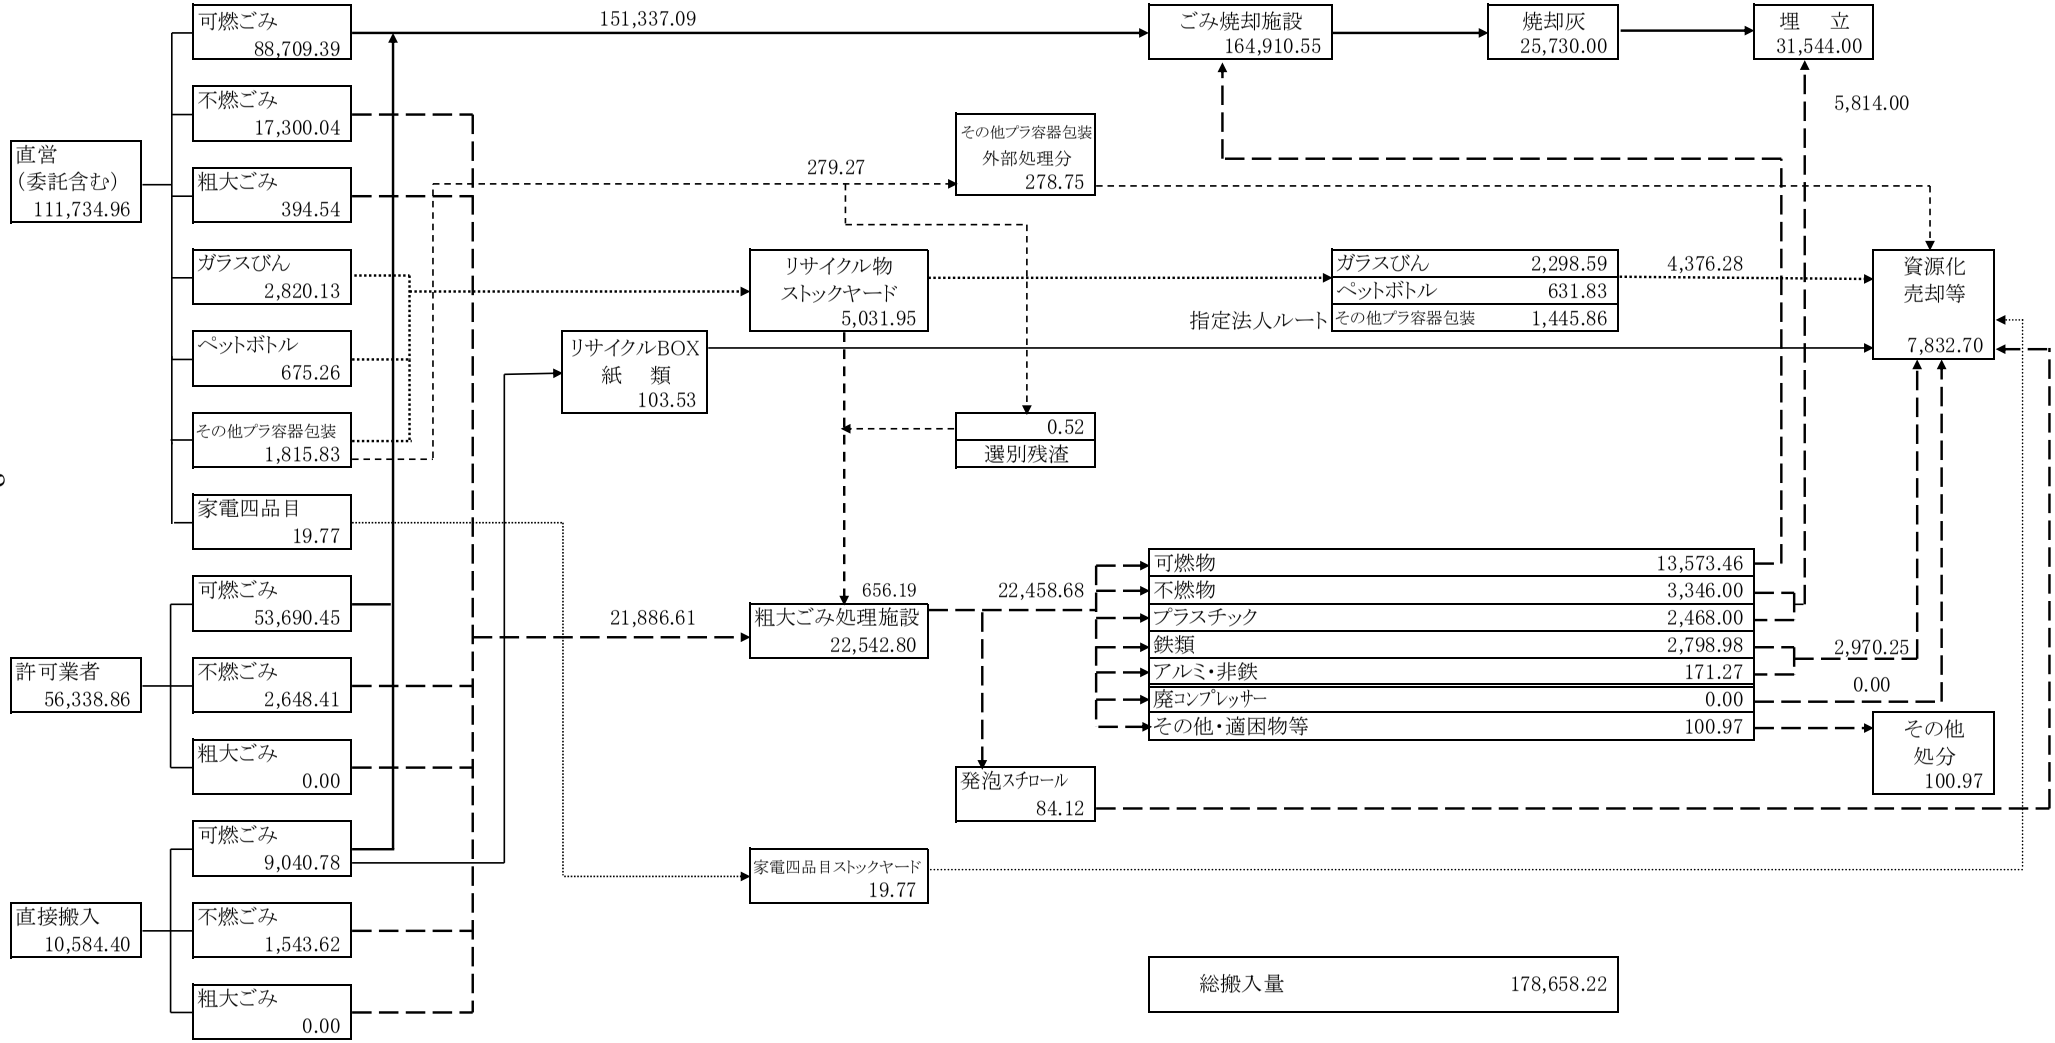

1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉)

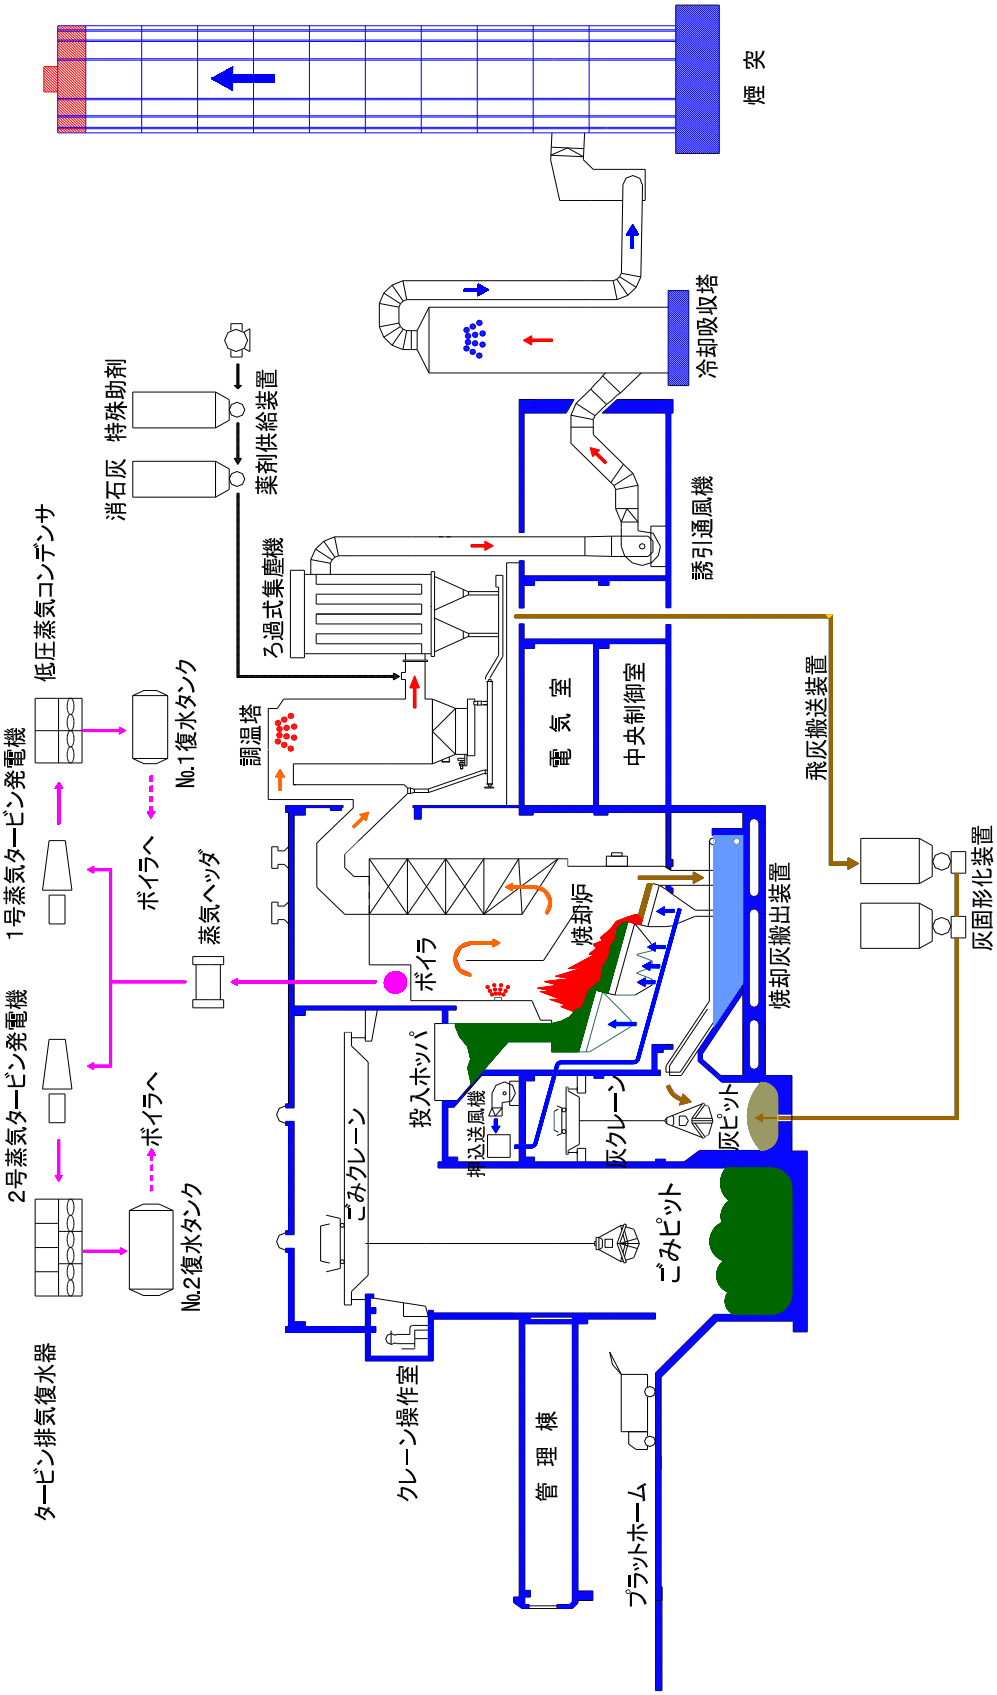

1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート

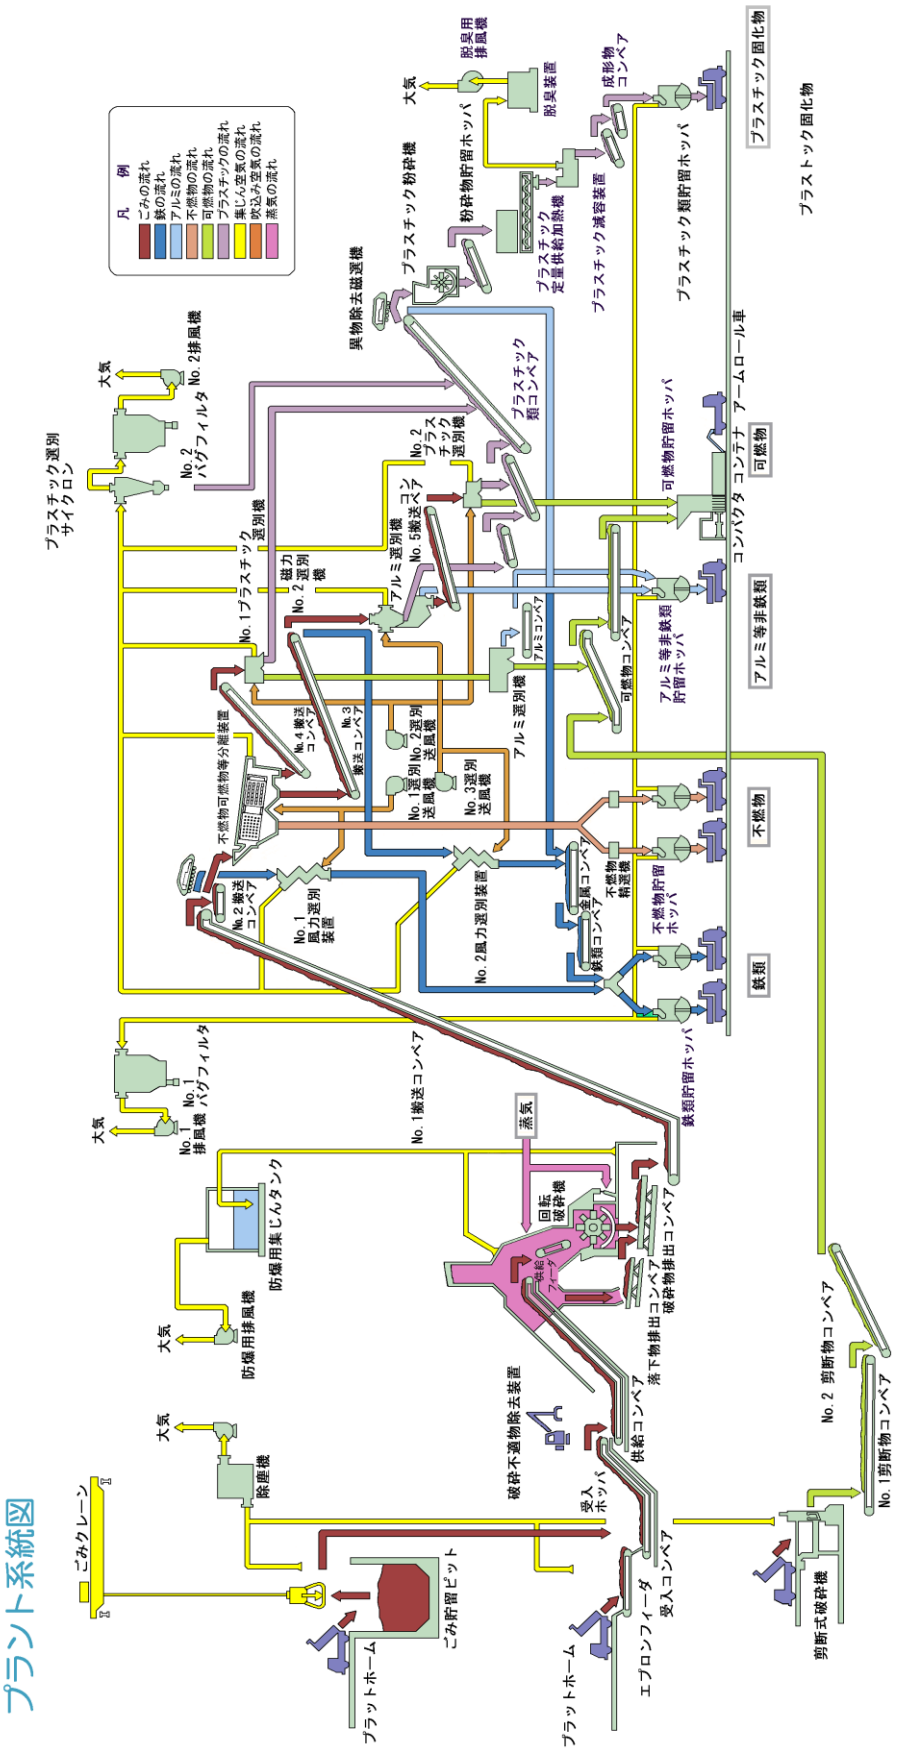

2. ごみ搬入量

2－1. ごみ搬入量実績（総括）

	両市搬入量					豊中市	
	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量
	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)	(台)	(t)
可燃ごみ	116,412	151,441	100.00	84.77	100.00	83,714	102,334
市扱い	61,392	88,709	58.58	79.39	100.00	44,963	59,267
許可業者	38,596	53,690	35.45	95.30	100.00	27,537	37,105
直接搬入	16,424	9,041	5.97	85.42	100.00	11,214	5,962
不燃ごみ	48,992	21,492	100.00	12.03	100.00	38,515	14,482
市扱い	26,665	17,300	80.50	15.48	100.00	20,404	12,280
許可業者	11,520	2,648	12.32	4.70	100.00	9,508	1,040
直接搬入	10,807	1,544	7.18	14.58	100.00	8,603	1,162
粗大ごみ	2,028	395	100.00	0.22	100.00	2,028	395
市扱い	2,028	395	100.00	0.35	100.00	2,028	395
許可業者	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
直接搬入	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
ガラスびん	3,986	2,820	100.00	1.58	100.00	2,927	1,609
市扱い	3,986	2,820	100.00	2.52	100.00	2,927	1,609
ペットボトル	2,696	675	100.00	0.38	100.00	1,667	279
市扱い	2,696	675	100.00	0.60	100.00	1,667	279
その他プラスチック	3,862	1,816	100.00	1.02	100.00	1,434	713
市扱い	3,862	1,816	100.00	1.63	100.00	1,434	713
家電四品目	495	20	100.00	0.01	100.00	356	14
市扱い	495	20	100.00	0.02	100.00	356	14
合　計	178,471	178,658	100.00	100.00	100.00	130,641	119,825
市扱い	101,124	111,735	62.54	100.00	100.00	73,779	74,557
許可業者	50,116	56,339	31.53	100.00	100.00	37,045	38,144
直接搬入	27,231	10,584	5.92	100.01	100.00	19,817	7,124
人口（10月1日現在）		584,409					388,544
一人1日平均排出量(g)		838					845
可燃ごみ		710					722
不燃ごみ		101					102
粗大ごみ		2					3
ガラスびん		13					11
ペットボトル		3					2
その他プラスチック		9					5
家電四品目		0					0

搬　入　量			伊　丹　市　搬　入　量				
搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合
(%)	(%)	(%)	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)
100.00	85.40	67.57	32,698	49,107	100.00	83.47	32.43
57.91	79.49	66.81	16,429	29,442	59.96	79.19	33.19
36.26	97.27	69.11	11,059	16,586	33.77	91.16	30.89
5.83	83.68	65.94	5,210	3,079	6.27	88.98	34.06
100.00	12.09	67.38	10,477	7,011	100.00	11.92	32.62
84.79	16.47	70.98	6,261	5,020	71.61	13.50	29.02
7.17	2.73	39.25	2,012	1,609	22.95	8.84	60.75
8.03	16.32	75.31	2,204	381	5.44	11.02	24.69
100.00	0.33	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	0.53	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	1.34	57.05	1,059	1,211	100.00	2.06	42.95
100.00	2.16	57.05	1,059	1,211	100.00	3.26	42.95
100.00	0.23	41.36	1,029	396	100.00	0.67	58.64
100.00	0.37	41.36	1,029	396	100.00	1.07	58.64
100.00	0.60	39.28	2,428	1,103	100.00	1.87	60.72
100.00	0.96	39.28	2,428	1,103	100.00	2.97	60.72
100.00	0.01	72.43	139	5	100.00	0.01	27.57
100.00	0.02	72.43	139	5	100.00	0.01	27.57
100.00	100.00	67.07	47,830	58,833	100.00	100.00	32.93
62.22	100.00	66.73	27,345	37,178	63.19	100.00	33.27
31.83	100.00	67.71	13,071	18,194	30.93	100.00	32.29
5.95	100.00	67.31	7,414	3,460	5.88	100.00	32.69
				195,865			
				823			
				687			
				98			
				0			
				17			
				6			
				15			
				0			

２－２. 月別ごみ搬入量実績（両市合計）

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	7,363.71	97.0	7,640.68	94.9	7,945.91	103.8
許可業者	4,622.19	89.6	4,532.35	86.9	4,691.32	92.7
直接搬入	420.79	97.3	716.55	99.4	963.72	99.4
小計(B)	5,042.98	90.2	5,248.90	88.5	5,655.04	93.8
合計(A＋B＝C)	12,406.69	94.1	12,889.58	92.1	13,600.95	99.4
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,477.79	98.5	1,524.63	96.2	1,428.85	106.0
許可業者	213.42	126.3	219.20	134.9	245.57	160.3
直接搬入	136.93	106.2	145.64	145.0	133.02	135.2
小計(E)	350.35	117.6	364.84	138.7	378.59	150.5
合計(D＋E＝F)	1,828.14	101.7	1,889.47	102.3	1,807.44	113.0
粗大ごみ						
市扱い(G)	36.63	103.2	40.44	112.2	37.54	104.8
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	36.63	103.2	40.44	112.2	37.54	104.8
ガラスびん						
市扱い(J)	227.21	104.5	246.16	99.4	231.30	101.7
合計(K)	227.21	104.5	246.16	99.4	231.30	101.7
ペットボトル						
市扱い(L)	51.95	107.9	56.25	99.7	62.25	112.6
合計(M)	51.95	107.9	56.25	99.7	62.25	112.6
その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
市扱い(N)	159.17	94.8	157.08	94.6	151.51	98.0
合計(O)	159.17	94.8	157.08	94.6	151.51	98.0
家電四品目						
市扱い(P)	1.87	84.2	1.33	160.2	2.02	174.1
合計(Q)	1.87	84.2	1.33	160.2	2.02	174.1
総搬入量						
市扱い(R)	9,318.33	97.4	9,666.57	95.3	9,859.38	104.1
許可業者	4,835.61	90.8	4,751.55	88.4	4,936.89	94.7
直接搬入	557.72	99.4	862.19	105.0	1,096.74	102.7
小計(S)	5,393.33	91.6	5,613.74	90.6	6,033.63	96.1
合計(R＋S＝T)	14,711.66	95.2	15,280.31	93.5	15,893.01	100.9
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	8,201	26	8,390	26	8,872
許可業者搬入全体	26	4,079	26	4,121	26	4,275
直接搬入全体	26	1,803	26	2,217	26	2,456
小　計		5,882		6,338		6,731
合　計		14,083		14,728		15,603

（両市合計）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)
7,793.53	99.1	7,234.34	101.0	6,965.92	90.2	7,569.69	99.1
4,835.99	94.2	4,694.48	95.5	4,298.45	84.2	4,546.85	92.9
1,080.77	103.8	920.06	94.7	839.95	86.5	936.04	89.6
5,916.76	95.8	5,614.54	95.3	5,138.40	84.6	5,482.89	92.3
13,710.29	97.6	12,848.88	98.5	12,104.32	87.7	13,052.58	96.1
1,549.77	101.5	1,408.26	100.0	1,454.81	100.8	1,456.94	96.3
245.97	132.7	216.62	125.8	232.33	128.8	224.77	107.3
113.37	125.6	127.17	122.4	112.39	117.0	114.47	118.2
359.34	130.4	343.79	124.5	344.72	124.7	339.24	110.7
1,909.11	105.9	1,752.05	104.0	1,799.53	104.7	1,796.18	98.7
35.89	122.0	31.54	97.3	31.07	100.2	29.80	84.1
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
35.89	122.0	31.54	97.3	31.07	100.2	29.80	84.1
245.47	101.0	251.27	98.0	232.60	100.7	232.41	98.8
245.47	101.0	251.27	98.0	232.60	100.7	232.41	98.8
74.58	98.5	75.28	97.5	71.40	101.1	58.77	94.7
74.58	98.5	75.28	97.5	71.40	101.1	58.77	94.7
164.51	99.3	145.57	96.3	149.31	97.0	139.81	84.4
164.51	99.3	145.57	96.3	149.31	97.0	139.81	84.4
1.25	89.3	1.47	85.0	1.58	109.7	1.44	122.0
1.25	89.3	1.47	85.0	1.58	109.7	1.44	122.0
9,865.00	99.6	9,147.73	100.7	8,906.69	92.3	9,488.86	98.3
5,081.96	95.5	4,911.10	96.5	4,530.78	85.7	4,771.62	93.4
1,194.14	105.5	1,047.23	97.3	952.34	89.3	1,050.51	92.0
6,276.10	97.3	5,958.33	96.6	5,483.12	86.3	5,822.13	93.2
16,141.10	98.7	15,106.06	99.0	14,389.81	89.9	15,310.99	96.3
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	8,884	26	8,290	26	8,479	27	8,653
27	4,443	26	4,448	26	4,211	27	4,323
27	2,517	26	2,577	26	2,385	27	2,524
	6,960		7,025		6,596		6,847
	15,844		15,315		15,075		15,500

（両市合計）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	7,333.93	106.1	8,037.80	93.4	7,152.29	98.1
許可業者	4,322.76	96.5	4,906.82	91.6	3,824.18	91.7
直接搬入	980.65	88.7	861.84	90.4	431.96	87.2
小計(B)	5,303.41	94.9	5,768.66	91.4	4,256.14	91.2
合計(A＋B＝C)	12,637.34	101.1	13,806.46	92.6	11,408.43	95.4
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,310.48	101.3	1,598.98	94.4	1,412.96	95.2
許可業者	193.42	88.4	256.97	95.1	180.35	95.6
直接搬入	114.41	125.6	121.83	113.5	112.92	122.7
小計(E)	307.83	99.3	378.80	100.3	293.27	104.5
合計(D＋E＝F)	1,618.31	101.0	1,977.78	95.5	1,706.23	96.7
粗大ごみ						
市扱い(G)	32.50	71.9	36.26	72.5	25.26	69.4
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	32.50	71.9	36.26	72.5	25.26	69.4
ガラスびん						
市扱い(J)	210.58	96.3	241.45	94.7	270.91	104.3
合計(K)	210.58	96.3	241.45	94.7	270.91	104.3
ペットボトル						
市扱い(L)	47.08	103.2	44.95	93.0	42.13	95.2
合計(M)	47.08	103.2	44.95	93.0	42.13	95.2
その他プラスチック						
市扱い(N)	140.77	100.4	152.86	92.8	153.33	96.6
合計(O)	140.77	100.4	152.86	92.8	153.33	96.6
家電四品目						
市扱い(P)	1.38	94.5	2.66	94.0	1.06	58.2
合計(Q)	1.38	94.5	2.66	94.0	1.06	58.2
総搬入量						
市扱い(R)	9,076.72	104.9	10,114.96	93.5	9,057.94	97.7
許可業者	4,516.18	96.1	5,163.79	91.8	4,004.53	91.9
直接搬入	1,095.06	91.5	983.67	92.7	544.88	92.8
小計(S)	5,611.24	95.2	6,147.46	91.9	4,549.41	92.0
合計(R＋S＝T)	14,687.96	101.0	16,262.42	92.9	13,607.35	95.7
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	25	8,284	26	8,907	24	7,991
許可業者搬入全体	25	4,025	27	4,571	24	3,718
直接搬入全体	25	2,494	24	2,581	24	1,673
小　計		6,519		7,152		5,391
合　計		14,803		16,059		13,382

（両市合計）　　［その4］

2月		3月		合計		搬入日平均搬入量(t)
搬入量(t)	対前年比率(%)	搬入量(t)	対前年比率(%)	搬入量(t)	対前年比率(%)	
6,179.92	97.5	7,491.67	99.0	88,709.39	98.1	286.16
3,761.91	95.7	4,653.15	99.8	53,690.45	92.4	172.64
394.35	98.6	494.10	116.8	9,040.78	94.9	29.35
4,156.26	95.9	5,147.25	101.2	62,731.23	92.8	201.99
10,336.18	96.9	12,638.92	99.9	151,440.62	95.8	488.15
1,172.01	96.6	1,504.56	103.0	17,300.04	99.0	55.81
186.27	104.5	233.52	102.6	2,648.41	114.4	8.52
115.30	120.0	196.17	148.0	1,543.62	125.1	5.01
301.57	109.9	429.69	119.4	4,192.03	118.1	13.53
1,473.58	99.0	1,934.25	106.3	21,492.07	102.2	69.33
28.32	79.6	29.29	85.4	394.54	90.3	1.27
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
28.32	79.6	29.29	85.4	394.54	90.3	1.27
211.77	97.1	219.00	100.8	2,820.13	99.8	9.10
211.77	97.1	219.00	100.8	2,820.13	99.8	9.10
41.21	101.8	49.41	108.0	675.26	100.8	2.18
41.21	101.8	49.41	108.0	675.26	100.8	2.18
136.93	97.1	164.98	106.0	1,815.83	96.3	5.86
136.93	97.1	164.98	106.0	1,815.83	96.3	5.86
1.79	235.5	1.92	128.0	19.77	107.9	0.06
1.79	235.5	1.92	128.0	19.77	107.9	0.06
7,771.95	97.3	9,460.83	99.8	111,734.96	98.3	360.44
3,948.18	96.0	4,886.67	99.9	56,338.86	93.3	181.15
509.65	102.8	690.27	124.3	10,584.40	98.3	34.36
4,457.83	96.8	5,576.94	102.4	66,923.26	94.0	215.52
12,229.78	97.1	15,037.77	100.7	178,658.22	96.6	575.95
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	7,551	27	8,622	310	101,124	326
24	3,655	27	4,247	311	50,116	161
24	1,595	27	2,409	308	27,231	88
	5,250		6,656		77,347	250
	12,801		15,278		178,471	576

2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	4,962.78	96.8	5,038.11	94.1	5,270.58	104.0
許可業者	3,198.22	90.1	3,104.35	86.4	3,222.28	93.1
直接搬入	278.17	102.1	526.11	104.0	572.12	83.2
小計(B)	3,476.39	90.9	3,630.46	88.6	3,794.40	91.4
合計(A＋B＝C)	8,439.17	94.3	8,668.57	91.7	9,064.98	98.4
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,035.62	98.4	1,075.55	96.1	1,021.14	106.0
許可業者	96.16	107.6	92.92	112.1	106.04	130.2
直接搬入	101.56	104.6	106.03	138.1	106.24	144.2
小計(E)	197.72	106.0	198.95	124.6	212.28	136.8
合計(D＋E＝F)	1,233.34	99.5	1,274.50	99.7	1,233.42	110.3
粗大ごみ						
市扱い(G)	36.63	103.2	40.44	112.2	37.54	104.8
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	36.63	103.2	40.44	112.2	37.54	104.8
ガラスびん						
市扱い(J)	131.69	107.9	144.65	101.0	128.77	99.6
合計(K)	131.69	107.9	144.65	101.0	128.77	99.6
ペットボトル						
市扱い(L)	22.22	113.1	23.67	103.2	25.83	111.9
合計(M)	22.22	113.1	23.67	103.2	25.83	111.9
その他プラスチック						
市扱い(N)	65.15	94.7	62.20	96.6	58.92	96.4
合計(O)	65.15	94.7	62.20	96.6	58.92	96.4
家電四品目						
市扱い(P)	1.27	80.9	0.97	140.6	1.52	185.4
合計(Q)	1.27	80.9	0.97	140.6	1.52	185.4
総搬入量						
市扱い(R)	6,255.36	97.4	6,385.59	94.7	6,544.30	104.2
許可業者	3,294.38	90.5	3,197.27	87.0	3,328.32	93.9
直接搬入	379.73	102.8	632.14	108.4	678.36	89.1
小計(S)	3,674.11	91.7	3,829.41	90.0	4,006.68	93.1
合計(R＋S＝T)	9,929.47	95.2	10,215.00	92.9	10,550.98	99.7
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	6,033	26	6,075	26	6,438
許可業者搬入全体	26	3,017	26	3,032	26	3,152
直接搬入全体	26	1,336	26	1,651	26	1,726
小　計		4,353		4,683		4,878
合　計		10,386		10,758		11,316

（豊中市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
5,123.76	98.5	4,771.93	101.5	4,628.43	90.1	5,054.85	100.0
3,340.84	94.2	3,233.54	97.1	2,984.85	86.0	3,143.85	91.3
704.26	105.2	654.03	99.6	577.13	83.4	636.73	87.5
4,045.10	95.9	3,887.57	97.5	3,561.98	85.6	3,780.58	90.6
9,168.86	97.3	8,659.50	99.7	8,190.41	88.0	8,835.43	95.7
1,099.94	100.2	1,000.69	99.9	1,034.81	100.8	1,032.30	97.3
106.43	106.6	95.12	93.6	96.43	104.8	84.51	89.6
85.16	136.2	92.05	127.5	85.47	126.2	85.96	118.2
191.59	118.0	187.17	107.7	181.90	113.9	170.47	102.1
1,291.53	102.5	1,187.86	101.1	1,216.71	102.6	1,202.77	97.9
35.89	122.0	31.54	97.3	31.07	100.2	29.80	84.1
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
35.89	122.0	31.54	97.3	31.07	100.2	29.80	84.1
133.87	103.5	147.93	97.0	128.15	98.3	135.22	103.3
133.87	103.5	147.93	97.0	128.15	98.3	135.22	103.3
30.25	91.2	31.35	92.5	29.18	94.2	24.87	91.6
30.25	91.2	31.35	92.5	29.18	94.2	24.87	91.6
65.04	101.3	56.44	95.8	58.58	100.1	56.08	87.5
65.04	101.3	56.44	95.8	58.58	100.1	56.08	87.5
0.75	63.6	1.47	105.8	1.35	108.0	0.99	137.5
0.75	63.6	1.47	105.8	1.35	108.0	0.99	137.5
6,489.50	99.0	6,041.35	101.0	5,911.57	92.1	6,334.11	99.3
3,447.27	94.5	3,328.66	97.0	3,081.28	86.5	3,228.36	91.3
789.42	107.9	746.08	102.4	662.60	87.3	722.69	90.3
4,236.69	96.7	4,074.74	97.9	3,743.88	86.6	3,951.05	91.1
10,726.19	98.1	10,116.09	99.8	9,655.45	89.9	10,285.16	96.0
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	6,361	26	6,006	26	6,143	27	6,310
27	3,322	26	3,331	26	3,128	27	3,201
27	1,795	26	1,905	26	1,760	27	1,830
	5,117		5,236		4,888		5,031
	11,478		11,242		11,031		11,341

（豊中市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	4,909.37	107.3	5,437.13	94.2	4,787.14	97.4
許可業者	2,968.20	94.2	3,411.15	90.3	2,645.73	90.9
直接搬入	602.50	90.5	564.75	90.5	266.69	83.4
小計(B)	3,570.70	93.6	3,975.90	90.3	2,912.42	90.2
合計(A＋B＝C)	8,480.07	101.0	9,413.03	92.5	7,699.56	94.5
不燃ごみ						
市扱い(D)	932.55	103.9	1,143.38	97.9	986.07	95.3
許可業者	64.32	75.0	90.79	81.9	63.73	75.7
直接搬入	92.14	145.3	90.11	121.2	87.42	125.7
小計(E)	156.46	104.9	180.90	97.7	151.15	98.3
合計(D＋E＝F)	1,089.01	104.0	1,324.28	97.9	1,137.22	95.7
粗大ごみ						
市扱い(G)	32.50	71.9	36.26	72.5	25.26	69.4
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	32.50	71.9	36.26	72.5	25.26	69.4
ガラスびん						
市扱い(J)	120.34	91.6	141.21	95.3	156.41	105.3
合計(K)	120.34	91.6	141.21	95.3	156.41	105.3
ペットボトル						
市扱い(L)	19.44	93.6	18.95	88.0	15.46	82.9
合計(M)	19.44	93.6	18.95	88.0	15.46	82.9
その他プラスチック						
市扱い(N)	55.95	104.6	61.71	93.4	57.28	93.8
合計(O)	55.95	104.6	61.71	93.4	57.28	93.8
家電四品目						
市扱い(P)	1.06	84.1	1.88	90.0	0.94	53.7
合計(Q)	1.06	84.1	1.88	90.0	0.94	53.7
総搬入量						
市扱い(R)	6,071.21	106.0	6,840.52	94.6	6,028.56	97.0
許可業者	3,032.52	93.7	3,501.94	90.1	2,709.46	90.5
直接搬入	694.64	95.3	654.86	93.8	354.11	90.9
小計(S)	3,727.16	94.0	4,156.80	90.6	3,063.57	90.5
合計(R＋S＝T)	9,798.37	101.1	10,997.32	93.1	9,092.13	94.7
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱全体	25	6,042	26	6,560	24	5,853
許可業者全体	25	2,956	27	3,392	24	2,724
直接全体	25	1,771	24	1,835	24	1,248
小　計		4,727		5,227		3,972
合　計		10,769		11,787		9,825

（豊中市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
4,190.96	97.7	5,092.02	99.0	59,267.06	98.2	162.38	191.18
2,623.80	95.2	3,228.12	99.0	37,104.93	92.2	101.66	119.31
248.02	92.3	331.14	128.9	5,961.65	93.9	16.33	19.36
2,871.82	95.0	3,559.26	101.2	43,066.58	92.4	117.99	138.66
7,062.78	96.6	8,651.28	99.9	102,333.64	95.7	280.37	329.85
842.49	97.9	1,075.05	103.5	12,279.59	99.7	33.64	39.61
64.53	84.2	78.57	80.3	1,039.55	94.8	2.85	3.34
89.80	124.4	140.49	137.7	1,162.43	128.6	3.18	3.77
154.33	103.7	219.06	109.6	2,201.98	110.0	6.03	7.12
996.82	98.7	1,294.11	104.5	14,481.57	101.1	39.68	46.72
28.32	79.6	29.29	85.4	394.54	90.3	1.08	1.27
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
28.32	79.6	29.29	85.4	394.54	90.3	1.08	1.27
123.88	95.3	116.77	95.9	1,608.89	99.5	4.41	5.19
123.88	95.3	116.77	95.9	1,608.89	99.5	4.41	5.19
17.34	101.7	20.75	105.6	279.31	96.8	0.77	0.90
17.34	101.7	20.75	105.6	279.31	96.8	0.77	0.90
52.33	96.7	63.50	107.8	713.18	97.2	1.95	2.30
52.33	96.7	63.50	107.8	713.18	97.2	1.95	2.30
0.85	146.6	1.27	104.1	14.32	98.6	0.04	0.05
0.85	146.6	1.27	104.1	14.32	98.6	0.04	0.05
5,256.17	97.6	6,398.65	99.7	74,556.89	98.4	204.27	240.51
2,688.33	94.9	3,306.69	98.5	38,144.48	92.3	104.51	122.65
337.82	99.1	471.63	131.4	7,124.08	98.3	19.52	23.13
3,026.15	95.4	3,778.32	101.6	45,268.56	93.1	124.02	145.78
8,282.32	96.8	10,176.97	100.4	119,825.45	96.4	328.29	386.29
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	5,586	27	6,372	310	73,779	202	238
24	2,671	27	3,119	311	37,045	101	119
24	1,184	27	1,776	308	19,817	54	64
	3,855		4,895		56,862	156	183
	9,441		11,267		130,641	358	421

2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,400.93	97.3	2,602.57	96.5	2,675.33	103.4
許可業者	1,423.97	88.6	1,428.00	88.0	1,469.04	92.0
直接搬入	142.62	89.1	190.44	88.6	391.60	138.8
小計(B)	1,566.59	88.6	1,618.44	88.1	1,860.64	99.0
合計(A＋B＝C)	3,967.52	93.7	4,221.01	93.1	4,535.97	101.6
不燃ごみ						
市扱い(D)	442.17	98.8	449.08	96.5	407.71	106.0
許可業者	117.26	147.3	126.28	158.6	139.53	194.5
直接搬入	35.37	111.1	39.61	167.4	26.78	108.2
小計(E)	152.63	136.9	165.89	160.6	166.31	172.4
合計(D＋E＝F)	594.80	106.4	614.97	108.1	574.02	119.3
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	95.52	100.0	101.51	97.4	102.53	104.3
合計(K)	95.52	100.0	101.51	97.4	102.53	104.3
ペットボトル						
市扱い(L)	29.73	104.2	32.58	97.3	36.42	113.1
合計(M)	29.73	104.2	32.58	97.3	36.42	113.1
その他プラスチック						
市扱い(N)	94.02	94.9	94.88	93.4	92.59	99.1
合計(O)	94.02	94.9	94.88	93.4	92.59	99.1
家電四品目						
市扱い(P)	0.60	92.3	0.36	257.1	0.50	147.1
合計(Q)	0.60	92.3	0.36	257.1	0.50	147.1
総搬入量						
市扱い(R)	3,062.97	97.6	3,280.98	96.4	3,315.08	103.7
許可業者	1,541.23	91.4	1,554.28	91.3	1,608.57	96.4
直接搬入	177.99	92.8	230.05	96.4	418.38	136.3
小計(S)	1,719.22	91.5	1,784.33	92.0	2,026.95	102.6
合計(R＋S＝T)	4,782.19	95.3	5,065.31	94.8	5,342.03	103.3
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	22	2,168	23	2,315	24	2,434
許可業者搬入全体	26	1,062	26	1,089	26	1,123
直接搬入全体	26	467	26	566	26	730
小　計		1,529		1,655		1,853
合　計		3,697		3,970		4,287

（伊丹市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
2,669.77	100.2	2,462.41	100.1	2,337.49	90.5	2,514.84	97.3
1,495.15	94.2	1,460.94	92.0	1,313.60	80.4	1,403.00	96.5
376.51	101.1	266.03	84.3	262.82	94.2	299.31	94.5
1,871.66	95.5	1,726.97	90.8	1,576.42	82.4	1,702.31	96.2
4,541.43	98.3	4,189.38	96.0	3,913.91	87.0	4,217.15	96.8
449.83	104.8	407.57	100.0	420.00	100.8	424.64	94.0
139.54	163.1	121.50	172.2	135.90	153.7	140.26	121.7
28.21	101.7	35.12	110.9	26.92	94.9	28.51	118.1
167.75	148.1	156.62	153.2	162.82	139.4	168.77	121.0
617.58	113.8	564.19	110.7	582.82	109.3	593.41	100.4
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
111.60	98.0	103.34	99.5	104.45	103.9	97.19	93.2
111.60	98.0	103.34	99.5	104.45	103.9	97.19	93.2
44.33	104.2	43.93	110.7	42.22	106.4	33.90	97.0
44.33	104.2	43.93	101.5	42.22	106.4	33.90	97.0
99.47	98.1	89.13	96.6	90.73	95.0	83.73	82.4
99.47	98.1	89.13	96.6	90.73	95.0	83.73	82.4
0.50	227.3	0.00	0.0	0.23	121.1	0.45	97.8
0.50	227.3	0.00	0.0	0.23	121.1	0.45	97.8
3,375.50	100.7	3,106.38	99.9	2,995.12	92.5	3,154.75	96.2
1,634.69	97.8	1,582.44	95.5	1,449.50	84.1	1,543.26	98.4
404.72	101.2	301.15	86.7	289.74	94.2	327.82	96.2
2,039.41	98.4	1,883.59	94.0	1,739.24	85.7	1,871.08	98.0
5,414.91	99.9	4,989.97	97.6	4,734.36	89.9	5,025.83	96.9
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
26	2,523	24	2,284	24	2,336	27	2,343
27	1,121	26	1,117	26	1,083	27	1,122
27	722	26	672	26	625	27	694
	1,843		1,789		1,708		1,816
	4,366		4,073		4,044		4,159

（伊丹市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,424.56	104.0	2,600.67	91.9	2,365.15	99.6
許可業者	1,354.56	101.9	1,495.67	94.6	1,178.45	93.5
直接搬入	378.15	86.0	297.09	90.3	165.27	94.3
小計(B)	1,732.71	97.9	1,792.76	93.9	1,343.72	93.6
合計(A＋B＝C)	4,157.27	101.4	4,393.43	92.7	3,708.87	97.4
不燃ごみ						
市扱い(D)	377.93	95.5	455.60	86.6	426.89	94.9
許可業者	129.10	97.1	166.18	104.2	116.62	111.7
直接搬入	22.27	80.4	31.72	96.1	25.50	113.6
小計(E)	151.37	94.2	197.90	102.8	142.12	112.0
合計(D＋E＝F)	529.30	95.1	653.50	90.9	569.01	98.7
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	90.24	103.3	100.24	93.9	114.50	103.0
合計(K)	90.24	103.3	100.24	93.9	114.50	103.0
ペットボトル						
市扱い(L)	27.64	111.2	26.00	97.1	26.67	104.1
合計(M)	27.64	111.2	26.00	97.1	26.67	104.1
その他プラスチック						
市扱い(N)	84.82	97.9	91.15	92.3	96.05	98.3
合計(O)	84.82	97.9	91.15	92.3	96.05	98.3
家電四品目						
市扱い(P)	0.32	160.0	0.78	105.4	0.12	171.4
合計(Q)	0.32	160.0	0.78	105.4	0.12	171.4
総搬入量						
市扱い(R)	3,005.51	102.7	3,274.44	91.3	3,029.38	99.1
許可業者	1,483.66	101.5	1,661.85	95.5	1,295.07	94.9
直接搬入	400.42	85.6	328.81	90.8	190.77	96.5
小計(S)	1,884.08	97.6	1,990.66	94.7	1,485.84	95.1
合計(R＋S＝T)	4,889.59	100.7	5,265.10	92.5	4,515.22	97.7
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	25	2,242	26	2,347	24	2,138
許可業者搬入全体	25	1,069	27	1,179	24	994
直接搬入全体	25	723	24	746	24	425
小　計		1,792		1,925		1,419
合　計		4,034		4,272		3,557

（伊丹市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
1,988.96	97.1	2,399.65	98.9	29,442.33	98.0	80.66	99.47
1,138.11	96.6	1,425.03	101.6	16,585.52	93.0	45.44	53.33
146.33	111.6	162.96	98.1	3,079.13	96.8	8.44	10.00
1,284.44	98.1	1,587.99	101.2	19,664.65	93.6	53.88	63.33
3,273.40	97.5	3,987.64	99.8	49,106.98	96.1	134.54	162.80
329.52	93.4	429.51	101.8	5,020.45	97.5	13.75	16.96
121.74	119.8	154.95	119.5	1,608.86	132.0	4.41	5.17
25.50	106.8	55.68	182.6	381.19	115.6	1.04	1.24
147.24	117.4	210.63	131.6	1,990.05	128.5	5.45	6.41
476.76	99.7	640.14	110.0	7,010.50	104.7	19.21	23.37
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
87.89	99.9	102.23	107.2	1,211.24	100.2	3.32	4.09
87.89	99.9	102.23	107.2	1,211.24	100.2	3.32	4.09
23.87	101.8	28.66	109.8	395.95	103.8	1.08	1.34
23.87	101.8	28.66	109.8	395.95	103.8	1.08	1.34
84.60	97.3	101.48	105.0	1,102.65	95.8	3.02	3.73
84.60	97.3	101.48	105.0	1,102.65	95.8	3.02	3.73
0.94	522.2	0.65	232.1	5.45	143.0	0.01	0.02
0.94	522.2	0.65	232.1	5.45	143.0	0.01	0.02
2,515.78	96.8	3,062.18	99.9	37,178.07	98.0	101.86	125.60
1,259.85	98.5	1,579.98	103.1	18,194.38	95.5	49.85	58.50
171.83	110.9	218.64	111.2	3,460.32	98.5	9.48	11.23
1,431.68	99.8	1,798.62	104.0	21,654.70	95.9	59.33	69.74
3,947.46	97.9	4,860.80	101.4	58,832.77	97.2	161.19	195.34
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	1,965	27	2,250	296	27,345	75	92
24	984	27	1,128	311	13,071	36	42
24	411	27	633	308	7,414	20	24
	1,395		1,761		20,485	56	66
	3,360		4,011		47,830	131	158

3. ごみ搬入量の経年変化

3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	196,673.53	100.0	20,993.09	100.0	217,666.62	100.0	
2	200,664.82	102.0	21,731.83	103.5	222,396.65	102.2	102.2
3	202,102.51	102.8	22,097.34	105.3	224,199.85	103.0	100.8
4	199,934.65	101.7	24,309.23	115.8	224,243.88	103.0	100.0
5	195,923.07	99.6	28,705.85	136.7	224,628.92	103.2	100.2
6	196,008.19	99.7	33,261.16	158.4	229,269.35	105.3	102.1
7	225,769.12	114.8	33,704.89	160.6	259,474.01	119.2	113.2
8	208,147.11	105.8	31,573.80	150.4	239,720.91	110.1	92.4
9	210,295.27	106.9	30,854.57	147.0	241,149.84	110.8	100.6
10	208,417.72	106.0	30,594.55	145.7	239,012.27	109.8	99.1
11	207,933.60	105.7	30,421.13	144.9	238,354.73	109.5	99.7
12	208,327.37	105.9	32,266.45	153.7	240,593.82	110.5	100.9
13	205,876.02	104.7	30,415.19	144.9	236,291.21	108.6	98.2
14	202,921.78	103.2	30,044.98	143.1	232,966.76	107.0	98.6
15	196,259.56	99.8	30,546.30	145.5	226,805.86	104.2	97.4
16	188,327.73	95.8	30,252.67	144.1	218,580.40	100.4	96.4
17	182,419.59	92.8	29,731.66	141.6	212,151.25	97.5	97.1
18	181,105.87	92.1	29,672.75	141.3	210,778.62	96.8	99.4
19	164,926.69	83.9	27,111.39	129.1	192,038.08	88.2	91.1
20	158,016.80	80.3	26,838.61	127.8	184,855.41	84.9	96.3
21	151,440.62	77.0	27,197.83	129.6	178,638.45	82.1	96.6

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

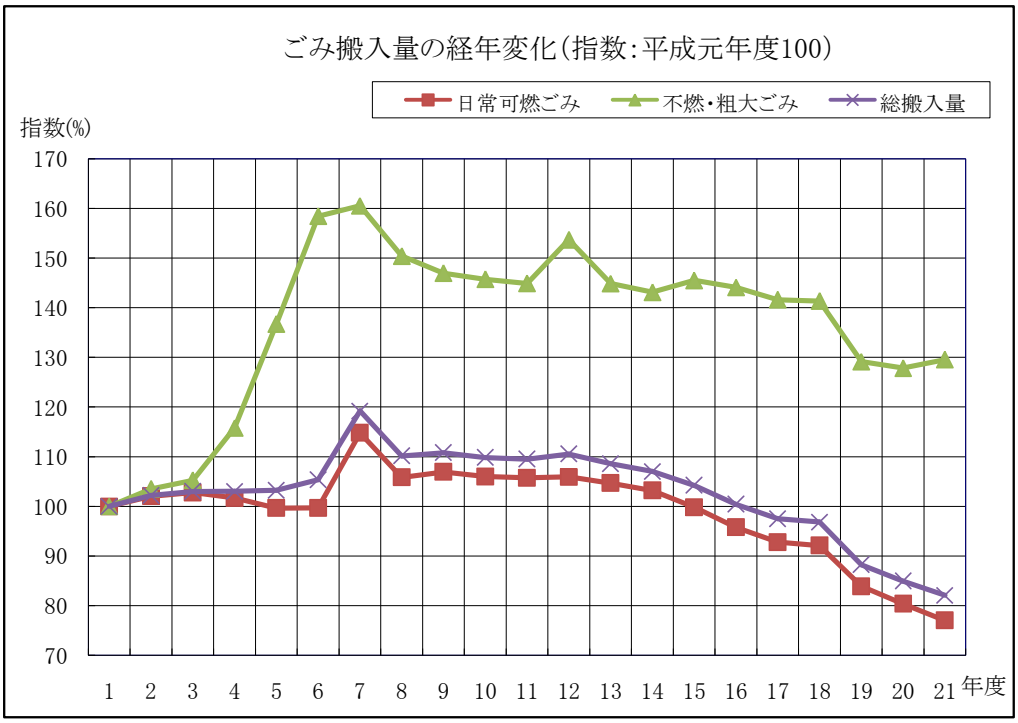

3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	143,008.31	100.0	14,277.99	100.0	157,286.30	100.0	
2	146,155.94	102.2	14,741.23	103.2	160,897.17	102.3	102.3
3	146,403.74	102.4	14,678.13	102.8	161,081.87	102.4	100.1
4	143,935.92	100.6	16,042.69	112.4	159,978.61	101.7	99.3
5	134,521.37	94.1	19,466.82	136.3	153,988.19	97.9	96.3
6	131,355.56	91.9	20,226.30	141.7	151,581.86	96.4	98.4
7	151,115.43	105.7	22,617.14	158.4	173,732.57	110.5	114.6
8	138,932.10	97.1	20,738.13	145.2	159,670.23	101.5	91.9
9	138,592.87	96.9	20,629.87	144.5	159,222.74	101.2	99.7
10	134,674.09	94.2	20,678.54	144.8	155,352.63	98.8	97.6
11	134,126.31	93.8	20,515.01	143.7	154,641.32	98.3	99.5
12	135,020.02	94.4	21,603.43	151.3	156,623.45	99.6	101.3
13	131,613.42	92.0	20,138.88	141.0	151,752.30	96.5	96.9
14	129,415.11	90.5	19,532.08	136.8	148,947.19	94.7	98.2
15	126,448.74	88.4	19,511.08	136.7	145,959.82	92.8	98.0
16	120,562.01	84.3	19,406.90	135.9	139,968.91	89.0	95.9
17	118,892.73	83.1	19,044.58	133.4	137,937.31	87.7	98.5
18	120,462.38	84.2	19,364.22	135.6	139,826.60	88.9	101.4
19	111,338.98	77.9	17,530.50	122.8	128,869.48	81.9	92.2
20	106,942.23	74.8	17,398.26	121.9	124,340.49	79.1	96.5
21	102,333.64	71.6	17,477.49	122.4	119,811.13	76.2	96.4

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

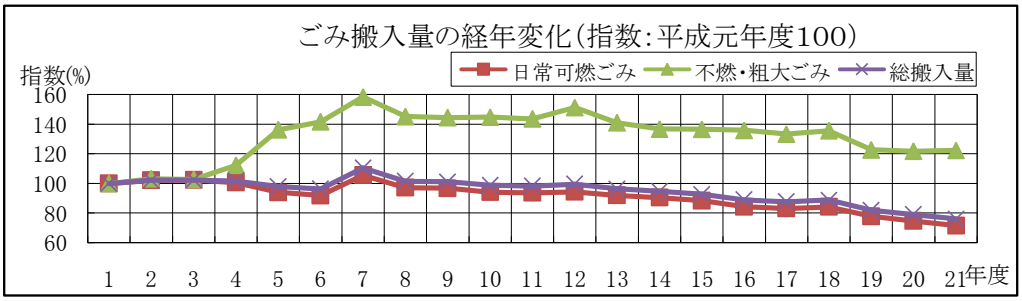

3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
元	53,665.22	100.0	6,715.10	100.0	60,380.32	100.0	
2	54,508.88	101.6	6,990.60	104.1	61,499.48	101.9	101.9
3	55,698.77	103.8	7,419.21	110.5	63,117.98	104.5	102.6
4	55,998.73	104.3	8,266.54	123.1	64,265.27	106.4	101.8
5	61,401.70	114.4	9,239.03	137.6	70,640.73	117.0	109.9
6	64,652.63	120.5	13,034.86	194.1	77,687.49	128.7	110.0
7	74,653.69	139.1	11,087.75	165.1	85,741.44	142.0	110.4
8	69,215.01	129.0	10,835.67	161.4	80,050.68	132.6	93.4
9	71,702.40	133.6	10,224.70	152.3	81,927.10	135.7	102.3
10	73,743.63	137.4	9,916.01	147.7	83,659.64	138.6	102.1
11	73,807.29	137.5	9,906.12	147.5	83,713.41	138.6	100.1
12	73,307.35	136.6	10,663.02	158.8	83,970.37	139.1	100.3
13	74,262.60	138.4	10,276.31	153.0	84,538.91	140.0	100.7
14	73,506.67	137.0	10,512.90	156.6	84,019.57	139.2	99.4
15	69,810.82	130.1	11,035.22	164.3	80,846.04	133.9	96.2
16	67,765.72	126.3	10,845.77	161.5	78,611.49	130.2	97.2
17	63,526.86	118.4	10,687.08	159.1	74,213.94	122.9	94.4
18	60,643.49	113.0	10,308.53	153.5	70,952.02	117.5	95.6
19	53,587.71	99.9	9,580.89	142.7	63,168.60	104.6	89.0
20	51,074.57	95.2	9,440.35	140.6	60,514.92	100.2	95.8
21	49,106.98	91.5	9,720.34	144.8	58,827.32	97.4	97.2

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

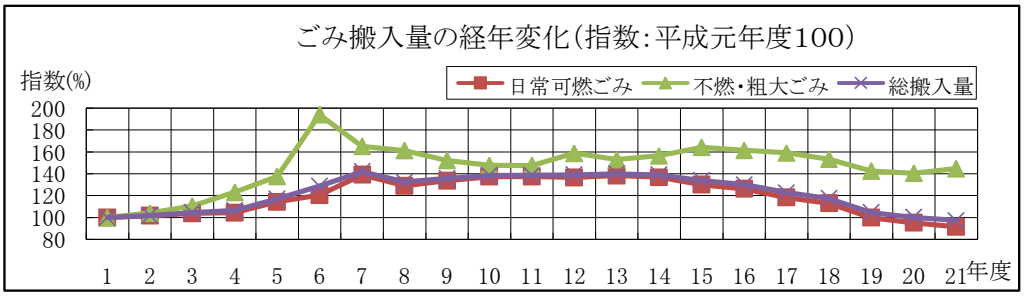

3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	148,269.28	100.0	59,876.44	100.0	9,520.90	100.0	217,666.62	100.0
2	149,493.76	100.8	64,235.96	107.3	8,666.93	91.0	222,396.65	102.2
3	148,502.70	100.2	65,862.97	110.0	9,834.18	103.3	224,199.85	103.0
4	149,304.31	100.7	66,024.43	110.3	8,915.14	93.6	224,243.88	103.0
5	147,406.15	99.4	68,334.63	114.1	8,888.14	93.4	224,628.92	103.2
6	148,768.96	100.3	72,392.06	120.9	8,108.33	85.2	229,269.35	105.3
7	175,064.05	118.1	75,661.21	126.4	8,748.75	91.9	259,474.01	119.2
8	152,231.45	102.7	77,755.48	129.9	9,733.98	102.2	239,720.91	110.1
9	150,501.64	101.5	80,313.59	134.1	10,334.61	108.5	241,149.84	110.8
10	147,630.23	99.6	80,509.50	134.5	10,872.54	114.2	239,012.27	109.8
11	147,290.41	99.3	80,157.14	133.9	10,907.18	114.6	238,354.73	109.5
12	148,598.01	100.2	82,389.97	137.6	9,605.84	100.9	240,593.82	110.5
13	144,438.65	97.4	81,534.28	136.2	10,318.28	108.4	236,291.21	108.6
14	139,502.39	94.1	82,918.69	138.5	10,545.68	110.8	232,966.76	107.0
15	130,377.85	87.9	84,057.55	140.4	12,370.46	129.9	226,805.86	104.2
16	125,664.38	84.8	80,960.90	135.2	11,955.12	125.6	218,580.40	100.4
17	123,476.36	83.3	76,142.32	127.2	12,532.57	131.6	212,151.25	97.5
18	123,197.61	83.1	71,474.82	119.4	16,106.19	169.2	210,778.62	96.8
19	116,586.98	78.6	64,763.28	108.2	10,687.82	112.3	192,038.08	88.2
20	113,688.60	76.7	60,403.98	100.9	10,762.83	113.0	184,855.41	84.9
21	111,715.19	75.3	56,338.86	94.1	10,584.40	111.2	178,638.45	82.1

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

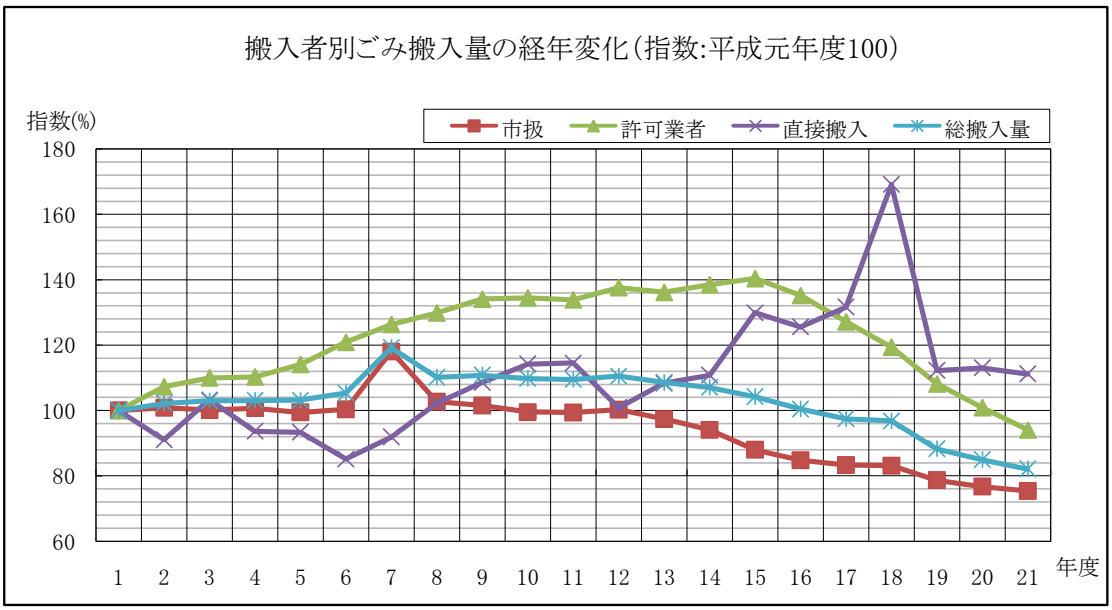

3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	103,631.95	100.0	47,540.05	100.0	6,114.30	100.0	157,286.30	100.0
2	104,522.46	100.9	50,740.44	106.7	5,634.27	92.1	160,897.17	102.3
3	102,695.94	99.1	51,870.67	109.1	6,515.26	106.6	161,081.87	102.4
4	101,721.38	98.2	52,130.78	109.7	6,126.45	100.2	159,978.61	101.7
5	97,748.53	94.3	50,406.93	106.0	5,832.73	95.4	153,988.19	97.9
6	95,408.20	92.1	50,922.55	107.1	5,251.11	85.9	151,581.86	96.4
7	116,017.41	112.0	52,064.27	109.5	5,650.89	92.4	173,732.57	110.5
8	100,382.17	96.9	53,058.75	111.6	6,229.31	101.9	159,670.23	101.5
9	99,378.13	95.9	53,404.54	112.3	6,440.07	105.3	159,222.74	101.2
10	97,509.41	94.1	51,223.02	107.7	6,620.20	108.3	155,352.63	98.8
11	96,841.31	93.4	50,935.49	107.1	6,864.52	112.3	154,641.32	98.3
12	97,178.01	93.8	53,631.97	112.8	5,813.47	95.1	156,623.45	99.6
13	93,689.03	90.4	52,048.43	109.5	6,014.84	98.4	151,752.30	96.5
14	90,044.33	86.9	52,864.65	111.2	6,038.21	98.8	148,947.19	94.7
15	87,442.15	84.4	51,906.85	109.2	6,610.82	108.1	145,959.82	92.8
16	83,114.98	80.2	49,883.11	104.9	6,970.82	114.0	139,968.91	89.0
17	81,499.74	78.6	48,003.06	101.0	8,434.51	137.9	137,937.31	87.7
18	82,083.96	79.2	46,618.32	98.1	11,124.32	181.9	139,826.60	88.9
19	77,776.53	75.1	44,167.11	92.9	6,925.84	113.3	128,869.48	81.9
20	75,742.54	73.1	41,347.00	87.0	7,250.95	118.6	124,340.49	79.1
21	74,542.57	71.9	38,144.48	80.2	7,124.08	116.5	119,811.13	76.2

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

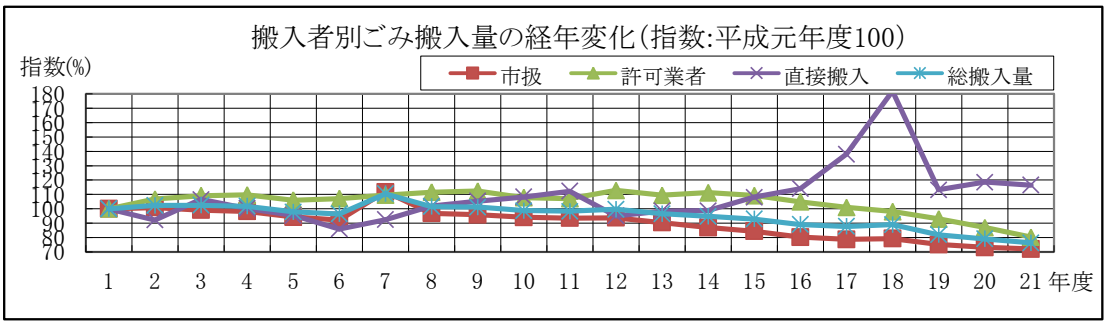

3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
元	44,637.33	100.0	12,336.39	100.0	3,406.60	100.0	60,380.32	100.0
2	44,971.30	100.7	13,495.52	109.4	3,032.66	89.0	61,499.48	101.9
3	45,806.76	102.6	13,992.30	113.4	3,318.92	97.4	63,117.98	104.5
4	47,582.93	106.6	13,893.65	112.6	2,788.69	81.9	64,265.27	106.4
5	49,657.62	111.2	17,927.70	145.3	3,055.41	89.7	70,640.73	117.0
6	53,360.76	119.5	21,469.51	174.0	2,857.22	83.9	77,687.49	128.7
7	59,046.64	132.3	23,596.94	191.3	3,097.86	90.9	85,741.44	142.0
8	51,849.28	116.2	24,696.73	200.2	3,504.67	102.9	80,050.68	132.6
9	51,123.51	114.5	26,909.05	218.1	3,894.54	114.3	81,927.10	135.7
10	50,120.82	112.3	29,286.48	237.4	4,252.34	124.8	83,659.64	138.6
11	50,449.10	113.0	29,221.65	236.9	4,042.66	118.7	83,713.41	138.6
12	51,420.00	115.2	28,758.00	233.1	3,792.37	111.3	83,970.37	139.1
13	50,749.62	113.7	29,485.85	239.0	4,303.44	126.3	84,538.91	140.0
14	49,458.06	110.8	30,054.04	243.6	4,507.47	132.3	84,019.57	139.2
15	42,935.70	96.2	32,150.70	260.6	5,759.64	169.1	80,846.04	133.9
16	42,549.40	95.3	31,077.79	251.9	4,984.30	146.3	78,611.49	130.2
17	41,976.62	94.0	28,139.26	228.1	4,098.06	120.3	74,213.94	122.9
18	41,113.65	92.1	24,856.50	201.5	4,981.87	146.2	70,952.02	117.5
19	38,810.45	86.9	20,596.17	167.0	3,761.98	110.4	63,168.60	104.6
20	37,946.06	85.0	19,056.98	154.5	3,511.88	103.1	60,514.92	100.2
21	37,172.62	83.3	18,194.38	147.5	3,460.32	101.6	58,827.32	97.4

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

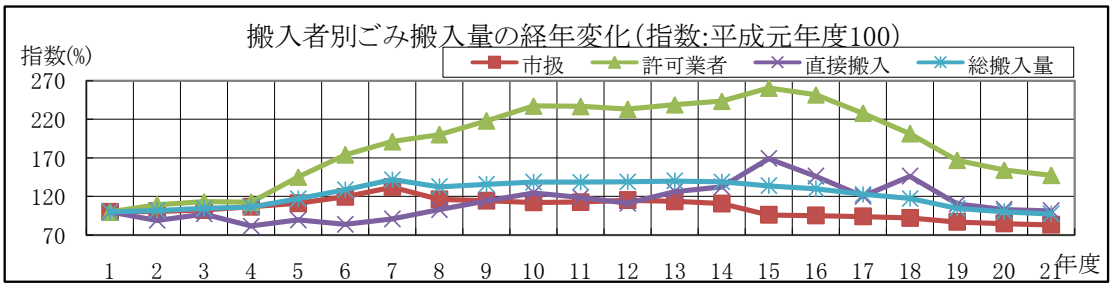

4. ご　み　質

4－1. 可燃ごみの物理組成（重量％・WET基準）

（WET：％）

物理組成 ＼ 月日		5月15日	7月17日	10月23日	1月15日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	35.5	39.0	49.6	47.5	42.8
	植物性厨芥	21.1	25.2	28.4	28.4	25.8
	動物性厨芥	0.8	2.9	1.4	0.2	1.3
	卵殻・骨類	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2
	木・竹類	3.4	0.2	2.1	4.0	2.4
	草・わら類	13.2	17.0	2.7	0.5	8.4
	繊維類	6.7	5.3	3.5	6.5	5.5
	その他（細塵）	1.3	0.8	0.8	0.9	1.0
可燃物計		82.2	90.6	88.8	88.0	87.4
焼却不適物	プラスチック類	16.9	8.5	10.8	11.2	11.9
	ゴム類	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		17.2	8.6	10.8	11.2	12.0
焼却不適物＋可燃物合計		99.4	99.2	99.6	99.2	99.4
不燃物	金属類	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2
	ガラス・陶器類	0.3	0.5	0.0	0.4	0.3
	土・石塊類	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1
不燃物合計		0.6	0.8	0.4	0.8	0.6
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－2. 可燃ごみの物理組成（重量％・DRY基準）

（DRY：％）

物理組成 ＼ 月日		5月15日	7月17日	10月23日	1月15日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	42.9	48.1	60.1	56.5	51.9
	植物性厨芥	7.5	11.2	12.7	10.7	10.5
	動物性厨芥	0.4	1.6	1.1	0.1	0.8
	卵殻・骨類	0.3	0.2	0.4	0.0	0.2
	木・竹類	4.4	0.3	2.3	5.3	3.1
	草・わら類	11.1	17.5	2.1	0.4	7.8
	繊維類	8.1	6.7	4.8	8.4	7.0
	その他（細塵）	1.5	1.0	0.9	1.2	1.2
可燃物計		76.2	86.6	84.4	82.6	82.5
焼却不適物	プラスチック類	22.7	12.1	15.1	16.1	16.4
	ゴム類	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		23.1	12.2	15.1	16.1	16.6
焼却不適物＋可燃物合計		99.3	98.8	99.5	98.7	99.1
不燃物	金属類	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3
	ガラス・陶器類	0.4	0.8	0.0	0.6	0.4
	土・石塊類	0.1	0.3	0.0	0.4	0.2
不燃物合計		0.7	1.2	0.5	1.3	0.9
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

（WET：%）

物理組成 ＼ 年度		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
可燃物	紙・セロファン類	41.5	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5	42.8
	植物性厨芥	18.9	24.3	29.3	23.6	19.8	27.6	28.9	27.1	26.4	30.2	25.8
	動物性厨芥	2.0	0.6	1.9	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.5	4.0	1.3
	卵殻・骨類	0.9	0.2	0.7	0.7	0.5	0.9	1.2	0.5	1.1	0.7	0.2
	木・竹類	3.8	0.7	1.1	2.6	5.6	1.7	1.9	2.8	1.0	2.0	2.4
	草・わら類	11.1	11.7	2.8	3.5	2.3	2.8	2.0	2.8	2.3	5.4	8.4
	繊維類	3.9	4.3	6.6	5.1	7.2	4.7	5.1	7.8	3.6	2.8	5.5
	その他（細塵）	1.2	0.5	2.0	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	0.9	1.6	1.0
可燃物計		83.3	83.3	86.0	86.1	85.4	85.3	84.1	86.4	84.1	83.2	87.4
不焼適物却	プラスチック類	13.9	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8	11.9
	ゴム類	0.2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.5	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.4	0.1
	皮革類	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	＜0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		14.1	13.5	12.9	12.2	13.1	13.7	14.8	11.0	14.0	15.2	12.0
焼却不適物＋可燃物合計		97.4	96.8	98.9	98.3	98.5	99.0	98.9	97.4	98.1	98.4	99.4
不燃物	金属類	1.2	0.5	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	1.6	1.2	0.7	0.2
	ガラス・陶器類	0.3	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	1.0	0.5	0.7	0.3
	土・石塊類	1.1	2.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1
不燃物合計		2.6	3.2	1.1	1.7	1.5	1.0	1.1	2.6	1.9	1.6	0.6
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・DRY基準）

（DRY：%）

物理組成 ＼ 年度		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
可燃物	紙・セロファン類	48.6	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2	51.9
	植物性厨芥	6.4	13.5	8.4	10.3	8.3	13.0	12.7	9.8	11.6	16.9	10.5
	動物性厨芥	1.2	0.4	1.4	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	2.8	0.8
	卵殻・骨類	1.0	0.3	0.9	0.9	0.5	1.2	1.7	0.5	1.4	1.0	0.2
	木・竹類	5.8	0.8	1.6	2.5	5.6	2.3	2.5	3.1	1.4	2.7	3.1
	草・わら類	9.7	8.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	2.2	1.6	3.4	7.8
	繊維類	5.6	6.2	10.2	6.9	10.1	7.3	7.0	10.5	5.1	4.1	7.0
	その他（細塵）	1.0	0.6	2.2	1.4	1.7	1.1	1.0	0.9	0.8	1.7	1.2
可燃物計		79.3	78.8	80.6	82.6	81.2	79.4	78.3	79.8	78.5	75.8	82.5
不焼適物却	プラスチック類	16.5	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4	16.4
	ゴム類	0.3	＜0.1	0.1	＜0.1	0.8	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.7	0.2
	皮革類	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	＜0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		16.8	16.6	17.6	14.7	16.2	18.9	19.8	15.7	18.3	21.1	16.6
焼却不適物＋可燃物合計		96.1	95.4	98.2	97.3	97.4	98.3	98.1	95.5	96.8	96.9	99.1
不燃物	金属類	1.8	0.9	0.8	1.2	1.4	1.0	0.8	2.8	1.9	1.3	0.3
	ガラス・陶器類	0.4	0.7	0.3	1.1	0.8	0.4	0.7	1.7	1.0	1.4	0.4
	土・石塊類	1.7	3.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.1	0.3	0.4	0.2
不燃物合計		3.9	4.6	1.8	2.7	2.6	1.7	1.9	4.5	3.2	3.1	0.9
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準)

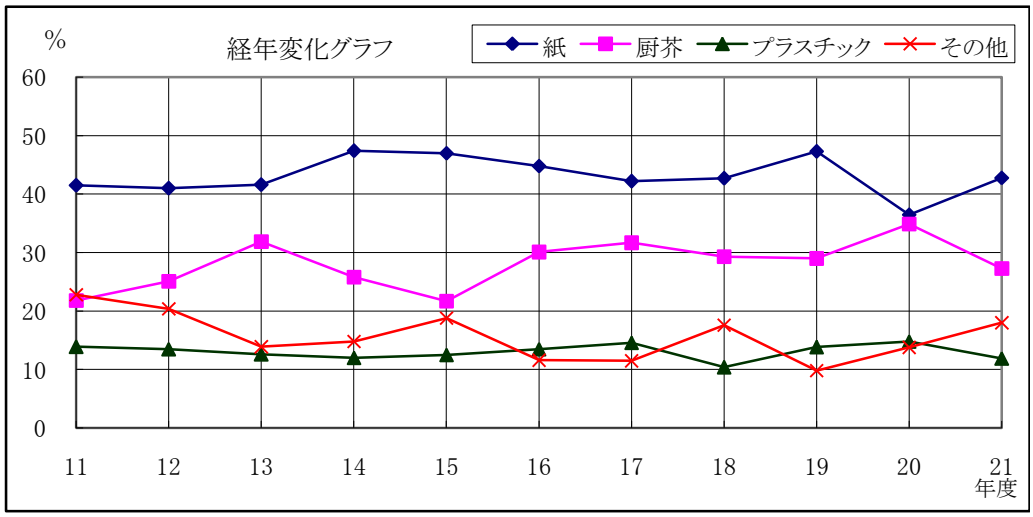

項目＼年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
紙	41.5	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5	42.8
厨　芥	21.8	25.1	31.9	25.8	21.7	30.1	31.7	29.3	29.0	34.9	27.3
プラスチック	13.9	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8	11.9
そ　の　他	22.8	20.4	13.9	14.8	18.8	11.6	11.5	17.6	9.8	13.8	18.0

4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準)

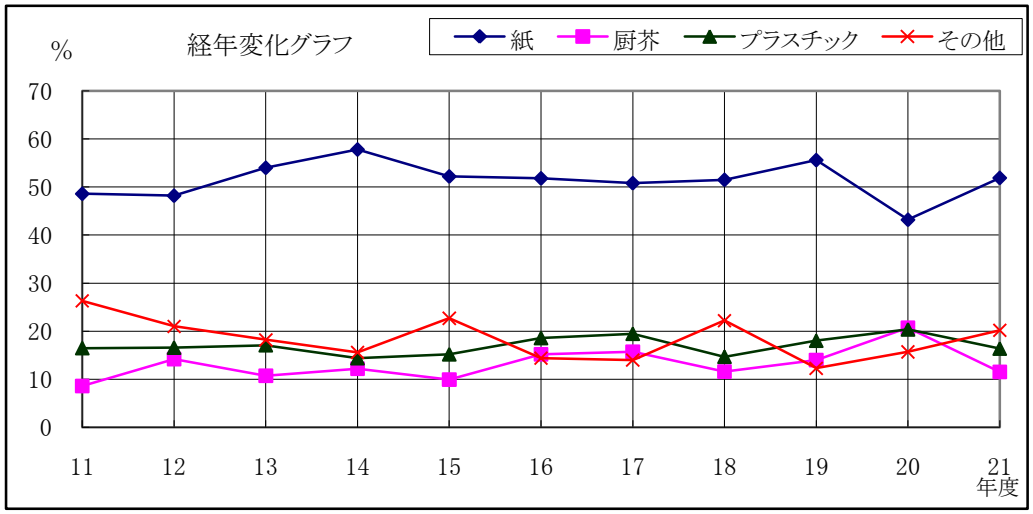

項目＼年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
紙	48.6	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2	51.9
厨　芥	8.6	14.2	10.7	12.2	9.9	15.2	15.7	11.6	14.0	20.7	11.5
プラスチック	16.5	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4	16.4
そ　の　他	26.3	21.0	18.2	15.6	22.7	14.4	14.0	22.2	12.3	15.7	20.2

4－7. 可燃ごみの見掛比重･ごみ質･低位発熱量

項目 ＼ 月日			5月15日	7月17日	10月23日	1月15日	平均値
見掛比重 t/m³			0.157	0.128	0.168	0.137	0.148
ごみ質	可燃分(B) %	プラスチック(Xpl)%	22.9	12.2	15.2	16.3	16.7
		プラスチック以外(Xpa)%	77.1	87.8	84.8	83.7	83.3
			56.7	55.6	55.0	56.6	56.0
	灰分(a)%		5.4	7.0	5.8	7.1	6.3
	水分(W)%		37.9	37.4	39.2	36.3	37.7
低位発熱量 MJ／kg	(1)三成分法による発熱量		9.72	9.55	9.39	9.76	9.61
	(2)ボンブ法による発熱量		9.50	10.63	9.42	10.34	9.97
	(3)四成分法による発熱量		12.11	10.77	10.89	11.44	11.30
	(4)熱精算法による発熱量		10.06	11.15	10.92	10.61	10.69

＊ (1)4．18605(4500×B－600×W)／1000
(2)実測発熱量
(3)4．18605{(8845×Xpl＋4500×Xpa)×B－600×W}／1000
(4)1～4号炉における熱精算法による日平均(運転状況)

4－8. ごみの三成分(可燃分･灰分･水分)の経年変化(%)

区分 ＼ 年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
可燃分	48.8	48.5	49.0	47.9	43.1	47.8	48.5	48.0	46.3	39.5	56.0
灰分	7.3	6.1	5.7	5.5	9.0	5.3	5.1	7.7	5.8	5.8	6.3
水分	43.9	45.4	45.3	46.6	47.9	46.9	46.4	44.3	47.9	54.7	37.7

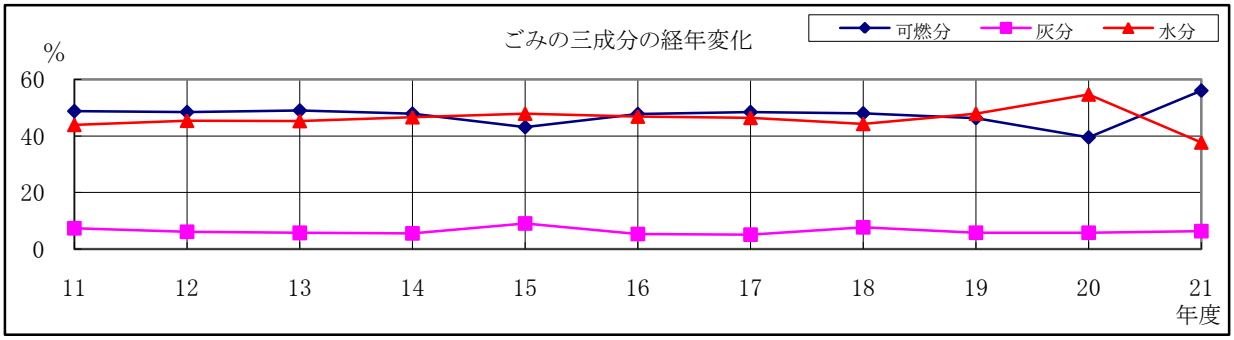

4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ／kg)

区分 ＼ 年度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボンブ法	9.38	9.60	9.50	8.77	9.08	9.36	9.84	9.09	8.73	6.62	9.97
三成分法	8.10	8.01	8.10	7.86	6.93	7.82	7.98	7.92	7.52	6.07	9.61

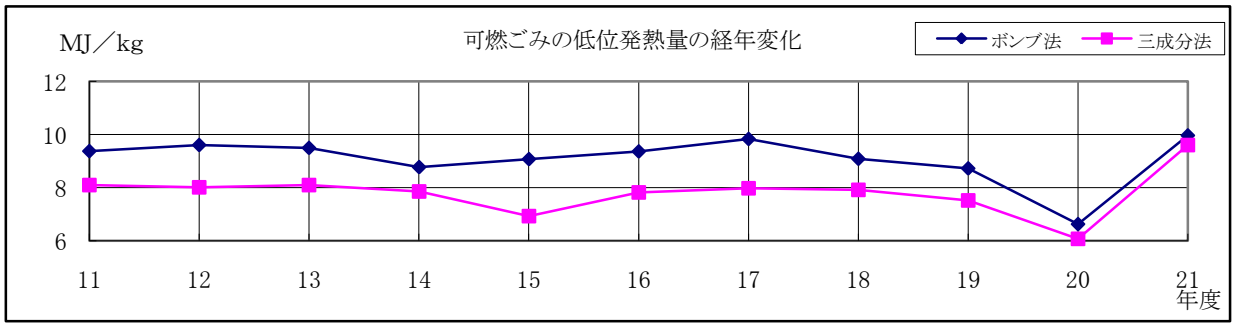

4－10. 不燃ごみの物理組成（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月14日	7月16日	10月13日	1月14日	平均値
可燃物	プラスチック類	48.1	53.6	52.8	46.7	50.3
	ゴム・皮革類	0.9	0.4	0.2	0.0	0.4
	紙類・その他可燃物	11.5	15.8	12.2	26.5	16.5
	細塵・その他	3.8	0.3	3.0	0.4	1.9
可燃物計		64.3	70.1	68.2	73.6	69.1
不燃物	鉄類	15.6	10.7	10.9	10.7	12.0
	非鉄金属類	3.1	2.4	6.1	1.8	3.3
	ガラス類	12.1	8.2	12.8	9.3	10.6
	陶磁器・土・石塊	4.9	8.6	2.0	4.6	5.0
不燃物計		35.7	29.9	31.8	26.4	30.9
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

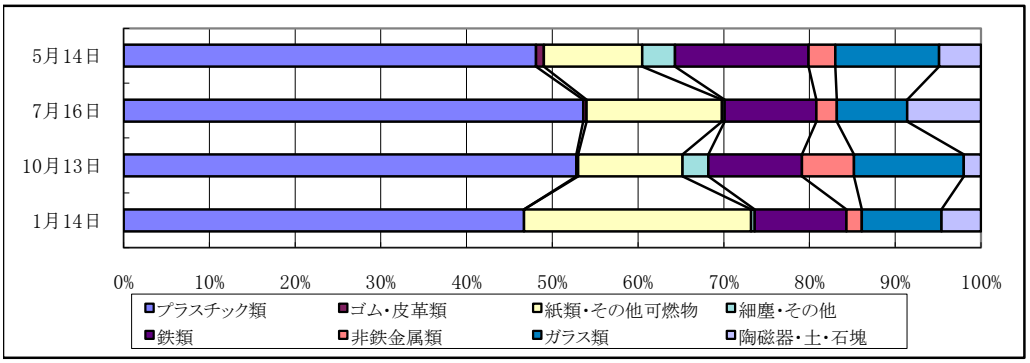

4－11. 不燃ごみの物理組成（重量%・DRY基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月14日	7月16日	10月13日	1月14日	平均値
可燃物	プラスチック類	49.4	54.7	53.4	47.9	51.3
	ゴム・皮革類	1.0	0.4	0.2	0.0	0.4
	紙類・その他可燃物	9.2	14.1	11.0	24.5	14.7
	細塵・その他	3.5	0.2	3.0	0.4	1.8
可燃物計		63.1	69.4	67.6	72.8	68.2
不燃物	鉄類	16.3	11.1	11.1	11.1	12.4
	非鉄金属類	3.3	2.5	6.2	1.9	3.5
	ガラス類	12.6	8.5	13.1	9.7	11.0
	陶磁器・土・石塊	4.7	8.5	2.0	4.5	4.9
不燃物計		36.9	30.6	32.4	27.2	31.8
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

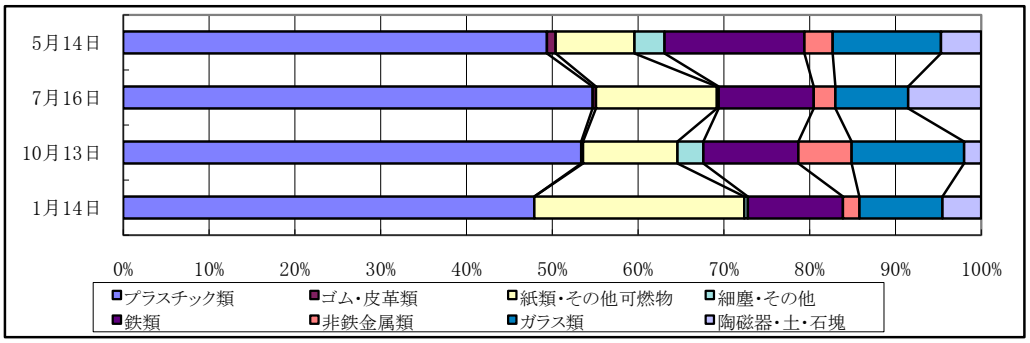

4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 年度		17	18	19	20	21
可燃物	プラスチック類	54.5	56.0	57.5	46.6	50.3
	ゴム・皮革類	1.7	4.8	1.6	6.2	0.4
	紙類・その他可燃物	10.4	4.6	9.9	10.6	16.5
	細塵・その他	0.5	2.1	0.5	0.3	1.9
可燃物計		67.1	67.5	69.5	63.7	69.1
不燃物	鉄類	9.5	9.7	10.6	11.7	12.0
	非鉄金属類	4.5	6.1	3.2	2.4	3.3
	ガラス類	13.0	12.7	13.5	15.9	10.6
	陶磁器・土・石塊	5.9	4.0	3.2	6.3	5.0
不燃物計		32.9	32.5	30.5	36.3	30.9
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

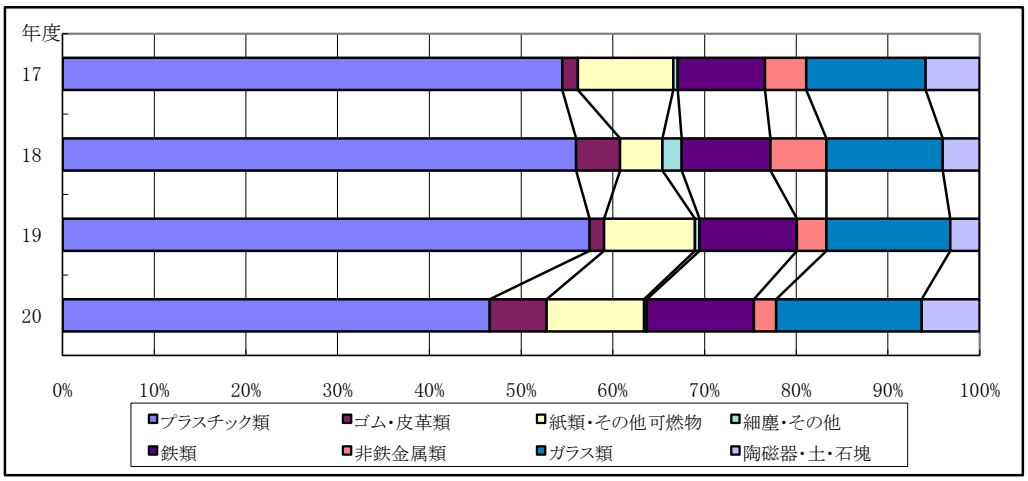

Ⅱ．ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化

1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化

区分	焼却対象ごみ量					焼却量		
	可燃ごみ搬入量	粗大選別可燃物	計	暦日平均	指数	焼却実績量	暦日平均	指数
年度	(t)	(t)	(t)	(t)	(%)	(t)	(t)	(%)
3	202,102.51		202,102.51	552	100.0	193,805.62	530	100.0
4	199,934.65	3,866.40	203,801.05	558	101.1	191,374.40	524	99.0
5	195,923.07	10,697.00	206,620.07	566	102.5	200,208.18	549	103.6
6	196,008.19	11,889.00	207,897.19	570	103.1	196,418.27	538	101.6
7	225,769.12	13,065.90	238,835.02	653	118.2	225,481.22	616	116.3
8	208,147.11	13,364.20	221,511.31	607	109.9	211,344.65	579	109.3
9	210,295.27	13,117.00	223,412.27	612	110.8	216,633.90	594	112.2
10	208,339.32	12,372.20	220,711.52	605	109.5	219,147.59	600	113.4
11	207,858.02	13,383.20	221,241.22	604	109.5	216,929.84	593	111.9
12	208,259.28	14,492.90	222,752.18	610	110.5	218,100.91	598	112.8
13	205,803.06	13,491.90	219,294.96	601	108.8	215,930.21	592	111.7
14	202,855.84	12,640.50	215,496.34	590	106.9	210,631.86	577	109.0
15	196,203.76	12,028.70	208,232.46	569	103.0	207,471.75	567	107.1
16	188,276.59	12,007.70	200,284.29	549	99.4	204,441.12	560	105.8
17	182,363.91	12,668.30	195,032.21	534	96.8	195,784.52	536	101.3
18	181,037.35	13,460.80	194,498.15	533	96.5	196,246.13	538	101.5
19	164,860.19	12,627.20	177,487.39	485	87.8	180,523.54	493	93.1
20	157,935.75	12,826.10	170,761.85	468	84.7	173,770.96	476	89.9
21	151,337.09	13,573.46	164,910.55	452	81.8	167,728.90	460	86.8

※平成10年度からリサイクルボックスに投入された紙類は可燃ごみ搬入量に含まない。

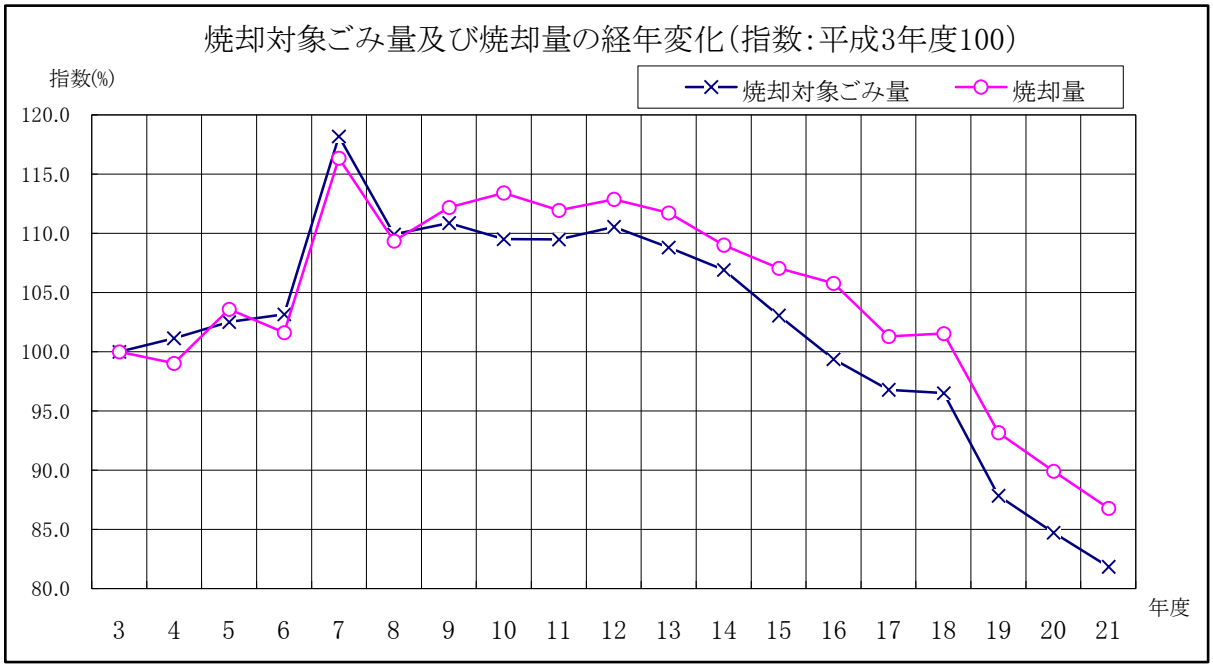

1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化

年度 / 月別	21年度		20年度		19年度		18年度		17年度	
	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)
4	13,398.00	447	14,196.60	473	14,663.12	489	15,369.32	539	16,170.27	512
5	14,144.86	456	15,206.98	491	15,989.71	516	17,705.86	550	17,041.13	571
6	14,774.65	492	14,680.31	489	14,987.86	500	17,282.19	548	16,453.33	576
7	14,947.57	482	15,133.72	488	16,161.86	521	17,348.35	530	16,432.27	560
8	13,953.59	450	14,041.06	453	14,969.89	483	17,622.85	554	17,176.42	568
9	13,033.80	434	14,818.24	494	13,605.50	454	16,276.35	543	16,280.65	543
10	14,419.75	465	14,716.95	475	15,389.21	496	16,414.24	528	16,368.50	529
11	13,650.43	455	13,399.43	447	14,891.96	496	15,641.50	546	16,393.19	521
12	14,965.09	483	16,157.26	521	15,984.98	516	17,511.37	572	17,739.23	565
1	12,495.47	403	13,047.02	421	13,924.09	449	14,790.99	488	15,123.87	485
2	11,281.57	403	11,622.37	415	12,808.85	442	13,324.83	494	13,818.58	476
3	13,845.77	447	13,741.91	443	14,110.36	455	15,210.30	517	16,034.77	491
計	164,910.55	569	170,761.85	569	177,487.39	485	194,498.15	534	195,032.21	534

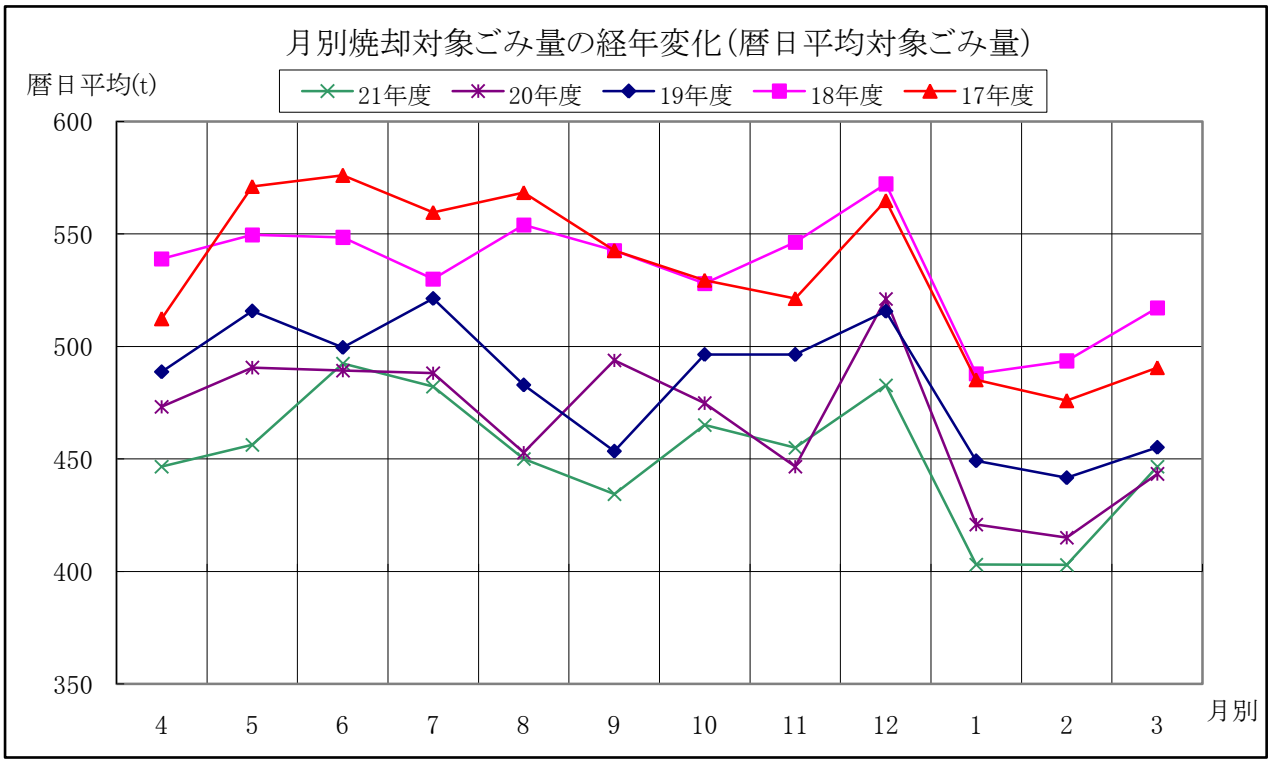

2. 焼 却 関 係

2－1. 焼却炉稼働状況（1～4号炉合計）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均	(最大値)	炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分		分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	12,754.02	490.54	26	1,128	30	606	0	1,734	30	61	4	20	27	5	15
5	15,420.12	497.42	31	750	0	1,481	56	2,231	56	0	0	0	0	0	4
6	14,977.35	499.25	30	0	0	2,162	33	2,162	33	18	23	8	26	0	31
7	13,991.88	451.35	31	480	0	1,469	26	1,949	26	40	33	18	56	0	0
8	14,960.59	482.60	31	1,043	43	1,008	0	2,051	43	0	0	13	31	0	51
9	13,977.09	465.90	30	1,381	4	504	0	1,885	4	19	40	0	0	0	0
10	12,925.52	416.95	31	1,224	27	576	0	1,800	27	39	47	15	38	0	11
11	15,009.09	500.30	30	192	0	1,883	22	2,075	22	0	0	6	6	0	0
12	15,851.30	528.38	30	826	20	1,356	15	2,182	35	40	11	27	11	0	10
1	13,837.27	494.19	28	475	57	1,439	56	1,915	53	80	51	7	28	0	0
2	10,596.84	378.46	28	1,244	31	159	34	1,404	5	21	2	13	42	2	41
3	13,427.83	433.16	31	1,392	0	431	53	1,823	53	38	1	6	1	10	4
計	167,728.90	－	357	10,138	32	13,078	55	23,217	27	359	32	137	26	19	47
平均	13,977.41	469.83	30	844	53	1,089	55	1,934	47	29	58	11	27	1	39
最大	15,851.30	528.38	31	1,392	0	2,162	33	2,231	56	80	51	27	11	10	4
最小	10,596.84	378.46	26	0	0	159	34	1,404	5	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24*4
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
86	46	1,821	16	240	0	0	0	818	44	1,058	44	3	3	1	63.2
0	4	2,232	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	1	75.0
27	20	2,189	53	231	19	0	0	458	48	690	7	1	1	1	76.0
59	29	2,008	55	687	20	0	0	279	45	967	5	2	2	0	67.5
14	22	2,066	5	192	0	0	0	717	55	909	55	0	1	1	69.4
19	40	1,904	44	720	0	0	0	255	16	975	16	1	0	0	66.1
55	36	1,856	3	288	0	0	0	831	57	1,119	57	2	2	1	62.4
6	6	2,081	28	720	0	0	0	78	32	798	32	0	1	0	72.3
67	32	2,250	7	40	11	0	0	685	42	725	53	2	4	1	75.6
88	19	2,004	12	0	0	293	50	677	58	971	48	4	1	0	67.3
37	25	1,441	30	0	0	0	0	1,246	30	1,246	30	1	2	1	53.6
54	6	1,877	59	0	0	0	0	1,842	1	1,842	1	2	1	1	63.1
516	45	23,734	12	3,862	50	293	50	7,893	8	12,049	48	18	18	8	—
43	4	1,977	51	321	54	24	29	657	46	1,004	9	2	2	1	67.7
88	19	2,250	7	744	0	293	50	1,842	1	1,842	1	4	4	1	76.0
0	4	1,441	30	0	0	0	0	0	0	690	7	0	0	0	53.6

2－2. 焼却炉稼働状況(1号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	4,068.59	156.48	26	377	18	202	0	579	18	20	27	7	13	0	0
5	5,012.95	161.71	31	250	0	493	56	743	56	0	0	0	0	0	4
6	4,584.48	152.82	30	0	0	719	29	719	29	0	0	0	0	0	31
7	2,875.10	130.69	22	0	0	460	56	460	56	20	13	12	19	0	0
8	5,121.45	165.21	31	408	0	336	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	5,097.30	169.91	30	552	0	168	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	2,134.59	152.47	14	132	52	192	0	324	52	0	0	8	28	0	0
11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4,355.14	150.18	29	202	55	444	15	647	10	19	34	6	25	0	0
1	4,282.64	152.95	28	159	23	480	0	639	23	20	42	0	0	0	0
2	221.77	110.89	2	0	0	35	0	35	0	0	0	5	10	0	0
3	2,406.45	133.69	18	192	0	153	57	345	57	38	1	6	1	0	0
計	40,160.46	－	261	2,274	28	3,685	33	5,960	1	118	57	45	36	0	35
平均	3,346.71	153.87	22	189	32	307	8	496	40	9	55	3	48	0	3
最大	5,121.45	169.91	31	552	0	719	29	744	0	38	1	12	19	0	31
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2－3. 焼却炉稼働状況(2号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	4,140.77	159.26	26	374	31	202	0	576	31	20	13	4	56	0	0
5	5,142.85	165.90	31	250	0	494	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	4,663.68	155.46	30	0	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0
7	4,820.47	160.68	30	240	0	468	10	708	10	0	0	6	37	0	0
8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2,840.40	149.49	19	420	34	0	0	420	34	19	39	0	0	0	11
11	4,804.32	160.14	30	96	0	624	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	4,811.30	160.38	30	252	8	456	0	708	8	0	0	6	21	0	0
1	1,976.15	0.00	14	0	0	301	14	301	14	20	14	0	0	0	0
2	4,932.76	176.17	28	624	0	48	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	5,350.79	172.61	31	600	0	133	56	733	56	0	0	0	0	10	4
計	43,483.49	－	269	2,857	13	3,447	20	6,304	33	60	6	17	54	10	15
平均	3,623.62	161.65	22	238	6	287	17	525	23	5	0	1	30	0	51
最大	5,350.79	176.17	31	624	0	720	0	744	0	20	14	6	37	10	4
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
27	40	606	58	0	0	0	0	113	2	113	2	1	1	0	84.3
0	4	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
0	31	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
32	32	493	28	0	0	0	0	250	32	250	32	1	1	0	66.3
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
8	28	333	20	48	0	0	0	362	40	410	40	0	1	0	44.8
0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0.0
25	59	673	9	40	11	0	0	30	40	70	51	1	1	0	90.5
20	42	660	5	0	0	0	0	83	55	83	55	1	0	0	88.7
5	10	40	10	0	0	0	0	631	50	631	50	0	1	0	6.0
44	2	389	59	0	0	0	0	354	1	354	1	2	1	0	52.4
165	8	6,125	9	808	11	0	0	1,826	40	2,634	51	6	6	2	―
13	46	510	26	67	21	0	0	152	13	219	34	1	1	0	69.9
44	2	744	0	720	0	0	0	631	50	720	0	2	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
25	9	601	40	0	0	0	0	118	20	118	20	1	1	0	83.6
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
6	37	714	47	0	0	0	0	29	13	29	13	0	1	0	96.1
0	0	0	0	192	0	0	0	552	0	744	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0.0
19	50	440	24	240	0	0	0	63	36	303	36	1	0	1	59.2
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
6	21	714	29	0	0	0	0	29	31	29	31	0	1	0	96.0
20	14	321	28	0	0	0	0	422	32	422	32	1	0	0	43.2
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
10	4	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
88	15	6,392	48	1,152	0	0	0	1,215	12	2,367	12	3	3	2	―
7	21	532	44	96	0	0	0	101	16	197	16	0	0	0	73.0
25	9	744	0	720	0	0	0	552	0	744	0	1	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－4. 焼却炉稼働状況(3号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	1,684.20	168.42	10	202	51	0	0	202	51	20	24	0	0	5	15
5	5,264.32	169.82	31	250	0	494	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	234.48	117.24	2	0	0	36	46	36	46	0	0	8	26	0	0
7	263.93	87.98	3	0	0	36	20	36	20	20	20	0	0	0	0
8	5,310.22	171.30	31	408	0	336	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	5,306.55	176.89	30	552	0	168	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	2,091.36	139.42	15	119	1	192	0	311	1	20	8	7	10	0	0
11	4,385.98	162.44	27	0	0	635	22	635	22	0	0	6	6	0	0
12	967.72	138.25	7	118	41	0	0	118	41	20	37	7	5	0	0
1	2,426.77	151.67	16	157	17	178	42	335	59	22	41	7	28	0	0
2	4,931.76	176.13	28	620	31	12	43	633	14	21	2	0	0	2	41
3	5,670.59	182.92	31	600	0	144	0	744	0	0	0	0	0	0	0
計	38,537.88	－	231	3,028	21	2,233	53	5,262	14	125	12	36	15	7	56
平均	3,211.49	166.83	19	252	22	186	9	438	31	10	26	3	1	0	40
最大	5,670.59	182.92	31	620	31	635	22	744	0	22	41	8	26	5	15
最小	234.48	87.98	2	0	0	0	0	36	20	0	0	0	0	0	0

2－5. 焼却炉稼働状況(4号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	2,860.46	168.26	17	173	50	202	0	375	50	0	0	8	18	0	0
5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5,494.71	183.16	30	0	0	686	18	686	18	18	23	0	0	0	0
7	6,032.38	194.59	31	240	0	504	0	744	0	0	0	0	0	0	0
8	4,528.92	181.16	25	227	43	336	0	563	43	0	0	13	31	0	51
9	3,573.24	178.66	20	277	4	168	0	445	4	19	40	0	0	0	0
10	5,859.17	189.01	31	552	0	192	0	744	0	0	0	0	0	0	0
11	5,818.79	193.96	30	96	0	624	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	5,717.14	190.57	30	252	36	456	0	708	36	0	0	7	20	0	10
1	5,151.71	183.99	28	159	17	480	0	639	17	17	14	0	0	0	0
2	510.55	127.64	4	0	0	63	51	63	51	0	0	8	32	0	0
3	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	45,547.07	－	246	1,978	30	3,712	9	5,690	39	55	17	37	41	1	1
平均	3,795.59	185.15	21	164	53	309	21	474	13	4	36	3	8	0	5
最大	6,032.38	194.59	31	552	0	686	18	744	0	19	40	13	31	0	51
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
25	39	228	30	0	0	0	0	491	30	491	30	1	0	1	31.7
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
8	26	45	12	216	0	0	0	458	48	674	48	0	1	0	6.3
20	20	56	40	687	20	0	0	0	0	687	20	1	0	0	7.6
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
27	18	338	19	0	0	0	0	405	41	405	41	1	1	0	45.5
6	6	641	28	0	0	0	0	78	32	78	32	0	1	0	89.1
27	42	146	23	0	0	0	0	597	37	597	37	1	1	0	19.7
30	9	366	8	0	0	293	50	84	2	377	52	1	1	0	49.2
23	43	656	57	0	0	0	0	15	3	15	3	1	0	1	97.8
0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	100.0
169	23	5,431	37	903	20	293	50	2,875	13	4,072	23	6	5	2	―
14	7	452	38	75	17	24	29	239	36	339	22	1	0	0	62.0
30	9	744	0	687	20	293	50	744	0	744	0	1	1	1	100.0
0	0	45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
8	18	384	8	240	0	0	0	95	52	335	52	0	1	0	53.4
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
18	23	704	41	15	19	0	0	0	0	15	19	1	0	0	97.9
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
14	22	578	5	0	0	0	0	165	55	165	55	0	1	1	77.7
19	40	464	44	0	0	0	0	255	16	255	16	1	0	0	64.5
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
7	30	716	6	0	0	0	0	27	54	27	54	0	1	1	96.3
17	14	656	31	0	0	0	0	87	29	87	29	1	0	0	88.2
8	32	72	23	0	0	0	0	599	37	599	37	0	1	0	10.8
0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0.0
93	59	5,784	38	999	19	0	0	1,976	3	2,975	22	3	4	2	―
7	50	482	3	83	17	0	0	164	40	247	57	0	0	0	66.0
19	40	744	0	744	0	0	0	744	0	744	0	1	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－6. ごみ焼却量と低位発熱量(熱精算法)の経年変化

項目 / 年度	焼却量 (t)	焼却量 指数	焼却量 前年比	低位発熱量 (MJ／kg)	低位発熱量 指数	低位発熱量 前年比
3	193,806	100.0		9.46	100.0	
4	191,374	98.7	98.7	9.91	104.8	104.8
5	200,208	103.3	104.6	9.70	102.5	97.9
6	196,418	101.3	98.1	10.28	108.7	106.0
7	225,481	116.3	114.8	10.47	110.7	101.8
8	211,345	109.0	93.7	10.55	111.5	100.8
9	216,634	111.8	102.5	10.45	110.5	99.1
10	219,148	113.1	101.2	10.55	111.5	101.0
11	216,930	111.9	99.0	10.63	112.4	100.8
12	218,101	112.5	100.5	11.08	117.1	104.2
13	215,930	111.4	99.0	11.28	119.2	101.8
14	210,632	108.7	97.5	11.37	120.2	100.8
15	207,471	107.1	98.5	11.31	119.6	99.5
16	204,441	105.5	98.5	10.96	115.9	96.9
17	195,785	101.0	95.8	11.41	120.6	104.1
18	196,246	101.3	100.2	11.39	120.4	99.8
19	180,524	93.1	92.0	10.97	116.0	96.3
20	173,771	89.7	96.3	10.77	113.8	98.2
21	167,729	86.5	96.5	10.80	114.2	100.3

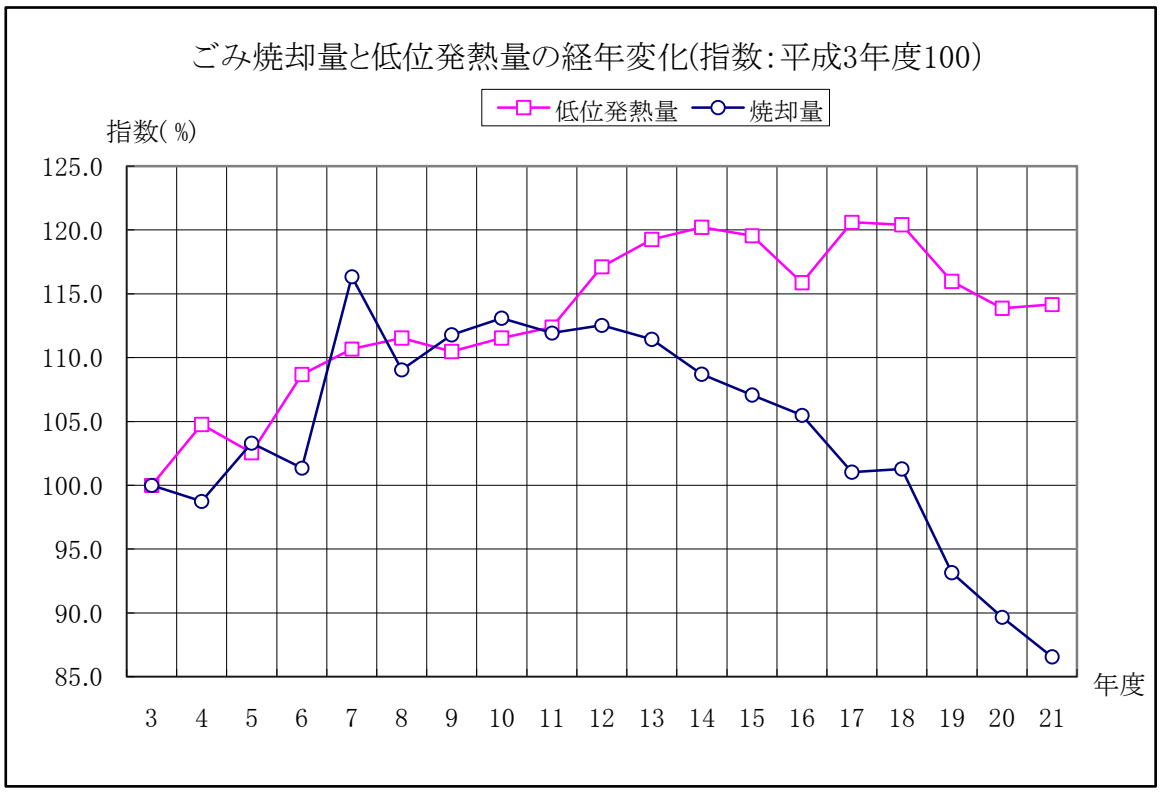

2－7. 月別焼却量の経年変化

年度 / 月別	21年度		20年度		19年度		18年度		17年度	
	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)
4	12,754	425	13,095	437	12,621	421	12,067	402	12,164	405
5	15,420	497	17,050	550	18,075	583	19,438	627	19,094	616
6	14,977	499	15,195	507	15,504	517	19,255	642	17,855	595
7	13,992	451	15,012	484	15,604	503	17,579	567	17,146	553
8	14,961	483	14,890	480	15,758	508	16,307	526	16,745	540
9	13,977	466	13,662	455	14,583	486	17,901	597	16,095	537
10	12,926	417	15,017	484	15,267	492	17,154	553	17,340	559
11	15,009	500	14,241	475	14,705	490	15,525	518	16,565	552
12	15,851	511	16,312	526	16,817	542	16,582	535	16,707	539
1	13,837	446	13,827	446	14,478	467	15,734	508	15,784	509
2	10,597	378	11,003	393	12,076	416	11,953	427	14,236	508
3	13,428	433	14,466	467	15,035	485	16,750	540	16,053	518
計	167,729	460	173,771	476	180,524	493	196,246	538	195,785	536

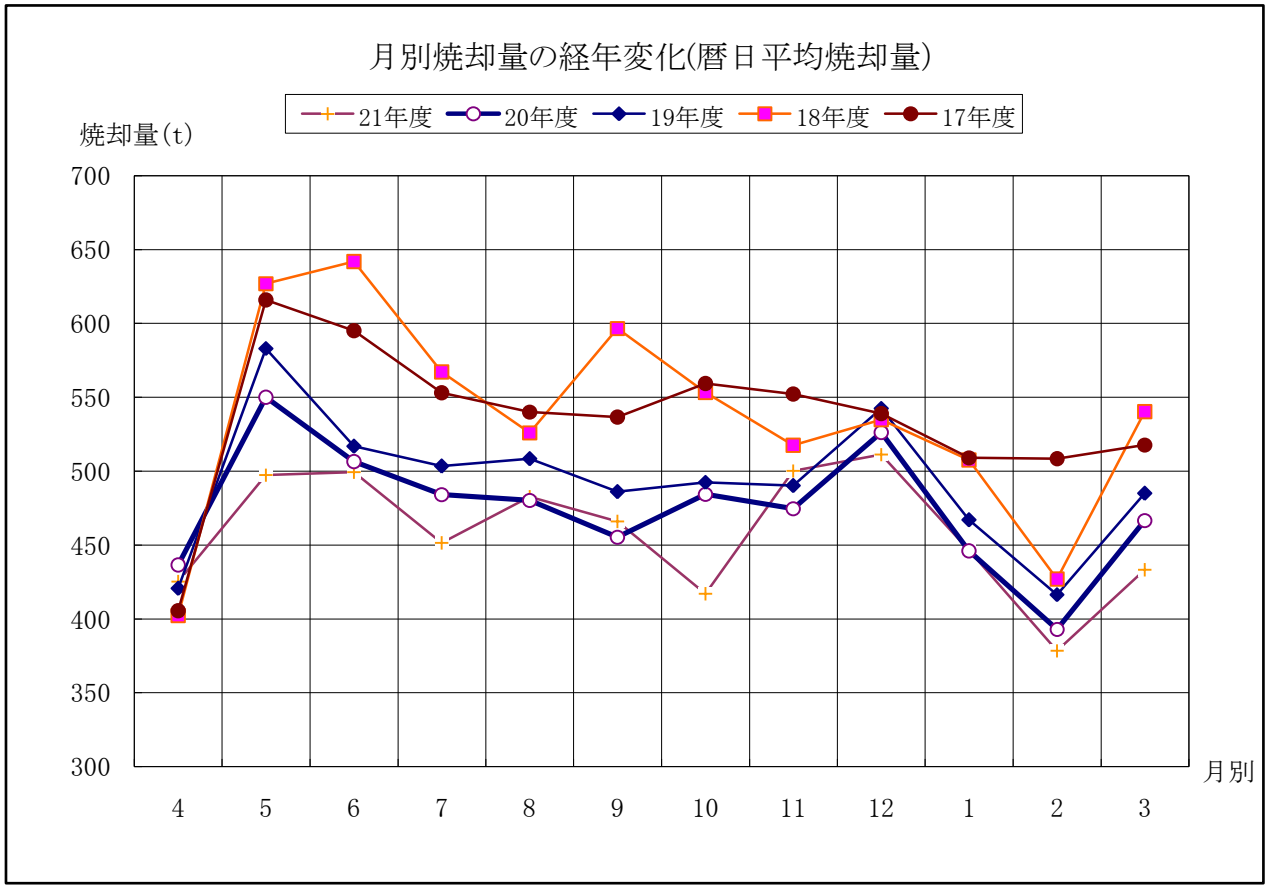

3. 管理薬剤の使用状況

3－1. 管理薬剤使用(購入)実績

項目 月別	液体 苛性ソーダ 48%	塩化 第二鉄	次亜塩素 酸ソーダ	硫酸	ヘラミン 90H-T	重金属捕集剤 エポフロック L1	塩酸 35%
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	12,104	3,560	1,470	0	150	0	39,790
5	11,631	7,140	1,500	3,520	0	0	57,370
6	18,148	6,980	1,470	0	150	0	59,690
7	11,630	7,060	1,520	3,440	0	400	53,710
8	11,585	6,990	1,480	0	0	0	47,830
9	13,070	3,580	1,480	3,530	0	0	46,730
10	16,673	6,990	1,470	3,570	150	0	45,710
11	11,638	7,120	2,970	0	0	0	57,250
12	11,630	3,560	2,950	3,080	0	400	52,720
1	11,609	6,080	1,490	0	150	0	51,530
2	6,544	3,560	2,980	3,710	0	0	41,020
3	13,177	7,070	2,980	0	40	400	58,560
計	149,439	69,690	23,760	20,850	640	1,200	611,910
月平均	12,453	5,808	1,980	1,738	53	100	50,993

項目 月別	塩酸 35% 20kg缶	凝集助剤 EDPﾌﾛｯｸ 351	塩素除去剤 ダイクリーン F504	防食剤 タワークリン S-112	次亜塩素酸 ナトリウム 溶液	防食剤 タワークリン パックマルチ
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(個)
4	0	50	0	0	0	0
5	0	50	20	0	40	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	50	20	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	50	0	0	0	0
10	0	50	20	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	50	20	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	50	0	0	0	0
3	100	0	30	0	0	0
計	100	350	110	0	40	0
月平均	8	29	9	0	3	0

項目 月別	飛灰装置用 ポルトランド セメント	飛灰用 キレート剤 エポルバ810	尿素水 40%	消石灰	特殊反応剤 クリアエイドS	重金属捕集剤 ジオスタ L-310
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	30,520	14,150	30,830	62,120	30,560	16,630
5	40,470	14,150	30,560	82,040	30,150	16,520
6	30,220	13,220	40,390	92,660	33,820	24,830
7	40,740	10,700	40,370	110,440	29,980	16,530
8	40,760	14,220	30,310	97,280	42,840	24,880
9	28,400	13,250	30,320	69,860	23,000	16,550
10	10,010	14,140	30,380	79,760	30,400	16,650
11	20,290	13,630	40,650	93,480	34,850	16,590
12	28,280	10,550	30,440	100,680	30,090	20,880
1	15,940	13,990	30,400	82,820	19,680	13,620
2	19,170	10,580	20,260	52,200	25,000	16,830
3	35,200	14,110	20,270	72,080	20,220	16,500
計	340,000	156,690	375,180	995,420	350,590	217,010
月平均	28,333	13,058	31,265	82,952	29,216	18,084

4. ボイラー・タービン関係

4－1. ボイラー運転状況（1～4号炉合計）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数（最大値）	起動回数	停止回数	灯油使用量	
											助燃バーナー	温水ボイラー
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)	(ℓ)
4	12,754.02	11,100	39,986.2	66.8	53.9	1,844	52	26	3	3	10,192	640
5	15,420.12	10,809	46,679.0	66.6	60.9	2,232	0	31	0	0	0	0
6	14,977.35	10,582	48,310.5	70.6	65.1	2,160	24	30	1	1	4,776	0
7	13,991.88	10,435	43,771.8	70.6	57.1	2,037	5	31	2	2	6,317	0
8	14,960.59	10,808	46,593.9	68.6	60.7	2,057	56	31	0	1	0	0
9	13,977.09	10,938	42,861.5	67.3	57.7	1,895	37	30	1	0	5,545	0
10	12,925.52	10,951	43,439.9	71.9	56.6	1,875	21	31	2	2	6,557	0
11	15,009.09	10,475	46,907.7	70.2	63.2	2,081	59	30	0	1	0	0
12	15,851.30	10,604	48,626.8	67.1	63.4	2,230	39	30	2	4	6,800	6,239
1	13,837.27	10,684	43,544.3	69.5	56.8	1,972	38	28	4	1	15,041	832
2	10,596.84	10,842	30,167.3	65.7	43.5	1,435	58	28	1	2	3,200	0
3	13,427.83	11,327	39,198.9	62.3	51.1	1,865	5	31	2	1	6,809	0
計	167,728.90	―	520,087.8	―	―	23,689	34	357	18	18	65,237	7,711
平均	13,977.41	10,796	43,340.7	68.1	57.50	1,974	8	30	2	2	5,436	643

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（1～3号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

=

$$\text{ボイラー利用率（4号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－2. ボイラー運転状況（1号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	4,068.59	11,100	12,495.1	66.3	71.12	613	10	26	1	1	3,851
5	5,012.95	10,793	15,417.5	67.8	84.93	744	0	31	0	0	0
6	4,584.48	10,581	14,675.3	71.6	83.53	720	0	30	0	0	0
7	2,875.10	10,393	8,976.4	71.1	49.45	503	55	22	1	1	3,393
8	5,121.45	10,744	15,386.2	66.4	84.76	744	0	31	0	0	0
9	5,097.30	11,006	15,053.1	63.6	85.68	720	0	30	0	0	0
10	2,134.59	10,645	6,772.3	70.3	37.31	332	35	14	0	1	0
11	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
12	4,355.14	10,552	13,235.2	68.7	72.91	666	32	28	1	1	3,427
1	4,282.64	10,663	13,274.1	68.7	73.12	651	28	28	1	0	3,533
2	221.77	10,547	685.2	68.4	4.03	44	30	2	0	1	0
3	2,406.45	11,504	7,467.2	65.0	41.13	377	5	16	2	1	5,967
計	40,160.46	―	123,437.6	―	―	6,117	15	258	6	6	20,171
平均	3,346.71	9,877	10,286.5	62.3	57.33	509	46	22	1	1	1,681

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－3. ボイラー運転状況（2号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	4,140.77	11,132	12,286.1	63.7	69.93	617	14	26	1	1	2,840
5	5,142.85	10,710	15,305.8	66.1	84.31	744	0	31	0	0	0
6	4,663.68	10,513	14,259.0	68.8	81.16	720	0	30	0	0	0
7	4,820.47	10,481	13,934.3	65.6	76.76	717	40	30	0	1	0
8	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
9	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
10	2,840.40	11,047	9,471.9	72.4	52.18	447	36	19	1	0	2,813
11	4,804.32	10,374	14,545.1	68.8	82.79	720	0	30	0	0	0
12	4,811.30	10,478	14,047.2	66.1	77.38	714	53	30	0	1	0
1	1,976.15	10,216	5,828.4	68.9	32.11	314	20	14	1	0	3,252
2	4,932.76	11,056	13,623.7	59.3	80.22	672	0	28	0	0	0
3	5,350.79	11,239	15,102.9	59.8	83.20	744	0	31	0	0	842
計	43,483.49	―	128,404.4	―	―	6,411	43	269	3	3	9,747
平均	3,623.62	8,937	10,700.4	55.0	60.00	534	19	22	0	0	812

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－4. ボイラー運転状況（3号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	1,684.20	10,674	4,606.7	61.1	26.22	235	29	10	1	0	3,501
5	5,264.32	10,924	15,955.7	65.8	87.89	744	0	31	0	0	0
6	234.48	10,482	728.9	67.4	4.15	45	50	2	0	1	0
7	263.93	10,278	757.3	71.2	4.17	71	30	3	1	0	2,924
8	5,310.22	11,085	16,011.7	64.9	88.20	744	0	31	0	0	0
9	5,306.55	11,022	15,687.6	63.6	89.30	720	0	30	0	0	0
10	2,091.36	11,116	6,794.7	69.8	37.43	351	10	15	1	1	3,744
11	4,385.98	10,551	13,374.6	68.2	76.13	641	59	27	0	1	0
12	967.72	10,827	2,640.6	60.0	14.55	138	55	6	1	1	3,373
1	2,426.77	10,770	7,351.8	66.6	40.50	360	28	16	1	1	3,152
2	4,931.76	11,162	14,171.9	61.6	83.45	650	20	28	1	0	3,200
3	5,670.59	11,239	16,628.8	62.0	91.60	744	0	31	0	0	0
計	38,537.88	―	114,710.3	―	―	5,447	41	230	6	5	19,894
平均	3,211.49	10,844	9,559.2	65.2	53.63	453	58	19	1	0	1,658

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－5. ボイラー運転状況（4号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	2,860.46	11,495	10,598.3	76.1	49.23	378	59	16	0	1	0
5	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
6	5,494.71	10,751	18,647.3	74.7	86.62	674	34	29	1	0	4,776
7	6,032.38	10,587	20,103.8	74.5	90.37	744	0	31	0	0	0
8	4,528.92	10,594	15,196.0	74.5	68.31	569	56	24	0	1	0
9	3,573.24	10,786	12,120.8	74.8	56.30	455	37	19	1	0	5,545
10	5,859.17	10,996	20,401.0	75.1	91.71	744	0	31	0	0	0
11	5,818.79	10,501	18,988.0	73.5	88.20	720	0	30	0	0	0
12	5,717.14	10,559	18,703.8	73.4	84.08	710	19	30	0	1	0
1	5,151.71	10,618	17,090.0	73.7	76.82	646	22	27	1	0	5,104
2	510.55	10,603	1,686.5	73.6	8.10	69	8	3	0	1	0
3	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
計	45,547.07	―	153,535.5	―	―	5,712	55	240	3	4	15,425
平均	3,795.59	8,958	12,794.6	62.0	58.31	476	5	20	0	0	1,285

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－6. タービン稼働状況

項目	蒸　気	蒸気発生量	1号タービン（2000KW）						2号タ		
	発生量	――――	運転	運転時間		タービン	発生蒸気	発電量	運転	運転時間	
		焼却量	日数			入口蒸気量	利用率		日数		
	(A)					(ア)	(ア／A)	(B)			
月別	(t)	(t)	(日)	(時間)	(分)	(t)	(%)	(kwh)	(日)	(時間)	(分)
4	39,986.2	3.14	17	365	43	4,821.3	12.06	245,708	25	575	40
5	46,679.0	3.03	11	250	45	3,224.6	6.91	165,974	31	744	0
6	48,310.5	3.23	29	682	27	8,279.7	17.14	406,205	30	720	0
7	43,771.8	3.13	6	124	31	1,460.5	3.34	71,223	31	744	0
8	46,593.9	3.11	24	563	23	7,418.1	15.92	393,299	31	744	0
9	42,861.5	3.07	13	287	9	3,548.2	8.28	176,674	30	720	0
10	43,439.9	3.36	0	0	0	0.0	0.00	0	31	740	8
11	46,907.7	3.13	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
12	48,626.8	3.07	10	215	14	4,717.0	9.70	298,979	30	708	24
1	43,544.3	3.15	8	167	52	2,392.8	5.50	131,756	27	634	14
2	30,167.3	2.85	0	0	0	0.0	0.00	0	28	672	0
3	39,198.9	2.92	10	209	31	2,733.9	6.97	142,865	31	744	0
計	520,087.8	37.16	128	2,866	35	38,596.1	―	2,032,683	355	8,466	26
月平均	43,340.7	3.10	11	238	53	3,216.3	7.42	169,390	30	705	32
最大	48,626.8	3.36	29	682	27	8,279.7	17.14	406,205	31	744	0
最小	30,167.3	2.85	0	0	0	0.0	0.00	0	25	575	40

ービン（5000KW）			合計（7000KW）			蒸気	1kwh	
タービン入口蒸気量（イ）	発生蒸気利用率（イ／A）	発電量（C）	タービン入口蒸気量（ア＋イ）＝（ウ）	発生蒸気利用率（ウ／A）	発電量（B＋C）	1トン当り発電量	当り蒸気消費量	発電量／焼却量
(t)	(%)	(kwh)	(t)	(%)	(kwh)	(kwh／t)	(kg／kwh)	(kwh／t)
28,845.9	72.14	2,373,722	33,667.2	84.20	2,619,430	77.8	12.85	205.4
36,454.8	78.10	2,991,197	39,679.4	85.00	3,157,171	79.6	12.57	204.7
33,636.7	69.63	2,732,127	41,916.4	86.76	3,138,332	74.9	13.36	209.5
35,723.7	81.61	2,915,428	37,184.2	84.95	2,986,651	80.3	12.45	213.5
32,887.6	70.58	2,630,670	40,305.7	86.50	3,023,969	75.0	13.33	202.1
33,367.3	77.85	2,707,949	36,915.5	86.13	2,884,623	78.1	12.80	206.4
36,445.5	83.90	2,983,944	36,445.5	83.90	2,983,944	81.9	12.21	230.9
38,826.7	82.77	3,252,265	38,826.7	82.77	3,252,265	83.8	11.94	216.7
36,359.1	74.77	3,025,984	41,076.1	84.47	3,324,963	80.9	12.35	209.8
33,753.8	77.52	2,818,304	36,146.6	83.01	2,950,060	81.6	12.25	213.2
24,978.1	82.80	1,895,594	24,978.1	82.80	1,895,594	75.9	13.18	178.9
30,080.3	76.74	2,344,304	32,814.2	83.71	2,487,169	75.8	13.19	185.2
401,359.5	—	32,671,488	439,955.6	—	34,704,171	—	—	—
33,446.6	77.37	2,722,624	36,663.0	84.59	2,892,014	78.9	12.68	206.9
38,826.7	83.90	3,252,265	41,916.4	86.76	3,324,963	83.8	13.36	230.9
24,978.1	69.63	1,895,594	24,978.1	82.77	1,895,594	74.9	11.94	178.9

4－7. 純水及び薬剤使用実績

項目 / 月別	純水使用量	純水使用量 暦日平均	苛性ソーダ（24%）	塩酸	亜硫酸ソーダ	ヘラミン 90H-T
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(kg)	(kg)
4	1,685.6	56.19	3.60	2.80	8	44
5	2,177.3	70.24	4.10	3.20	10	49
6	2,133.6	71.12	4.10	3.20	8	43
7	2,002.0	64.58	4.10	3.20	10	44
8	2,193.5	70.76	3.60	2.80	8	43
9	1,829.1	60.97	4.05	3.15	8	44
10	1,806.5	58.27	4.05	3.15	10	45
11	1,959.8	65.33	3.60	2.80	8	51
12	2,144.4	69.17	4.50	3.50	8	51
1	1,806.7	58.28	3.60	2.80	10	58
2	1,516.7	54.17	2.70	2.10	8	38
3	1,832.4	59.11	4.10	3.20	10	50
計	23,087.6	—	46.10	35.90	106	560
月平均	1,924.0	63.08	3.84	2.99	9	47

5. 洗煙装置関係

5－1. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計）

項目	1～4号炉合計													
	洗煙装置稼働時焼却量（A）	稼働日数（最大値）	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	12,754.02	26	1,821	16	1,058	44	1,058	44	0	0	0	0	0	0
5	15,420.12	31	2,232	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	14,977.35	30	2,189	53	690	7	690	7	0	0	0	0	0	0
7	13,991.88	31	2,008	55	967	5	967	5	0	0	0	0	0	0
8	14,960.59	31	2,066	5	909	55	909	55	0	0	0	0	0	0
9	13,977.09	30	1,904	44	975	16	975	16	0	0	0	0	0	0
10	12,925.52	31	1,856	3	1,119	57	1,119	57	0	0	0	0	0	0
11	15,009.09	30	2,081	28	798	32	798	32	0	0	0	0	0	0
12	15,851.30	30	2,250	7	725	53	725	53	0	0	0	0	0	0
1	13,837.27	28	2,004	12	971	48	971	48	0	0	0	0	0	0
2	10,596.84	28	1,441	30	1,246	30	1,246	30	0	0	0	0	0	0
3	13,427.27	31	1,877	54	354	6	354	1	0	0	0	5	0	0
計	167,728.34	357	23,734	7	10,561	53	10,561	48	0	0	0	5	0	0
月平均	13,977.36	30	1,977	51	880	9	880	9	0	0	0	0	0	0

5－2. 洗煙装置稼働実績(1号炉)

項目	1　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	4,068.59	26	606	58	113	2	113	2	0	0	0	0	0	0
5	5,012.95	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4,584.48	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2,875.10	22	493	28	250	32	250	32	0	0	0	0	0	0
8	5,121.45	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5,097.30	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2,134.59	14	333	20	410	40	410	40	0	0	0	0	0	0
11	0.00	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	4,355.14	29	673	9	70	51	70	51	0	0	0	0	0	0
1	4,282.64	28	660	5	83	55	83	55	0	0	0	0	0	0
2	221.77	2	40	10	631	50	631	50	0	0	0	0	0	0
3	2,406.45	18	389	59	354	1	354	1	0	0	0	0	0	0
計	40,160.46	261	6,125	9	2,634	51	2,634	51	0	0	0	0	0	0
月平均	3,346.71	22	510	26	219	34	219	34	0	0	0	0	0	0

5－3. 洗煙装置稼働実績(2号炉)

項目	2　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	4,140.77	26	601	40	118	20	118	20	0	0	0	0	0	0
5	5,142.85	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4,663.68	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4,820.47	30	714	47	29	13	29	13	0	0	0	0	0	0
8	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	0.00	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	2,840.40	19	440	24	303	36	303	36	0	0	0	0	0	0
11	4,804.32	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4,811.30	30	714	29	29	31	29	31	0	0	0	0	0	0
1	1,976.15	14	321	28	422	32	422	32	0	0	0	0	0	0
2	4,932.76	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5,350.23	31	743	55	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
計	43,482.93	269	6,392	43	2,367	17	2,367	12	0	0	0	5	0	0
月平均	3,623.58	22	532	44	197	16	197	16	0	0	0	0	0	0

5－4. 洗煙装置稼働実績(3号炉)

項目	3　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	1,684.20	10	228	30	491	30	491	30	0	0	0	0	0	0
5	5,264.32	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	234.48	2	45	12	674	48	674	48	0	0	0	0	0	0
7	263.93	3	56	40	687	20	687	20	0	0	0	0	0	0
8	5,310.22	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5,306.55	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2,091.36	15	338	19	405	41	405	41	0	0	0	0	0	0
11	4,385.98	27	641	28	78	32	78	32	0	0	0	0	0	0
12	967.72	7	146	23	597	37	597	37	0	0	0	0	0	0
1	2,426.77	16	366	8	377	52	377	52	0	0	0	0	0	0
2	4,931.76	28	656	57	15	3	15	3	0	0	0	0	0	0
3	5,670.59	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	38,537.88	231	5,431	37	3,328	23	3,328	23	0	0	0	0	0	0
月平均	3,211.49	19	452	38	277	22	277	22	0	0	0	0	0	0

5－5. 洗煙装置稼働実績(4号炉)

項目	4　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	2,860.46	17	384	8	335	52	335	52	0	0	0	0	0	0
5	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	5,494.71	30	704	41	15	19	15	19	0	0	0	0	0	0
7	6,032.38	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4,528.92	25	578	5	165	55	165	55	0	0	0	0	0	0
9	3,573.24	20	464	44	255	16	255	16	0	0	0	0	0	0
10	5,859.17	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5,818.79	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5,717.14	30	716	6	27	54	27	54	0	0	0	0	0	0
1	5,151.71	28	656	31	87	29	87	29	0	0	0	0	0	0
2	510.55	4	72	23	599	37	599	37	0	0	0	0	0	0
3	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	45,547.07	246	5,784	38	2,231	22	2,231	22	0	0	0	0	0	0
月平均	3,795.59	21	482	3	185	57	185	57	0	0	0	0	0	0

5－6. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績

項目	3% 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量 FS－710	焼却量 1ﾄﾝ当り 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量	稼働率 洗煙装置稼働時間／焼却炉稼働時間					稼働率 洗煙装置稼働時焼却量／総焼却量				
	(B)	(B／A)	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(㎥)	(㎥)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	341.06	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	322.93	0.02	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0
6	366.44	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7	264.46	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8	273.52	0.02	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0
9	284.35	0.02	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0
10	341.10	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11	275.86	0.02	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0
12	305.29	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	280.93	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	189.41	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3	263.19	0.02	100.0	99.9	100.0	－	99.9	100.0	100.0	100.0	－	100.0
計	3,508.54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	292.38	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

5－7. 洗煙装置暦日数平均稼働率

項目	稼働率 洗煙装置稼働日数／暦日数					稼働率 洗煙装置稼働時間／暦日数×24時間				
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	86.7	86.7	33.3	56.7	65.8	84.3	83.6	31.7	53.4	63.2
5	100.0	100.0	100.0	0.0	75.0	100.0	100.0	100.0	0.0	75.0
6	100.0	100.0	6.7	100.0	76.7	100.0	100.0	6.3	97.9	76.0
7	71.0	96.8	9.7	100.0	69.4	66.3	96.1	7.6	100.0	67.5
8	100.0	0.0	100.0	80.6	70.2	100.0	0.0	100.0	77.7	69.4
9	100.0	0.0	100.0	66.7	66.7	100.0	0.0	100.0	64.5	66.1
10	45.2	61.3	48.4	100.0	63.7	44.8	59.2	45.5	100.0	62.4
11	0.0	100.0	90.0	100.0	72.5	0.0	100.0	89.1	100.0	72.3
12	93.5	96.8	22.6	96.8	77.4	90.5	96.0	19.7	96.3	75.6
1	90.3	45.2	51.6	90.3	69.4	88.7	43.2	49.2	88.2	67.3
2	7.1	100.0	100.0	14.3	55.4	6.0	100.0	97.8	10.8	53.6
3	58.1	100.0	100.0	0.0	64.5	52.4	100.0	100.0	0.0	63.1
計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	71.5	73.7	63.3	67.4	69.0	69.9	73.0	62.0	66.0	67.7

6. 排水処理関係

6－1. 排水処理実績

項目	放流水量						排水処理関係薬剤使用量					
	総放流水量 FRS-708	暦日平均	プラント放流水量 FRS-707	暦日平均	生活排水等（余熱利用施設排水量含）	暦日平均	苛性ソーダ 3%	硫酸	塩化第二鉄	凝集助剤EDP 351	次亜塩素酸ソーダ	重金属捕集剤 L－1
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	20,021.0	667.4	9,512.7	317.1	10,508.3	350.3	28,271	1,490	3,230	18,200	1,120	1,690
5	18,426.7	594.4	11,669.5	376.4	6,757.2	218.0	48,303	1,290	4,720	22,400	1,310	2,640
6	18,796.2	626.5	11,741.3	391.4	7,054.9	235.2	52,253	1,000	4,650	21,000	1,520	2,840
7	21,420.4	691.0	11,315.7	365.0	10,104.7	326.0	63,224	1,050	4,300	21,000	1,240	2,410
8	24,000.8	774.2	11,398.7	367.7	12,602.1	406.5	54,335	1,220	4,150	22,400	1,580	2,310
9	23,738.7	791.3	10,469.0	349.0	13,269.7	442.3	45,492	1,590	4,020	21,000	1,080	2,020
10	20,257.8	653.5	10,707.0	345.4	9,550.8	308.1	46,081	1,120	3,800	19,600	1,520	1,960
11	17,033.6	567.8	10,887.5	362.9	6,146.1	204.9	47,978	1,000	3,850	21,000	2,650	2,170
12	15,819.9	510.3	10,358.3	334.1	5,461.6	176.2	44,854	1,110	3,750	19,600	2,300	3,560
1	15,997.4	516.0	9,679.5	312.2	6,317.9	203.8	36,877	1,590	3,450	19,600	1,530	2,150
2	15,481.1	552.9	9,310.9	332.5	6,170.2	220.4	50,653	700	3,300	16,800	1,710	2,050
3	17,948.0	579.0	10,758.2	347.0	7,189.8	231.9	48,994	1,050	3,700	21,000	1,840	2,180
計	228,941.6	―	127,808.3	―	101,133.3	―	567,315	14,210	46,920	243,600	19,400	27,980
月平均	19,078.5	625.5	10,650.7	349.2	8,427.8	276.3	47,276	1,184	3,910	20,300	1,617	2,332

6－2. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績

項目	脱水機				処理薬剤
	汚泥供給量 FS-709	脱水機運転時間		脱水汚泥排出量	ジオスタ L-310
月別	(㎥)	(時間)	(分)	(kg)	(kg)
4	28.94	8	12	3,850	16,875.0
5	29.32	12	38	3,190	21,060.0
6	24.53	7	32	1,840	21,195.0
7	25.40	4	5	5,710	19,440.0
8	0.00	0	0	0	19,710.0
9	0.65	0	21	0	17,820.0
10	22.49	6	54	4,080	17,347.5
11	8.04	3	56	810	19,372.5
12	20.84	9	26	1,890	19,575.0
1	23.75	15	38	3,500	15,255.0
2	20.22	15	2	4,180	10,732.5
3	23.82	11	1	4,160	14,985.0
計	228.00	94	45	33,210	213,367.5
月平均	19.00	7	54	2,768	17,780.6

7. 電力関係

7－1. 電力使用実績

項目 / 月別	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	発電量 DCS B (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 A＋B＝C (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	（売電）取引メータ D (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)
4	203,860	283	2,619,430	3,638	2,823,290	3,921	786,584	1,092
5	13,230	18	3,157,171	4,244	3,170,401	4,261	885,756	1,191
6	14,980	21	3,138,332	4,359	3,153,312	4,380	928,902	1,290
7	30,360	41	2,986,651	4,014	3,017,011	4,055	854,980	1,149
8	41,100	55	3,023,969	4,064	3,065,069	4,120	861,951	1,159
9	40,816	57	2,884,623	4,006	2,925,439	4,063	868,737	1,207
10	26,099	35	2,983,944	4,011	3,010,043	4,046	915,442	1,230
11	8,637	12	3,252,265	4,517	3,260,902	4,529	1,070,811	1,487
12	69,942	94	3,324,963	4,469	3,394,905	4,563	1,110,185	1,492
1	168,694	227	2,950,060	3,965	3,118,754	4,192	977,094	1,313
2	125,841	187	1,895,594	2,821	2,021,435	3,008	193,635	288
3	110,117	148	2,487,169	3,343	2,597,286	3,491	417,732	561
計	853,676	－	34,704,171	－	35,557,847	－	9,871,809	－
月平均	71,140	97	2,892,014	3,962	2,963,154	4,059	822,651	1,127

項目 / 月別	総需要電力量								電力自給率 B－D / C－D
	ごみ焼却施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	粗大ごみ処理施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	余熱利用施設電力使用量 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	(%)
4	1,769,643	2,458	161,819	225	57,636	80	1,989,098	2,763	90.0
5	1,967,024	2,644	182,412	245	85,793	115	2,235,229	3,004	99.4
6	1,898,082	2,636	191,902	267	88,023	122	2,178,007	3,025	99.3
7	1,857,758	2,497	198,905	267	60,680	82	2,117,343	2,846	98.6
8	1,888,154	2,538	178,562	240	91,731	123	2,158,447	2,901	98.1
9	1,776,264	2,467	160,449	223	75,609	105	2,012,322	2,795	98.0
10	1,787,244	2,402	199,941	269	60,607	81	2,047,792	2,752	98.8
11	1,886,440	2,620	162,549	226	88,423	123	2,137,412	2,969	99.6
12	1,984,045	2,667	185,714	250	64,165	86	2,233,924	3,003	96.9
1	1,854,587	2,493	178,369	240	62,733	84	2,095,689	2,817	92.1
2	1,634,537	2,432	164,951	245	4,979	7	1,804,467	2,685	93.1
3	1,941,113	2,609	186,497	251	20,725	28	2,148,335	2,888	94.9
計	22,244,891	－	2,152,070	－	761,104	－	25,158,065	－	－
月平均	1,853,741	2,539	179,339	246	63,425	87	2,096,505	2,872	96.7

8. 市水・工水・防臭薬剤関係

8－1. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績

項目	市水					
	使用水量		認定使用水量			
	(管理月報)	暦日平均	伊丹市水道局	暦日平均	豊中市水道局	暦日平均
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	9,098.9	303.3	20,494.0	336.0	40.2	1.3
5	11,408.8	368.0		—	37.5	1.2
6	10,366.5	345.6	20,668.0	338.8	51.6	1.7
7	10,060.8	324.5		—	52.2	1.7
8	11,127.8	359.0	23,004.0	377.1	57.5	1.9
9	10,728.1	357.6		—	63.3	2.1
10	10,082.6	325.2	20,025.0	328.3	59.8	1.9
11	10,500.3	350.0		—	44.2	1.5
12	10,636.6	343.1	20,623.0	332.6	39.9	1.3
1	9,651.0	311.3		—	35.2	1.1
2	8,856.2	316.3	17,866.0	297.8	36.0	1.3
3	11,452.1	369.4		—	47.0	1.5
計	123,969.7	—	122,680.0	—	564.4	—
月平均	10,330.8	339.6	20,446.7	336.1	47.0	1.6

*伊丹市水道局の認定市水量は、2ヶ月分です。(例) 4・5月は3/10～5/10の使用量です。

項目	工水						
	使用水量		認定使用水量		基本使用水量		超過水量
	(管理月報)	暦日平均	(伊丹市水道局)	暦日平均	(伊丹市水道局)	暦日平均	(伊丹市水道局)
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	17,527.0	584.2	18,848.00	628.27	48,000	1,600	0
5	19,869.0	640.9	24,244.00	782.06	49,600	1,600	0
6	17,070.0	569.0	22,842.00	761.40	48,000	1,600	0
7	16,886.0	544.7	21,210.00	684.19	49,600	1,600	0
8	18,943.0	611.1	21,690.00	699.68	49,600	1,600	0
9	18,914.0	630.5	23,734.00	791.13	48,000	1,600	0
10	15,419.0	497.4	17,338.00	559.29	49,600	1,600	0
11	16,581.0	552.7	18,445.00	614.83	48,000	1,600	0
12	17,976.0	579.9	17,064.00	550.45	49,600	1,600	0
1	15,513.0	500.4	20,609.00	664.81	49,600	1,600	0
2	16,594.0	592.6	19,029.00	679.61	44,800	1,600	0
3	19,505.0	629.2	24,359.00	785.77	49,600	1,600	0
計	210,797.0	—	249,412.00	—	584,000	—	0
月平均	17,566.4	577.5	20,784.33	683.32	48,667	1,600	0

項目	防臭薬剤			
	ﾗﾊﾞﾄﾘｱﾝ PS(粉末)	ﾗﾊﾞﾄﾘｱﾝ KY(香料)	オフナック VP(殺虫剤)	強力無臭元 T
月別	(kg)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	－	－	－	0
5	－	－	－	0
6	－	－	－	0
7	－	－	－	0
8	－	－	－	0
9	－	－	－	0
10	－	－	－	0
11	－	－	－	0
12	－	－	－	0
1	－	－	－	0
2	－	－	－	0
3	－	－	－	0
計	－	－	－	0
月平均	－	－	－	0

9. 焼却残渣(灰)関係

9－1. 飛灰安定化装置稼働実績

(東)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	165.3	11.1	35.6	6,354	91	36
5	156.6	10.5	38.9	4,742	86	43
6	177.3	11.8	42.0	5,334	98	36
7	195.6	13.0	44.6	6,642	108	49
8	173.4	16.1	37.9	5,918	96	20
9	249.3	17.6	53.1	8,783	137	46
10	172.9	11.9	38.5	5,811	95	57
11	157.5	10.7	36.2	4,880	88	2
12	140.7	9.0	28.8	3,881	73	58
1	158.3	10.7	33.0	4,585	87	57
2	154.1	10.4	35.0	4,456	85	21
3	156.7	10.6	37.0	5,900	86	51
計	2,057.7	143.4	460.6	67,286	1,137	56
月平均	171.5	12.0	38.4	5,607	94	50

(西)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	126.4	8.8	45.2	5,159	88	24
5	176.0	12.2	61.3	7,358	120	54
6	132.4	9.2	47.5	5,647	92	43
7	111.4	7.8	40.6	4,146	77	20
8	154.0	10.8	56.0	5,522	106	8
9	65.5	5.0	23.4	2,637	45	14
10	104.2	7.2	35.5	4,276	73	19
11	159.1	11.0	54.0	6,448	108	52
12	200.8	31.1	70.4	7,500	133	19
1	130.3	12.1	40.1	4,455	84	12
2	109.9	10.5	32.2	3,515	67	30
3	194.8	10.8	47.9	5,083	111	14
計	1,664.8	136.5	554.1	61,746.0	1,109	9
月平均	138.7	11.4	46.2	5,145.5	92	26

9－2. 焼却残渣(灰)処分実績

項目	焼却残渣(灰)処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	126	1,157	53.3	114	1,014	46.7	240	2,171	100	2,469	87.9
5	149	1,390	58.3	109	993	41.7	258	2,383	100	2,664	89.5
6	144	1,359	59.5	100	925	40.5	244	2,284	100	2,389	95.6
7	150	1,412	63.1	89	826	36.9	239	2,238	100	2,499	89.6
8	155	1,456	68.5	73	671	31.5	228	2,127	100	2,210	96.2
9	151	1,457	68.3	70	675	31.7	221	2,132	100	2,189	97.4
10	158	1,497	73.3	58	544	26.7	216	2,041	100	2,460	83.0
11	174	1,646	73.9	61	582	26.1	235	2,228	100	2,109	105.6
12	192	1,827	75.0	64	610	25.0	256	2,437	100	2,682	90.9
1	137	1,328	68.3	64	617	31.7	201	1,945	100	2,354	82.6
2	123	1,182	70.5	52	494	29.5	175	1,676	100	1,679	99.8
3	155	1,461	70.6	65	607	29.4	220	2,068	100	2,324	89.0
計	1,814	17,172		919	8,558		2,733	25,730		28,028	
月平均	151	1,431	66.7	77	713	33.3	228	2,144	100	2,336	92.3

9－3. 焼却残渣(灰)測定結果

項目	焼却残渣(灰)測定結果											
	1号炉		2号炉		3号炉		4号炉		全体		灰ﾋﾟｯﾄ	
	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	2.0	38.0	3.9	45.9	2.6	38.5	—	—	2.8	40.8	6.7	31.8
5	2.9	38.8	3.8	44.8	3.8	40.9	—	—	3.5	41.5	6.8	25.5
6	4.5	43.0	3.9	41.3	—	—	7.0	56.4	5.1	46.9	4.2	26.9
7	5.1	44.1	4.0	38.1	—	—	3.1	38.1	4.1	40.1	7.1	36.4
8	5.0	47.2	—	—	7.2	53.1	5.4	46.8	5.9	49.0	6.3	30.4
9	6.3	47.9	—	—	5.7	39.9	3.8	37.6	5.3	41.8	5.8	33.3
10	4.9	50.3	7.2	65.9	5.2	48.8	7.1	55.8	6.1	55.2	—	—
11	—	—	4.7	46.3	5.6	45.2	4.3	47.1	4.9	46.2	4.8	30.7
12	4.3	39.3	6.9	55.3	—	—	6.0	61.6	5.7	52.1	8.9	24.7
1	4.1	45.3	3.3	37.3	—	—	4.0	47.7	3.8	43.4	2.7	31.1
2	2.0	24.6	2.8	31.1	4.1	39.5	3.2	46.3	3.0	35.4	6.0	32.9
3	4.3	44.7	2.8	33.8	6.7	51.7	—	—	4.6	43.4	5.4	28.9
平均	4.1	42.1	4.3	44.0	5.1	44.7	4.9	48.6	4.6	44.7	5.9	30.2
最大	6.3	50.3	7.2	65.9	7.2	53.1	7.1	61.6	6.1	55.2	8.9	36.4
最小	2.0	24.6	2.8	31.1	2.6	38.5	3.1	37.6	2.8	35.4	2.7	24.7

10. 公害関係

10－1. 敷地境界線における臭気測定結果（悪臭防止法に基づく）

（単位：ppm）

測定項目＼測定点	測定日： 平成21年 8月24日（月）				
	東 側	西 側	南 側	北 側	基準値
アンモニア	N. D.	0.2	0.1	0.1	1
メチルメルカプタン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.002
硫化水素	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.01
二硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
トリメチルアミン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.005
アセトアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.05
プロピオンアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
イソブチルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
イソバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.003
イソブタノール	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.9
酢酸エチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	3
メチルイソブチルケトン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
トルエン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	10
スチレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.4
キシレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
プロピオン酸	N. D.	N. D.	N. D.	0.005	0.03
ノルマル酪酸	0.0004	0.0005	0.0001	0.0006	0.001
ノルマル吉草酸	N. D.	0.00017	N. D.	0.00013	0.0009
イソ吉草酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.001
臭気指数	＜10	＜10	＜10	＜10	―

※臭気指数の単位：希釈倍数で無次元
※定量下限値未満はNDとした。

測定箇所概略図

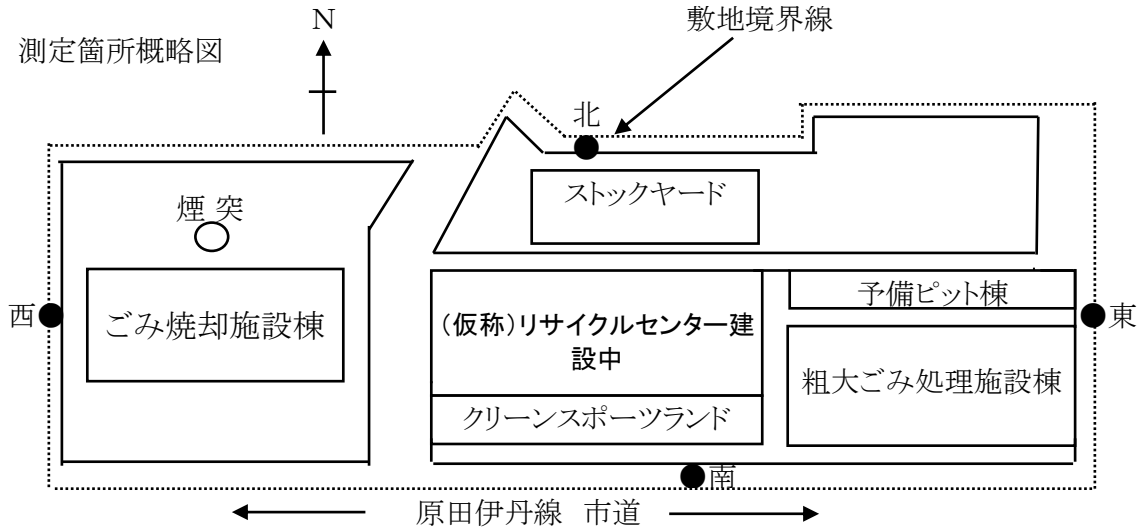

10－2. 排ガス関係測定結果　　（大気汚染防止法に基づく）

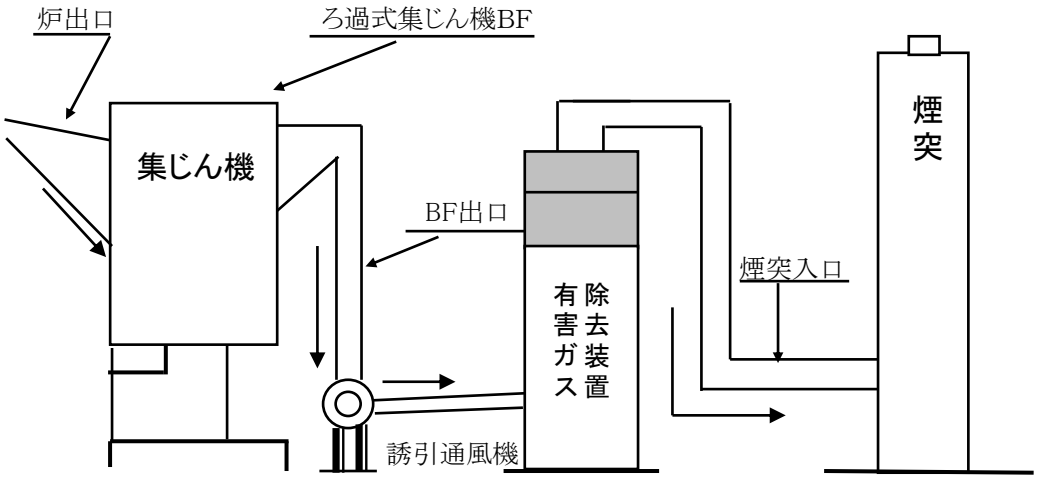

○ばいじん量

炉 出 口　　(g/Nm³)

測定炉	1月
1号炉	1.5
2号炉	1.2
3号炉	1.6
4号炉	1.2

BF出口　　(g/Nm³)

測 定 炉	7月	1月
1 号 炉	<0.001	<0.001
2 号 炉	<0.001	<0.001
3 号 炉	<0.001	<0.001
4 号 炉	<0.001	<0.001

煙突入口　　(g/Nm³)

測定炉	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
1号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08
2号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
3号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
4号炉	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	

※ 4号炉5月記入分は6月測定結果、3，4号炉7月記入分は8月測定結果、2，4号炉9月記入分は10月測定結果
1号炉11月記入分は12月測定結果、3号炉1月記入分は2月測定結果

（全炉、年平均）



◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物

1号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	50,400
排ガス量(dry)	Nm³／h	42,300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	370
いおう酸化物	Nm³／h	1.0
	cm³／Nm³	24

1号炉集じん機出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	56,100	50,300
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,200	42,100
塩化水素	※ mg／Nm³	7.3	81
いおう酸化物	Nm³／h	0.65	0.42
	cm³／Nm³	14	10

1号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	12月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	71,700	73,500	70,400	66,400	65,200	76,600	
排ガス量(dry)	Nm³／h	51,900	52,600	49,800	47,300	46,500	53,100	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.7	5.3	4.1	5.2	5.1	4.8	
	※cm³／Nm³	80	97	66	110	110	88	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.5	700
いおう酸化物	Nm³／h	<0.03	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	8.92 ～ 9.65
	cm³／Nm³	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

2号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	60,400
排ガス量(dry)	Nm³／h	51,900
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	390
いおう酸化物	Nm³／h	1.1
	cm³／Nm³	22

2号炉集じん機出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	58,400	63,600
排ガス量(dry)	Nm³／h	48,300	52,500
塩化水素	※ mg／Nm³	11	20
いおう酸化物	Nm³／h	0.36	0.11
	cm³／Nm³	7.5	2.1

2号炉煙突入口

項	目	5月	7月	10月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	77,700	73,600	77,000	70,300	83,100	85,600	
排ガス量(dry)	Nm³／h	57,000	52,800	53,600	50,200	57,700	58,400	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.7	5.3	5.4	4.1	5.5	5.6	
	※cm³／Nm³	110	110	120	100	110	91	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	1.5	2.0	1.2	1.1	＜0.5	1.1	700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	9.32～ 10.26
	cm³／Nm³	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

3号炉炉出口

項	目	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	70,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	51,500
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	360
いおう酸化物	Nm³／h	1.3
	cm³／Nm³	25

3号炉集じん機出口

項	目	8月	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	49,800	75,100
排ガス量(dry)	Nm³／h	40,200	51,100
塩化水素	※ mg／Nm³	13	58
いおう酸化物	Nm³／h	0.03	0.31
	cm³／Nm³	0.7	6.0

3号炉煙突入口

項	目	5月	8月	9月	11月	2月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	64,100	63,700	65,000	67,200	80,900	76,700	
排ガス量(dry)	Nm³／h	47,400	46,100	47,000	48,300	57,300	53,900	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.2	5.1	4.7	4.3	5.7	5.2	
	※cm³／Nm³	96	98	79	85	100	77	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	1.2	1.0	0.6	0.9	0.7	0.5	700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.02	0.06	＜0.02	＜0.02	＜0.03	＜0.03	8.86～9.95
	cm³／Nm³	＜0.5	1.3	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

4号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	50,300
排ガス量(dry)	Nm³／h	42,900
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	450
いおう酸化物	Nm³／h	0.77
	cm³／Nm³	18

4号炉集じん機出口

項	目	8月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	59,600	50,100
排ガス量(dry)	Nm³／h	47,300	42,000
塩化水素	※ mg／Nm³	9.0	28
いおう酸化物	Nm³／h	0.03	0.42
	cm³／Nm³	0.6	10

4号炉煙突入口

項	目	6月	8月	10月	11月	1月		規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	61,800	69,400	64,500	66,600	68,800		
排ガス量(dry)	Nm³／h	45,500	50,300	44,200	47,500	48,700		
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.5	4.8	4.4	5.7	5.4		
	※cm³／Nm³	98	80	85	97	100		250
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	0.5	0.6	1.1	0.4	0.5		700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.02	＜0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02		3.51 ～ 3.69
	cm³／Nm³	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5		

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

（全炉、年平均）

排ガス量
wet 57,900 Nm³/h
dry 46,200 Nm³/h

塩化水素 28 mg/Nm³
SOx 6.4 cm³/Nm³

有害ガス除去装置

（洗 煙 塔 ）

除去率
塩化水素 97.8 %
SOx 95.3 %

排ガス量
wet 71,300 Nm³/h
dry 50,700 Nm³/h

◎塩化水素 0.63 mg/Nm³
◎SOx 0.30 cm³/Nm³

◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量

項目（稼働炉数）		5月(3)	7月(2)	9月(2)
窒素酸化物（NOx）	Nm³／h	14.6	10.6	8.8
いおう酸化物（SOx）	Nm³／h	＜0.08	＜0.06	＜0.04

項目（稼働炉数）		11月 (3)	1月(3)	3月(3)	総量規制値
NOx	Nm³／h	14.1	16.0	15.6	39.28
SOx	Nm³／h	＜0.07	＜0.07	＜0.09	19.35

10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口）

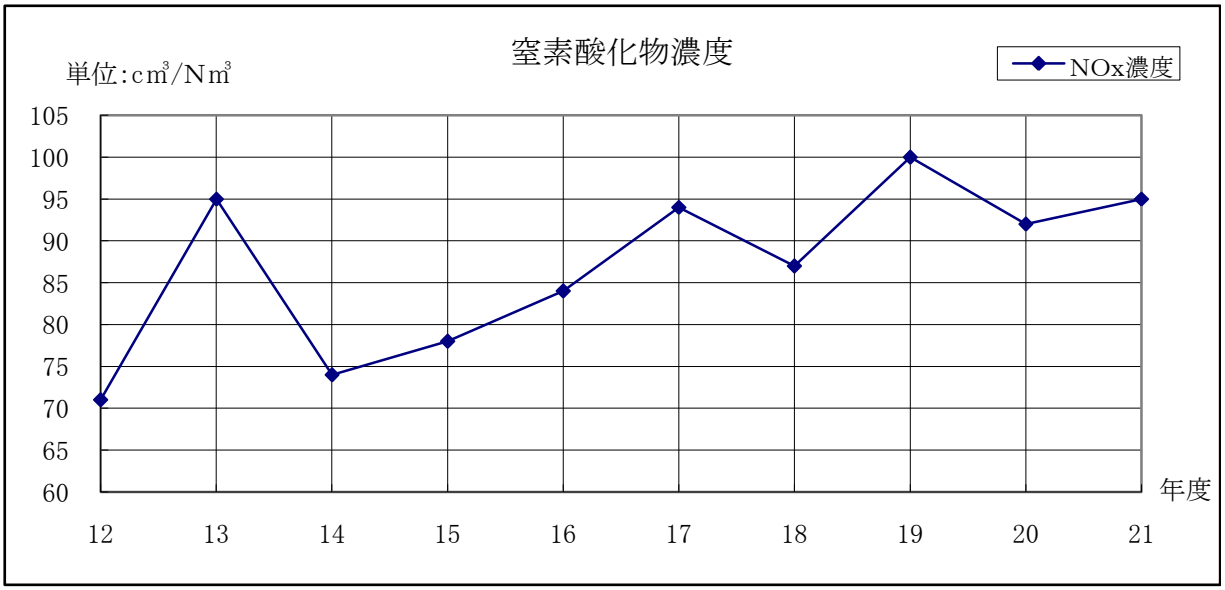

年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NOx 濃度	71	95	74	78	84	94	87	100	92	95

10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

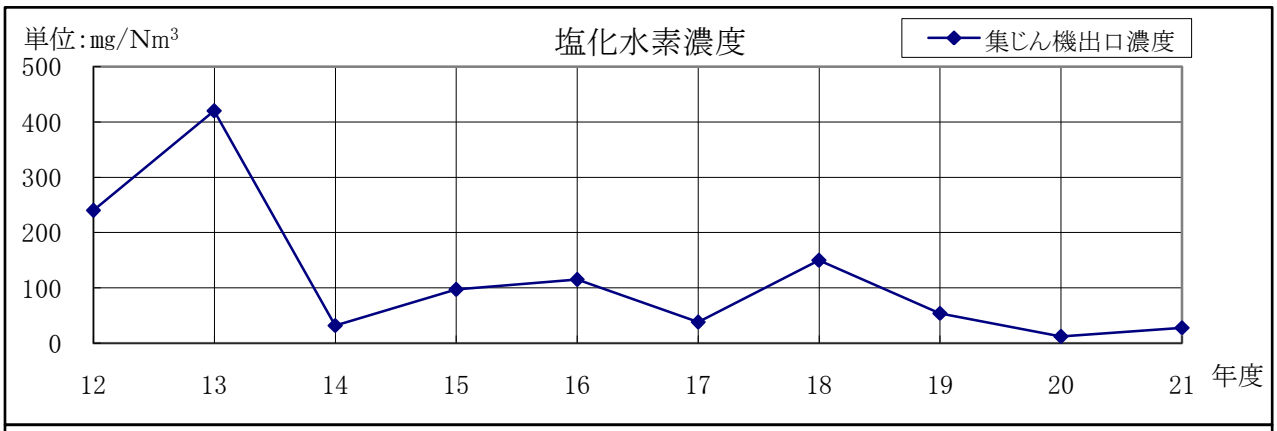

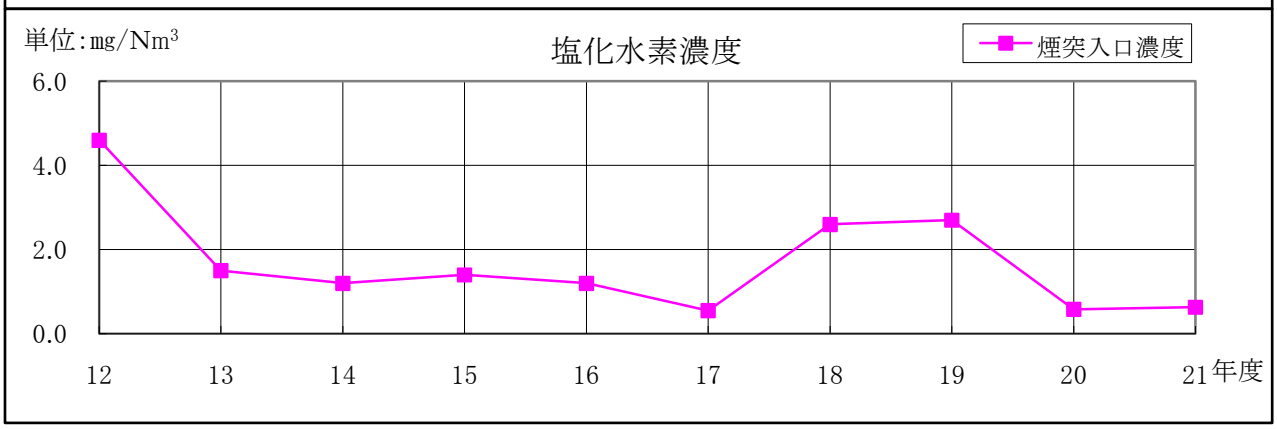

年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
集じん機出口濃度	240	420	32	97	115	38	150	54	12	28
煙突入口濃度	4.6	1.5	1.2	1.4	1.2	0.55	2.6	2.7	0.58	0.63
除去率（％）	98.1	99.6	96.3	98.6	99.0	98.6	98.3	95.0	95.2	97.8

10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

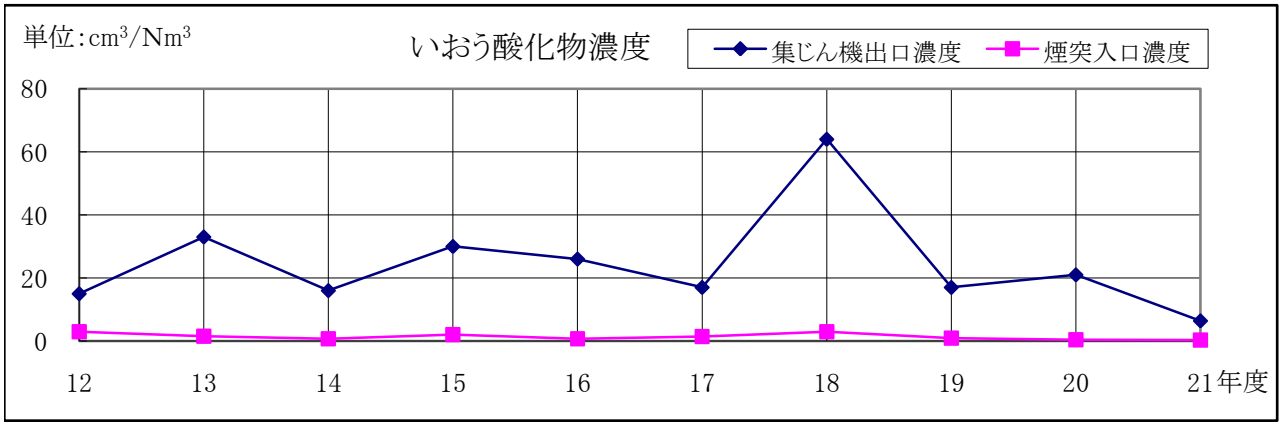

年　　度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
集じん機出口濃度	15	33	16	30	26	17	64	17	21	6.4
煙突入口濃度	2.9	1.5	0.66	2.0	0.66	1.4	2.9	0.89	0.36	0.30
除　去　率	80.7	95.5	95.9	93.3	97.5	91.7	95.5	94.8	98.3	95.3

10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む)

(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく)

		1 号 炉	2 号 炉
測 定 日		9月14日	10月28日
当日分	焼 却 量 t／日	177.55	140.84
	炉出口温度 ℃	904	905
	集じん機入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	73	61
	湿り排ガス量 Nm³/h	70,400	77,000
	乾き排ガス量 Nm³/h	49,800	53,600
	平均水分量 %	29.2	30.3
	酸素濃度 (4時間平均値) %	9.9	12.6
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	14	11
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.001	<0.001
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.073	0.059

		3 号 炉	4 号 炉
測 定 日		9月14日	10月28日
当日分	焼 却 量 t／日	184.98	155.48
	炉出口温度 ℃	885	1046
	集じん機入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	70	66
	湿り排ガス量 Nm³/h	65,000	64,500
	乾き排ガス量 Nm³/h	47,000	44,200
	平均水分量 %	27.8	31.5
	酸素濃度 (4時間平均値) %	9.6	9.6
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	19	13
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.001	<0.001
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.038	0.098

● 基準値 (ng-TEQ/Nm³)

	1, 2, 3号炉	4 号 炉
大気汚染防止法 平成10年12月 1日～平成14年11月30日	80	80
〃 平成14年12月 1日～	1	1
ガイドライン恒久対策	1	0.5

10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化 （煙突入口）

基準値:1ng-TEQ/Nm³

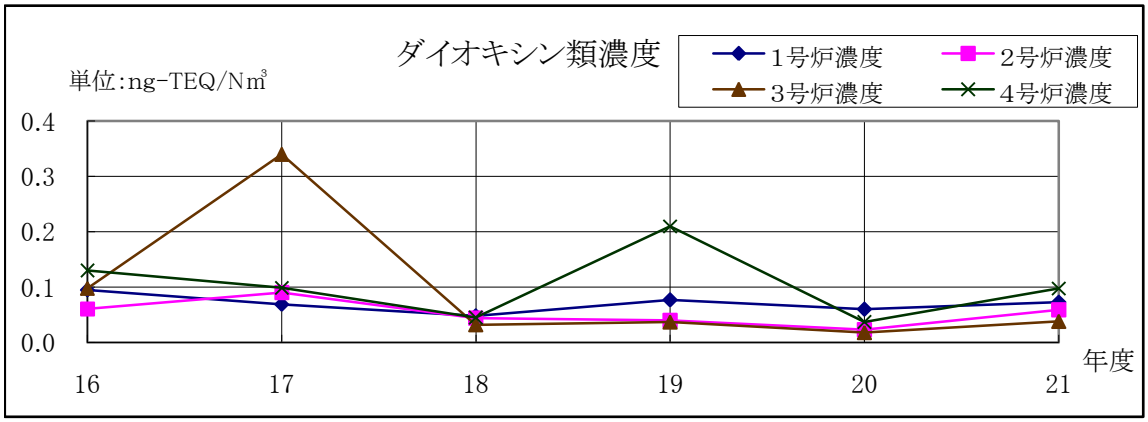

年 度	16	17	18	19	20	21
1 号 炉 濃 度	0.095	0.069	0.048	0.077	0.060	0.073
2 号 炉 濃 度	0.061	0.090	0.044	0.040	0.023	0.059
3 号 炉 濃 度	0.098	0.34	0.032	0.037	0.018	0.038
4 号 炉 濃 度	0.13	0.099	0.045	0.21	0.037	0.098

※毒性等価係数について、平成20年度よりWHO（2006）－TEFを適用

10－8. その他のダイオキシン類測定結果（コプラナーPCB含む）

（ダイオキシン類対策特別措置法に基づく）

①ばいじん及び焼却灰関係

サンプル	測定日	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 ng-TEQ/g	基準値
1 号 炉 焼 却 灰	9月14日	0.0055	3ng-TEQ/g
2 号 炉 焼 却 灰	10月28日	0.018	
3 号 炉 焼 却 灰	9月14日	0.0038	
4 号 炉 焼 却 灰	10月28日	0.012	
東 側 バ グ 灰 固 化 物	10月28日	0.84	
西 側 バ グ 灰 固 化 物	9月14日	0.38	
脱 水 ケ ー キ	9月14日	0.11	
ピ ッ ト 残 灰	9月14日	0.0031	

②排水関係

サンプル	測定日	浮遊物質量 mg/ℓ	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 pg-TEQ/ℓ	基準値
※下水放流水	12月9日	7.5	0.31	10pg-TEQ/ℓ
西側放流水	9月14日	3.0	0.19	
東側放流水	9月14日	N. D.	0.40	

※下水放流水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時の流量、1系11㎥/h、2系3㎥/h、総放流46㎥/h

10－9. 排水関係測定結果　　（下水道法に基づく）

①原水水質測定結果

●洗灰処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	20.9	29.2	30.0	31.3	33.7	30.4	24.6	24.8	19.2	16.0	19.0	18.5
水素イオン濃度	11.0	11.1	10.1	10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	11.6	11.3	11.2	11.4
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	70	50	94	60	66	30	86	33	110	95	75	65
化学的酸素要求量 (〃)	71	48	81	62	48	39	94	48	100	88	64	70
浮遊物質量 (〃)	140	99	140	98	74	92	570	110	230	280	32	300
全蒸発残留物 (〃)	6,500	6,800	7,700	8,900	6,100	8,200	6,200	6,000	8,400	7,100	5,700	6,200
よう素消費量 (〃)	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有量 (〃)	0.002	0.002	0.003	ND	ND	ND	0.008	0.002	0.002	0.004	ND	0.002
鉛含有量 (〃)	0.08	0.07	0.09	0.03	0.03	0.04	0.18	0.08	0.07	0.1	0.02	0.09
総水銀含有量 (〃)	0.001	0.004	0.0005	ND	ND	0.0005	0.0007	0.1	0.0009	0.0006	0.0005	0.0006
クロム含有量 (〃)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3
銅含有量 (〃)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
亜鉛含有量 (〃)	0.3	0.2	0.3	ND	ND	ND	1.2	0.5	0.3	0.6	ND	0.5
鉄含有量 (〃)	0.6	0.3	0.4	ND	ND	ND	2.0	5.3	0.6	0.9	ND	1.3
ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	0.2	ND	0.2
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素含有量 (〃)	0.24	0.26	0.81	0.29	0.24	0.21	0.22	0.33	0.20	0.20	ND	ND

●洗煙処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	27.0	27.2	32.0	36.2	36.5	34.8	28.1	23.5	31.4	26.5	33.9	35.9
水素イオン濃度	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	9.5	7.6	9.3	8.6	7.5	7.1
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	4.0	8.0	7.0	5.0	7.0	14	18	8.0	4.0	23	240	36
化学的酸素要求量 (〃)	13	13	16	12	11	22	23	13	14	24	110	16
浮遊物質量 (〃)	8.0	11	37	35	6.5	12	300	53	16	360	990	51
全蒸発残留物 (〃)	8,400	6,000	7,400	3,900	4,500	6,500	5,500	2,000	4,600	7,800	5,900	3,100
よう素消費量 (〃)	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム含有量 (〃)	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	0.003	0.003	0.002	0.003	0.020	0.008
鉛含有量 (〃)	ND	0.02	0.07	0.06	0.02	ND	0.2	0.1	0.05	0.1	0.2	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2
クロム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	ND
銅含有量 (〃)	ND	0.02	0.04	0.02	ND	ND	0.2	0.06	0.03	0.4	1.2	0.09
亜鉛含有量 (〃)	0.1	0.2	0.3	0.2	ND	0.2	0.7	0.9	0.3	0.7	2.0	0.8
鉄含有量 (〃)	0.5	0.9	4.1	1.2	0.2	0.5	10	7.0	1.3	69	180	10
マンガン含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	ND	ND	0.5	1.2	0.1
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素含有量 (〃)	1.4	1.5	1.9	1.0	0.87	1.6	1.4	0.52	1.4	1.9	1.5	1.0

②放流水水質測定結果

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
温度 (℃)	23.6	28.6	30.3	31.1	32.0	29.7	27.1	23.9	22.8	18.7	20.6	21.3	45
水素イオン濃度	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	6.8	7.3	7.1	7.1	5～9
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	94	57	36	67	45	39	44	71	110	36	28	26	600
化学的酸素要求量 (〃)	91	31	35	34	35	21	41	60	46	36	34	39	—
浮遊物質量 (〃)	21	14	7.8	16	12	20	6.1	15	14	6.1	8.2	10	600
全蒸発残留物 (〃)	6,500	2,900	3,900	7,400	5,500	5,200	6,000	2,800	3,000	6,900	5,200	4,600	—
ようそ消費量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	220
シアン含有量 (〃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
カドミウム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
鉛含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.07	ND	ND	ND	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.0008	0.0007	0.0007	0.005
クロム含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	0.2	ND	ND	2
銅含有量 (〃)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	ND	3
亜鉛含有量 (〃)	0.2	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9	ND	ND	ND	2
鉄含有量 (〃)	1.3	0.7	0.2	0.5	0.2	0.4	0.2	0.9	1.0	ND	0.4	0.2	(溶) 10
マンガン含有量 (〃)	0.2	0.1	ND	0.1	ND	0.1	ND	0.4	1.2	ND	ND	ND	(溶) 10
ふっ素含有量 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30
ほう素含有量 (〃)	0.56	0.53	0.64	0.50	0.46	0.42	0.52	0.54	0.64	0.46	0.31	0.33	10

③水素イオン濃度の経月変化

放流水の基準値:5～9

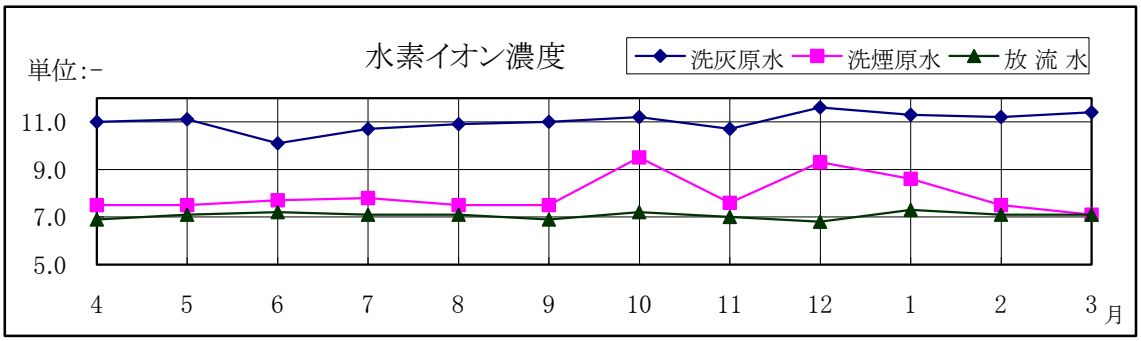

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	11.0	11.1	10.1	10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	11.6	11.3	11.2	11.4
洗煙原水	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	9.5	7.6	9.3	8.6	7.5	7.1
放 流 水	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	6.8	7.3	7.1	7.1

④水銀濃度の経月変化

放流水の基準値:0.005mg/ℓ

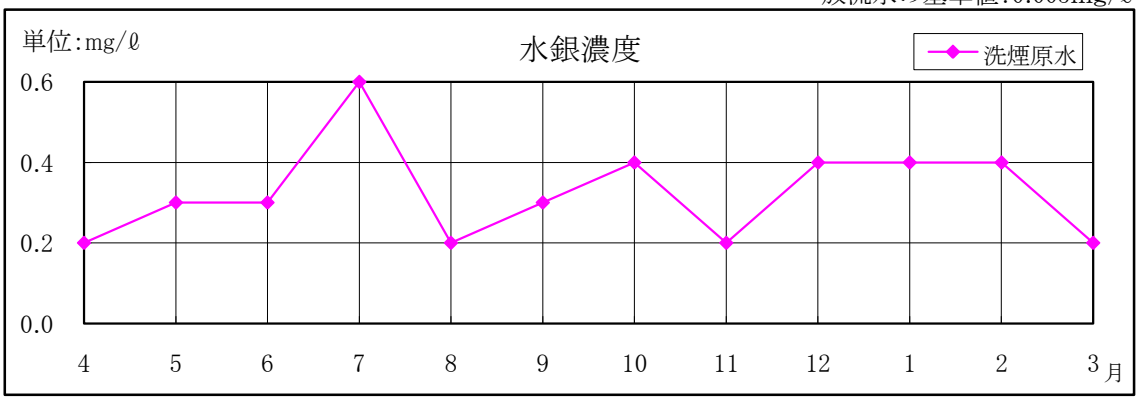

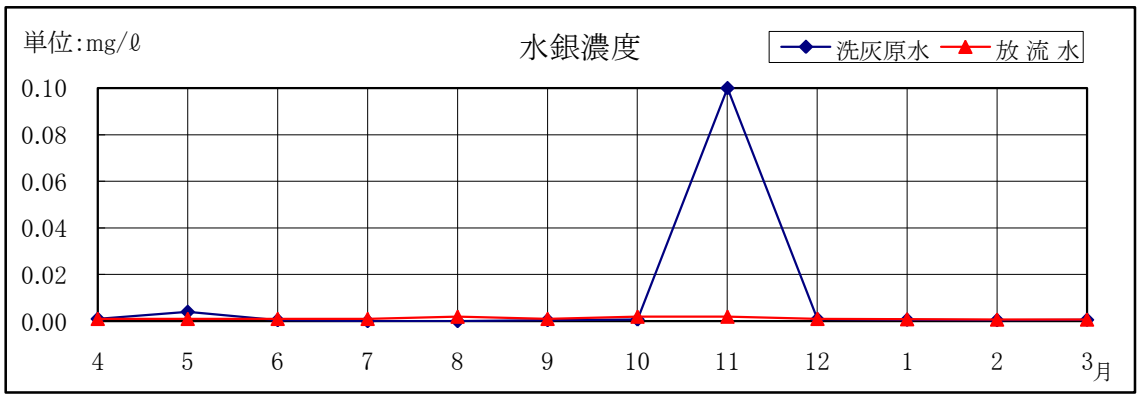

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.001	0.004	0.0005	ND	ND	0.0005	0.0007	0.1	0.0009	0.0006	0.0005	0.0006
洗煙原水	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2
放 流 水	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.0008	0.0007	0.0007

⑤鉛濃度の経月変化

放流水の基準値:0.1mg/ℓ

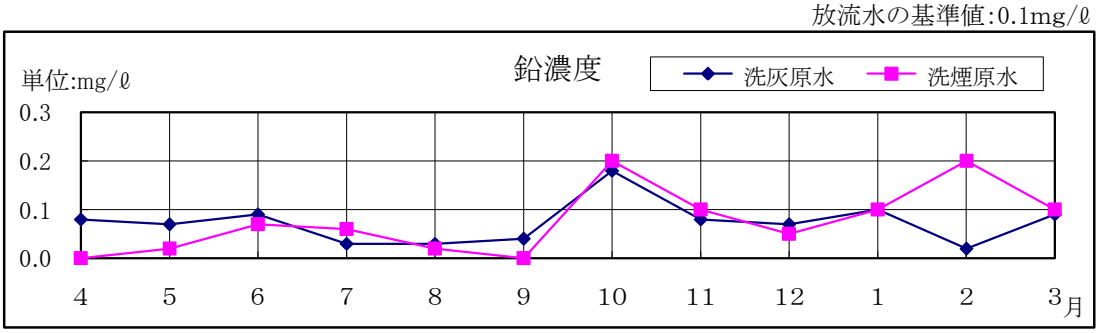

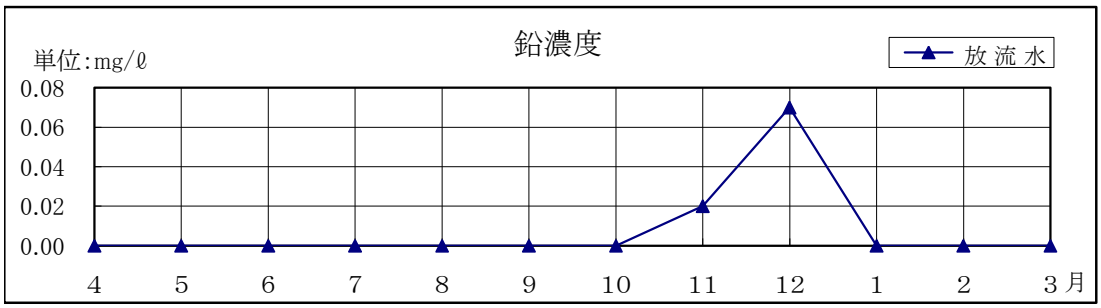

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.08	0.07	0.09	0.03	0.03	0.04	0.18	0.08	0.07	0.1	0.02	0.09
洗煙原水	ND	0.02	0.07	0.06	0.02	ND	0.2	0.1	0.05	0.1	0.2	0.1
放 流 水	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.07	ND	ND	ND

⑥亜鉛濃度の経月変化

放流水の基準値:2mg/ℓ

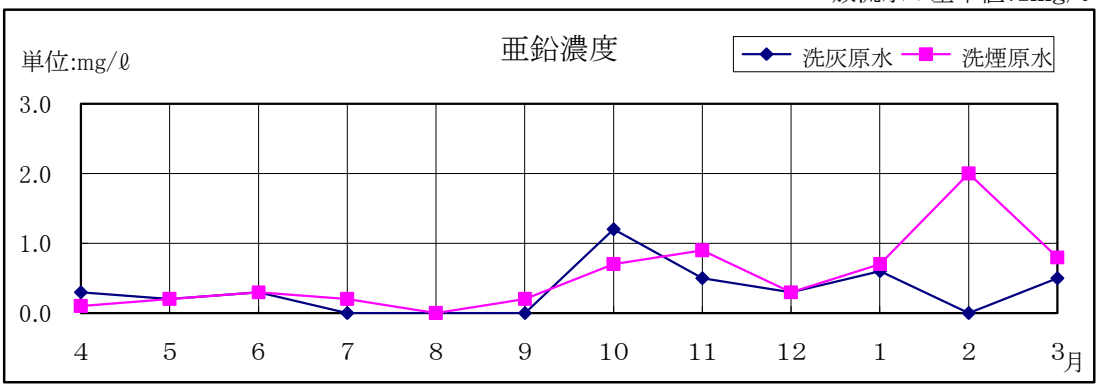

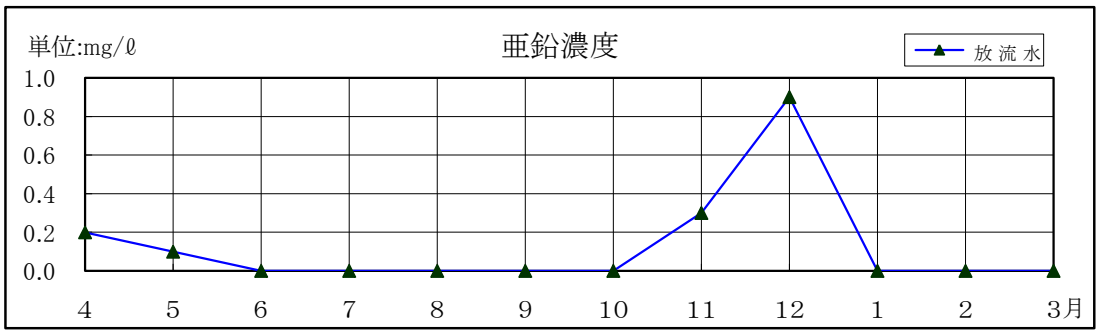

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.3	0.2	0.3	ND	ND	ND	1.2	0.5	0.3	0.6	ND	0.5
洗煙原水	0.1	0.2	0.3	0.2	ND	0.2	0.7	0.9	0.3	0.7	2.0	0.8
放 流 水	0.2	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9	ND	ND	ND

11. 維持管理経費の状況(ごみ焼却施設)

11－1. 処理経費

(単位:円)

区分 ＼ 年度			平成21年度	平成20年度	前年比(%)
	人件費		830,833,947	881,289,880	94.3
	物件費		972,182,289	1,050,889,802	92.5
	内訳	消耗品費	180,890,909	195,282,115	92.6
		光熱水費・下水道使用料	116,550,495	114,380,969	101.9
		工事・修繕料	394,891,670	471,492,805	83.8
		残灰処分委託料	193,289,476	187,667,020	103.0
		その他	86,559,739	82,066,893	105.5
合計			1,803,016,236	1,932,179,682	93.3
処理経費	総可燃ごみ搬入量(t)		151,441	158,017	95.8
	トン当り処理経費(円)		11,906	12,228	97.4
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,276	1,188	107.5
	焼却量(t)		167,729	173,771	96.5
	トン当り処理経費(円)		10,750	11,119	96.7
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,152	1,080	106.7
人口(10月1日現在)			584,409	583,295	100.2
市民一人当り負担額			3,085	3,313	93.1

11－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費(円)	可燃ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費(円)	焼却量(t)	焼却量トン当り処理経費(円)
9	2,519,867,176	210,295	11,983	216,634	11,632
10	2,533,845,618	208,417	12,158	219,148	11,562
11	2,334,019,645	207,934	11,225	216,930	10,759
12	2,279,856,950	208,327	10,944	218,101	10,453
13	2,363,998,879	205,876	11,483	215,930	10,948
14	2,312,448,257	202,922	11,396	210,632	10,979
15	2,247,159,678	196,260	11,450	207,472	10,831
16	1,953,146,295	188,328	10,371	204,441	9,554
17	1,925,753,315	182,420	10,557	195,785	9,836
18	2,084,674,962	181,106	11,511	196,246	10,623
19	2,013,723,060	164,927	12,210	180,524	11,155
20	1,932,179,682	158,017	12,228	173,771	11,119
21	1,803,016,236	151,441	11,906	167,729	10,750

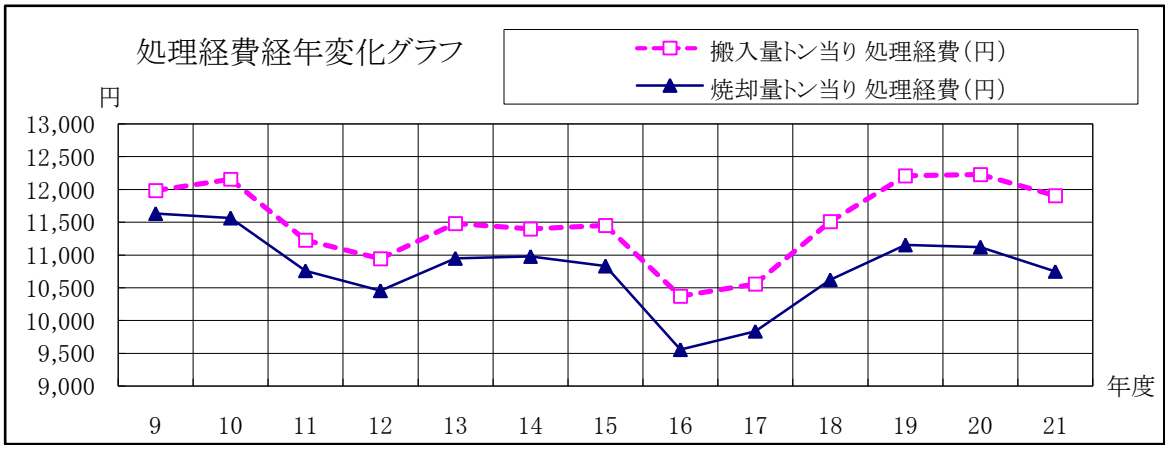

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績

1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（両市合計）

項目 / 月別	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	3,934	1,828.14	177	36.63	4,111	1,864.77
5	4,116	1,889.47	185	40.44	4,301	1,929.91
6	4,072	1,807.44	172	37.54	4,244	1,844.98
7	4,204	1,909.11	170	35.89	4,374	1,945.00
8	4,063	1,752.05	160	31.54	4,223	1,783.59
9	4,120	1,799.53	167	31.07	4,287	1,830.60
10	4,095	1,796.18	173	29.80	4,268	1,825.98
11	3,797	1,618.31	172	32.50	3,969	1,650.81
12	4,502	1,977.78	178	36.26	4,680	2,014.04
1	3,759	1,706.23	143	25.26	3,902	1,731.49
2	3,661	1,473.58	168	28.32	3,829	1,501.90
3	4,669	1,934.25	163	29.29	4,832	1,963.54
計	48,992	21,492.07	2,028	394.54	51,020	21,886.61
月平均	4,083	1,791.01	169	32.88	4,252	1,823.88

1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	3,083	1,233.34	177	36.63	3,260	1,269.97
5	3,205	1,274.50	185	40.44	3,390	1,314.94
6	3,225	1,233.42	172	37.54	3,397	1,270.96
7	3,311	1,291.53	170	35.89	3,481	1,327.42
8	3,190	1,187.86	160	31.54	3,350	1,219.40
9	3,240	1,216.71	167	31.07	3,407	1,247.78
10	3,225	1,202.77	173	29.80	3,398	1,232.57
11	3,011	1,089.01	172	32.50	3,183	1,121.51
12	3,531	1,324.28	178	36.26	3,709	1,360.54
1	2,960	1,137.22	143	25.26	3,103	1,162.48
2	2,891	996.82	168	28.32	3,059	1,025.14
3	3,643	1,294.11	163	29.29	3,806	1,323.40
計	38,515	14,481.57	2,028	394.54	40,543	14,876.11
月平均	3,210	1,206.80	169	32.88	3,379	1,239.68

1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	851	594.80	0	0.00	851	594.80
5	911	614.97	0	0.00	911	614.97
6	847	574.02	0	0.00	847	574.02
7	893	617.58	0	0.00	893	617.58
8	873	564.19	0	0.00	873	564.19
9	880	582.82	0	0.00	880	582.82
10	870	593.41	0	0.00	870	593.41
11	786	529.30	0	0.00	786	529.30
12	971	653.50	0	0.00	971	653.50
1	799	569.01	0	0.00	799	569.01
2	770	476.76	0	0.00	770	476.76
3	1,026	640.14	0	0.00	1,026	640.14
計	10,477	7,010.50	0	0	10,477	7,010.50
月平均	873	584.21	0.00	0.00	873	584.21

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績

2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績

項目	処理実績			回転破砕機稼働時間		処理運転時間（試運転含む）		せん断破砕機稼働時間		稼働日数
月別	クレーン投入量 (t)	直接投入量 (t)	計 (t)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(日)
4	1,531.20	141.94	1,673.14	118	29	74	11	0	0	16
5	1,908.46	164.82	2,073.28	139	7	91	32	0	0	18
6	1,824.14	170.27	1,994.41	140	16	88	50	0	0	19
7	1,931.74	149.83	2,081.57	149	12	97	3	0	0	20
8	1,731.44	128.09	1,859.53	132	5	83	27	0	0	19
9	1,445.04	145.59	1,590.63	111	40	70	12	0	0	15
10	2,064.40	180.01	2,244.41	152	8	94	40	0	0	20
11	1,531.31	136.99	1,668.30	124	30	73	11	0	0	18
12	1,804.88	159.75	1,964.63	150	9	91	40	0	0	20
1	1,662.27	117.49	1,779.76	136	46	84	46	0	0	18
2	1,499.81	108.77	1,608.58	123	59	79	51	0	0	16
3	1,820.17	178.04	1,998.21	146	10	92	35	0	0	20
計	20,754.86	1,781.59	22,536.45	1,624	31	1,021	58	0	0	219
月平均	1,729.57	148.47	1,878.04	135	22	85	9	0	0	18
実日平均	94.77	8.14	102.91	7	25	4	39	0	0	

項目	処理選別物搬出量									
月別	可燃物 (t)	台数 (台)	不燃物 (t)	台数 (台)	鉄類 (t)	台数 (台)	非鉄類 (t)	台数 (台)	プラスチック類 (t)	台数 (台)
4	1,001.43	396	233.53	49	199.81	73	10.04	16	228.33	80
5	1,264.63	497	294.21	58	262.01	91	16.52	20	235.91	55
6	1,180.43	475	286.38	57	246.87	91	13.70	21	267.03	57
7	1,247.23	508	317.70	67	246.96	93	13.42	25	256.26	56
8	1,111.53	443	275.47	58	227.22	85	13.01	21	232.30	80
9	938.73	376	233.28	46	194.98	70	12.37	15	211.27	91
10	1,372.13	527	302.35	64	250.27	91	12.61	24	307.05	111
11	1,019.63	414	237.24	52	197.30	79	9.24	18	204.89	58
12	1,169.23	484	293.46	59	248.32	93	11.76	22	241.86	75
1	1,092.93	453	265.98	56	203.92	77	10.83	20	206.10	75
2	953.33	402	253.39	55	191.93	71	9.81	16	200.12	69
3	1,222.23	491	292.59	63	239.69	89	11.71	20	231.99	81
計	13,573.46	5,466	3,285.58	684	2,709.28	1,003	145.02	238	2,823.11	888
月平均	1,131.12	456	273.80	57	225.77	84	12.09	20	235.26	74
実日平均	61.98	25	15.00	3	12.37	5	0.66	1	12.89	4
構成比	60.23 %		14.58 %		12.02 %		0.64 %		12.53 %	

2－2. 用水・電力・蒸気使用量実績

項目 / 月別	処理量	工水使用量		上水使用量		蒸気使用量	
			トン当り使用量		トン当り使用量		トン当り使用量
	(t)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(t)	(t)
4	1,695.61	171.13	0.10	355.25	0.21	256.35	0.15
5	2,095.75	172.54	0.08	452.55	0.22	300.78	0.14
6	2,016.88	291.87	0.14	443.26	0.22	307.15	0.15
7	2,104.04	214.98	0.10	555.32	0.26	304.94	0.14
8	1,882.00	167.18	0.09	537.56	0.29	255.51	0.14
9	1,613.10	175.97	0.11	570.33	0.35	214.49	0.13
10	2,266.88	220.15	0.10	415.86	0.18	317.25	0.14
11	1,690.77	174.41	0.10	341.82	0.20	270.22	0.16
12	1,987.10	209.83	0.11	335.50	0.17	338.47	0.17
1	1,802.23	122.90	0.07	315.65	0.18	268.46	0.15
2	1,631.05	105.35	0.06	411.54	0.25	240.02	0.15
3	2,020.68	139.49	0.07	347.76	0.17	291.05	0.14
計	22,806.09	2,165.80		5,082.40		3,364.69	
月平均	1,900.51	180.48		423.53		280.39	
暦日平均	62.48	5.93		13.92		9.22	
実日平均	105.10	9.98		23.42		15.51	

３．不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況

３－１．不燃・粗大ごみの処理残渣等の処分実績

項目 / 月別	不燃・粗大ごみの処理残渣処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
	(台)	(ｔ)	(%)	(台)	(ｔ)	(%)	(台)	(ｔ)	(%)	(ｔ)	(%)
4	24	189	37	36	326	63	60	515	100	411	125.3
5	23	191	33	41	381	67	64	572	100	689	83.0
6	29	246	45	32	295	55	61	541	100	446	121.3
7	25	196	43	29	257	57	54	453	100	630	71.9
8	23	193	42	28	263	58	51	456	100	433	105.3
9	23	185	47	22	210	53	45	395	100	498	79.3
10	32	257	47	31	288	53	63	545	100	526	103.6
11	20	163	38	28	261	62	48	424	100	502	84.5
12	32	257	45	35	309	55	67	566	100	475	119.2
1	23	194	44	29	251	56	52	445	100	577	77.1
2	23	192	46	25	225	54	48	417	100	431	96.8
3	25	205	42	29	280	58	54	485	100	383	126.6
計	302	2,468	42	365	3,346	58	667	5,814	100	6,001	
月平均	25	206		30	279		56	485		500	99.5

3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績

項目	鉄類			非鉄(アルミ)類			発泡スチロール		
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)
4	16	178.33	91.6	6	12.33	6.3	2	4.10	2.1
5	24	280.96	90.3	9	19.75	6.4	5	10.26	3.3
6	23	266.85	93.0	6	13.37	4.7	3	6.57	2.3
7	23	251.58	90.9	8	16.45	5.9	4	8.71	3.2
8	22	233.91	91.2	8	16.65	6.5	3	5.94	2.3
9	19	204.79	90.8	6	11.99	5.3	4	8.81	3.9
10	24	265.89	91.5	7	15.75	5.4	4	8.98	3.1
11	18	207.31	91.5	6	12.85	5.7	3	6.35	2.8
12	30	268.54	93.0	4	13.74	4.8	3	6.41	2.2
1	21	185.58	91.4	3	10.29	5.1	3	7.17	3.5
2	26	220.95	92.2	4	14.67	6.1	2	3.97	1.7
3	29	234.29	92.0	4	13.43	5.3	3	6.85	2.7
計	275	2,798.98	91.6	71	171.27	5.6	39	84.12	2.8
月平均	23	233.25		6	14.27		3	7.01	

項目	コンプレッサー			合計			前年度	前年比
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	処分量	
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	0	0.00	0.0	24	194.76	100	190.66	102.2
5	0	0.00	0.0	38	310.97	100	300.71	103.4
6	0	0.00	0.0	32	286.79	100	280.22	102.3
7	0	0.00	0.0	35	276.74	100	268.03	103.2
8	0	0.00	0.0	33	256.50	100	250.56	102.4
9	0	0.00	0.0	29	225.59	100	216.78	104.1
10	0	0.00	0.0	35	290.62	100	281.64	103.2
11	0	0.00	0.0	27	226.51	100	220.16	102.9
12	0	0.00	0.0	37	288.69	100	282.28	102.3
1	0	0.00	0.0	27	203.04	100	195.87	103.7
2	0	0.00	0.0	32	239.59	100	235.62	101.7
3	0	0.00	0.0	36	254.57	100	247.72	102.8
計	0	0.00	0.0	385	3,054.37	100	2,970.25	
月平均	0	0.00		32	254.53		247.52	102.8

３－２．適正処理困難物処分量実績

項目 / 月別	バッテリー		消火器	塗料・廃液	マットレス	金属・プラスチック類	プロパンボンベ	その他ボンベ	単車類
	（ｋｇ）	（個）	（本）	（缶）	（㎥）	（㎥）	（本）	（本）	（台）
4	0	0	0	0	66	13	0	0	0
5	0	0	0	0	66	13	0	0	0
6	0	0	0	0	66	13	0	0	30
7	0	0	0	0	66	13	0	0	0
8	0	0	0	0	66	13	0	0	0
9	890	123	0	0	66	13	0	0	0
10	0	0	64	0	66	0	0	0	0
11	0	0	0	0	44	13	0	0	0
12	1,180	109	0	0	66	13	0	0	30
1	0	0	54	0	44	13	0	0	0
2	0	0	0	0	44	13	0	0	0
3	0	0	0	28	88	26	0	0	0
計	2,070	232	118	28	748	156	0	0	60
月平均	173	19	10	2	62	13	0	0	5

4. 維持管理経費の状況（粗大ごみ処理施設）

4－1. 処理経費

（単位：円）

区分 ＼ 年度			平成21年度	平成20年度	前年比（%）
	人件費		89,508,079	111,492,685	80.3
	物件費		325,190,313	363,031,280	89.6
	内訳	消耗品費	19,968,904	20,709,974	96.4
		光熱水費・下水道使用料	20,427,035	21,128,063	96.7
		工事・修繕料	102,966,981	148,348,346	69.4
		不燃物等処分委託料	52,493,458	47,039,016	111.6
		その他	129,333,935	125,805,881	102.8
合計			414,698,392	474,523,965	87.4
処理経費	不燃・粗大ごみ搬入量（t）　※1		27,218	26,857	101.3
	トン当り処理経費（円）		15,236	17,669	86.2
	トン当り最終処分経費［再掲］（円）		1,929	1,751	110.1
	粗大ごみ処理施設処理量（t）		22,536	22,547	100.0
	トン当り処理経費（円）		18,402	21,046	87.4
	トン当り最終処分経費［再掲］（円）		2,329	2,086	111.7
人口（10月1日現在）			584,409	583,295	100.2
市民一人当り負担額			710	814	87.2

※1　不燃・粗大ごみ搬入量はガラス、ペット、その他プラ、家電四品目（換算値）の搬入量を含んでいます。

4－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費（円）	不燃・粗大ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費（円）	粗大ごみ処理施設処理量(t)	処理量トン当り処理経費（円）
9	560,474,566	30,855	18,165	28,355	19,766
10	544,109,885	30,595	17,784	27,123	20,061
11	535,890,773	30,421	17,616	26,948	19,886
12	458,261,024	32,266	14,202	28,291	16,198
13	455,689,752	30,439	14,971	26,898	16,941
14	489,680,208	30,075	16,282	26,248	18,656
15	487,731,850	30,578	15,950	25,197	19,357
16	444,934,966	30,288	14,690	23,543	18,899
17	455,316,866	29,788	15,285	24,126	18,872
18	443,243,380	29,707	14,920	24,876	17,818
19	478,003,595	27,136	17,615	22,348	21,389
20	474,523,965	26,857	17,669	22,547	21,046
21	414,698,392	27,218	15,236	22,536	18,402

※平成9年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はガラス・ペットの搬入量を含んでいます。
※平成13年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はその他プラ、家電四品目（換算値）の搬入量を含んでいます。

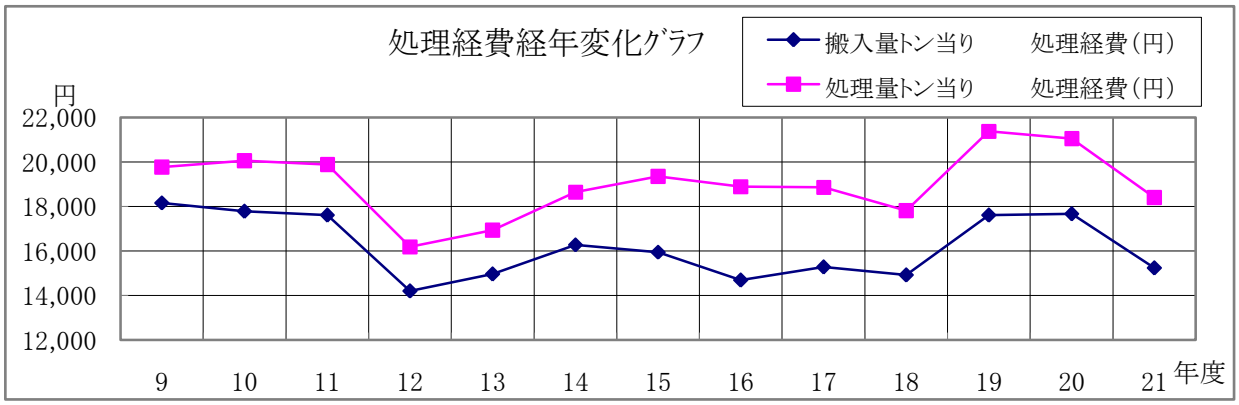

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績

1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績

項目	搬入量 (t)								
	豊中市			伊丹市			両市合計		
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ
4	131.69	22.22	65.15	95.52	29.73	94.02	227.21	51.95	159.17
5	144.65	23.67	62.20	101.51	32.58	94.88	246.16	56.25	157.08
6	128.77	25.83	58.92	102.53	36.42	92.59	231.30	62.25	151.51
7	133.87	30.25	65.04	111.60	44.33	99.47	245.47	74.58	164.51
8	147.93	31.35	56.44	103.34	43.93	89.13	251.27	75.28	145.57
9	128.15	29.18	58.58	104.45	42.22	90.73	232.60	71.40	149.31
10	135.22	24.87	56.08	97.19	33.90	83.73	232.41	58.77	139.81
11	120.34	19.44	55.95	90.24	27.64	84.82	210.58	47.08	140.77
12	141.21	18.95	61.71	100.24	26.00	91.15	241.45	44.95	152.86
1	156.41	15.46	57.28	114.50	26.67	96.05	270.91	42.13	153.33
2	123.88	17.34	52.33	87.89	23.87	84.60	211.77	41.21	136.93
3	116.77	20.75	63.50	102.23	28.66	101.48	219.00	49.41	164.98
計	1,608.89	279.31	713.18	1,211.24	395.95	1,102.65	2,820.13	675.26	1,815.83
月平均	134.07	23.28	59.43	100.94	33.00	91.89	235.01	56.27	151.32

項目	搬出量 (t)						
	ガラスびん			ペットボトル		その他プラスチック	
月別	再商品化	残渣	計	再商品化	残渣	再商品化	残渣
4	181.11	20.25	201.36	35.48	1.85	124.16	12.48
5	200.22	22.42	222.64	81.73	1.86	150.84	13.93
6	187.80	21.01	208.81	46.11	1.69	151.50	13.25
7	203.23	22.75	225.98	72.62	1.99	157.77	12.97
8	207.56	23.27	230.83	69.87	1.53	128.76	11.41
9	187.44	20.99	208.43	62.77	1.42	146.00	10.93
10	189.64	21.24	210.88	57.55	1.88	150.09	10.58
11	171.08	19.17	190.25	45.51	1.74	128.58	8.78
12	202.73	22.73	225.46	32.68	1.72	146.95	11.23
1	220.41	24.66	245.07	43.27	1.44	157.18	11.34
2	169.67	19.02	188.69	33.15	1.58	141.90	8.88
3	177.70	19.91	197.61	51.09	1.67	140.88	11.13
計	2,298.59	257.42	2,556.01	631.83	20.37	1,724.61	136.91
月平均	191.55	21.45	213.00	52.65	1.70	143.72	11.41

1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績

項目	搬入台数(台)									搬出台数(台)		
	豊中市			伊丹市			両市合計			ガラスびん	ペットボトル	その他プラスチック
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ			
4	248	134	120	83	80	187	331	214	307	24	6	51
5	264	135	113	85	85	198	349	220	311	26	14	53
6	234	149	110	86	86	206	320	235	316	28	8	53
7	237	157	126	95	100	217	332	257	343	35	12	61
8	251	158	112	87	99	203	338	257	315	32	12	50
9	235	152	130	90	98	216	325	250	346	28	11	61
10	252	149	119	88	88	206	340	237	325	29	10	53
11	246	132	117	85	81	195	331	213	312	27	8	50
12	245	129	129	87	78	201	332	207	330	39	6	53
1	245	111	112	99	74	200	344	185	312	30	8	56
2	239	119	112	80	74	186	319	193	298	23	6	49
3	231	142	134	94	86	213	325	228	347	27	9	55
計	2,927	1,667	1,434	1,059	1,029	2,428	3,986	2,696	3,862	348	110	645
月平均	244	139	120	88	86	202	332	225	322	29	9	54

1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績

項目 / 月別	容器包装の種類					
	無色ガラスびん	茶色ガラスびん	その他ガラスびん	ガラスびん合計	ペットボトル	その他プラスチック
	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4	68.43	50.16	62.52	181.11	35.48	124.16
5	75.67	55.41	69.14	200.22	81.73	150.84
6	70.96	52.00	64.84	187.80	46.11	151.50
7	76.82	56.27	70.14	203.23	72.62	157.77
8	78.47	57.48	71.61	207.56	69.87	128.76
9	70.82	51.96	64.66	187.44	62.77	146.00
10	71.61	52.49	65.54	189.64	57.55	150.09
11	64.52	47.44	59.12	171.08	45.51	128.58
12	76.50	56.11	70.12	202.73	32.68	146.95
1	83.16	61.09	76.16	220.41	43.27	157.18
2	63.99	47.02	58.66	169.67	33.15	141.90
3	67.06	49.23	61.41	177.70	51.09	140.88
計	868.01	636.66	793.92	2,298.59	631.83	1,724.61
月平均	72.33	53.06	66.16	191.55	52.65	143.72
色別混入率(%)	37.76%	27.70%	34.54%	100%		

2. 家電四品目搬入・搬出実績

2－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器)搬入実績（両市合計）

両市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	0	11	9	3	5	1	3	15	17	32	1.28	0
5	0	0	9	12	2	3	1	2	12	17	29	1.07	0
6	0	0	11	11	4	5	4	0	19	16	35	1.41	0
7	0	2	3	9	2	3	1	1	6	15	21	0.87	0
8	0	0	0	11	4	3	0	0	4	14	18	0.82	0
9	1	1	4	6	6	5	1	1	12	13	25	1.23	0
10	0	0	6	10	2	4	3	2	11	16	27	1.05	0
11	0	1	11	15	2	0	2	0	15	16	31	1.03	0
12	0	0	20	25	5	9	3	5	28	39	67	2.57	0
1	0	0	5	4	1	5	1	2	7	11	18	0.78	0
2	0	1	3	11	2	4	1	2	6	18	24	0.98	0
3	0	1	15	20	0	4	0	1	15	26	41	1.41	0
合計	1	6	98	143	33	50	18	19	150	218	368	14.50	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

両市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	0	4	2	2	3	1	1	7	6	13	0.59
5	0	0	1	1	2	0	2	0	5	1	6	0.26
6	2	0	4	3	1	2	0	3	7	8	15	0.61
7	0	0	3	4	1	1	1	0	5	5	10	0.38
8	0	0	1	3	3	2	1	5	5	10	15	0.65
9	0	0	0	4	1	1	0	3	1	8	9	0.35
10	1	1	2	1	1	1	0	2	4	5	9	0.39
11	0	0	1	5	0	2	0	1	1	8	9	0.35
12	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0.09
1	0	1	2	0	1	1	1	0	4	2	6	0.28
2	0	0	6	3	3	3	2	2	11	8	19	0.81
3	0	0	3	2	0	3	1	4	4	9	13	0.51
合計	3	2	27	30	15	19	9	22	54	73	127	5.27

両市　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	0	15	11	5	8	2	4	22	23	45	1.87	0
5	0	0	10	13	4	3	3	2	17	18	35	1.33	0
6	2	0	15	14	5	7	4	3	26	24	50	2.02	0
7	0	2	6	13	3	4	2	1	11	20	31	1.25	0
8	0	0	1	14	7	5	1	5	9	24	33	1.47	0
9	1	1	4	10	7	6	1	4	13	21	34	1.58	0
10	1	1	8	11	3	5	3	4	15	21	36	1.44	0
11	0	1	12	20	2	2	2	1	16	24	40	1.38	0
12	0	0	20	27	5	9	3	6	28	42	70	2.66	0
1	0	1	7	4	2	6	2	2	11	13	24	1.06	0
2	0	1	9	14	5	7	3	4	17	26	43	1.79	0
3	0	1	18	22	0	7	1	5	19	35	54	1.92	0
合計	4	8	125	173	48	69	27	41	204	291	495	19.77	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（豊中市分）

豊中市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値（0.07t／台）		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	9	7	2	0	0	3	11	10	21	0.71	0
5	0	0	8	11	2	1	1	1	11	13	24	0.84	0
6	0	0	5	7	3	5	4	0	12	12	24	1.04	0
7	0	0	3	5	0	1	1	1	4	7	11	0.37	0
8	0	0	0	11	4	3	0	0	4	14	18	0.82	0
9	0	0	4	5	6	4	0	1	10	10	20	1.00	0
10	0	0	3	7	0	3	1	2	4	12	16	0.60	0
11	0	0	4	13	2	0	2	0	8	13	21	0.71	0
12	0	0	12	16	5	6	3	3	20	25	45	1.79	0
1	0	0	2	3	1	5	1	2	4	10	14	0.66	0
2	0	0	1	4	1	3	0	0	2	7	9	0.43	0
3	0	1	9	10	0	2	0	0	9	13	22	0.76	0
合計	0	1	60	99	26	33	13	13	99	146	245	9.73	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

豊中市　リサイクル券搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値（0.07t／台）		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)
4	0	0	4	2	2	3	1	0	7	5	12	0.56
5	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0.13
6	2	0	3	3	1	1	0	2	6	6	12	0.48
7	0	0	3	4	1	1	1	0	5	5	10	0.38
8	0	0	1	3	3	2	1	5	5	10	15	0.65
9	0	0	0	4	1	1	0	3	1	8	9	0.35
10	1	1	2	1	1	1	0	2	4	5	9	0.39
11	0	0	1	5	0	2	0	1	1	8	9	0.35
12	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0.09
1	0	1	2	0	1	1	1	0	4	2	6	0.28
2	0	0	3	3	1	2	1	0	5	5	10	0.42
3	0	0	3	2	0	3	1	4	4	9	13	0.51
合計	3	2	23	29	12	17	7	18	45	66	111	4.59

豊中市搬入分　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値（0.07t／台）		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	13	9	4	3	1	3	18	15	33	1.27	0
5	0	0	9	11	3	1	2	1	14	13	27	0.97	0
6	2	0	8	10	4	6	4	2	18	18	36	1.52	0
7	0	0	6	9	1	2	2	1	9	12	21	0.75	0
8	0	0	1	14	7	5	1	5	9	24	33	1.47	0
9	0	0	4	9	7	5	0	4	11	18	29	1.35	0
10	1	1	5	8	1	4	1	4	8	17	25	0.99	0
11	0	0	5	18	2	2	2	1	9	21	30	1.06	0
12	0	0	12	18	5	6	3	4	20	28	48	1.88	0
1	0	1	4	3	2	6	2	2	8	12	20	0.94	0
2	0	0	4	7	2	5	1	0	7	12	19	0.85	0
3	0	1	12	12	0	5	1	4	13	22	35	1.27	0
合計	3	3	83	128	38	50	20	31	144	212	356	14.32	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－3. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（伊丹市分）

伊丹市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	2	2	1	5	1	0	4	7	11	0.57	0
5	0	0	1	1	0	2	0	1	1	4	5	0.23	0
6	0	0	6	4	1	0	0	0	7	4	11	0.37	0
7	0	2	0	4	2	2	0	0	2	8	10	0.50	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
9	1	1	0	1	0	1	1	0	2	3	5	0.23	0
10	0	0	3	3	2	1	2	0	7	4	11	0.45	0
11	0	1	7	2	0	0	0	0	7	3	10	0.32	0
12	0	0	8	9	0	3	0	2	8	14	22	0.78	0
1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	4	0.12	0
2	0	1	2	7	1	1	1	2	4	11	15	0.55	0
3	0	0	6	10	0	2	0	1	6	13	19	0.65	0
合計	1	5	38	44	7	17	5	6	51	72	123	4.77	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

伊丹市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)
4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0.03
5	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	3	0.13
6	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	3	0.13
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	3	0	2	1	1	2	6	3	9	0.39
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	4	1	3	2	2	4	9	7	16	0.68

伊丹市　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	2	2	1	5	1	1	4	8	12	0.60	0
5	0	0	1	2	1	2	1	1	3	5	8	0.36	0
6	0	0	7	4	1	1	0	1	8	6	14	0.50	0
7	0	2	0	4	2	2	0	0	2	8	10	0.50	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
9	1	1	0	1	0	1	1	0	2	3	5	0.23	0
10	0	0	3	3	2	1	2	0	7	4	11	0.45	0
11	0	1	7	2	0	0	0	0	7	3	10	0.32	0
12	0	0	8	9	0	3	0	2	8	14	22	0.78	0
1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	4	0.12	0
2	0	1	5	7	3	2	2	4	10	14	24	0.94	0
3	0	0	6	10	0	2	0	1	6	13	19	0.65	0
合計	1	5	42	45	10	19	7	10	60	79	139	5.45	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－4. 家電四品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器)搬出実績

家電リサイクル品Aグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	11	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	13	0	4	17	0.63
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	0	0	0	0	0	9	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	13	0	3	16	0.64
7	0	0	0	0	0	6	0	6	0	3	0	1	0	4	0	0	0	13	0	7	20	0.76
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	8	0	3	11	0.59
10	0	0	0	0	0	6	0	2	0	6	0	1	0	1	0	3	0	13	0	6	19	0.85
11	3	0	0	0	15	0	3	0	11	0	1	0	6	0	1	0	35	0	5	0	40	1.74
12	0	0	0	0	0	11	0	14	0	4	0	1	0	3	0	0	0	18	0	15	33	1.19
1	0	0	0	0	0	7	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	13	0	3	16	0.60
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	0	0	0	0	1	4	2	4	0	2	1	1	0	0	1	1	1	6	4	6	17	0.67
合計	3	0	0	1	16	57	5	33	11	27	2	8	6	13	2	5	36	97	9	47	189	7.67

家電リサイクル品Bグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	14	0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	0	19	0	4	23	0.73
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	0	0	0	0	0	12	0	2	0	1	0	6	0	2	0	1	0	15	0	9	24	1.00
7	0	0	0	0	0	9	0	4	0	6	0	1	0	0	0	0	0	15	0	5	20	0.88
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	0	0	3	15	16	1	4	10	3	1	2	9	1	3	0	35	20	5	9	69	2.79
10	0	0	0	0	0	7	0	4	0	7	0	2	0	1	0	0	0	15	0	6	21	0.99
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	0	0	0	1	0	30	0	5	0	4	0	2	0	4	0	1	0	38	0	9	47	1.67
1	0	0	0	0	0	7	0	7	0	5	0	1	0	3	0	1	0	15	0	9	24	0.96
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	0	0	1	15	9	0	8	8	7	1	1	7	0	2	2	32	16	3	12	63	2.63
合計	3	0	0	5	30	104	1	38	18	34	2	15	16	15	5	5	67	153	8	63	291	11.65

家電リサイクル品　A+Bグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	25	0	6	0	3	0	1	0	4	0	1	0	32	0	8	40	1.36
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	0	0	0	0	0	21	0	4	0	4	0	7	0	3	0	1	0	28	0	12	40	1.64
7	0	0	0	0	0	15	0	10	0	9	0	2	0	4	0	0	0	28	0	12	40	1.64
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	0	0	4	15	19	1	4	10	7	1	4	9	2	3	0	35	28	5	12	80	3.38
10	0	0	0	0	0	13	0	6	0	13	0	3	0	2	0	3	0	28	0	12	40	1.84
11	3	0	0	0	15	0	3	0	11	0	1	0	6	0	1	0	35	0	5	0	40	1.74
12	0	0	0	1	0	41	0	19	0	8	0	3	0	7	0	1	0	56	0	24	80	2.86
1	0	0	0	0	0	14	0	10	0	8	0	1	0	6	0	1	0	28	0	12	40	1.56
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	0	0	1	16	13	2	12	8	9	2	2	7	0	3	3	33	22	7	18	80	3.30
合計	6	0	0	6	46	161	6	71	29	61	4	23	22	28	7	10	103	250	17	110	480	19.32

3. その他のリサイクル等の状況

3－1. 逆送電力量経年変化

項目 / 年度	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	発電量 DCS B (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 A＋B＝C (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	（売電）取引メータ D (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)
7	405,851	46	45,085,311	5,133	45,491,162	5,179	21,149,284	2,408
8	361,513	41	41,856,006	4,778	42,217,519	4,819	18,580,353	2,121
9	409,925	47	42,281,716	4,827	42,691,641	4,873	18,380,734	2,098
10	496,744	57	42,571,772	4,860	43,068,516	4,916	17,506,450	1,998
11	323,664	37	43,120,481	4,909	43,444,145	4,946	17,589,645	2,002
12	487,752	56	43,406,606	4,955	43,894,358	5,011	17,593,062	2,008
13	686,469	78	44,004,813	5,023	44,691,282	5,102	15,685,688	1,791
14	900,856	103	43,473,907	4,963	44,374,763	5,066	14,760,644	1,685
15	784,492	89	42,625,080	4,853	43,409,572	4,942	12,714,266	1,447
16	597,960	68	42,369,054	4,837	42,967,014	4,905	14,180,628	1,619
17	619,240	71	41,533,755	4,741	42,152,995	4,812	13,785,531	1,574
18	729,890	83	41,194,963	4,703	41,924,853	4,786	13,610,873	1,554
19	621,150	71	38,402,326	4,384	39,023,476	4,455	11,781,284	1,345
20	949,300	108	36,223,331	4,135	37,172,631	4,243	10,769,322	1,229
21	853,676	97	34,704,171	3,962	35,557,847	4,059	9,871,809	1,127

※平成6年度の12月より売電実施。6年度の逆送電力量の暦日は121日。

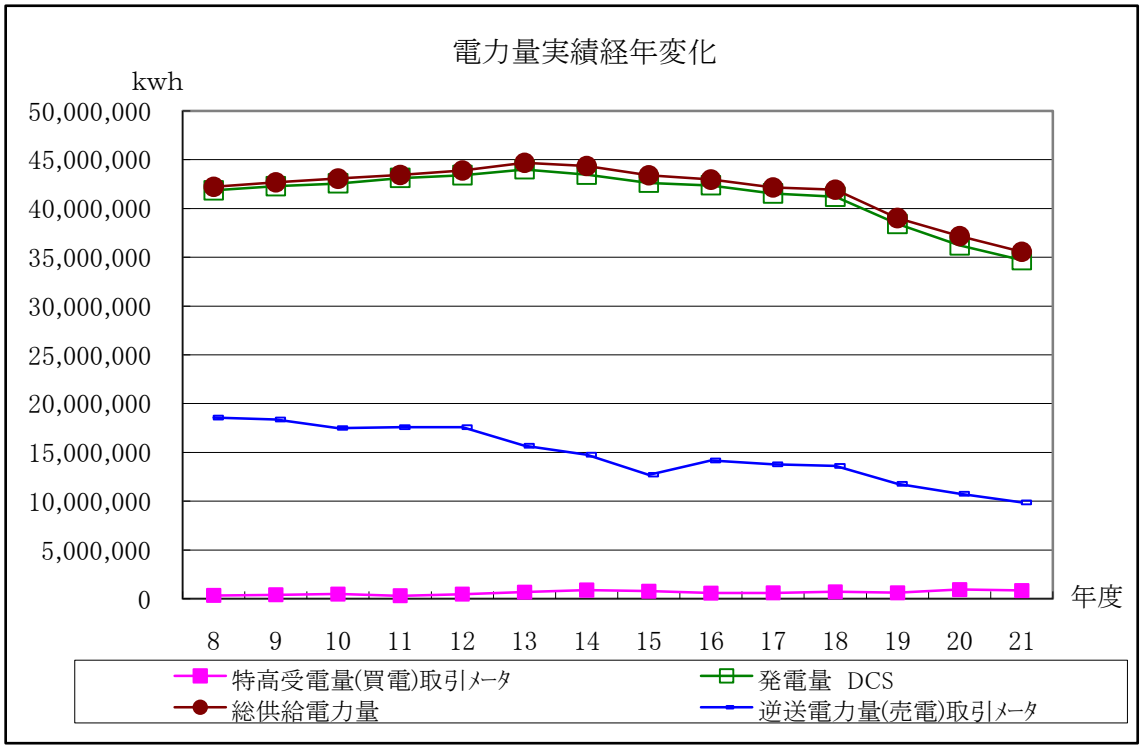

3－2. 搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績

区分 月別	申込件数(件)	薪ﾘｻｲｸﾙ量(kg)
4	0	0
5	2	110
6	8	290
7	7	310
8	2	70
9	1	100
10	4	170
11	6	250
12	8	280
1	1	50
2	0	0
3	0	0
計	39	1,630
月平均	3	136

3－3. 古紙類の資源化実績

区分 月別	新聞(kg)	雑誌(kg)	ダンボール(kg)	合計(kg)	前年度合計(kg)	前年比(%)
4	390	5,820	3,910	10,120	8,610	117.5
5	470	5,610	3,270	9,350	3,930	237.9
6	290	3,750	2,690	6,730	4,350	154.7
7	570	5,670	3,710	9,950	5,040	197.4
8	570	3,240	3,010	6,820	5,020	135.9
9	880	4,610	3,760	9,250	4,820	191.9
10	230	1,860	2,870	4,960	6,760	73.4
11	340	3,540	2,660	6,540	9,590	68.2
12	880	5,500	4,220	10,600	11,450	92.6
1	390	3,000	2,500	5,890	5,640	104.4
2	360	4,700	2,880	7,940	5,590	142.0
3	2290	7,960	5,130	15,380	10,250	150.0
計	7,660	55,260	40,610	103,530	81,050	127.7
月平均	638	4,605	3,384	8,628	6,754	

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況

1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	587,383,000	587,383,000	100.0	0
豊中市負担金	343,002,000	343,002,000	100.0	0
伊丹市負担金	244,381,000	244,381,000	100.0	0
使用料及び手数料	84,234,000	74,211,660	88.1	△ 10,022,340
余熱利用施設使用料	82,274,000	72,251,100	87.8	△ 10,022,900
総務管理使用料	1,960,000	1,960,560	100.0	560
繰越金	1,000	15,558,293	1,555,829.3	15,557,293
諸収入	6,282,000	7,163,893	114.0	881,893
組合預金利子	200,000	93,079	46.5	△ 106,921
雑入	6,082,000	7,070,814	116.3	988,814
歳入合計	677,900,000	684,316,846	100.9	6,416,846

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
議会費	1,427,000	1,334,436	93.5	92,564
議会費	1,427,000	1,334,436	93.5	92,564
議会費	1,427,000	1,334,436	93.5	92,564
報酬	1,053,000	1,038,000	98.6	15,000
職員手当等	333,000	282,450	84.8	50,550
旅費	0	0	－	0
交際費	30,000	10,500	35.0	19,500
需用費	7,514	0	0.0	7,514
役務費	3,486	3,486	100.0	0
使用料及び賃借料	0	0	－	0
総務費	350,676,000	338,713,461	96.6	11,962,539
総務管理費	182,210,000	172,821,163	94.8	9,388,837
一般管理費	155,215,000	149,556,785	96.4	5,658,215
報酬	1,375,000	992,000	72.1	383,000
給料	62,331,000	61,025,271	97.9	1,305,729
職員手当等	48,185,000	46,764,739	97.1	1,420,261
共済費	20,536,000	20,440,285	99.5	95,715
賃金	2,088,000	1,426,000	68.3	662,000
旅費	120,000	45,990	38.3	74,010
交際費	50,000	0	0.0	50,000
需用費	521,000	371,482	71.3	149,518
役務費	1,626,000	1,580,315	97.2	45,685
委託料	13,369,000	12,241,372	91.6	1,127,628
使用料及び賃借料	4,447,000	4,155,964	93.5	291,036
備品購入費	20,000	0	0.0	20,000
負担金補助及び交付金	547,000	513,367	93.9	33,633
総務管理退職負担金	26,995,000	23,264,378	86.2	3,730,622
負担金補助及び交付金	26,995,000	23,264,378	86.2	3,730,622
監査委員費	26,000	24,000	92.3	2,000
公平委員会費	39,000	36,000	92.3	3,000

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
余熱利用施設費	168,401,000	165,832,298	98.5	2,568,702
管理費	168,401,000	165,832,298	98.5	2,568,702
報酬	0	0	－	0
給料	10,301,000	10,294,400	99.9	6,600
職員手当等	3,996,856	3,840,212	96.1	156,644
共済費	2,019,144	2,019,144	100.0	0
賃金	0	0	－	0
旅費	0	0	－	0
需用費	45,441,794	45,441,794	100.0	0
役務費	1,474,592	1,474,592	100.0	0
委託料	100,385,611	100,385,611	100.0	0
使用料及び賃借料	2,313,095	2,313,095	100.0	0
工事請負費	2,405,458	0	0.0	2,405,458
備品購入費	51,450	51,450	100.0	0
負担金補助及び交付金	12,000	12,000	100.0	0
公債費	325,697,000	325,696,123	100.0	877
公債費	325,697,000	325,696,123	100.0	877
元金	307,541,000	307,540,992	100.0	8
利子	18,156,000	18,155,131	100.0	869
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	677,900,000	665,744,020	98.2	12,155,980

［歳入歳出差引額　　18,572,826 円］

１－２. ごみ処理施設勘定の予算･決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	2,549,601,000	2,549,601,000	100.0	0
豊中市負担金	1,706,958,000	1,706,958,000	100.0	0
伊丹市負担金	842,643,000	842,643,000	100.0	0
使用料及び手数料	465,132,000	426,802,872	91.8	△ 38,329,128
国庫支出金	9,558,000	8,642,000	90.4	△ 916,000
財産収入	63,500,000	64,910,337	102.2	1,410,337
繰越金	53,320,000	146,556,433	274.9	93,236,433
諸収入	84,463,000	90,973,696	107.7	6,510,696
売電収入	84,462,000	81,341,633	96.3	△ 3,120,367
雑入	1,000	9,632,063	963206.3	9,631,063
組合債	28,200,000	19,200,000	68.1	△ 9,000,000
一般廃棄物処理事業債	28,200,000	19,200,000	68.1	△ 9,000,000
ごみ処理施設整備債	0	0	－	0
府県支出金	16,724,000	13,788,871	82.4	△ 2,935,129
歳入合計	3,270,498,000	3,320,475,209	101.5	49,977,209

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	2,587,350,000	2,389,698,437	92.4	197,651,563
ごみ処理施設費	2,139,169,000	1,975,000,045	92.3	164,168,955
管理費	1,901,519,000	1,803,016,236	94.8	98,502,764
報酬	16,068,730	16,068,730	100.0	0
給料	393,482,270	373,292,495	94.9	20,189,775
職員手当等	345,354,000	314,791,136	91.2	30,562,864
共済費	131,274,000	126,681,586	96.5	4,592,414
賃金	14,220,563	14,220,563	100.0	0
報償費	498,000	129,510	26.0	368,490
旅費	909,000	533,610	58.7	375,390
需用費	331,217,045	314,909,877	95.1	16,307,168
消耗品費	192,750,516	180,890,909	93.8	11,859,607
燃料費	7,954,000	3,536,940	44.5	4,417,060
食糧費	69,000	38,499	55.8	30,501
印刷製本費	215,204	215,204	100.0	0
光熱水費	116,550,495	116,550,495	100.0	0
修繕料	13,677,830	13,677,830	100.0	0
役務費	10,695,000	8,752,941	81.8	1,942,059
委託料	249,443,437	236,560,737	94.8	12,882,700
灰最終処分委託料	135,082,500	135,082,500	100.0	0
灰搬送委託料	61,610,937	58,206,976	94.5	3,403,961
その他	52,750,000	43,271,261	82.0	9,478,739
使用料及び賃借料	13,643,000	12,529,598	91.8	1,113,402
工事請負費	389,996,000	381,213,840	97.7	8,782,160
原材料費	187,000	44,268	23.7	142,732
備品購入費	580,125	580,125	100.0	0
負担金補助及び交付金	3,671,000	2,436,590	66.4	1,234,410
補償補填及び賠償金	67,830	67,830	100.0	0
公課費	212,000	202,800	95.7	9,200
ごみ処理施設退職負担金	103,424,000	65,732,986	63.6	37,691,014
負担金補助及び交付金	103,424,000	65,732,986	63.6	37,691,014
ごみ処理整備費	31,622,000	21,479,000	67.9	10,143,000
負担金補助及び交付金	31,622,000	21,479,000	67.9	10,143,000
新ごみ処理施設整備費	102,604,000	84,771,823	82.6	17,832,177
職員手当等	0	0	－	0
報償費	1,895,590	926,600	48.9	968,990
旅費	488,410	488,410	100.0	0
需用費	491,000	414,584	84.4	76,416
役務費	63,000	27,220	43.2	35,780
委託料	42,655,000	38,547,441	90.4	4,107,559
使用料及び賃借料	782,000	702,268	89.8	79,732
工事請負費	56,209,000	43,665,300	77.7	12,543,700
備品購入費	20,000	0	0.0	20,000
負担金補助及び交付金	0	0	－	0

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
粗大ごみ処理施設費	448,181,000	414,698,392	92.5	33,482,608
管理費	431,403,000	414,698,392	96.1	16,704,608
報酬	12,949,397	12,949,397	100.0	0
給料	36,796,603	35,762,316	97.2	1,034,287
職員手当等	33,788,000	27,718,064	82.0	6,069,936
共済費	13,592,000	13,078,302	96.2	513,698
賃金	2,194,437	2,194,437	100.0	0
旅費	87,000	13,260	15.2	73,740
需用費	59,179,563	55,605,772	94.0	3,573,791
消耗品費	22,051,563	19,968,904	90.6	2,082,659
燃料費	727,000	642,352	88.4	84,648
食糧費	0	0	－	0
印刷製本費	0	0	－	0
光熱水費	20,821,000	20,427,035	98.1	393,965
修繕料	15,580,000	14,567,481	93.5	1,012,519
役務費	2,586,000	2,562,608	99.1	23,392
委託料	170,742,000	170,010,968	99.6	731,032
不燃物処分委託料	5,446,906	5,446,906	100.0	0
不燃物最終処分委託料	30,523,500	30,523,500	100.0	0
不燃物搬送委託料	16,544,577	16,523,052	99.9	21,525
諸委託料	113,969,350	113,969,350	100.0	0
その他	4,257,667	3,548,160	83.3	709,507
使用料及び賃借料	333,000	321,819	96.6	11,181
工事請負費	91,965,000	88,399,500	96.1	3,565,500
原材料費	110,000	97,156	88.3	12,844
備品購入費	10,000	0	0.0	10,000
負担金補助及び交付金	6,906,000	5,820,993	84.3	1,085,007
公課費	164,000	163,800	99.9	200
粗大ごみ処理施設退職負担金	16,778,000	0	0.0	16,778,000
負担金補助及び交付金	16,778,000	0	0.0	16,778,000
公債費	683,048,000	682,515,787	99.9	532,213
公債費	683,048,000	682,515,787	99.9	532,213
元金	657,009,000	657,008,654	100.0	346
利子	26,039,000	25,507,133	98.0	531,867
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	3,270,498,000	3,072,214,224	93.9	198,283,776

［歳入歳出差引額　　248,260,985円］

１－３. リサイクル施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	31,046,000	31,046,000	100.0	0
豊中市負担金	22,870,000	22,870,000	100.0	0
伊丹市負担金	8,176,000	8,176,000	100.0	0
国庫支出金	33,613,000	33,500,000	99.7	△ 113,000
諸収入	1,000	0	0.0	△ 1,000
組合債	68,900,000	60,000,000	87.1	△ 8,900,000
歳入合計	133,560,000	124,546,000	93.3	△ 9,014,000

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	133,460,000	120,100,510	90.0	13,359,490
リサイクル施設費	133,460,000	120,100,510	90.0	13,359,490
リサイクル施設整備費	133,460,000	120,100,510	90.0	13,359,490
報酬	0	0	－	0
給料	9,773,000	9,010,204	92.2	762,796
職員手当等	7,870,000	7,584,593	96.4	285,407
共済費	3,203,000	3,005,713	93.8	197,287
旅費	0	0	－	0
需用費	0	0	－	0
役務費	568,000	0	0.0	568,000
委託料	12,046,000	500,000	4.2	11,546,000
使用料及び賃借料	0	0	－	0
工事請負費	100,000,000	100,000,000	100.0	0
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	133,560,000	120,100,510	89.9	13,459,490

［歳入歳出差引額　　4,445,490円］

2. 歳入歳出決算の状況

2－1. 共通経費勘定

[歳入]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	587,383,000	561,541,000	104.6	25,842,000
豊中市負担金	343,002,000	327,912,000	104.6	15,090,000
伊丹市負担金	244,381,000	233,629,000	104.6	10,752,000
使用料及び手数料	74,211,660	80,199,180	92.5	△ 5,987,520
余熱利用施設使用料	72,251,100	78,235,220	92.4	△ 5,984,120
総務管理使用料	1,960,560	1,963,960	99.8	△ 3,400
繰越金	15,558,293	12,416,225	125.3	3,142,068
諸収入	7,163,893	7,418,314	96.6	△ 254,421
組合預金利子	93,079	559,413	16.6	△ 466,334
雑入	7,070,814	6,858,901	103.1	211,913
歳入合計	684,316,846	661,574,719	103.4	22,742,127

[歳出]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
議会費	1,334,436	2,007,431	66.5	△ 672,995
議会費	1,334,436	2,007,431	66.5	△ 672,995
議会費	1,334,436	2,007,431	66.5	△ 672,995
報酬	1,038,000	1,038,000	100.0	0
職員手当等	282,450	310,200	91.1	△ 27,750
旅費	0	636,110	皆減	△ 636,110
交際費	10,500	0	皆増	10,500
役務費	3,486	2,121	164.4	1,365
使用料及び賃借料	0	21,000	皆減	△ 21,000
総務費	338,713,461	313,116,595	108.2	25,596,866
総務管理費	172,821,163	147,596,823	117.1	25,224,340
一般管理費	149,556,785	141,521,487	105.7	8,035,298
報酬	992,000	900,000	110.2	92,000
給料	61,025,271	60,246,021	101.3	779,250
職員手当等	46,764,739	49,676,264	94.1	△ 2,911,525
共済費	20,440,285	18,452,363	110.8	1,987,922
賃金	1,426,000	1,761,250	81.0	△ 335,250
旅費	45,990	223,730	20.6	△ 177,740
交際費	0	0	－	0
需用費	371,482	455,763	81.5	△ 84,281
役務費	1,580,315	1,631,935	96.8	△ 51,620
委託料	12,241,372	2,755,148	444.3	9,486,224
使用料及び賃借料	4,155,964	5,160,494	80.5	△ 1,004,530
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	513,367	258,519	198.6	254,848

項目 ＼ 年度	平成21年度 決算額 (円)	平成20年度 決算額 (円)	前年比 (%)	増減額 (円)
総務管理退職負担金	23,264,378	6,075,336	382.9	17,189,042
負担金補助及び交付金	23,264,378	6,075,336	382.9	17,189,042
監査委員費	24,000	24,000	100.0	0
公平委員会費	36,000	36,000	100.0	0
余熱利用施設費	165,832,298	165,459,772	100.2	372,526
管理費	165,832,298	165,459,772	100.2	372,526
報酬	0	0	－	0
給料	10,294,400	10,300,800	99.9	△ 6,400
職員手当等	3,840,212	3,800,442	101.0	39,770
共済費	2,019,144	1,905,880	105.9	113,264
賃金	0	0	－	0
旅費	0	0	－	0
需用費	45,441,794	39,554,707	114.9	5,887,087
役務費	1,474,592	1,639,009	90.0	△ 164,417
委託料	100,385,611	100,414,900	100.0	△ 29,289
使用料及び賃借料	2,313,095	7,844,034	29.5	△ 5,530,939
工事請負費	0	0	－	0
備品購入費	51,450	0	皆増	51,450
負担金補助及び交付金	12,000	0	皆増	12,000
公債費	325,696,123	330,892,400	98.4	△ 5,196,277
公債費	325,696,123	330,892,400	98.4	△ 5,196,277
元金	307,540,992	307,479,929	100.0	61,063
償還金利子及び割引料	307,540,992	307,479,929	100.0	61,063
利子	18,155,131	23,412,471	77.5	△ 5,257,340
償還金利子及び割引料	18,155,131	23,412,471	77.5	△ 5,257,340
歳出合計	665,744,020	646,016,426	103.1	19,727,594

２－２.ごみ処理施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	2,549,601,000	2,953,991,000	86.3	△ 404,390,000
豊中市負担金	1,706,958,000	1,966,324,000	86.8	△ 259,366,000
伊丹市負担金	842,643,000	987,667,000	85.3	△ 145,024,000
使用料及び手数料	426,802,872	415,208,120	102.8	11,594,752
国庫支出金	8,642,000	20,084,000	43.0	△ 11,442,000
財産収入	64,910,337	153,991,883	42.2	△ 89,081,546
繰越金	146,556,433	174,315,203	84.1	△ 27,758,770
諸収入	90,973,696	91,266,248	99.7	△ 292,552
売電収入	81,341,633	78,802,395	103.2	2,539,238
雑入	9,632,063	12,463,853	77.3	△ 2,831,790
組合債	19,200,000	45,400,000	42.3	△ 26,200,000
一般廃棄物処理事業債	19,200,000	45,400,000	42.3	△ 26,200,000
ごみ処理施設整備債	0	0	－	0
府県支出金	13,788,871	0	皆増	13,788,871
歳入合計	3,320,475,209	3,854,256,454	86.2	△ 533,781,245

[歳出]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	2,389,698,437	2,662,092,114	89.8	△ 272,393,677
ごみ処理施設費	1,975,000,045	2,172,257,059	90.9	△ 197,257,014
管理費	1,803,016,236	1,932,179,682	93.3	△ 129,163,446
報酬	16,068,730	7,431,294	216.2	8,637,436
給料	373,292,495	399,815,142	93.4	△ 26,522,647
職員手当等	314,791,136	351,097,152	89.7	△ 36,306,016
共済費	126,681,586	122,946,292	103.0	3,735,294
賃金	14,220,563	17,555,601	81.0	△ 3,335,038
報償費	129,510	12,980	997.8	116,530
旅費	533,610	1,102,110	48.4	△ 568,500
需用費	314,909,877	759,603,560	41.5	△ 444,693,683
消耗品費	180,890,909	195,282,115	92.6	△ 14,391,206
燃料費	3,536,940	6,040,268	58.6	△ 2,503,328
食糧費	38,499	45,360	84.9	△ 6,861
印刷製本費	215,204	163,243	131.8	51,961
光熱水費	116,550,495	88,637,769	131.5	27,912,726
修繕料	13,677,830	469,434,805	2.9	△ 455,756,975
役務費	8,752,941	8,768,731	99.8	△ 15,790

項目 ＼ 年度	平成21年度 決算額 (円)	平成20年度 決算額 (円)	前年比 (%)	増減額 (円)
委託料	236,560,737	228,865,143	103.4	7,695,594
灰最終処分委託料	135,082,500	135,375,240	99.8	△ 292,740
灰搬送委託料	58,206,976	52,291,780	111.3	5,915,196
その他	43,271,261	41,198,123	105.0	2,073,138
使用料及び賃借料	12,529,598	28,563,593	43.9	△ 16,033,995
工事請負費	381,213,840	2,058,000	18,523.5	379,155,840
原材料費	44,268	154,160	28.7	△ 109,892
備品購入費	580,125	877,180	66.1	△ 297,055
負担金補助及び交付金	2,436,590	3,093,544	78.8	△ 656,954
補償補填及び賠償金	67,830	58,800	115.4	9,030
公課費	202,800	176,400	115.0	26,400
ごみ処理施設退職負担金	65,732,986	98,496,547	66.7	△ 32,763,561
負担金補助及び交付金	65,732,986	98,496,547	66.7	△ 32,763,561
ごみ処理整備費	21,479,000	50,576,000	42.5	△ 29,097,000
負担金補助及び交付金	21,479,000	50,576,000	42.5	△ 29,097,000
新ごみ処理施設整備費	84,771,823	91,004,830	93.2	△ 6,233,007
職員手当等	0	0	－	0
報償費	926,600	1,146,600	80.8	△ 220,000
旅費	488,410	232,650	209.9	255,760
需用費	414,584	19,520	2,123.9	395,064
役務費	27,220	23,050	118.1	4,170
委託料	38,547,441	75,917,100	50.8	△ 37,369,659
使用料及び賃借料	702,268	593,410	118.3	108,858
工事請負費	43,665,300	13,072,500	334.0	30,592,800
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0

項目 ＼ 年度	平成21年度 決算額 (円)	平成20年度 決算額 (円)	前年比 (%)	増減額 (円)
粗大ごみ処理施設費	414,698,392	489,835,055	84.7	△ 75,136,663
管理費	414,698,392	474,523,965	87.4	△ 59,825,573
報酬	12,949,397	9,680,122	133.8	3,269,275
給料	35,762,316	47,378,880	75.5	△ 11,616,564
職員手当等	27,718,064	39,471,987	70.2	△ 11,753,923
共済費	13,078,302	14,961,696	87.4	△ 1,883,394
賃金	2,194,437	0	皆増	2,194,437
旅費	13,260	77,180	17.2	△ 63,920
需用費	55,605,772	189,546,655	29.3	△ 133,940,883
消耗品費	19,968,904	20,709,974	96.4	△ 741,070
燃料費	642,352	573,024	112.1	69,328
印刷製本費	0	24,675	皆減	△ 24,675
光熱水費	20,427,035	19,890,636	102.7	536,399
修繕料	14,567,481	148,348,346	9.8	△ 133,780,865
役務費	2,562,608	2,515,144	101.9	47,464
委託料	170,010,968	163,887,588	103.7	6,123,380
不燃物処分委託料	5,446,906	4,887,564	111.4	559,342
不燃物最終処分委託料	30,523,500	28,984,830	105.3	1,538,670
不燃物搬送委託料	16,523,052	13,166,622	125.5	3,356,430
諸委託料	113,969,350	112,027,865	101.7	1,941,485
その他	3,548,160	4,820,707	73.6	△ 1,272,547
使用料及び賃借料	321,819	1,439,748	22.4	△ 1,117,929
工事請負費	88,399,500	0	皆増	88,399,500
原材料費	97,156	77,542	125.3	19,614
備品購入費	0	49,140	皆減	△ 49,140
負担金補助及び交付金	5,820,993	5,312,283	109.6	508,710
公課費	163,800	126,000	130.0	37,800
粗大ごみ処理施設退職金	0	15,311,090	皆減	△ 15,311,090
負担金補助及び交付金	0	15,311,090	皆減	△ 15,311,090
公債費	682,515,787	1,045,607,907	65.3	△ 363,092,120
公債費	682,515,787	1,045,607,907	65.3	△ 363,092,120
元金	657,008,654	991,297,073	66.3	△ 334,288,419
償還金利子及び割引料	657,008,654	991,297,073	66.3	△ 334,288,419
利子	25,507,133	54,310,834	47.0	△ 28,803,701
償還金利子及び割引料	25,507,133	54,310,834	47.0	△ 28,803,701
歳出合計	3,072,214,224	3,707,700,021	82.9	△ 635,485,797

2－3. リサイクル施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	31,046,000	0	皆増	31,046,000
豊中市負担金	22,870,000	0	皆増	22,870,000
伊丹市負担金	8,176,000	0	皆増	8,176,000
国庫支出金	33,500,000	0	皆増	33,500,000
諸収入	0	0	－	0
組合債	60,000,000	0	皆増	60,000,000
歳入合計	124,546,000	0	皆増	124,546,000

[歳出]

項目＼年度	平成21年度 決算額（円）	平成20年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	120,100,510	0	皆増	120,100,510
リサイクル施設費	120,100,510	0	皆増	120,100,510
リサイクル施設整備費	120,100,510	0	皆増	120,100,510
報酬	0	0	－	0
給料	9,010,204	0	皆増	9,010,204
職員手当等	7,584,593	0	皆増	7,584,593
共済費	3,005,713	0	皆増	3,005,713
旅費	0	0	－	0
需用費	0	0	－	0
役務費	0	0	－	0
委託料	500,000	0	皆増	500,000
使用料及び賃借料	0	0	－	0
工事請負費	100,000,000	0	皆増	100,000,000
予備費	0	0	－	0
歳出合計	120,100,510	0	皆増	120,100,510

VI. その他

1. 啓発活動の状況

1－1. 施設見学者実績

区分 / 月別	小・中学校		自治会・市民等		他市等		その他		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	6	430	0	0	0	0	0	0	6	430
5	12	907	0	0	0	0	0	0	12	907
6	36	2,447	2	25	0	0	0	0	38	2,472
7	16	1,110	3	42	0	0	0	0	19	1,152
8	0	0	4	77	0	0	2	16	6	93
9	3	193	5	91	0	0	0	0	8	284
10	5	371	7	131	0	0	0	0	12	502
11	2	167	6	108	1	65	2	88	11	428
12	1	36	2	55	0	0	2	22	5	113
1	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25
2	1	19	2	41	0	0	2	13	5	73
3	0	0	5	76	0	0	1	33	6	109
計	82	5,680	36	646	1	65	10	197	129	6,588
月平均	7	473	3	54	0	5	1	16	11	549

※「自治会・市民等」は、老人クラブ・婦人会・PTA・個人見学者等、「その他」は、両市議会議員・職員・両市内の企業等の見学者である。小学校の見学の下見は含まない。

1－2. 体験学習受入れの実績

実施日	団体名	日数	人数	内容	備考
5月25日～29日	伊丹市立天王寺川中学校	5	3	○保全業務作業 ○ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾔｰﾄﾞ作業 ○粗大業務 ○ｸﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ作業 ○薪割り作業 ○小学校社会見学対応 ○出前講座補助	トライやるウイーク
9月8日～10日	豊中市立第15中学校	3	4		CUL地域体験
10月27日～29日	豊中市立第6中学校	3	2		CUL地域体験
11月9日～13日	伊丹市立松崎中学校	5	3		トライやるウイーク
11月10日～12日	豊中市立第12中学校	3	3		CUL地域体験
11月11日～13日	豊中市立第2中学校	3	2		CUL地域体験
11月16日～20日	伊丹市立北中学校	5	4		トライやるウイーク
11月17日～19日	豊中市立第10中学校	3	6		CUL地域体験
計 8 校	延べ日数	30	日	人数計 27 人	

1－3. 出前講座の実績

実施日	事業名 テーマ	会場	人 数	主　　催
6月2日	みんなで分けよう！資源ごみ	豊中市立豊中人権まちづくりセンター保育所	60	クリーンランド業務管理課
6月19日	クリーンランドのごみ処理について	伊丹市立有岡小学校	105	クリーンランド業務管理課
6月22日	クリーンランドのごみ処理について	伊丹市立池尻小学校	145	クリーンランド業務管理課
10月23日	クリーンランドのごみ処理について ～いつまでもきれいな街にするために～	豊中市立第1中学校	37	クリーンランド業務管理課
11月11日	クリンちゃんとランドくんといっしょに遊ぼう！！～まぜればごみ、わければたからもの	豊中市立北緑丘保育所	72	クリーンランド業務管理課
11月13日	クリーンランドのごみ処理について ～自分たちの生活の中でできることを見つけよう～	伊丹市立天王寺川中学校	286	クリーンランド業務管理課
計	6 件		705 人	

1－4. イベント等の実績

実施日	事業名 目的	内容	人 数	主　　催
8月1・2日	豊中まつり2009 市民との協働イベントをとおして、持続可能な地域社会づくりをめざす。	ごみ分別輪投げ チラシ配布 パネル展示	来店者 822人	豊中まつり実行委員会
9月20日	伊丹市シルバーフェスティバル クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	チラシ配布 パネル展示		伊丹市シルバーフェスティバル実行委員会
10月17日	第4回とよっぴーまつり 市民との協働をとおして、「クリーンランドのPR」を推進する。	ごみ分別輪投げ	来店者 280人	NPO花と緑のネットワーク
10月25日	第4回クリーンランドフェスティバル 「3Rの実践～ごみを減らして環境にやさしく～」をテーマにクリーンランドから3R推進を発信する。	ごみ分別輪投げ、パネル展示、施設見学会、ガレージセール、エコカー試乗会	来場者 850人	クリーンランドフェスティバル実行委員会
12月11日・12日	とよなか市民環境展2009 クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	リユースコーナー パネル展示		NPOとよなか市民環境会議アジェンダ21

1－5. 搬入ごみ検査状況

検査日	検査結果	処置
6月23日 9月16日 12月10日 12月15日 3月3日	検査対象を両市許可業者の全社とすることを目標に5回／年の実施を行いました。搬入物の内容では、可燃物中に資源化物の混入や産業廃棄物の混入が見受けられました。	鉄類やプラスチック類の産業廃棄物は、持ち帰らせ適正な処理をするよう指導をしました。排出先の特定ができた不適正搬入物においては、両市を通じて指導・啓発へとつなげています。

2. 余熱利用施設(クリーンスポーツランド)利用者の状況

2－1. 施設利用者実績

	大人					小人				高齢者			
	一回使用	回数券	定期券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計
4	1,200	410	2,308	0	3,918	607	21	0	628	173	716	0	889
5	2,308	450	2,906	0	5,664	1,102	85	0	1,187	254	965	0	1,219
6	3,933	219	2,771	0	6,923	1,756	68	0	1,824	280	1,136	0	1,416
7	3,686	639	3,172	0	7,497	2,353	261	0	2,614	314	1,142	0	1,456
8	6,022	680	3,056	0	9,758	4,042	317	0	4,359	620	1,032	0	1,652
9	2,521	382	3,206	0	6,109	876	138	0	1,014	247	961	0	1,208
10	1,902	280	2,988	0	5,170	526	135	0	661	196	939	0	1,135
11	1,718	271	2,944	0	4,933	496	113	0	609	153	956	0	1,109
12	1,351	244	2,522	0	4,117	374	41	0	415	165	844	0	1,009
1	1,603	326	2,266	0	4,195	527	124	0	651	174	831	0	1,005
2	1,717	384	2,887	0	4,988	695	25	0	720	207	949	0	1,156
3	1,830	390	3,206	0	5,426	689	99	0	788	249	1,090	0	1,339
計	29,791	4,675	34,232	0	68,698	14,043	1,427	0	15,470	3,032	11,561	0	14,593

	障害者大人			障害者小人			幼児	介助者	合計
	一回使用	回数券	計	一回使用	回数券	計			
4	42	112	154	12	5	17	357	133	6,096
5	66	135	201	24	3	27	754	198	9,250
6	72	150	222	34	6	40	1,175	218	11,818
7	114	149	263	47	5	52	1,411	276	13,569
8	176	124	300	86	5	91	2,595	295	19,050
9	120	104	224	49	5	54	891	208	9,708
10	98	122	220	31	8	39	745	190	8,160
11	79	118	197	29	7	36	646	179	7,709
12	73	109	182	16	8	24	491	155	6,393
1	87	94	181	26	8	34	691	167	6,924
2	86	116	202	8	5	13	696	182	7,957
3	73	118	191	28	2	30	868	177	8,819
計	1,086	1,451	2,537	390	67	457	11,320	2,378	115,453

2－2. 年間の利用者の割合

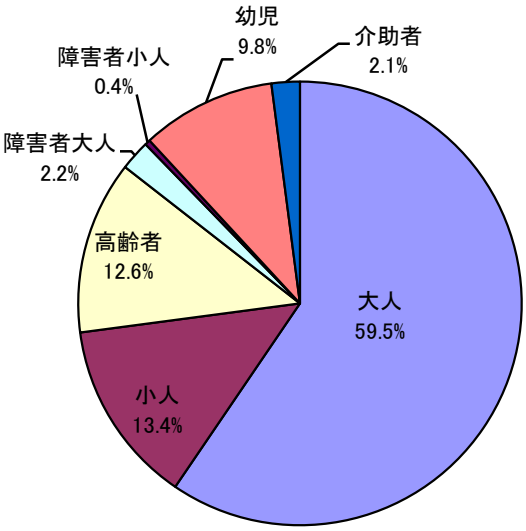

2－3. 施設利用状況の経年変化

	大人		小人		高齢者		障害者大人		障害者小人		幼児		介助者		合計	
		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数
10	87,524	100.0	16,145	100.0	5,716	100.0	1,122	100.0	196	100.0	10,873	100.0	659	100.0	122,235	100.0
11	107,470	122.8	15,624	96.8	8,726	152.7	1,903	169.6	261	133.2	11,212	103.1	1,083	164.3	146,279	119.7
12	100,149	114.4	13,657	84.6	10,275	179.8	1,802	160.6	170	86.7	10,141	93.3	1,114	169.0	137,308	112.3
13	96,297	110.0	14,227	88.1	10,194	178.3	1,729	154.1	170	86.7	10,310	94.8	1,118	169.7	134,045	109.7
14	95,243	108.8	15,101	93.5	11,206	196.0	2,370	211.2	149	76.0	11,907	109.5	1,462	221.9	137,438	112.4
15	94,700	108.2	16,350	101.3	12,395	216.8	2,815	250.9	341	174.0	11,769	108.2	2,065	313.4	140,435	114.9
16	91,233	104.2	14,726	91.2	11,235	196.6	2,934	261.5	433	220.9	10,203	93.8	2,341	355.2	133,105	108.9
17	84,270	96.3	14,228	88.1	11,325	198.1	2,939	261.9	643	328.1	8,501	78.2	2,719	412.6	124,625	102.0
18	81,394	93.0	13,760	85.2	13,587	237.7	2,921	260.3	621	316.8	8,182	75.3	2,805	425.6	123,270	100.8
19	76,085	86.9	14,587	90.3	13,588	237.7	2,826	251.9	630	321.4	9,939	91.4	2,807	425.9	120,462	98.5
20	71,697	81.9	15,589	96.6	14,511	253.9	2,694	240.1	491	250.5	10,755	98.9	2,566	389.4	118,303	96.8
21	68,698	78.5	15,470	95.8	14,593	255.3	2,537	226.1	457	233.2	11,320	104.1	2,378	360.8	115,453	94.5

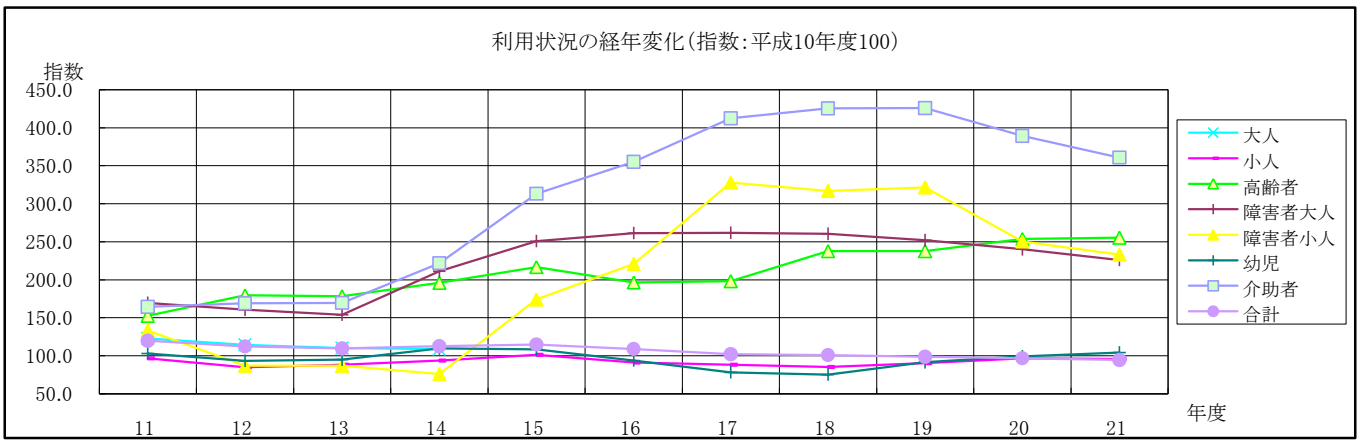

3．組織及び職員数

3－1．組織図 （平成22年3月31日現在）

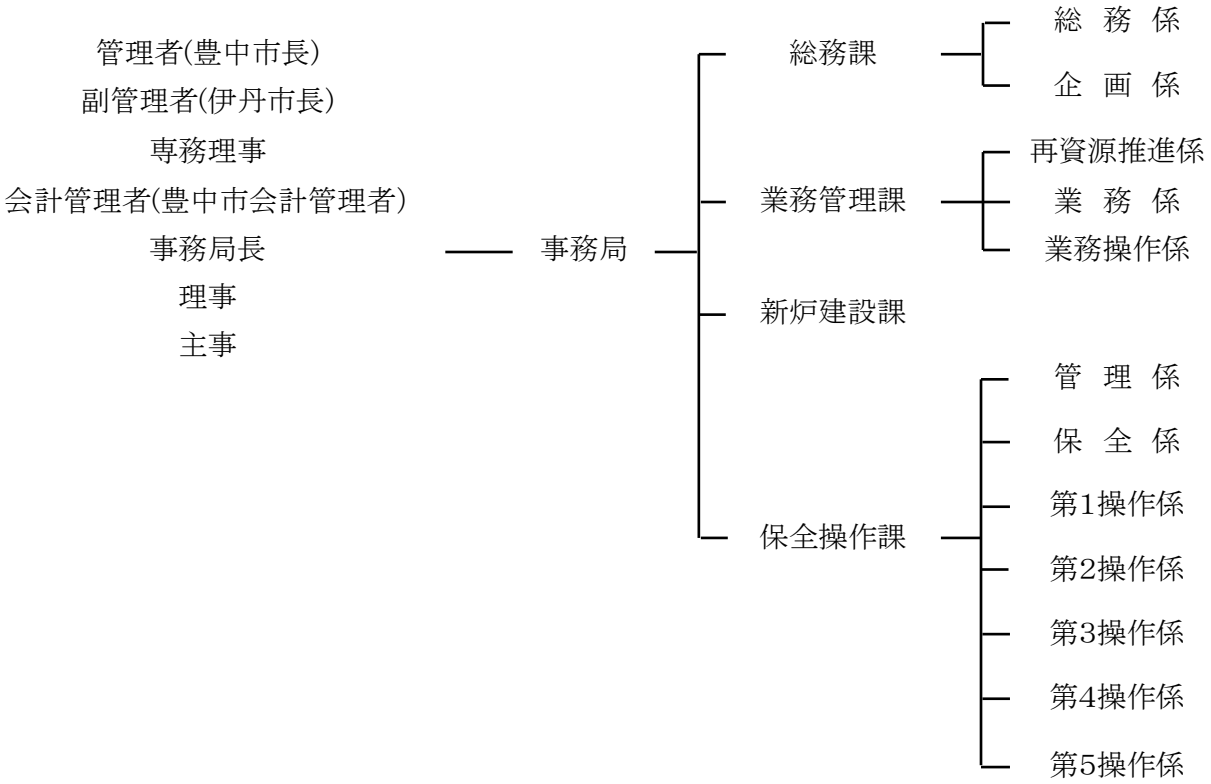

3－2．職種別人員配置 （平成22年3月31日現在）

単位(人)

	事務職員	技術職員	技能職員	計	再任用	任期付	嘱託	臨職	パート	計
総務課	7	5	1	13	5	0	0	0	1	19
総務係	5	3	1	9					1	10
企画係	2	2		4	5					9
業務管理課	3	5	5	13	3	2	9	1	5	33
再資源推進係	3	1	3	7			4		5	16
業務係		1		1	3		4	1		9
業務操作係		3	2	5		2	1			8
新炉建設課	2	6	1	9	0	0	0	0	1	10
保全操作課	1	38	34	73	2	0	2	2	0	79
管理係	1	6	1	8						8
保全係		8	6	14			1	1		16
第1操作係		4	5	9			1	1		11
第2操作係		5	5	10	1					11
第3操作係		4	6	10	1					11
第4操作係		6	5	11						11
第5操作係		5	6	11						11
合計	13	54	41	108	10	2	11	3	7	141

平成21年度(2009年度)ごみ処理事業年報

平成22年(2010年)9月発行

豊中市伊丹市クリーンランド
〒561-0806　豊中市原田西町２－１
TEL　06-6841-5395

編集　　総務課　企画係

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
