平成22年度（2010年度）

ごみ処理事業年報

豊中市伊丹市クリーンランド

目　　次

Ⅰ. 総括

1. 一般廃棄物処理実績フロー図
1－1. 一般廃棄物処理実績フロー図 …… 3
1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉) …… 4
1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート …… 5

2. ごみ搬入量
2－1. ごみ搬入量実績(総括) …… 6
2－2. 月別ごみ搬入量実績(両市合計) …… 8
2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分) …… 12
2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分) …… 16

3. ごみ搬入量の経年変化
3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化 …… 20
3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化 …… 21
3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 22
3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23
3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 23

4. ごみ質
4－1. 可燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 24
4－2. 可燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 24
4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 25
4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・DRY基準) …… 25
4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準) …… 26
4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準) …… 26
4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量 …… 27
4－8. ごみの三成分(可燃分・灰分・水分)の経年変化(%) …… 27
4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ/Kg) …… 27
4－10. 不燃ごみの物理組成(重量%・WET基準) …… 28
4－11. 不燃ごみの物理組成(重量%・DRY基準) …… 28
4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準) …… 29

Ⅱ. ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化
1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化 …… 32
1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化 …… 33

2. 焼却関係
2－1. 焼却炉稼働状況(1～4号炉合計) …… 34
2－2. 焼却炉稼働状況(1号炉) …… 36
2－3. 焼却炉稼働状況(2号炉) …… 36

２－４. 焼却炉稼働状況（3号炉） …… 38
２－５. 焼却炉稼働状況（4号炉） …… 38
２－６. ごみ焼却量と低位発熱量（熱精算法）の経年変化 …… 40
２－７. 月別焼却量の経年変化 …… 41

3. 管理薬剤の使用状況
３－１. 管理薬剤使用（購入）実績 …… 42

4. ボイラー・タービン関係
４－１. ボイラー運転状況（1～4号炉合計） …… 43
４－２. ボイラー運転状況（1号炉） …… 44
４－３. ボイラー運転状況（2号炉） …… 44
４－４. ボイラー運転状況（3号炉） …… 45
４－５. ボイラー運転状況（4号炉） …… 45
４－６. タービン稼働状況 …… 46
４－７. 純水及び薬剤使用実績 …… 48

5. 洗煙装置関係
５－１. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計） …… 49
５－２. 洗煙装置稼働実績（1号炉） …… 50
５－３. 洗煙装置稼働実績（2号炉） …… 50
５－４. 洗煙装置稼働実績（3号炉） …… 51
５－５. 洗煙装置稼働実績（4号炉） …… 51
５－６. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績 …… 52
５－７. 洗煙装置暦日数平均稼働率 …… 52

6. 排水処理関係
６－１. 排水処理実績 …… 53
６－２. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績 …… 53

7. 電力関係
７－１. 電力使用実績 …… 54

8. 市水・工水・防臭薬剤関係
８－１. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績 …… 55

9. 焼却残渣（灰）関係
９－１. 飛灰安定化装置稼働実績 …… 56
９－２. 焼却残渣（灰）処分実績 …… 57
９－３. 焼却残渣（灰）測定結果 …… 57

10. 公害関係
10－1. 敷地境界線における臭気測定結果 …… 58
10－2. 排ガス関係測定結果 …… 59
○ばいじん量
○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物
○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量
10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口） …… 62
10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口・煙突入口） …… 63
10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 64
10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化（煙突入口） …… 65
10－8. その他のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 65
10－9. 排水関係測定結果
①原水水質測定結果 …… 66
②放流水水質測定結果 …… 68
③水素イオン濃度の経月変化 …… 69
④水銀濃度の経月変化 …… 69
⑤鉛濃度の経月変化 …… 70
⑥亜鉛濃度の経月変化 …… 70

11. 維持管理経費の状況（ごみ焼却施設）
11－1. 処理経費 …… 71
11－2. 処理経費の経年変化 …… 71

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績
1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（両市合計） …… 74
1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分） …… 75
1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分） …… 75

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績
2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績 …… 76
2－2. 用水・蒸気使用量実績 …… 77

3. 不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況
3－1. 不燃・粗大ごみ処理残渣の処分実績 …… 78
3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績 …… 79
3－3. 適正処理困難物処分量実績 …… 80

4. 維持管理経費の状況（粗大ごみ処理施設）
4－1. 処理経費 …… 81
4－2. 処理経費の経年変化 …… 81

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績
1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績 …… 84
1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績 …… 84
1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績 …… 85

2. 家電四品目搬入・搬出実績
2－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（両市合計） …… 86
2－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（豊中市分） …… 87
2－3. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（伊丹市分） …… 88
2－4. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬出実績 …… 89

3. その他のリサイクル等の状況
3－1. 逆送電力量経年変化 …… 90
3－2. 搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績 …… 91
3－3. 古紙類の資源化実績 …… 91

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況
1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況 …… 94
1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況 …… 95
1－3. リサイクル施設勘定の予算・決算状況 …… 97

2. 歳入歳出決算の状況
2－1. 共通経費勘定 …… 99
2－2. ごみ処理施設勘定 …… 101
2－3. リサイクル施設勘定 …… 104

Ⅵ. その他

1. 啓発活動の状況
1－1. 施設見学者実績 …… 106
1－2. 体験学習受入れの実績 …… 106
1－3. 出前講座の実績 …… 107
1－4. イベント等の実績 …… 107
1－5. 搬入ごみ検査状況 …… 107

2. 余熱利用施設（クリーンスポーツランド）利用者の状況
2－1. 施設利用者実績 …… 108
2－2. 年間の利用者の割合 …… 109
2－3. 施設利用状況の経年変化 …… 109

3. 組織及び職員数
3－1. 組織図 …… 110
3－2. 職種別人員配置 …… 110

Ⅰ．総　　括

平成22年度一般廃棄物処理実績フロー図（両市）

（単位：t）

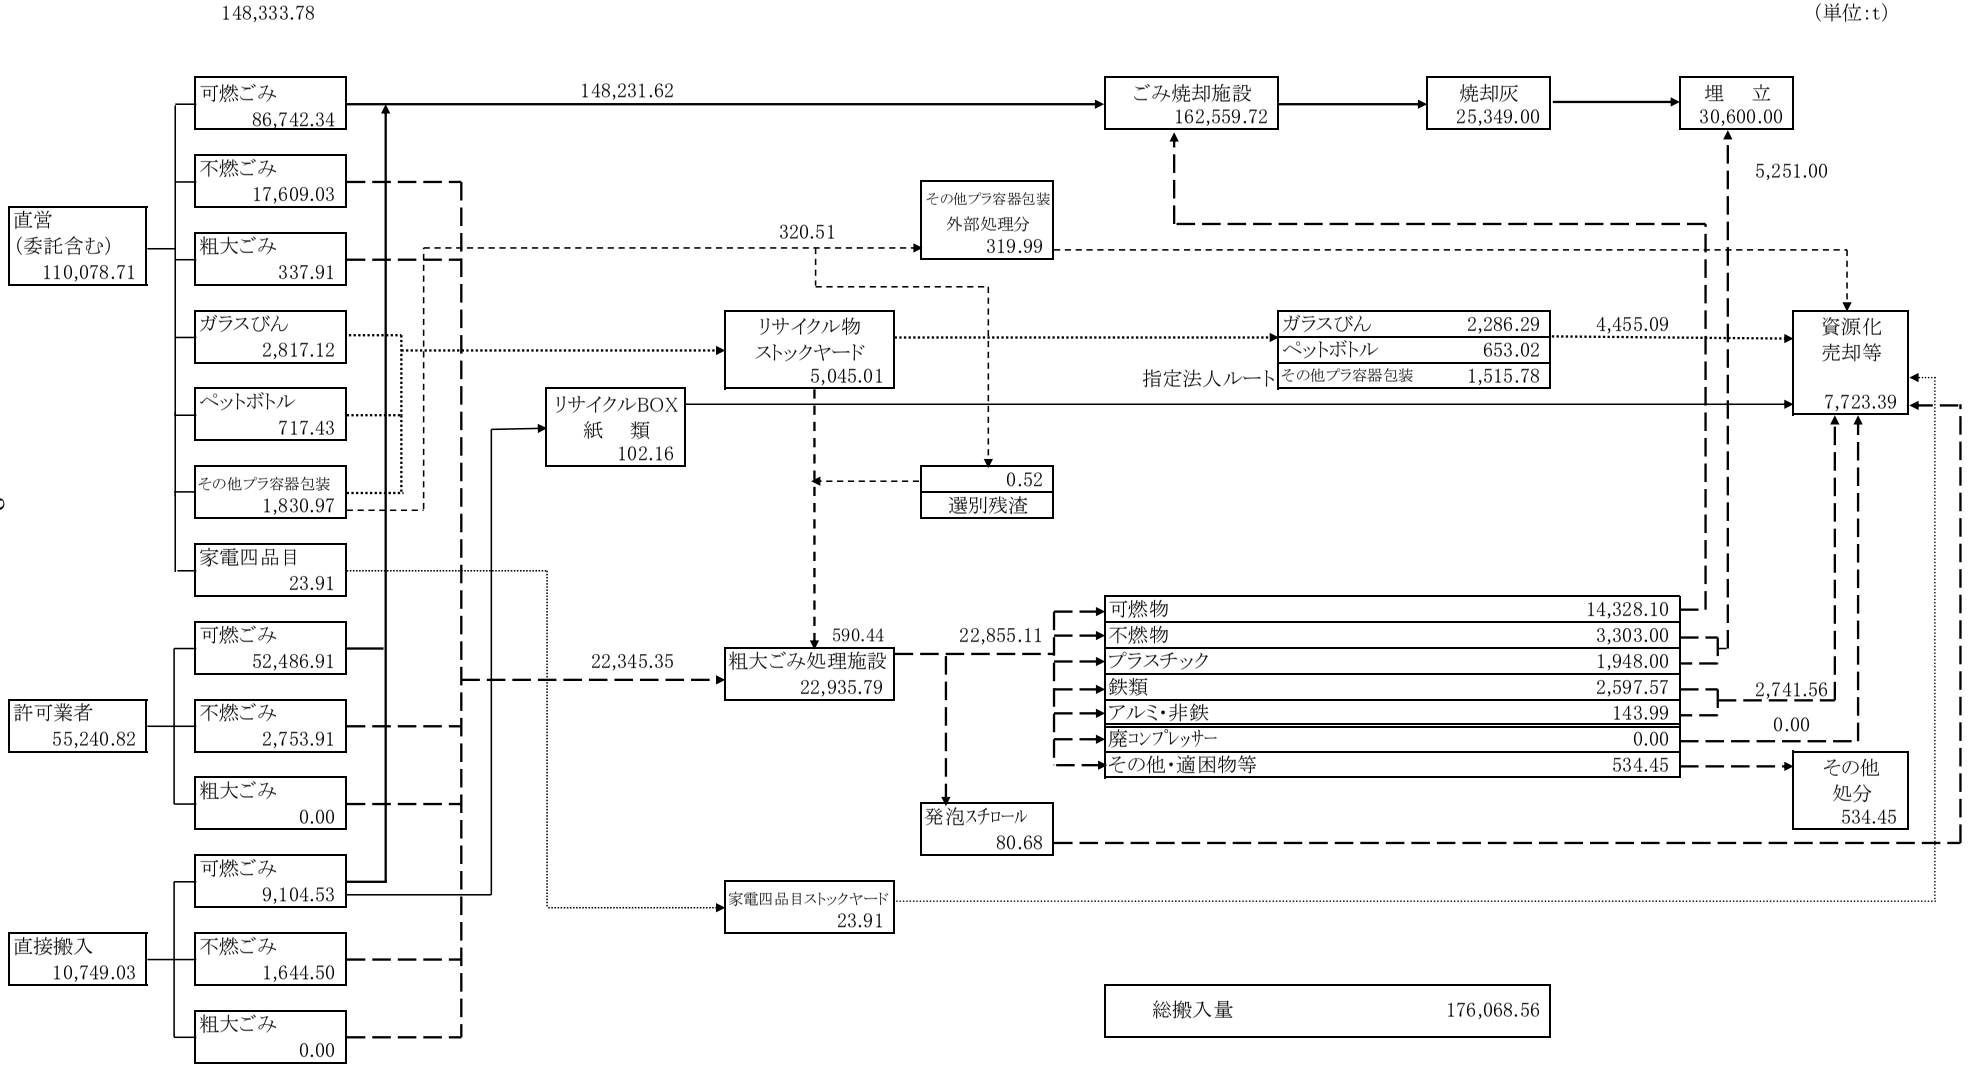

１－２. ごみ焼却施設フローシート（１～４号炉）

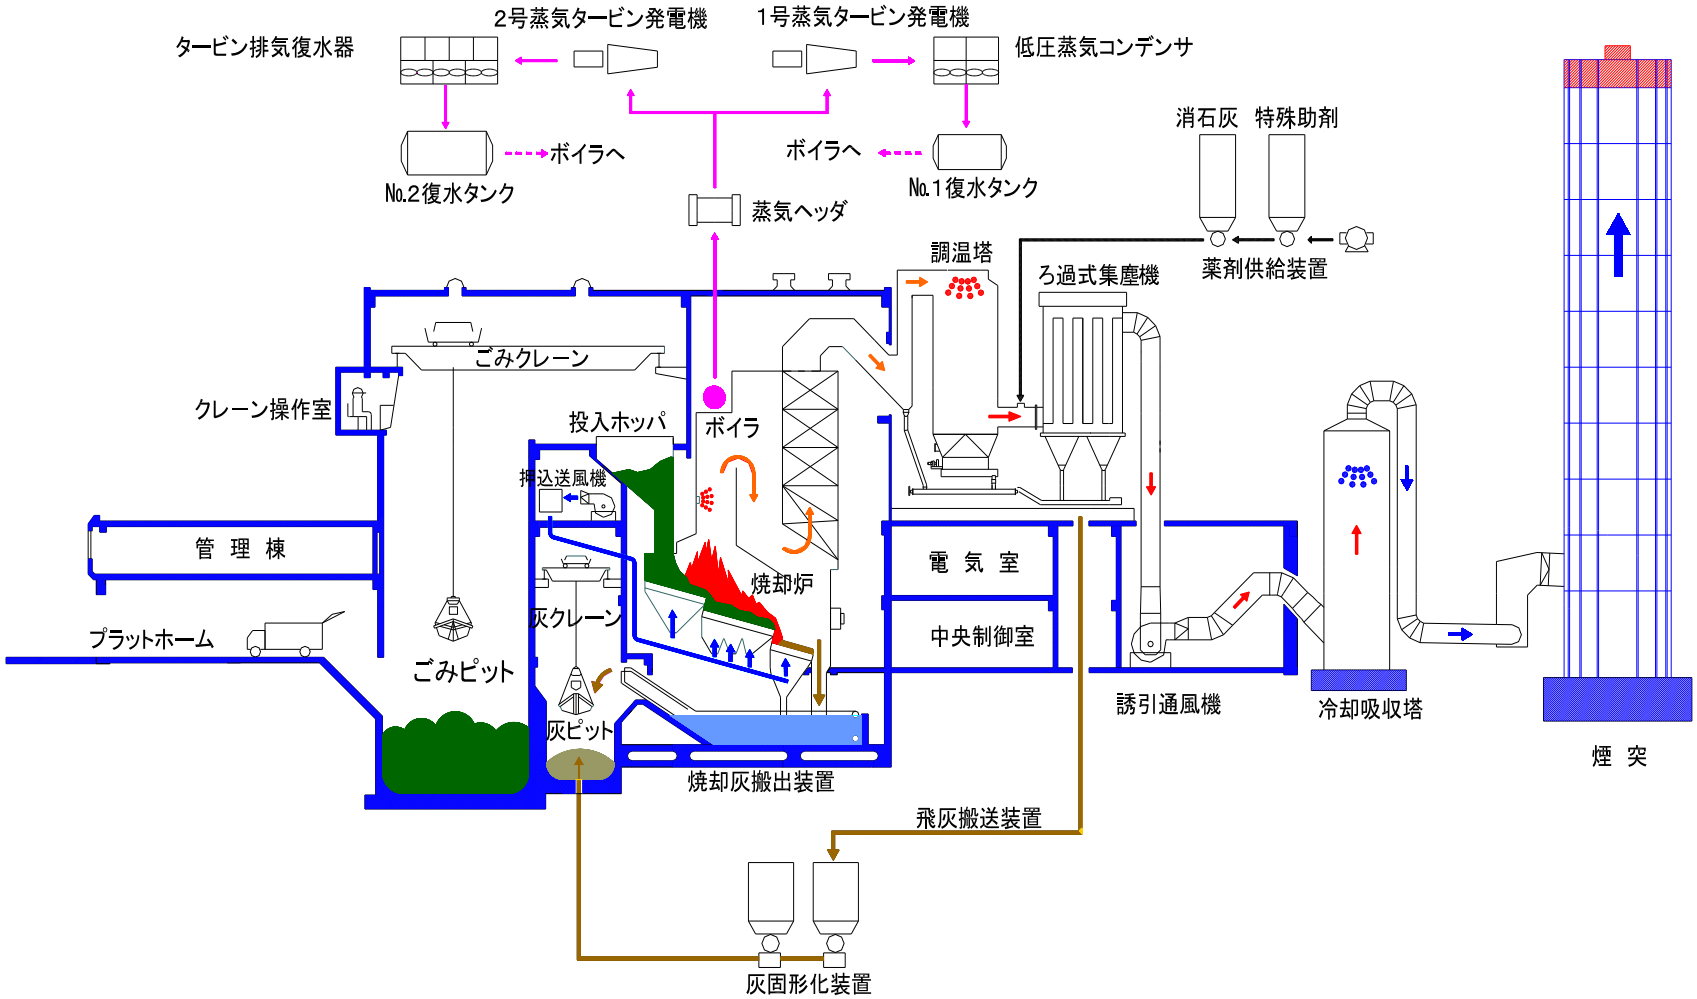

1－3. 粗大ごみ処理施設フローシート

プラント系統図

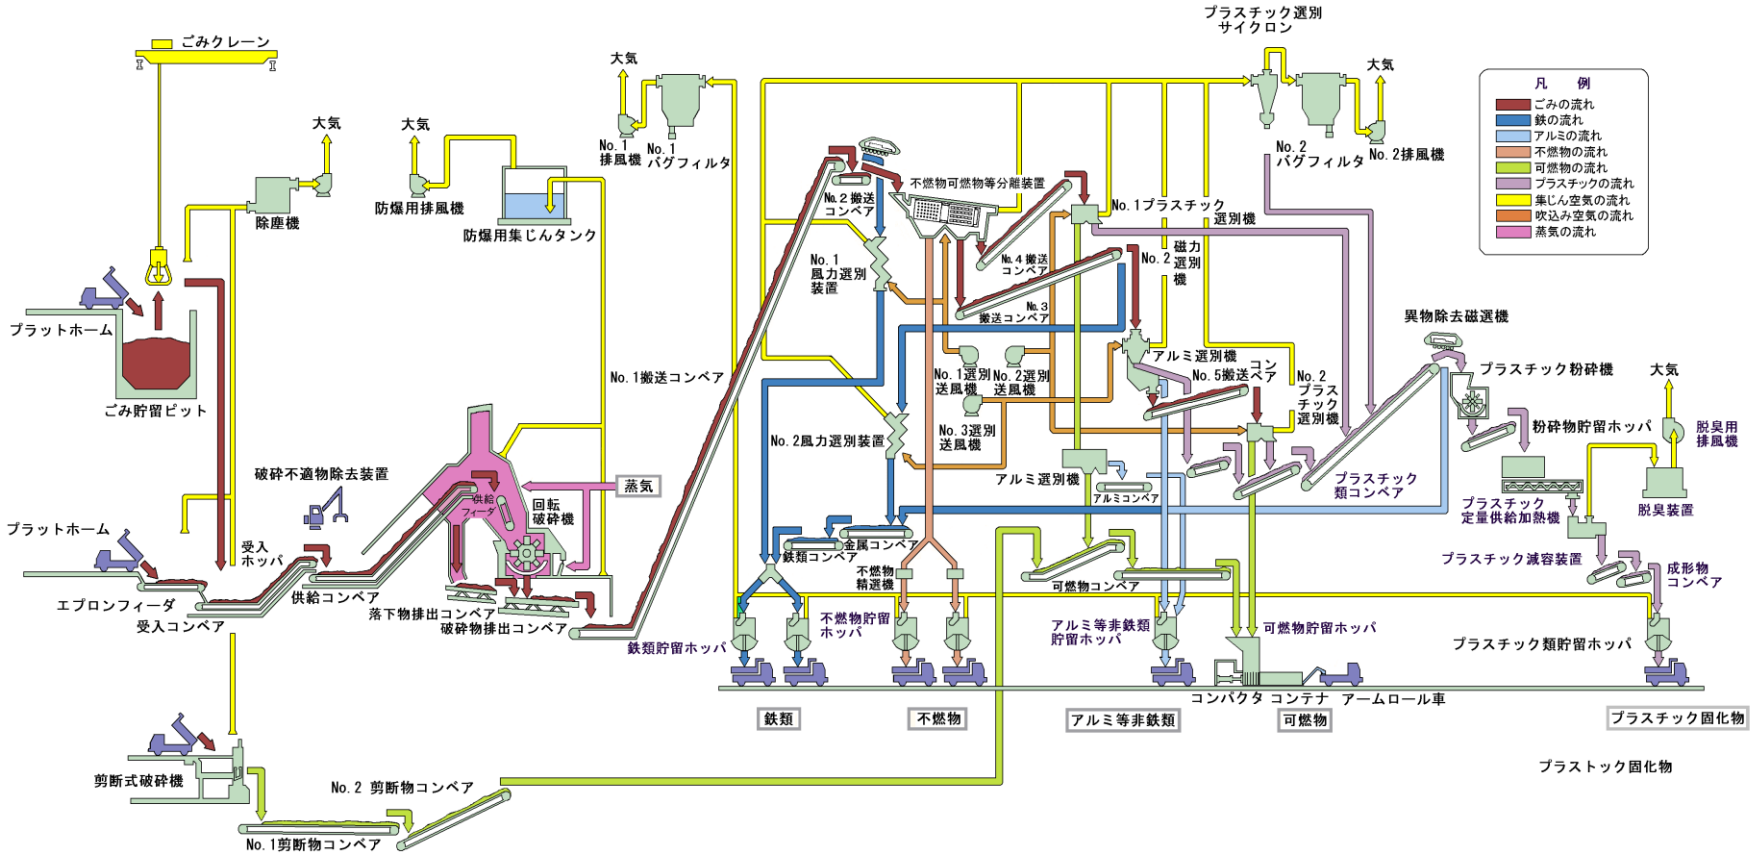

2. ごみ搬入量

2－1. ごみ搬入量実績（総括）

	両市搬入量					豊中市	
	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量
	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)	(台)	(t)
可燃ごみ	117,257	148,334	100.00	84.25	100.00	84,082	100,121
市扱い	62,282	86,742	58.48	78.80	100.00	45,455	58,041
許可業者	37,686	52,487	35.38	95.01	100.00	26,920	36,192
直接搬入	17,289	9,105	6.14	84.70	100.00	11,707	5,887
不燃ごみ	52,153	22,007	100.00	12.50	100.00	40,765	14,853
市扱い	27,261	17,609	80.01	16.00	100.00	20,608	12,553
許可業者	11,359	2,754	12.51	4.99	100.00	9,197	1,052
直接搬入	13,533	1,645	7.47	15.30	100.00	10,960	1,248
粗大ごみ	1,931	338	100.00	0.19	100.00	1,931	338
市扱い	1,931	338	100.00	0.31	100.00	1,931	338
許可業者	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
直接搬入	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
ガラスびん	3,959	2,817	100.00	1.60	100.00	2,890	1,607
市扱い	3,959	2,817	100.00	2.56	100.00	2,890	1,607
ペットボトル	2,866	717	100.00	0.41	100.00	1,802	313
市扱い	2,866	717	100.00	0.65	100.00	1,802	313
その他プラスチック	3,857	1,831	100.00	1.04	100.00	1,383	665
市扱い	3,857	1,831	100.00	1.66	100.00	1,383	665
家電四品目	649	24	100.00	0.01	100.00	455	17
市扱い	649	24	100.00	0.02	100.00	455	17
合　計	182,672	176,069	100.00	100.00	100.00	133,308	117,914
市扱い	102,805	110,079	62.52	100.00	100.00	74,524	73,534
許可業者	49,045	55,241	31.37	100.00	100.00	36,117	37,244
直接搬入	30,822	10,749	6.11	100.00	100.00	22,667	7,136
人口（10月1日現在）		585,427					389,359
一人1日平均排出量(g)		824					830
可燃ごみ		694					705
不燃ごみ		103					105
粗大ごみ		2					2
ガラスびん		13					11
ペットボトル		3					2
その他プラスチック		9					5
家電四品目		0					0

搬　入　量			伊　丹　市　搬　入　量				
搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合
(%)	(%)	(%)	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)
100.00	84.91	67.50	33,175	48,213	100.00	82.90	32.50
57.97	78.93	66.91	16,827	28,701	59.53	78.54	33.09
36.15	97.18	68.95	10,766	16,295	33.80	90.54	31.05
5.88	82.51	64.66	5,582	3,217	6.67	89.03	35.34
100.00	12.60	67.49	11,388	7,154	100.00	12.30	32.51
84.51	17.07	71.29	6,653	5,056	70.67	13.84	28.71
7.08	2.82	38.20	2,162	1,702	23.79	9.46	61.80
8.40	17.49	75.90	2,573	396	5.54	10.97	24.10
100.00	0.29	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	0.46	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
100.00	1.36	57.05	1,069	1,210	100.00	2.08	42.95
100.00	2.19	57.05	1,069	1,210	100.00	3.31	42.95
100.00	0.27	43.62	1,064	405	100.00	0.70	56.38
100.00	0.43	43.62	1,064	405	100.00	1.11	56.38
100.00	0.56	36.32	2,474	1,166	100.00	2.00	63.68
100.00	0.90	36.32	2,474	1,166	100.00	3.19	63.68
100.00	0.01	69.97	194	7	100.00	0.01	30.03
100.00	0.02	69.97	194	7	100.00	0.02	30.03
100.00	100.00	66.97	49,364	58,155	100.00	100.00	33.03
62.36	100.00	66.80	28,281	36,545	62.84	100.00	33.20
31.59	100.00	67.42	12,928	17,997	30.95	100.00	32.58
6.05	100.00	66.38	8,155	3,613	6.21	100.00	33.62
				196,068			
				813			
				674			
				100			
				0			
				17			
				6			
				16			
				0			

２－２. 月別ごみ搬入量実績（両市合計）

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)	搬入量 (t)	対前年比率(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	7,435.21	101.0	7,566.66	99.0	7,380.68	92.9
許可業者	4,358.84	94.3	4,492.43	99.1	4,425.75	94.3
直接搬入	372.66	88.6	707.22	98.7	922.28	95.7
小計(B)	4,731.50	93.8	5,199.65	99.1	5,348.03	94.6
合計(A＋B＝C)	12,166.71	98.1	12,766.31	99.0	12,728.71	93.6
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,459.60	98.8	1,475.34	96.8	1,453.70	101.7
許可業者	220.23	103.2	210.84	96.2	222.52	90.6
直接搬入	164.43	120.1	159.19	109.3	127.24	95.7
小計(E)	384.66	109.8	370.03	101.4	349.76	92.4
合計(D＋E＝F)	1,844.26	100.9	1,845.37	97.7	1,803.46	99.8
粗大ごみ						
市扱い(G)	32.59	89.0	27.40	67.8	27.30	72.7
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	32.59	89.0	27.40	67.8	27.30	72.7
ガラスびん						
市扱い(J)	227.74	100.2	231.69	94.1	229.58	99.3
合計(K)	227.74	100.2	231.69	94.1	229.58	99.3
ペットボトル						
市扱い(L)	49.48	95.2	56.73	100.9	62.98	101.2
合計(M)	49.48	95.2	56.73	100.9	62.98	101.2
その他プラスチック						
市扱い(N)	152.54	95.8	154.11	98.1	162.18	107.0
合計(O)	152.54	95.8	154.11	98.1	162.18	107.0
家電四品目						
市扱い(P)	1.88	100.5	1.89	142.1	2.22	109.9
合計(Q)	1.88	100.5	1.89	142.1	2.22	109.9
総搬入量						
市扱い(R)	9,359.04	100.4	9,513.82	98.4	9,318.64	94.5
許可業者	4,579.07	94.7	4,703.27	99.0	4,648.27	94.2
直接搬入	537.09	96.3	866.41	100.5	1,049.52	95.7
小計(S)	5,116.16	94.9	5,569.68	99.2	5,697.79	94.4
合計(R＋S＝T)	14,475.20	98.4	15,083.50	98.7	15,016.43	94.5
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	8,459	26	8,490	26	8,798
許可業者搬入全体	26	3,995	26	4,117	26	4,072
直接搬入全体	26	2,031	26	2,443	26	2,658
小　計		6,026		6,560		6,730
合　計		14,485		15,050		15,528

（両市合計）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)	搬入量 (t)	対前年 比率(%)
7,619.36	97.8	7,469.29	103.2	6,678.08	95.9	6,934.57	91.6
4,707.89	97.4	4,532.23	96.5	4,383.11	102.0	4,271.25	93.9
1,022.68	94.6	866.00	94.1	843.82	100.5	976.41	104.3
5,730.57	96.9	5,398.23	96.1	5,226.93	101.7	5,247.66	95.7
13,349.93	97.4	12,867.52	100.1	11,905.01	98.4	12,182.23	93.3
1,526.05	98.5	1,489.40	105.8	1,470.07	101.0	1,411.07	96.9
246.36	100.2	236.16	109.0	245.26	105.6	221.35	98.5
142.39	125.6	149.30	117.4	125.87	112.0	110.63	96.6
388.75	108.2	385.46	112.1	371.13	107.7	331.98	97.9
1,914.80	100.3	1,874.86	107.0	1,841.20	102.3	1,743.05	97.0
27.30	76.1	29.62	93.9	29.60	95.3	31.16	104.6
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
27.30	76.1	29.62	93.9	29.60	95.3	31.16	104.6
248.41	101.2	245.99	97.9	239.85	103.1	225.63	97.1
248.41	101.2	245.99	97.9	239.85	103.1	225.63	97.1
76.66	102.8	89.00	118.2	88.35	123.7	64.10	109.1
76.66	102.8	89.00	118.2	88.35	123.7	64.10	109.1
156.22	95.0	144.79	99.5	152.00	101.8	141.37	101.1
156.22	95.0	144.79	99.5	152.00	101.8	141.37	101.1
2.74	219.2	3.59	244.2	1.89	119.6	1.13	78.5
2.74	219.2	3.59	244.2	1.89	119.6	1.13	78.5
9,656.74	97.9	9,471.68	103.5	8,659.84	97.2	8,809.03	92.8
4,954.25	97.5	4,768.39	97.1	4,628.37	102.2	4,492.60	94.2
1,165.07	97.6	1,015.30	97.0	969.69	101.8	1,087.04	103.5
6,119.32	97.5	5,783.69	97.1	5,598.06	102.1	5,579.64	95.8
15,776.06	97.7	15,255.37	101.0	14,257.90	99.1	14,388.67	94.0
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	8,855	26	8,861	26	8,561	27	8,390
27	4,239	26	4,180	26	4,145	27	4,085
27	2,915	26	2,832	26	2,715	27	2,844
	7,154		7,012		6,860		6,929
	16,009		15,873		15,421		15,319

（両市合計）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量（t）	対前年比率（%）	搬入量（t）	対前年比率（%）	搬入量（t）	対前年比率（%）
可燃ごみ						
市扱い（A）	7,580.97	103.4	7,734.02	96.2	7,087.77	99.1
許可業者	4,356.87	100.8	4,883.09	99.5	3,871.84	101.2
直接搬入	1,077.40	109.9	978.82	113.6	560.28	129.7
小計（B）	5,434.27	102.5	5,861.91	101.6	4,432.12	104.1
合計（A＋B＝C）	13,015.24	103.0	13,595.93	98.5	11,519.89	101.0
不燃ごみ						
市扱い（D）	1,438.35	109.8	1,806.87	113.0	1,340.69	94.9
許可業者	225.30	116.5	269.83	105.0	197.61	109.6
直接搬入	115.79	101.2	149.31	122.6	100.73	89.2
小計（E）	341.09	110.8	419.14	110.6	298.34	101.7
合計（D＋E＝F）	1,779.44	110.0	2,226.01	112.6	1,639.03	96.1
粗大ごみ						
市扱い（G）	29.54	90.9	34.67	95.6	25.01	99.0
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計（H）	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計（G＋H＝I）	29.54	90.9	34.67	95.6	25.01	99.0
ガラスびん						
市扱い（J）	213.81	101.5	264.60	109.6	258.87	95.6
合計（K）	213.81	101.5	264.60	109.6	258.87	95.6
ペットボトル						
市扱い（L）	51.19	108.7	50.66	112.7	42.50	100.9
合計（M）	51.19	108.7	50.66	112.7	42.50	100.9
その他プラスチック						
市扱い（N）	148.06	105.2	163.61	107.0	152.04	99.2
合計（O）	148.06	105.2	163.61	107.0	152.04	99.2
家電四品目						
市扱い（P）	1.47	106.5	2.37	89.1	1.31	123.6
合計（Q）	1.47	106.5	2.37	89.1	1.31	123.6
総搬入量						
市扱い（R）	9,463.39	104.3	10,056.80	99.4	8,908.19	98.3
許可業者	4,582.17	101.5	5,152.92	99.8	4,069.45	101.6
直接搬入	1,193.19	109.0	1,128.13	114.7	661.01	121.3
小計（S）	5,775.36	102.9	6,281.05	102.2	4,730.46	104.0
合計（R＋S＝T）	15,238.75	103.7	16,337.85	100.5	13,638.65	100.2
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	25	8,770	26	9,166	24	8,096
許可業者搬入全体	25	4,135	27	4,516	24	3,716
直接搬入全体	25	3,065	24	3,142	24	2,022
小　計		7,200		7,658		5,738
合　計		15,970		16,824		13,834

（両市合計）　　［その4］

2月		3月		合計		搬入日平均搬入量(t)
搬入量(t)	対前年比率(%)	搬入量(t)	対前年比率(%)	搬入量(t)	対前年比率(%)	
6,122.00	99.1	7,133.73	95.2	86,742.34	97.8	279.81
3,759.69	99.9	4,443.92	95.5	52,486.91	97.8	168.77
359.46	91.2	417.50	84.5	9,104.53	100.7	29.56
4,119.15	99.1	4,861.42	94.4	61,591.44	98.2	198.33
10,241.15	99.1	11,995.15	94.9	148,333.78	97.9	478.14
1,222.89	104.3	1,515.00	100.7	17,609.03	101.8	56.80
203.51	109.3	254.94	109.2	2,753.91	104.0	8.86
117.14	101.6	182.48	93.0	1,644.50	106.5	5.34
320.65	106.3	437.42	101.8	4,398.41	104.9	14.19
1,543.54	104.7	1,952.42	100.9	22,007.44	102.4	71.00
22.30	78.7	21.42	73.1	337.91	85.6	1.09
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00
22.30	78.7	21.42	73.1	337.91	85.6	1.09
213.59	100.9	217.36	99.3	2,817.12	99.9	9.09
213.59	100.9	217.36	99.3	2,817.12	99.9	9.09
39.15	95.0	46.63	94.4	717.43	106.2	2.31
39.15	95.0	46.63	94.4	717.43	106.2	2.31
141.16	103.1	162.89	98.7	1,830.97	100.8	5.91
141.16	103.1	162.89	98.7	1,830.97	100.8	5.91
2.09	116.8	1.33	69.3	23.91	120.9	0.08
2.09	116.8	1.33	69.3	23.91	120.9	0.08
7,763.18	99.9	9,098.36	96.2	110,078.71	98.5	355.09
3,963.20	100.4	4,698.86	96.2	55,240.82	98.1	177.62
476.60	93.5	599.98	86.9	10,749.03	101.6	34.90
4,439.80	99.6	5,298.84	95.0	65,989.85	98.6	212.52
12,202.98	99.8	14,397.20	95.7	176,068.56	98.6	567.62
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	7,682	27	8,677	310	102,805	332
24	3,638	27	4,207	311	49,045	158
24	1,743	27	2,412	308	30,822	100
	5,381		6,619		79,867	258
	13,063		15,296		182,672	589

2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	5,013.41	101.0	5,039.06	100.0	4,898.72	92.9
許可業者	3,022.63	94.5	3,082.32	99.3	3,022.21	93.8
直接搬入	247.33	88.9	492.32	93.6	566.49	99.0
小計(B)	3,269.96	94.1	3,574.64	98.5	3,588.70	94.6
合計(A＋B＝C)	8,283.37	98.2	8,613.70	99.4	8,487.42	93.6
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,030.59	99.5	1,047.27	97.4	1,040.14	101.9
許可業者	85.59	89.0	77.05	82.9	85.81	80.9
直接搬入	122.42	120.5	115.50	108.9	99.72	93.9
小計(E)	208.01	105.2	192.55	96.8	185.53	87.4
合計(D＋E＝F)	1,238.60	100.4	1,239.82	97.3	1,225.67	99.4
粗大ごみ						
市扱い(G)	32.59	89.0	27.40	67.8	27.30	72.7
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	32.59	89.0	27.40	67.8	27.30	72.7
ガラスびん						
市扱い(J)	135.16	102.6	135.24	93.5	126.00	97.8
合計(K)	135.16	102.6	135.24	93.5	126.00	97.8
ペットボトル						
市扱い(L)	21.98	98.9	24.77	104.6	26.77	103.6
合計(M)	21.98	98.9	24.77	104.6	26.77	103.6
その他プラスチック						
市扱い(N)	59.55	91.4	58.23	93.6	59.62	101.2
合計(O)	59.55	91.4	58.23	93.6	59.62	101.2
家電四品目						
市扱い(P)	1.05	82.7	1.11	114.4	1.95	128.3
合計(Q)	1.05	82.7	1.11	114.4	1.95	128.3
総搬入量						
市扱い(R)	6,294.33	100.6	6,333.08	99.2	6,180.50	94.4
許可業者	3,108.22	94.3	3,159.37	98.8	3,108.02	93.4
直接搬入	369.75	97.4	607.82	96.2	666.21	98.2
小計(S)	3,477.97	94.7	3,767.19	98.4	3,774.23	94.2
合計(R＋S＝T)	9,772.30	98.4	10,100.27	98.9	9,954.73	94.3
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	6,214	26	6,117	26	6,376
許可業者搬入全体	26	2,935	26	3,032	26	2,978
直接搬入全体	26	1,527	26	1,812	26	1,941
小　計		4,462		4,844		4,919
合　計		10,676		10,961		11,295

（豊中市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
5,026.20	98.1	4,955.94	103.9	4,454.44	96.2	4,584.49	90.7
3,238.60	96.9	3,136.04	97.0	3,041.93	101.9	2,958.13	94.1
648.93	92.1	549.48	84.0	587.25	101.8	632.39	99.3
3,887.53	96.1	3,685.52	94.8	3,629.18	101.9	3,590.52	95.0
8,913.73	97.2	8,641.46	99.8	8,083.62	98.7	8,175.01	92.5
1,086.56	98.8	1,067.77	106.7	1,059.53	102.4	999.23	96.8
92.78	87.2	95.11	100.0	102.17	106.0	80.78	95.6
96.66	113.5	110.20	119.7	96.62	113.0	87.66	102.0
189.44	98.9	205.31	109.7	198.79	109.3	168.44	98.8
1,276.00	98.8	1,273.08	107.2	1,258.32	103.4	1,167.67	97.1
27.30	76.1	29.62	93.9	29.60	95.3	31.16	104.6
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
27.30	76.1	29.62	93.9	29.60	95.3	31.16	104.6
142.38	106.4	137.07	92.7	136.02	106.1	133.35	98.6
142.38	106.4	137.07	92.7	136.02	106.1	133.35	98.6
33.80	111.7	39.04	124.5	38.59	132.2	28.56	114.8
33.80	111.7	39.04	124.5	38.59	132.2	28.56	114.8
56.95	87.6	52.44	92.9	53.76	91.8	51.25	91.4
56.95	87.6	52.44	92.9	53.76	91.8	51.25	91.4
1.81	241.3	2.16	146.9	1.36	100.7	1.04	105.1
1.81	241.3	2.16	146.9	1.36	100.7	1.04	105.1
6,375.00	98.2	6,284.04	104.0	5,773.30	97.7	5,829.08	92.0
3,331.38	96.6	3,231.15	97.1	3,144.10	102.0	3,038.91	94.1
745.59	94.4	659.68	88.4	683.87	103.2	720.05	99.6
4,076.97	96.2	3,890.83	95.5	3,827.97	102.2	3,758.96	95.1
10,451.97	97.4	10,174.87	100.6	9,601.27	99.4	9,588.04	93.2
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	6,339	26	6,316	26	6,184	26	6,044
27	3,113	27	3,088	26	3,067	26	3,043
27	2,080	26	2,047	26	2,014	26	2,047
	5,193		5,135		5,081		5,090
	11,532		11,451		11,265		11,134

（豊中市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	5,070.02	103.3	5,219.96	96.0	4,781.10	99.9
許可業者	2,985.80	100.6	3,368.67	98.8	2,673.16	101.0
直接搬入	685.67	113.8	675.13	119.5	323.04	121.1
小計(B)	3,671.47	102.8	4,043.80	101.7	2,996.20	102.9
合計(A＋B＝C)	8,741.49	103.1	9,263.76	98.4	7,777.30	101.0
不燃ごみ						
市扱い(D)	1,016.20	109.0	1,272.10	111.3	954.55	96.8
許可業者	83.32	129.5	98.79	108.8	75.17	118.0
直接搬入	92.76	100.7	121.21	134.5	75.77	86.7
小計(E)	176.08	112.5	220.00	121.6	150.94	99.9
合計(D＋E＝F)	1,192.28	109.5	1,492.10	112.7	1,105.49	97.2
粗大ごみ						
市扱い(G)	29.54	90.9	34.67	95.6	25.01	99.0
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	29.54	90.9	34.67	95.6	25.01	99.0
ガラスびん						
市扱い(J)	118.16	98.2	152.10	107.7	149.99	95.9
合計(K)	118.16	98.2	152.10	107.7	149.99	95.9
ペットボトル						
市扱い(L)	23.18	119.2	22.00	116.1	18.24	118.0
合計(M)	23.18	119.2	22.00	116.1	18.24	118.0
その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
市扱い(N)	52.71	94.2	59.61	96.6	55.91	97.6
合計(O)	52.71	94.2	59.61	96.6	55.91	97.6
家電四品目						
市扱い(P)	1.07	100.9	1.38	73.4	1.13	120.2
合計(Q)	1.07	100.9	1.38	73.4	1.13	120.2
総搬入量						
市扱い(R)	6,310.88	103.9	6,761.82	98.8	5,985.93	99.3
許可業者	3,069.12	101.2	3,467.46	99.0	2,748.33	101.4
直接搬入	778.43	112.1	796.34	121.6	398.81	112.6
小計(S)	3,847.55	103.2	4,263.80	102.6	3,147.14	102.7
合計(R＋S＝T)	10,158.43	103.7	11,025.62	100.3	9,133.07	100.5
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱全体	26	6,340	26	6,645	24	5,952
許可業者全体	26	3,056	27	3,329	24	2,729
直接全体	26	2,217	24	2,372	24	1,446
小　計		5,273		5,701		4,175
合　計		11,613		12,346		10,127

（豊中市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
4,160.56	99.3	4,837.42	95.0	58,041.32	97.9	159.02	187.23
2,603.75	99.2	3,058.86	94.8	36,192.10	97.5	99.16	116.00
229.63	92.6	249.78	75.4	5,887.44	98.8	16.13	19.12
2,833.38	98.7	3,308.64	93.0	42,079.54	97.7	115.29	135.12
6,993.94	99.0	8,146.06	94.2	100,120.86	97.8	274.30	322.35
880.73	104.5	1,098.29	102.2	12,552.96	102.2	34.39	40.49
73.80	114.4	101.65	129.4	1,052.02	101.2	2.88	3.37
86.65	96.5	143.00	101.8	1,248.17	107.4	3.42	4.05
160.45	104.0	244.65	111.7	2,300.19	104.5	6.30	7.42
1,041.18	104.5	1,342.94	103.8	14,853.15	102.6	40.69	47.91
22.30	78.7	21.42	73.1	337.91	85.6	0.93	1.09
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
22.30	78.7	21.42	73.1	337.91	85.6	0.93	1.09
124.69	100.7	117.11	100.3	1,607.27	99.9	4.40	5.18
124.69	100.7	117.11	100.3	1,607.27	99.9	4.40	5.18
16.26	93.8	19.73	95.1	312.92	112.0	0.86	1.01
16.26	93.8	19.73	95.1	312.92	112.0	0.86	1.01
49.59	94.8	55.30	87.1	664.92	93.2	1.82	2.14
49.59	94.8	55.30	87.1	664.92	93.2	1.82	2.14
1.51	177.6	1.16	91.3	16.73	116.8	0.05	0.05
1.51	177.6	1.16	91.3	16.73	116.8	0.05	0.05
5,255.64	100.0	6,150.43	96.1	73,534.03	98.6	201.46	237.21
2,677.55	99.6	3,160.51	95.6	37,244.12	97.6	102.04	119.37
316.28	93.6	392.78	83.3	7,135.61	100.2	19.55	23.17
2,993.83	98.9	3,553.29	94.0	44,379.73	98.0	121.59	142.54
8,249.47	99.6	9,703.72	95.3	117,913.76	98.4	323.05	379.75
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	5,651	27	6,346	310	74,524	204	240
24	2,670	27	3,077	312	36,117	99	116
24	1,304	27	1,860	308	22,667	62	74
	3,974		4,937		58,784	161	189
	9,625		11,283		133,308	365	429

2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)	搬入量 (t)	対前年比率 (%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,421.80	100.9	2,527.60	97.1	2,481.96	92.8
許可業者	1,336.21	93.8	1,410.11	98.7	1,403.54	95.5
直接搬入	125.33	87.9	214.90	112.8	355.79	90.9
小計(B)	1,461.54	93.3	1,625.01	100.4	1,759.33	94.6
合計(A＋B＝C)	3,883.34	97.9	4,152.61	98.4	4,241.29	93.5
不燃ごみ						
市扱い(D)	429.01	97.0	428.07	95.3	413.56	101.4
許可業者	134.64	114.8	133.79	105.9	136.71	98.0
直接搬入	42.01	118.8	43.69	110.3	27.52	102.8
小計(E)	176.65	115.7	177.48	107.0	164.23	98.7
合計(D＋E＝F)	605.66	101.8	605.55	98.5	577.79	100.7
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	92.58	96.9	96.45	95.0	103.58	101.0
合計(K)	92.58	96.9	96.45	95.0	103.58	101.0
ペットボトル						
市扱い(L)	27.50	92.5	31.96	98.1	36.21	99.4
合計(M)	27.50	92.5	31.96	98.1	36.21	99.4
その他プラスチック						
市扱い(N)	92.99	98.9	95.88	101.1	102.56	110.8
合計(O)	92.99	98.9	95.88	101.1	102.56	110.8
家電四品目						
市扱い(P)	0.83	138.3	0.78	216.7	0.27	54.0
合計(Q)	0.83	138.3	0.78	216.7	0.27	54.0
総搬入量						
市扱い(R)	3,064.71	100.1	3,180.74	96.9	3,138.14	94.7
許可業者	1,470.85	95.4	1,543.90	99.3	1,540.25	95.8
直接搬入	167.34	94.0	258.59	112.4	383.31	91.6
小計(S)	1,638.19	95.3	1,802.49	101.0	1,923.56	94.9
合計(R＋S＝T)	4,702.90	98.3	4,983.23	98.4	5,061.70	94.8
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	2,245	26	2,373	26	2,422
許可業者搬入全体	26	1,060	26	1,085	26	1,094
直接搬入全体	26	504	26	631	26	717
小　計		1,564		1,716		1,811
合　計		3,809		4,089		4,233

（伊丹市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
2,593.16	97.1	2,513.35	102.1	2,223.64	95.1	2,350.08	93.4
1,469.29	98.3	1,396.19	95.6	1,341.18	102.1	1,313.12	93.6
373.75	99.3	316.52	119.0	256.57	97.6	344.02	114.9
1,843.04	98.5	1,712.71	99.2	1,597.75	101.4	1,657.14	97.3
4,436.20	97.7	4,226.06	100.9	3,821.39	97.6	4,007.22	95.0
439.49	97.7	421.63	103.4	410.54	97.7	411.84	97.0
153.58	110.1	141.05	116.1	143.09	105.3	140.57	100.2
45.73	162.1	39.10	111.3	29.25	108.7	22.97	80.6
199.31	118.8	180.15	115.0	172.34	105.8	163.54	96.9
638.80	103.4	601.78	106.7	582.88	100.0	575.38	97.0
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
106.03	95.0	108.92	105.4	103.83	99.4	92.28	94.9
106.03	95.0	108.92	105.4	103.83	99.4	92.28	94.9
42.86	96.7	49.96	118.3	49.76	117.9	35.54	104.8
42.86	96.7	49.96	113.7	49.76	117.9	35.54	104.8
99.27	99.8	92.35	103.6	98.24	108.3	90.12	107.6
99.27	99.8	92.35	103.6	98.24	108.3	90.12	107.6
0.93	186.0	1.43	-------	0.53	230.4	0.09	20.0
0.93	186.0	1.43	-------	0.53	230.4	0.09	20.0
3,281.74	97.2	3,187.64	102.6	2,886.54	96.4	2,979.95	94.5
1,622.87	99.3	1,537.24	97.1	1,484.27	102.4	1,453.69	94.2
419.48	103.6	355.62	118.1	285.82	98.6	366.99	111.9
2,042.35	100.1	1,892.86	100.5	1,770.09	101.8	1,820.68	97.3
5,324.09	98.3	5,080.50	101.8	4,656.63	98.4	4,800.63	95.5
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	2,516	26	2,545	26	2,377	26	2,346
27	1,126	26	1,092	26	1,078	26	1,042
27	835	26	785	26	701	26	797
	1,961		1,877		1,779		1,839
	4,477		4,422		4,156		4,185

（伊丹市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ						
市扱い(A)	2,510.95	103.6	2,514.06	96.7	2,306.67	97.5
許可業者	1,371.07	101.2	1,514.42	101.3	1,198.68	101.7
直接搬入	391.73	103.6	303.69	102.2	237.24	143.5
小計(B)	1,762.80	101.7	1,818.11	101.4	1,435.92	106.9
合計(A＋B＝C)	4,273.75	102.8	4,332.17	98.6	3,742.59	100.9
不燃ごみ						
市扱い(D)	422.15	111.7	534.77	117.4	386.14	90.5
許可業者	141.98	110.0	171.04	102.9	122.44	105.0
直接搬入	23.03	103.4	28.10	88.6	24.96	97.9
小計(E)	165.01	109.0	199.14	100.6	147.40	103.7
合計(D＋E＝F)	587.16	110.9	733.91	112.3	533.54	93.8
粗大ごみ						
市扱い(G)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
許可業者	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
直接搬入	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
小計(H)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
合計(G＋H＝I)	0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------
ガラスびん						
市扱い(J)	95.65	106.0	112.50	112.2	108.88	95.1
合計(K)	95.65	106.0	112.50	112.2	108.88	95.1
ペットボトル						
市扱い(L)	28.01	101.3	28.66	110.2	24.26	91.0
合計(M)	28.01	101.3	28.66	110.2	24.26	91.0
その他プラスチック						
市扱い(N)	95.35	112.4	104.00	114.1	96.13	100.1
合計(O)	95.35	112.4	104.00	114.1	96.13	100.1
家電四品目						
市扱い(P)	0.40	125.0	0.99	126.9	0.18	150.0
合計(Q)	0.40	125.0	0.99	126.9	0.18	150.0
総搬入量						
市扱い(R)	3,152.51	104.9	3,294.98	100.6	2,922.26	96.5
許可業者	1,513.05	102.0	1,685.46	101.4	1,321.12	102.0
直接搬入	414.76	103.6	331.79	100.9	262.20	137.4
小計(S)	1,927.81	102.3	2,017.25	101.3	1,583.32	106.6
合計(R＋S＝T)	5,080.32	103.9	5,312.23	100.9	4,505.58	99.8
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱搬入全体	26	2,430	26	2,521	24	2,144
許可業者搬入全体	26	1,079	27	1,187	24	987
直接搬入全体	26	848	24	770	24	576
小　計		1,927		1,957		1,563
合　計		4,357		4,478		3,707

（伊丹市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量	搬入日平均搬入量
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(t)
1,961.44	98.6	2,296.31	95.7	28,701.02	97.5	78.63	92.58
1,155.94	101.6	1,385.06	97.2	16,294.81	98.2	44.64	52.39
129.83	88.7	167.72	102.9	3,217.09	104.5	8.81	10.45
1,285.77	100.1	1,552.78	97.8	19,511.90	99.2	53.46	62.84
3,247.21	99.2	3,849.09	96.5	48,212.92	98.2	132.09	155.42
342.16	103.8	416.71	97.0	5,056.07	100.7	13.85	16.31
129.71	106.5	153.29	98.9	1,701.89	105.8	4.66	5.47
30.49	119.6	39.48	70.9	396.33	104.0	1.09	1.29
160.20	108.8	192.77	91.5	2,098.22	105.4	5.75	6.76
502.36	105.4	609.48	95.2	7,154.29	102.1	19.60	23.07
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
0.00	-------	0.00	-------	0.00	-------	0.00	0.00
88.90	101.1	100.25	98.1	1,209.85	99.9	3.31	3.90
88.90	101.1	100.25	98.1	1,209.85	99.9	3.31	3.90
22.89	95.9	26.90	93.9	404.51	102.2	1.11	1.30
22.89	95.9	26.90	93.9	404.51	102.2	1.11	1.30
91.57	108.2	107.59	106.0	1,166.05	105.7	3.19	3.76
91.57	108.2	107.59	106.0	1,166.05	105.7	3.19	3.76
0.58	61.7	0.17	26.2	7.18	131.7	0.02	0.02
0.58	61.7	0.17	26.2	7.18	131.7	0.02	0.02
2,507.54	99.7	2,947.93	96.3	36,544.68	98.3	100.12	117.89
1,285.65	102.0	1,538.35	97.4	17,996.70	98.9	49.31	57.87
160.32	93.3	207.20	94.8	3,613.42	104.4	9.90	11.73
1,445.97	101.0	1,745.55	97.0	21,610.12	99.8	59.21	69.60
3,953.51	100.2	4,693.48	96.6	58,154.80	98.8	159.33	187.49
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	2,031	27	2,331	310	28,281	77	91
24	968	27	1,130	311	12,928	35	42
24	439	27	552	308	8,155	22	26
	1,407		1,682		21,083	58	68
	3,438		4,013		49,364	135	159

3. ごみ搬入量の経年変化

3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
4	199,934.65	100.0	24,309.23	100.0	224,243.88	100.0	
5	195,923.07	98.0	28,705.85	118.1	224,628.92	100.2	100.2
6	196,008.19	98.0	33,261.16	136.8	229,269.35	102.2	102.1
7	225,769.12	112.9	33,704.89	138.7	259,474.01	115.7	113.2
8	208,147.11	104.1	31,573.80	129.9	239,720.91	106.9	92.4
9	210,295.27	105.2	30,854.57	126.9	241,149.84	107.5	100.6
10	208,417.72	104.2	30,594.55	125.9	239,012.27	106.6	99.1
11	207,933.60	104.0	30,421.13	125.1	238,354.73	106.3	99.7
12	208,327.37	104.2	32,266.45	132.7	240,593.82	107.3	100.9
13	205,876.02	103.0	30,415.19	125.1	236,291.21	105.4	98.2
14	202,921.78	101.5	30,044.98	123.6	232,966.76	103.9	98.6
15	196,259.56	98.2	30,546.30	125.7	226,805.86	101.1	97.4
16	188,327.73	94.2	30,252.67	124.4	218,580.40	97.5	96.4
17	182,419.59	91.2	29,731.66	122.3	212,151.25	94.6	97.1
18	181,105.87	90.6	29,672.75	122.1	210,778.62	94.0	99.4
19	164,926.69	82.5	27,111.39	111.5	192,038.08	85.6	91.1
20	158,016.80	79.0	26,838.61	110.4	184,855.41	82.4	96.3
21	151,440.62	75.7	27,197.83	111.9	178,638.45	79.7	96.6
22	148,333.78	74.2	27,710.87	114.0	176,044.65	78.5	98.5

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

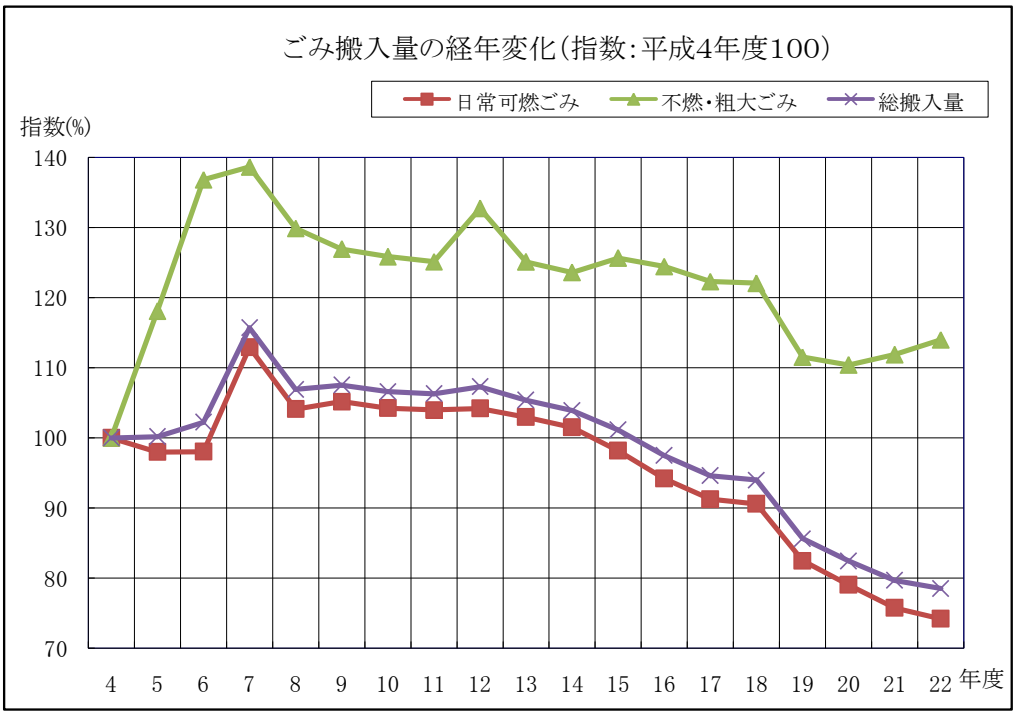

3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
4	143,935.92	100.0	16,042.69	100.0	159,978.61	100.0	
5	134,521.37	93.5	19,466.82	121.3	153,988.19	96.3	96.3
6	131,355.56	91.3	20,226.30	126.1	151,581.86	94.8	98.4
7	151,115.43	105.0	22,617.14	141.0	173,732.57	108.6	114.6
8	138,932.10	96.5	20,738.13	129.3	159,670.23	99.8	91.9
9	138,592.87	96.3	20,629.87	128.6	159,222.74	99.5	99.7
10	134,674.09	93.6	20,678.54	128.9	155,352.63	97.1	97.6
11	134,126.31	93.2	20,515.01	127.9	154,641.32	96.7	99.5
12	135,020.02	93.8	21,603.43	134.7	156,623.45	97.9	101.3
13	131,613.42	91.4	20,138.88	125.5	151,752.30	94.9	96.9
14	129,415.11	89.9	19,532.08	121.8	148,947.19	93.1	98.2
15	126,448.74	87.9	19,511.08	121.6	145,959.82	91.2	98.0
16	120,562.01	83.8	19,406.90	121.0	139,968.91	87.5	95.9
17	118,892.73	82.6	19,044.58	118.7	137,937.31	86.2	98.5
18	120,462.38	83.7	19,364.22	120.7	139,826.60	87.4	101.4
19	111,338.98	77.4	17,530.50	109.3	128,869.48	80.6	92.2
20	106,942.23	74.3	17,398.26	108.4	124,340.49	77.7	96.5
21	102,333.64	71.1	17,477.49	108.9	119,811.13	74.9	96.4
22	100,120.86	69.6	17,776.17	110.8	117,897.03	73.7	98.4

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

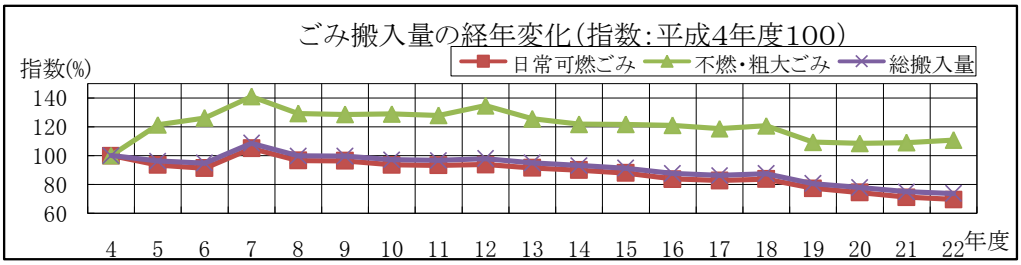

3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	日常可燃ごみ (t)	指数	不燃・粗大ごみ・びん・ペット・その他プラ (t)	指数	総搬入量 (t)	指数	前年比
4	55,998.73	100.0	8,266.54	100.0	64,265.27	100.0	
5	61,401.70	109.6	9,239.03	111.8	70,640.73	109.9	109.9
6	64,652.63	115.5	13,034.86	157.7	77,687.49	120.9	110.0
7	74,653.69	133.3	11,087.75	134.1	85,741.44	133.4	110.4
8	69,215.01	123.6	10,835.67	131.1	80,050.68	124.6	93.4
9	71,702.40	128.0	10,224.70	123.7	81,927.10	127.5	102.3
10	73,743.63	131.7	9,916.01	120.0	83,659.64	130.2	102.1
11	73,807.29	131.8	9,906.12	119.8	83,713.41	130.3	100.1
12	73,307.35	130.9	10,663.02	129.0	83,970.37	130.7	100.3
13	74,262.60	132.6	10,276.31	124.3	84,538.91	131.5	100.7
14	73,506.67	131.3	10,512.90	127.2	84,019.57	130.7	99.4
15	69,810.82	124.7	11,035.22	133.5	80,846.04	125.8	96.2
16	67,765.72	121.0	10,845.77	131.2	78,611.49	122.3	97.2
17	63,526.86	113.4	10,687.08	129.3	74,213.94	115.5	94.4
18	60,643.49	108.3	10,308.53	124.7	70,952.02	110.4	95.6
19	53,587.71	95.7	9,580.89	115.9	63,168.60	98.3	89.0
20	51,074.57	91.2	9,440.35	114.2	60,514.92	94.2	95.8
21	49,106.98	87.7	9,720.34	117.6	58,827.32	91.5	97.2
22	48,212.92	86.1	9,934.70	120.2	58,147.62	90.5	98.8

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

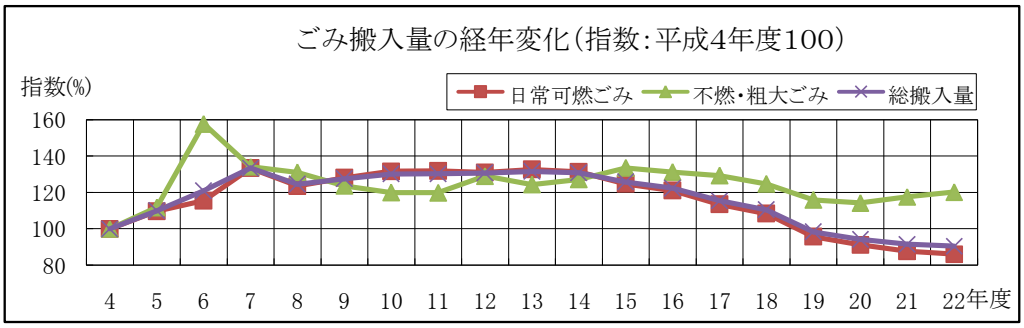

3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
4	149,304.31	100.0	66,024.43	100.0	8,915.14	100.0	224,243.88	100.0
5	147,406.15	98.7	68,334.63	103.5	8,888.14	99.7	224,628.92	100.2
6	148,768.96	99.6	72,392.06	109.6	8,108.33	91.0	229,269.35	102.2
7	175,064.05	117.3	75,661.21	114.6	8,748.75	98.1	259,474.01	115.7
8	152,231.45	102.0	77,755.48	117.8	9,733.98	109.2	239,720.91	106.9
9	150,501.64	100.8	80,313.59	121.6	10,334.61	115.9	241,149.84	107.5
10	147,630.23	98.9	80,509.50	121.9	10,872.54	122.0	239,012.27	106.6
11	147,290.41	98.7	80,157.14	121.4	10,907.18	122.3	238,354.73	106.3
12	148,598.01	99.5	82,389.97	124.8	9,605.84	107.7	240,593.82	107.3
13	144,438.65	96.7	81,534.28	123.5	10,318.28	115.7	236,291.21	105.4
14	139,502.39	93.4	82,918.69	125.6	10,545.68	118.3	232,966.76	103.9
15	130,377.85	87.3	84,057.55	127.3	12,370.46	138.8	226,805.86	101.1
16	125,664.38	84.2	80,960.90	122.6	11,955.12	134.1	218,580.40	97.5
17	123,476.36	82.7	76,142.32	115.3	12,532.57	140.6	212,151.25	94.6
18	123,197.61	82.5	71,474.82	108.3	16,106.19	180.7	210,778.62	94.0
19	116,586.98	78.1	64,763.28	98.1	10,687.82	119.9	192,038.08	85.6
20	113,688.60	76.1	60,403.98	91.5	10,762.83	120.7	184,855.41	82.4
21	111,715.19	74.8	56,338.86	85.3	10,584.40	118.7	178,638.45	79.7
22	110,054.80	73.7	55,240.82	83.7	10,749.03	120.6	176,044.65	78.5

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

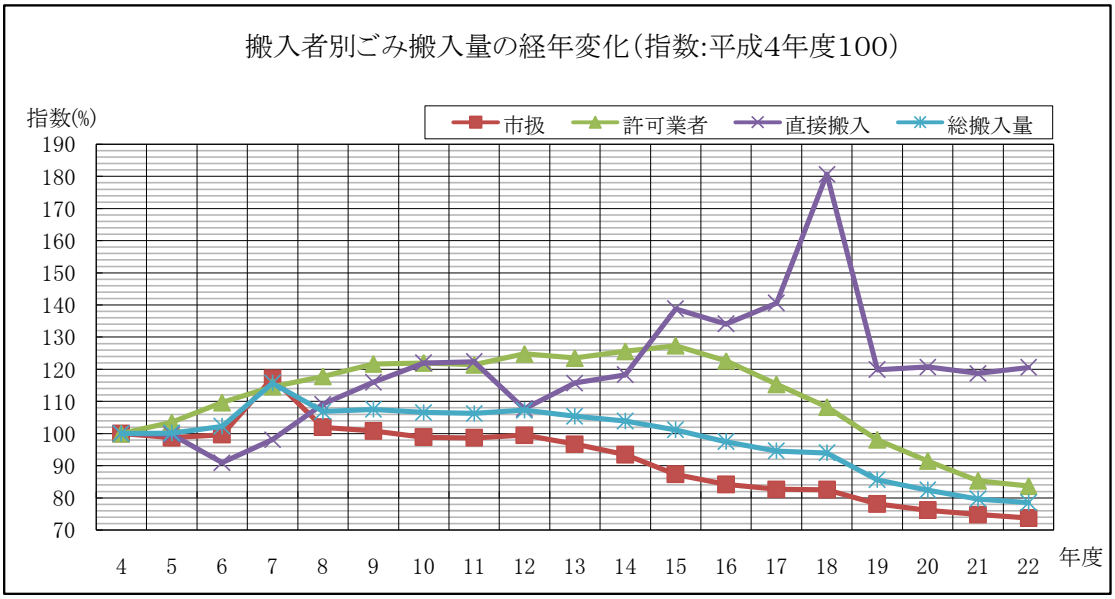

3－5.豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
4	101,721.38	100.0	52,130.78	100.0	6,126.45	100.0	159,978.61	100.0
5	97,748.53	96.1	50,406.93	96.7	5,832.73	95.2	153,988.19	96.3
6	95,408.20	93.8	50,922.55	97.7	5,251.11	85.7	151,581.86	94.8
7	116,017.41	114.1	52,064.27	99.9	5,650.89	92.2	173,732.57	108.6
8	100,382.17	98.7	53,058.75	101.8	6,229.31	101.7	159,670.23	99.8
9	99,378.13	97.7	53,404.54	102.4	6,440.07	105.1	159,222.74	99.5
10	97,509.41	95.9	51,223.02	98.3	6,620.20	108.1	155,352.63	97.1
11	96,841.31	95.2	50,935.49	97.7	6,864.52	112.0	154,641.32	96.7
12	97,178.01	95.5	53,631.97	102.9	5,813.47	94.9	156,623.45	97.9
13	93,689.03	92.1	52,048.43	99.8	6,014.84	98.2	151,752.30	94.9
14	90,044.33	88.5	52,864.65	101.4	6,038.21	98.6	148,947.19	93.1
15	87,442.15	86.0	51,906.85	99.6	6,610.82	107.9	145,959.82	91.2
16	83,114.98	81.7	49,883.11	95.7	6,970.82	113.8	139,968.91	87.5
17	81,499.74	80.1	48,003.06	92.1	8,434.51	137.7	137,937.31	86.2
18	82,083.96	80.7	46,618.32	89.4	11,124.32	181.6	139,826.60	87.4
19	77,776.53	76.5	44,167.11	84.7	6,925.84	113.0	128,869.48	80.6
20	75,742.54	74.5	41,347.00	79.3	7,250.95	118.4	124,340.49	77.7
21	74,542.57	73.3	38,144.48	73.2	7,124.08	116.3	119,811.13	74.9
22	73,517.30	72.3	37,244.12	71.4	7,135.61	116.5	117,897.03	73.7

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

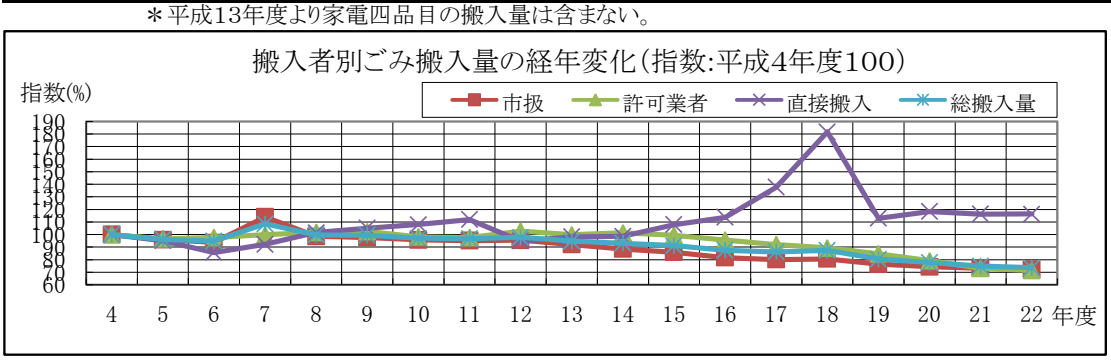

3－6.伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市扱 (t)	市扱 指数	許可業者 (t)	許可業者 指数	直接搬入 (t)	直接搬入 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数
4	47,582.93	100.0	13,893.65	100.0	2,788.69	100.0	64,265.27	100.0
5	49,657.62	104.4	17,927.70	129.0	3,055.41	109.6	70,640.73	109.9
6	53,360.76	112.1	21,469.51	154.5	2,857.22	102.5	77,687.49	120.9
7	59,046.64	124.1	23,596.94	169.8	3,097.86	111.1	85,741.44	133.4
8	51,849.28	109.0	24,696.73	177.8	3,504.67	125.7	80,050.68	124.6
9	51,123.51	107.4	26,909.05	193.7	3,894.54	139.7	81,927.10	127.5
10	50,120.82	105.3	29,286.48	210.8	4,252.34	152.5	83,659.64	130.2
11	50,449.10	106.0	29,221.65	210.3	4,042.66	145.0	83,713.41	130.3
12	51,420.00	108.1	28,758.00	207.0	3,792.37	136.0	83,970.37	130.7
13	50,749.62	106.7	29,485.85	212.2	4,303.44	154.3	84,538.91	131.5
14	49,458.06	103.9	30,054.04	216.3	4,507.47	161.6	84,019.57	130.7
15	42,935.70	90.2	32,150.70	231.4	5,759.64	206.5	80,846.04	125.8
16	42,549.40	89.4	31,077.79	223.7	4,984.30	178.7	78,611.49	122.3
17	41,976.62	88.2	28,139.26	202.5	4,098.06	147.0	74,213.94	115.5
18	41,113.65	86.4	24,856.50	178.9	4,981.87	178.6	70,952.02	110.4
19	38,810.45	81.6	20,596.17	148.2	3,761.98	134.9	63,168.60	98.3
20	37,946.06	79.7	19,056.98	137.2	3,511.88	125.9	60,514.92	94.2
21	37,172.62	78.1	18,194.38	131.0	3,460.32	124.1	58,827.32	91.5
22	36,537.50	76.8	17,996.70	129.5	3,613.42	129.6	58,147.62	90.5

＊平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

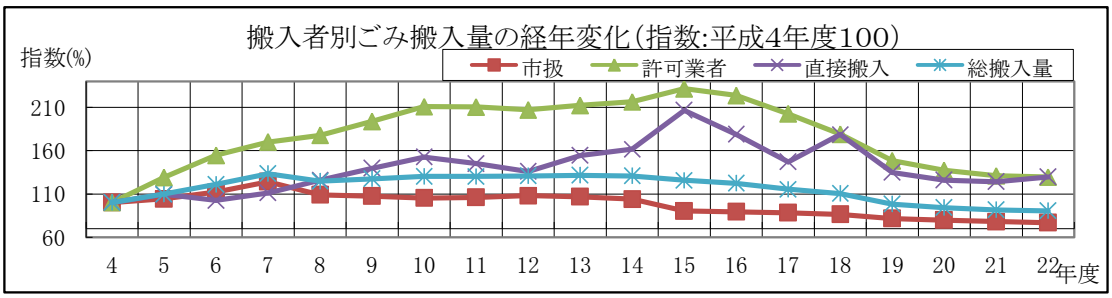

4. ご　み　質

4－1. 可燃ごみの物理組成（重量％・WET基準）

（WET：％）

物理組成 ＼ 月日		5月6日	7月15日	10月21日	1月20日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	28.8	41.0	38.6	38.2	36.6
	植物性厨芥	33.1	33.0	27.8	43.1	34.2
	動物性厨芥	3.4	1.0	0.9	3.8	2.3
	卵殻・骨類	0.8	1.0	0.9	1.3	1.0
	木・竹類	7.0	2.3	8.7	0.7	4.7
	草・わら類	11.4	4.6	4.0	0.6	5.1
	繊維類	6.4	3.3	5.6	2.4	4.4
	その他（細塵）	0.5	0.4	3.1	1.8	1.5
可燃物計		91.4	86.6	89.6	91.9	89.8
不焼却適物	プラスチック類	8.2	12.4	9.5	7.8	9.5
	ゴム類	0.2	0.6	0.0	0.0	0.2
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		8.4	13.0	9.5	7.8	9.7
焼却不適物＋可燃物合計		99.8	99.6	99.1	99.7	99.5
不燃物	金属類	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
	ガラス・陶器類	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
	土・石塊類	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1
不燃物合計		0.2	0.4	0.9	0.3	0.5
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－2. 可燃ごみの物理組成（重量％・DRY基準）

（DRY：％）

物理組成 ＼ 月日		5月6日	7月15日	10月21日	1月20日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	39.2	48.3	48.7	44.3	45.1
	植物性厨芥	13.7	20.1	9.6	28.0	17.9
	動物性厨芥	2.1	0.8	0.5	3.8	1.8
	卵殻・骨類	1.3	1.1	1.2	2.1	1.4
	木・竹類	11.0	4.1	7.8	1.3	6.1
	草・わら類	6.3	2.6	3.0	0.4	3.1
	繊維類	11.4	4.4	7.4	4.8	7.0
	その他（細塵）	0.6	0.4	4.9	1.9	2.0
可燃物計		85.6	81.8	83.1	86.6	84.4
不焼却適物	プラスチック類	13.5	16.2	14.9	12.7	14.3
	ゴム類	0.4	1.2	0.1	0.0	0.4
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		13.9	17.4	15.0	12.7	14.7
焼却不適物＋可燃物合計		99.5	99.2	98.1	99.3	99.1
不燃物	金属類	0.5	0.7	0.9	0.4	0.6
	ガラス・陶器類	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	土・石塊類	0.0	0.1	0.6	0.2	0.2
不燃物合計		0.5	0.8	1.9	0.7	0.9
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

（WET：%）

物理組成 ＼ 年度		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
可燃物	紙・セロファン類	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5	42.8	36.6
	植物性厨芥	24.3	29.3	23.6	19.8	27.6	28.9	27.1	26.4	30.2	25.8	34.2
	動物性厨芥	0.6	1.9	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.5	4.0	1.3	2.3
	卵殻・骨類	0.2	0.7	0.7	0.5	0.9	1.2	0.5	1.1	0.7	0.2	1.0
	木・竹類	0.7	1.1	2.6	5.6	1.7	1.9	2.8	1.0	2.0	2.4	4.7
	草・わら類	11.7	2.8	3.5	2.3	2.8	2.0	2.8	2.3	5.4	8.4	5.1
	繊維類	4.3	6.6	5.1	7.2	4.7	5.1	7.8	3.6	2.8	5.5	4.4
	その他（細塵）	0.5	2.0	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	0.9	1.6	1.0	1.5
可燃物計		83.3	86.0	86.1	85.4	85.3	84.1	86.4	84.1	83.2	87.4	89.8
不適焼却物	プラスチック類	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8	11.9	9.5
	ゴム類	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.5	0.2	0.2	＜0.1	0.1	0.4	0.1	0.2
	皮革類	0.0	0.3	0.2	0.1	＜0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		13.5	12.9	12.2	13.1	13.7	14.8	11.0	14.0	15.2	12.0	9.7
焼却不適物＋可燃物合計		96.8	98.9	98.3	98.5	99.0	98.9	97.4	98.1	98.4	99.4	99.5
不燃物	金属類	0.5	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	1.6	1.2	0.7	0.2	0.3
	ガラス・陶器類	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	1.0	0.5	0.7	0.3	0.1
	土・石塊類	2.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	＜0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
不燃物合計		3.2	1.1	1.7	1.5	1.0	1.1	2.6	1.9	1.6	0.6	0.5
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・DRY基準）

（DRY：%）

物理組成 ＼ 年度		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
可燃物	紙・セロファン類	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2	51.9	45.1
	植物性厨芥	13.5	8.4	10.3	8.3	13.0	12.7	9.8	11.6	16.9	10.5	17.9
	動物性厨芥	0.4	1.4	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	2.8	0.8	1.8
	卵殻・骨類	0.3	0.9	0.9	0.5	1.2	1.7	0.5	1.4	1.0	0.2	1.4
	木・竹類	0.8	1.6	2.5	5.6	2.3	2.5	3.1	1.4	2.7	3.1	6.1
	草・わら類	8.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	2.2	1.6	3.4	7.8	3.1
	繊維類	6.2	10.2	6.9	10.1	7.3	7.0	10.5	5.1	4.1	7.0	7.0
	その他（細塵）	0.6	2.2	1.4	1.7	1.1	1.0	0.9	0.8	1.7	1.2	2.0
可燃物計		78.8	80.6	82.6	81.2	79.4	78.3	79.8	78.5	75.8	82.5	84.4
不適焼却物	プラスチック類	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4	16.4	14.3
	ゴム類	＜0.1	0.1	＜0.1	0.8	0.3	0.3	＜0.1	0.2	0.7	0.2	0.4
	皮革類	0.0	0.4	0.3	0.2	＜0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		16.6	17.6	14.7	16.2	18.9	19.8	15.7	18.3	21.1	16.6	14.7
焼却不適物＋可燃物合計		95.4	98.2	97.3	97.4	98.3	98.1	95.5	96.8	96.9	99.1	99.1
不燃物	金属類	0.9	0.8	1.2	1.4	1.0	0.8	2.8	1.9	1.3	0.3	0.6
	ガラス・陶器類	0.7	0.3	1.1	0.8	0.4	0.7	1.7	1.0	1.4	0.4	0.1
	土・石塊類	3.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	＜0.1	0.3	0.4	0.2	0.2
不燃物合計		4.6	1.8	2.7	2.6	1.7	1.9	4.5	3.2	3.1	0.9	0.9
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・WET基準)

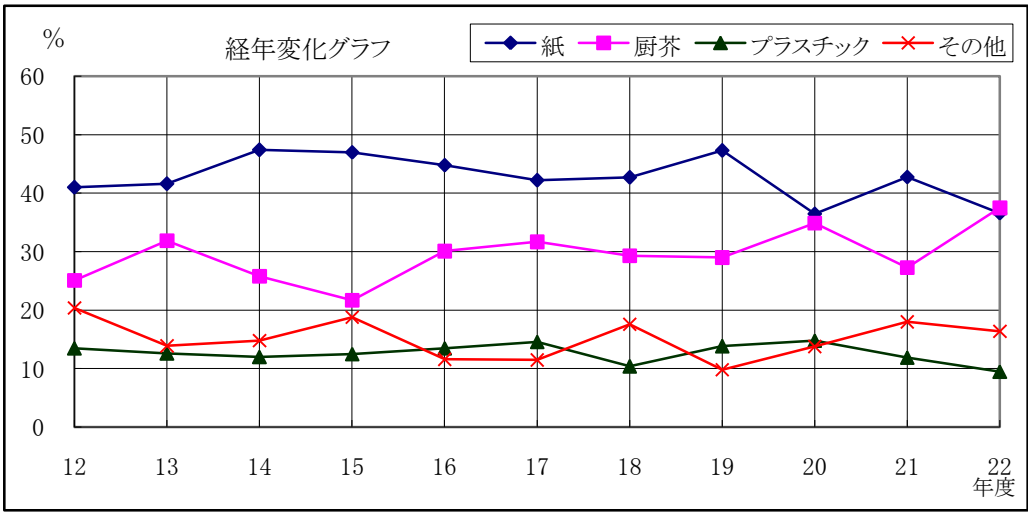

項目＼年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
紙	41.0	41.6	47.4	47.0	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5	42.8	36.6
厨　芥	25.1	31.9	25.8	21.7	30.1	31.7	29.3	29.0	34.9	27.3	37.5
プラスチック	13.5	12.6	12.0	12.5	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8	11.9	9.5
そ　の　他	20.4	13.9	14.8	18.8	11.6	11.5	17.6	9.8	13.8	18.0	16.4

4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準)

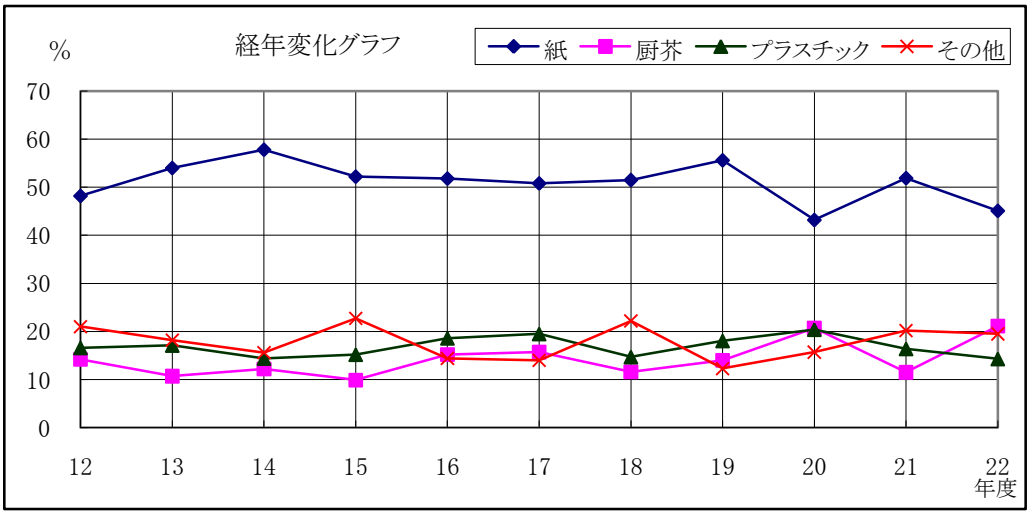

項目＼年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
紙	48.2	54.0	57.8	52.2	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2	51.9	45.1
厨　芥	14.2	10.7	12.2	9.9	15.2	15.7	11.6	14.0	20.7	11.5	21.1
プラスチック	16.6	17.1	14.4	15.2	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4	16.4	14.3
そ　の　他	21.0	18.2	15.6	22.7	14.4	14.0	22.2	12.3	15.7	20.2	19.5

4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量

項目 ＼ 月日			5月6日	7月15日	10月21日	1月20日	平均値
見掛比重 t/m³			0.167	0.197	0.161	0.209	0.184
ごみ質	可燃分(B) %	プラスチック(Xpl)%	14.0	17.6	15.2	12.8	14.9
		プラスチック以外(Xpa)%	86.0	82.4	84.8	87.2	85.1
			42.6	42.1	39.4	35.5	39.9
	灰分(a)%		5.7	5.4	4.3	4.1	4.9
	水分(W)%		51.7	52.5	56.3	60.4	55.2
低位発熱量 MJ／kg	(1)三成分法による発熱量		6.74	6.61	6.03	5.19	6.14
	(2)ボンブ法による発熱量		7.28	7.45	6.45	6.82	7.00
	(3)四成分法による発熱量		7.83	7.95	7.12	5.99	7.22
	(4)熱精算法による発熱量		11.89	10.54	12.10	11.42	11.49

＊ (1)4．18605(4500×B－600×W)／1000
(2)実測発熱量
(3)4．18605{(8845×Xpl＋4500×Xpa)×B－600×W}／1000
(4)1～4号炉における熱精算法による日平均(運転状況)

4－8. ごみの三成分(可燃分・灰分・水分)の経年変化(%)

区分 ＼ 年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
可燃分	48.5	49.0	47.9	43.1	47.8	48.5	48.0	46.3	39.5	56.0	39.9
灰分	6.1	5.7	5.5	9.0	5.3	5.1	7.7	5.8	5.8	6.3	4.9
水分	45.4	45.3	46.6	47.9	46.9	46.4	44.3	47.9	54.7	37.7	55.2

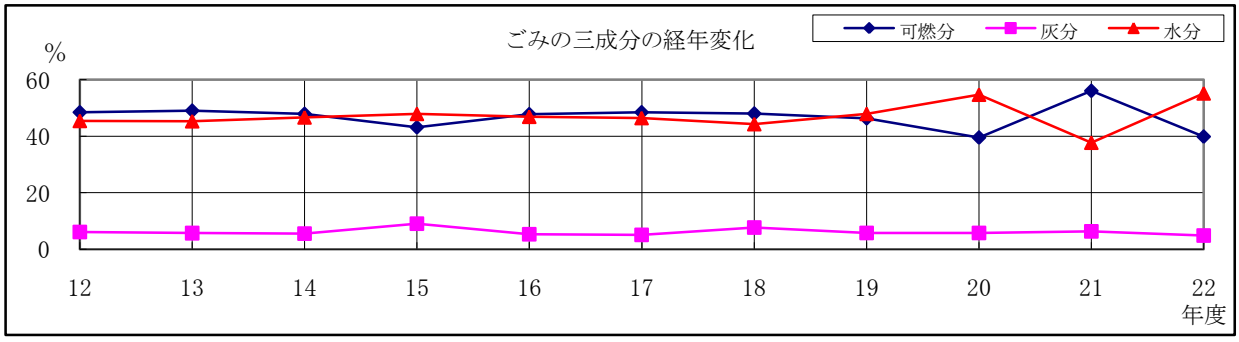

4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ／kg)

区分 ＼ 年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ボンブ法	9.60	9.50	8.77	9.08	9.36	9.84	9.09	8.73	6.62	9.97	7.00
三成分法	8.01	8.10	7.86	6.93	7.82	7.98	7.92	7.52	6.07	9.61	6.14

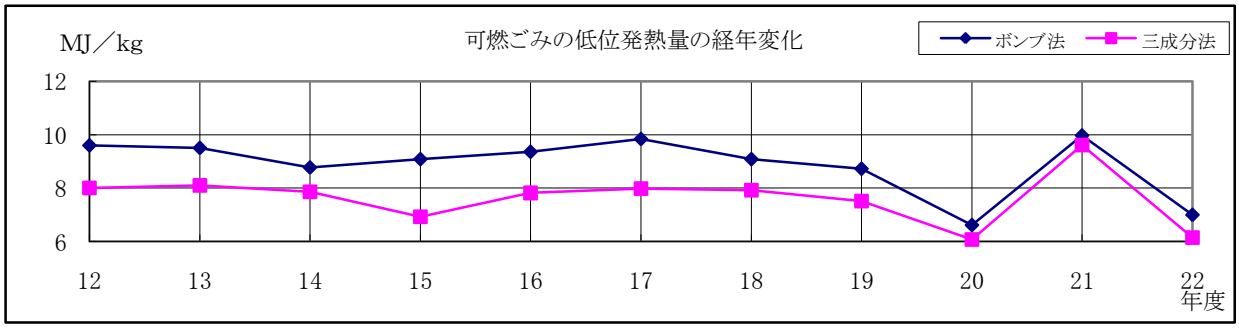

4－10. 不燃ごみの物理組成（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月19日	7月14日	10月20日	1月19日	平均値
可燃物	プラスチック類	59.7	25.7	40.7	10.8	34.2
	ゴム・皮革類	5.2	3.5	3.8	0.0	3.1
	紙類・その他可燃物	7.8	8.3	7.9	39.7	15.9
	細塵・その他	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4
可燃物計		73.0	38.0	53.0	50.8	53.6
不燃物	鉄類	7.3	34.8	7.7	22.8	18.2
	非鉄金属類	3.0	4.3	7.1	3.1	4.4
	ガラス類	14.9	22.0	22.1	22.0	20.3
	陶磁器・土・石塊	1.8	0.9	10.1	1.3	3.5
不燃物計		27.0	62.0	47.0	49.2	46.4
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

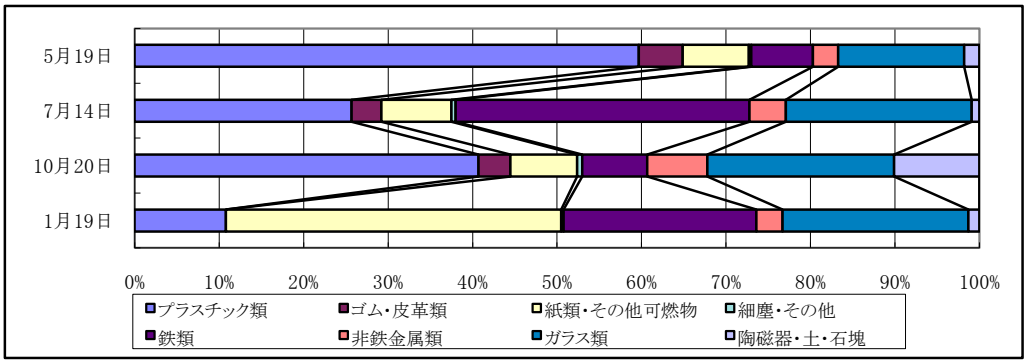

4－11. 不燃ごみの物理組成（重量%・DRY基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月19日	7月14日	10月20日	1月19日	平均値
可燃物	プラスチック類	58.2	26.5	39.5	12.3	34.1
	ゴム・皮革類	5.7	3.6	4.1	0.0	3.4
	紙類・その他可燃物	6.2	3.8	4.8	14.1	7.2
	細塵・その他	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4
可燃物計		70.4	34.4	49.0	26.6	45.1
不燃物	鉄類	8.1	35.0	8.3	41.1	23.1
	非鉄金属類	3.2	4.7	7.7	3.5	4.8
	ガラス類	16.4	24.9	24.0	27.2	23.1
	陶磁器・土・石塊	1.9	1.0	11.0	1.6	3.9
不燃物計		29.6	65.6	51.0	73.4	54.9
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

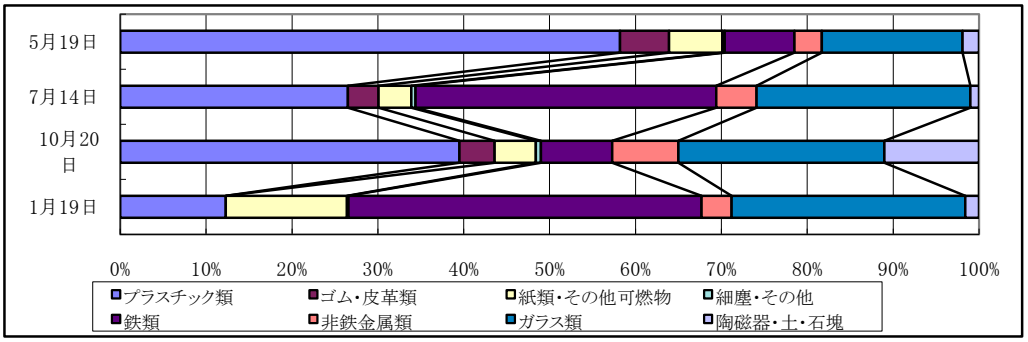

4－12. 不燃ごみの物理組成の経年変化(重量%・WET基準)

物理組成 ＼ 年 度		18	19	20	21	22
可燃物	プラスチック類	56.0	57.5	46.6	50.3	34.2
	ゴム・皮革類	4.8	1.6	6.2	0.4	3.1
	紙類・その他可燃物	4.6	9.9	10.6	16.5	15.9
	細塵・その他	2.1	0.5	0.3	1.9	0.4
可燃物計		67.5	69.5	63.7	69.1	53.6
不燃物	鉄類	9.7	10.6	11.7	12.0	18.2
	非鉄金属類	6.1	3.2	2.4	3.3	4.4
	ガラス類	12.7	13.5	15.9	10.6	20.3
	陶磁器・土・石塊	4.0	3.2	6.3	5.0	3.5
不燃物計		32.5	30.5	36.3	30.9	46.4
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

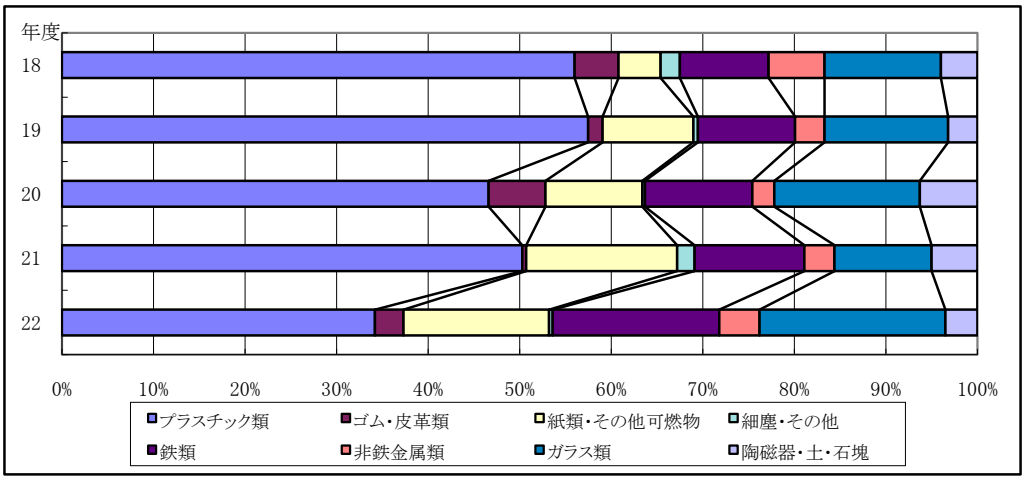

Ⅱ．ごみ焼却処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化

1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化

区分	焼却対象ごみ量					焼却量		
	可燃ごみ搬入量	粗大選別可燃物	計	暦日平均	指数	焼却実績量	暦日平均	指数
年度	(t)	(t)	(t)	(t)	(%)	(t)	(t)	(%)
4	199,934.65	3,866.40	203,801.05	558	100.0	191,374.40	524	100.0
5	195,923.07	10,697.00	206,620.07	566	101.4	200,208.18	549	104.6
6	196,008.19	11,889.00	207,897.19	570	102.0	196,418.27	538	102.6
7	225,769.12	13,065.90	238,835.02	653	116.9	225,481.22	616	117.5
8	208,147.11	13,364.20	221,511.31	607	108.7	211,344.65	579	110.4
9	210,295.27	13,117.00	223,412.27	612	109.6	216,633.90	594	113.3
10	208,339.32	12,372.20	220,711.52	605	108.3	219,147.59	600	114.5
11	207,858.02	13,383.20	221,241.22	604	108.3	216,929.84	593	113.0
12	208,259.28	14,492.90	222,752.18	610	109.3	218,100.91	598	114.0
13	205,803.06	13,491.90	219,294.96	601	107.6	215,930.21	592	112.8
14	202,855.84	12,640.50	215,496.34	590	105.7	210,631.86	577	110.1
15	196,203.76	12,028.70	208,232.46	569	101.9	207,471.75	567	108.1
16	188,276.59	12,007.70	200,284.29	549	98.3	204,441.12	560	106.8
17	182,363.91	12,668.30	195,032.21	534	95.7	195,784.52	536	102.3
18	181,037.35	13,460.80	194,498.15	533	95.4	196,246.13	538	102.5
19	164,860.19	12,627.20	177,487.39	485	86.9	180,523.54	493	94.1
20	157,935.75	12,826.10	170,761.85	468	83.8	173,770.96	476	90.8
21	151,337.09	13,573.46	164,910.55	452	80.9	167,728.90	460	87.6
22	148,231.62	14,328.10	162,559.72	445	79.8	164,992.31	452	86.2

※平成10年度からリサイクルボックスに投入された紙類は可燃ごみ搬入量に含まない。

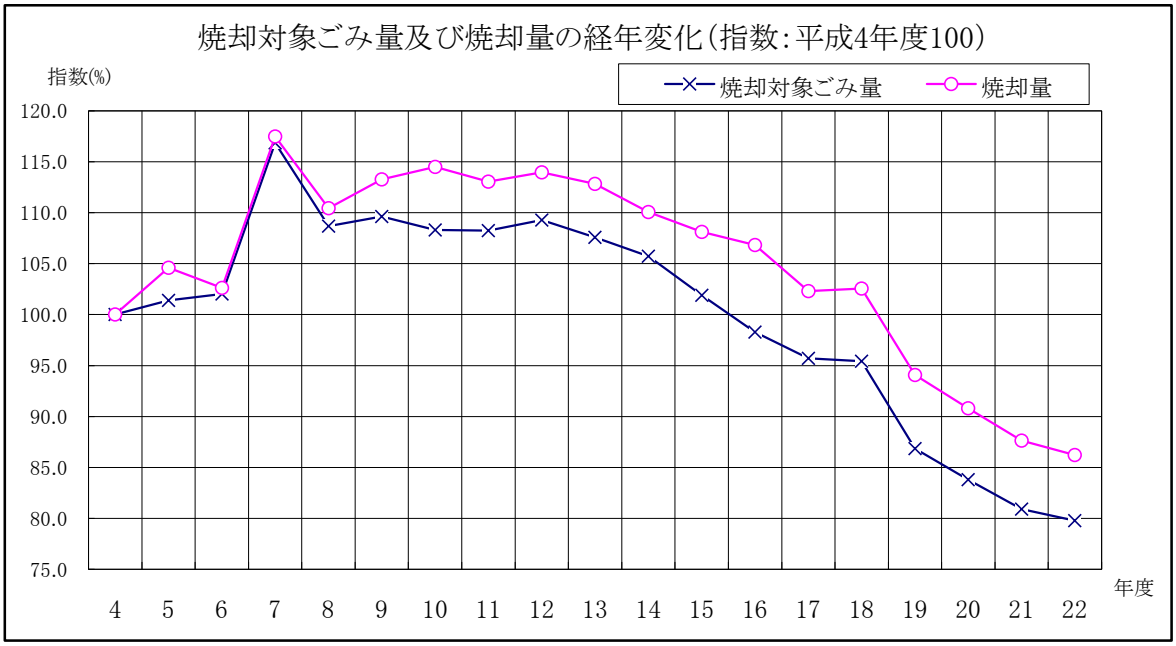

1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化

年度 / 月別	22年度		21年度		20年度		19年度		18年度	
	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)
4	13,292.44	443	13,398.00	447	14,196.60	473	14,663.12	489	15,369.32	539
5	13,954.80	450	14,144.86	456	15,206.98	491	15,989.71	516	17,705.86	550
6	13,937.61	465	14,774.65	492	14,680.31	489	14,987.86	500	17,282.19	548
7	14,586.05	471	14,947.57	482	15,133.72	488	16,161.86	521	17,348.35	530
8	14,098.66	455	13,953.59	450	14,041.06	453	14,969.89	483	17,622.85	554
9	13,171.14	439	13,033.80	434	14,818.24	494	13,605.50	454	16,276.35	543
10	13,397.58	432	14,419.75	465	14,716.95	475	15,389.21	496	16,414.24	528
11	14,162.77	472	13,650.43	455	13,399.43	447	14,891.96	496	15,641.50	546
12	14,833.91	479	14,965.09	483	16,157.26	521	15,984.98	516	17,511.37	572
1	12,673.24	409	12,495.47	403	13,047.02	421	13,924.09	449	14,790.99	488
2	11,228.81	401	11,281.57	403	11,622.37	415	12,808.85	442	13,324.83	494
3	13,222.71	427	13,845.77	447	13,741.91	443	14,110.36	455	15,210.30	517
計	162,559.72	569	164,910.55	569	170,761.85	569	177,487.39	485	194,498.15	534

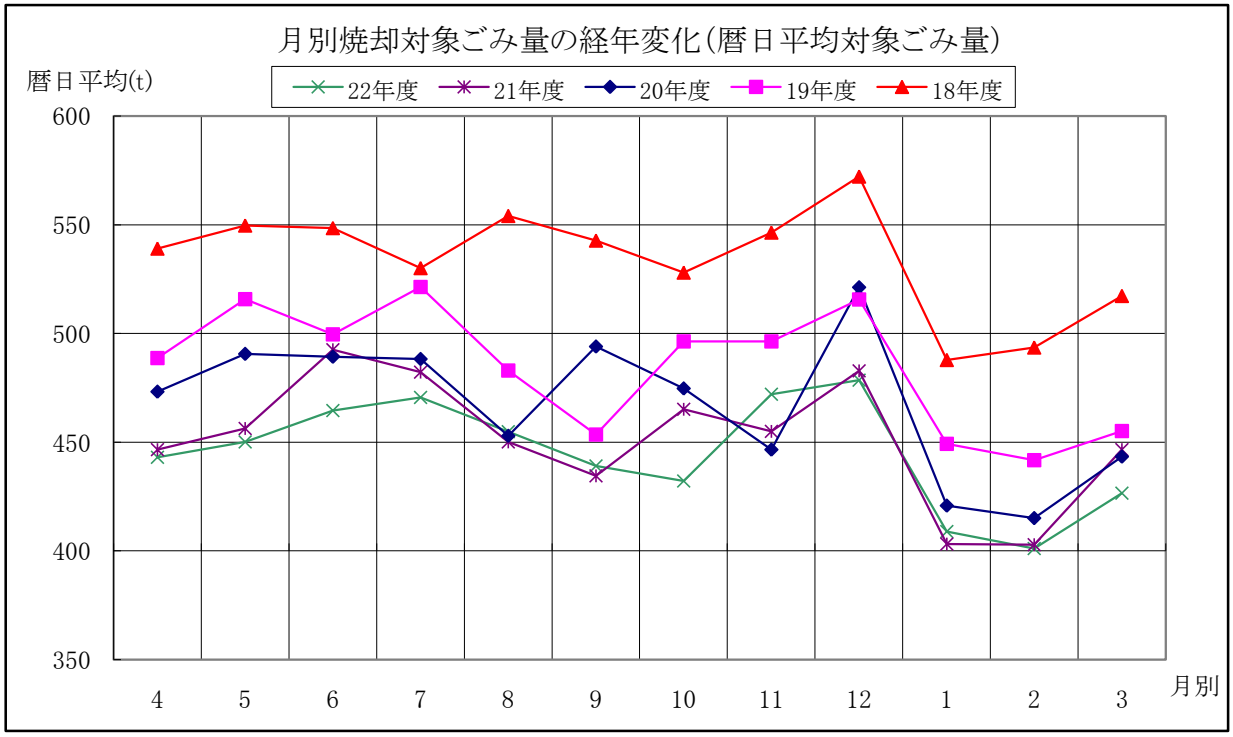

2. 焼 却 関 係

2－1. 焼却炉稼働状況（1～4号炉合計）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均	(最大値)	炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	12,599.60	484.60	26	959	25	922	24	1,881	49	81	8	18	33	22	12
5	14,872.49	479.76	31	0	0	2,232	20	2,232	20	17	7	7	12	2	45
6	14,369.65	478.99	30	202	57	1,860	30	2,063	27	20	12	10	50	0	0
7	13,482.44	434.92	31	528	0	1,392	16	1,920	16	20	19	8	38	0	0
8	14,762.06	476.20	31	240	0	1,885	41	2,125	41	0	0	6	44	0	0
9	13,322.20	444.07	30	288	0	1,717	38	2,005	38	37	48	5	12	0	0
10	12,695.28	409.53	31	1,597	1	144	0	1,741	1	19	43	15	4	0	0
11	14,935.48	497.85	30	541	55	1,572	0	2,113	55	45	33	13	44	0	0
12	15,816.69	527.22	30	1,403	0	804	41	2,207	41	39	27	21	0	0	0
1	13,447.27	480.26	28	620	42	1,284	2	1,904	44	57	54	8	4	0	0
2	9,773.19	349.04	28	1,344	0	0	0	1,344	0	8	32	0	0	0	0
3	14,915.96	481.16	31	240	0	1,888	19	2,128	19	28	13	4	15	0	0
計	164,992.31	－	357	7,965	0	15,703	51	23,668	51	375	56	119	16	24	57
平均	13,749.36	462.16	30	663	45	1,308	39	1,972	24	31	20	9	56	2	5
最大	15,816.69	527.22	31	1,597	1	2,232	20	2,232	20	81	8	21	0	22	12
最小	9,773.19	349.04	26	0	0	0	0	1,344	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24*4
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
121	53	2,003	42	716	45	0	0	159	33	876	18	4	4	1	69.6
27	4	2,259	24	615	14	0	0	101	22	716	36	1	1	1	75.9
31	2	2,094	29	194	0	0	0	591	18	785	31	1	1	0	72.7
28	57	1,949	13	1,026	47	0	0	0	0	1,026	47	1	1	0	65.5
6	44	2,132	25	744	0	0	0	99	35	843	35	0	1	0	71.7
43	0	2,048	38	352	14	0	0	478	28	831	22	2	1	0	71.1
34	47	1,775	48	456	0	0	0	744	12	1,200	12	1	2	0	59.7
59	17	2,173	12	414	37	0	0	292	11	706	48	3	3	0	75.5
60	27	2,268	8	0	0	0	0	707	52	707	52	2	4	0	76.2
65	58	1,970	42	0	0	0	0	1,005	18	1,005	18	3	1	0	66.2
8	32	1,352	32	0	0	0	0	1,335	28	1,335	28	1	0	0	50.3
32	28	2,160	47	0	0	0	0	815	13	815	13	1	1	0	72.6
520	9	24,189	0	4,519	37	0	0	6,330	30	10,851	0	20	20	2	—
43	21	2,015	45	376	38	0	0	527	32	904	15	2	2	0	69.0
121	53	2,268	8	1,026	47	0	0	1,335	28	1,335	28	4	4	1	76.2
6	44	1,352	32	0	0	0	0	0	0	706	48	0	0	0	50.3

2－2. 焼却炉稼働状況（1号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,806.77	146.41	26	304	58	275	16	580	14	20	11	4	42	0	0
5	4,063.43	150.50	27	0	0	632	41	632	41	0	0	7	12	2	45
6	708.69	118.12	6	0	0	108	30	108	30	20	12	0	0	0	0
7	4,798.60	154.79	31	264	0	480	0	744	0	0	0	0	0	0	0
8	4,744.01	153.03	31	120	0	624	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	4,439.23	147.97	30	144	0	576	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	883.43	147.24	6	83	44	48	0	131	44	0	0	4	55	0	0
11	1,827.34	130.52	14	0	0	277	50	277	50	27	33	0	0	0	0
12	4,835.40	161.18	30	442	59	264	0	706	59	0	0	6	12	0	0
1	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3,170.14	144.10	22	0	0	492	38	492	38	20	7	0	0	0	0
計	33,277.04	－	223	1,359	41	3,778	55	5,138	36	88	3	23	1	2	45
平均	2,773.09	149.22	19	113	18	314	55	428	13	7	20	1	55	0	14
最大	4,835.40	161.18	31	442	59	632	41	744	0	27	33	7	12	2	45
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2－3. 焼却炉稼働状況（2号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,772.56	145.10	26	301	7	275	8	576	15	21	4	4	50	0	0
5	4,855.50	156.63	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	4,650.93	155.03	30	96	0	624	0	720	0	0	0	0	0	0	0
7	2,332.91	145.81	16	0	0	371	54	371	54	0	0	8	38	0	0
8	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2,165.04	135.32	16	0	0	347	17	347	17	20	29	0	0	0	0
10	5,295.00	170.81	31	696	0	48	0	744	0	0	0	0	0	0	0
11	2,829.60	148.93	19	192	0	251	8	443	8	0	0	6	6	0	0
12	4,183.27	149.40	28	371	45	252	41	624	26	19	44	5	28	0	0
1	4,184.54	149.45	28	208	29	432	0	640	29	20	9	0	0	0	0
2	4,780.75	170.74	28	672	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	4,842.22	156.20	31	120	0	624	0	744	0	0	0	0	0	0	0
計	43,892.32	－	284	2,657	21	3,970	8	6,627	29	81	26	25	2	0	0
平均	3,657.69	154.55	24	221	27	330	51	552	17	6	47	2	5	0	0
最大	5,295.00	170.81	31	696	0	744	0	744	0	21	4	8	38	0	0
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
24	53	605	7	114	53	0	0	0	0	114	53	1	1	0	84.0
9	57	642	38	0	0	0	0	101	22	101	22	0	1	1	86.4
20	12	128	42	0	0	0	0	591	18	591	18	1	0	0	17.9
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
4	55	136	39	456	0	0	0	151	21	607	21	0	1	0	18.4
27	33	305	23	414	37	0	0	0	0	414	37	2	1	0	42.4
6	12	713	11	0	0	0	0	30	49	30	49	0	1	0	95.9
0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	672	0	0	0	0	0.0
20	7	512	45	0	0	0	0	231	15	231	15	1	0	0	68.9
113	49	5,252	25	985	30	0	0	2,522	5	3,507	35	5	5	1	―
9	29	437	42	82	8	0	0	210	10	292	18	0	0	0	60.0
27	33	744	0	456	0	0	0	744	0	744	0	2	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

計		合計(C)		炉休止時間 O・H		修繕		計画休止		計		正常外回数 昇温	降温	正常外	稼働率 (C)/暦日数*24
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
25	54	602	9	117	51	0	0	0	0	117	51	1	1	0	83.6
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
8	38	380	32	363	28	0	0	0	0	363	28	0	1	0	51.1
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
20	29	367	46	352	14	0	0	0	0	352	14	1	0	0	51.1
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
6	6	449	14	0	0	0	0	270	46	270	46	0	1	0	62.4
25	12	649	38	0	0	0	0	94	22	94	22	1	1	0	87.3
20	9	660	38	0	0	0	0	83	22	83	22	1	0	0	88.8
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
106	28	6,733	57	1,577	33	0	0	448	30	2,026	3	4	4	0	―
8	52	561	10	131	28	0	0	37	23	168	50	0	0	0	76.9
25	54	744	0	744	0	0	0	270	46	744	0	1	1	0	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－4. 焼却炉稼働状況（3号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,707.50	142.60	26	281	20	274	51	556	11	21	1	4	6	22	12
5	5,020.88	161.96	31	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	3,348.85	152.22	22	10	57	504	0	514	57	0	0	10	50	0	0
7	403.72	100.93	4	0	0	60	22	60	22	20	19	0	0	0	0
8	5,001.33	161.33	31	120	0	624	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	2,463.56	153.97	16	144	0	227	8	371	8	0	0	5	12	0	0
10	4,338.27	173.53	25	564	54	0	0	564	54	19	43	0	0	0	0
11	4,863.84	162.13	30	192	0	515	2	707	2	0	0	7	38	0	0
12	1,204.34	133.82	9	143	58	24	0	167	58	19	43	4	10	0	0
1	4,361.44	155.77	28	208	8	432	0	640	8	19	57	0	0	0	0
2	4,992.44	178.30	28	672	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	1,084.85	154.98	7	24	0	131	47	155	47	0	0	4	15	0	0
計	40,791.02	－	257	2,361	17	3,537	10	5,898	27	100	43	36	11	22	12
平均	3,399.25	158.72	21	196	46	294	46	491	32	8	24	3	1	1	51
最大	5,020.88	178.30	31	672	0	744	0	744	0	21	1	10	50	22	12
最小	403.72	100.93	4	0	0	0	0	60	22	0	0	0	0	0	0

2－5. 焼却炉稼働状況（4号炉）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月別	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	1,312.77	145.86	9	72	0	97	9	169	9	18	52	4	55	0	0
5	932.68	155.45	6	0	0	111	39	111	39	17	7	0	0	0	0
6	5,661.18	188.71	30	96	0	624	0	720	0	0	0	0	0	0	0
7	5,947.21	191.85	31	264	0	480	0	744	0	0	0	0	0	0	0
8	5,016.72	185.80	27	0	0	637	41	637	41	0	0	6	44	0	0
9	4,254.37	170.17	25	0	0	567	13	567	13	17	19	0	0	0	0
10	2,178.58	167.58	13	252	23	48	0	300	23	0	0	10	9	0	0
11	5,414.70	180.49	30	157	55	528	0	685	55	18	0	0	0	0	0
12	5,593.68	186.46	30	444	18	264	0	708	18	0	0	5	10	0	0
1	4,901.29	175.05	28	204	5	420	2	624	7	17	48	8	4	0	0
2	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	0	8	32	0	0	0	0
3	5,818.75	187.70	31	96	0	639	54	735	54	8	6	0	0	0	0
計	47,031.93	－	261	1,586	41	4,417	38	6,004	19	105	44	35	2	0	0
平均	3,919.33	180.20	22	132	13	368	8	500	22	8	49	2	55	0	0
最大	5,947.21	191.85	31	444	18	639	54	744	0	18	52	10	9	0	0
最小	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
47	19	603	30	116	30	0	0	0	0	116	30	1	1	1	83.8
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
10	50	525	47	194	0	0	0	0	0	194	13	0	1	0	73.0
20	19	80	41	663	19	0	0	0	0	663	19	1	0	0	10.8
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
5	12	376	20	0	0	0	0	343	0	343	40	0	1	0	52.3
19	43	584	37	0	0	0	0	159	23	159	23	1	0	0	78.6
7	38	714	40	0	0	0	0	5	20	5	20	0	1	0	99.3
23	53	191	51	0	0	0	0	552	9	552	9	1	1	0	25.8
19	57	660	5	0	0	0	0	83	55	83	55	1	0	0	88.7
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
4	15	160	2	0	0	0	0	583	58	583	58	0	1	0	21.5
159	6	6,057	33	973	49	0	0	1,727	45	2,702	27	5	6	1	―
13	16	504	48	81	9	0	0	143	59	225	12	0	1	0	69.2
47	19	744	0	663	19	0	0	583	58	663	19	1	1	1	100.0
0	0	80	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.8

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
23	47	192	56	367	31	0	0	159	33	527	4	1	1	0	26.8
17	7	128	46	615	14	0	0	0	0	615	14	1	0	0	17.3
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
6	44	644	25	0	0	0	0	99	35	99	35	0	1	0	86.6
17	19	584	32	0	0	0	0	135	28	135	28	1	0	0	81.2
10	9	310	32	0	0	0	0	433	28	433	28	0	1	0	41.7
18	0	703	55	0	0	0	0	16	5	16	5	1	0	0	97.8
5	10	713	28	0	0	0	0	30	32	30	32	0	1	0	95.9
25	52	649	59	0	0	0	0	94	1	94	1	1	1	0	87.4
8	32	8	32	0	0	0	0	663	28	663	28	1	0	0	1.3
8	6	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
140	46	6,145	5	982	45	0	0	1,632	10	2,614	55	6	5	0	―
11	44	512	5	81	54	0	0	136	1	217	55	1	0	0	70.1
25	52	744	0	615	14	0	0	663	28	663	28	1	1	0	100.0
0	0	8	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3

2－6. ごみ焼却量と低位発熱量(熱精算法)の経年変化

項目 / 年度	焼却量 (t)	焼却量 指数	焼却量 前年比	低位発熱量 (MJ／kg)	低位発熱量 指数	低位発熱量 前年比
4	191,374	100.0		9.91	100.0	
5	200,208	104.6	104.6	9.70	97.9	97.9
6	196,418	102.6	98.1	10.28	103.7	106.0
7	225,481	117.8	114.8	10.47	105.7	101.8
8	211,345	110.4	93.7	10.55	106.5	100.8
9	216,634	113.2	102.5	10.45	105.4	99.1
10	219,148	114.5	101.2	10.55	106.5	101.0
11	216,930	113.4	99.0	10.63	107.3	100.8
12	218,101	114.0	100.5	11.08	111.8	104.2
13	215,930	112.8	99.0	11.28	113.8	101.8
14	210,632	110.1	97.5	11.37	114.7	100.8
15	207,471	108.4	98.5	11.31	114.1	99.5
16	204,441	106.8	98.5	10.96	110.6	96.9
17	195,785	102.3	95.8	11.41	115.1	104.1
18	196,246	102.5	100.2	11.39	114.9	99.8
19	180,524	94.3	92.0	10.97	110.7	96.3
20	173,771	90.8	96.3	10.77	108.7	98.2
21	167,729	87.6	96.5	10.80	109.0	100.3
22	164,992	86.2	98.4	11.10	112.0	102.8

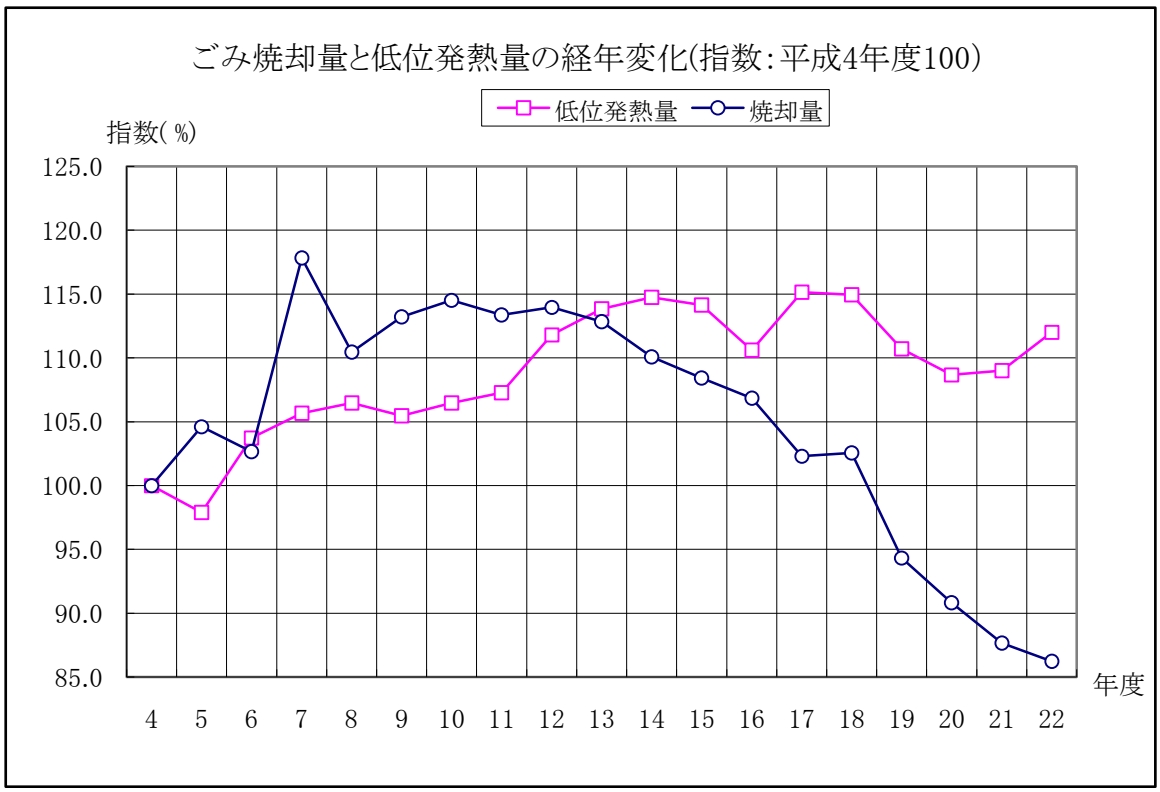

2－7. 月別焼却量の経年変化

年度 / 月別	22年度		21年度		20年度		19年度		18年度	
	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)	焼却量 (t)	暦日平均 (t)
4	12,600	420	12,754	425	13,095	437	12,621	421	12,067	402
5	14,872	480	15,420	497	17,050	550	18,075	583	19,438	627
6	14,370	479	14,977	499	15,195	507	15,504	517	19,255	642
7	13,482	435	13,992	451	15,012	484	15,604	503	17,579	567
8	14,762	476	14,961	483	14,890	480	15,758	508	16,307	526
9	13,322	444	13,977	466	13,662	455	14,583	486	17,901	597
10	12,695	410	12,926	417	15,017	484	15,267	492	17,154	553
11	14,935	498	15,009	500	14,241	475	14,705	490	15,525	518
12	15,817	510	15,851	511	16,312	526	16,817	542	16,582	535
1	13,447	434	13,837	446	13,827	446	14,478	467	15,734	508
2	9,773	349	10,597	378	11,003	393	12,076	416	11,953	427
3	14,916	481	13,428	433	14,466	467	15,035	485	16,750	540
計	164,992	452	167,729	460	173,771	476	180,524	493	196,246	538

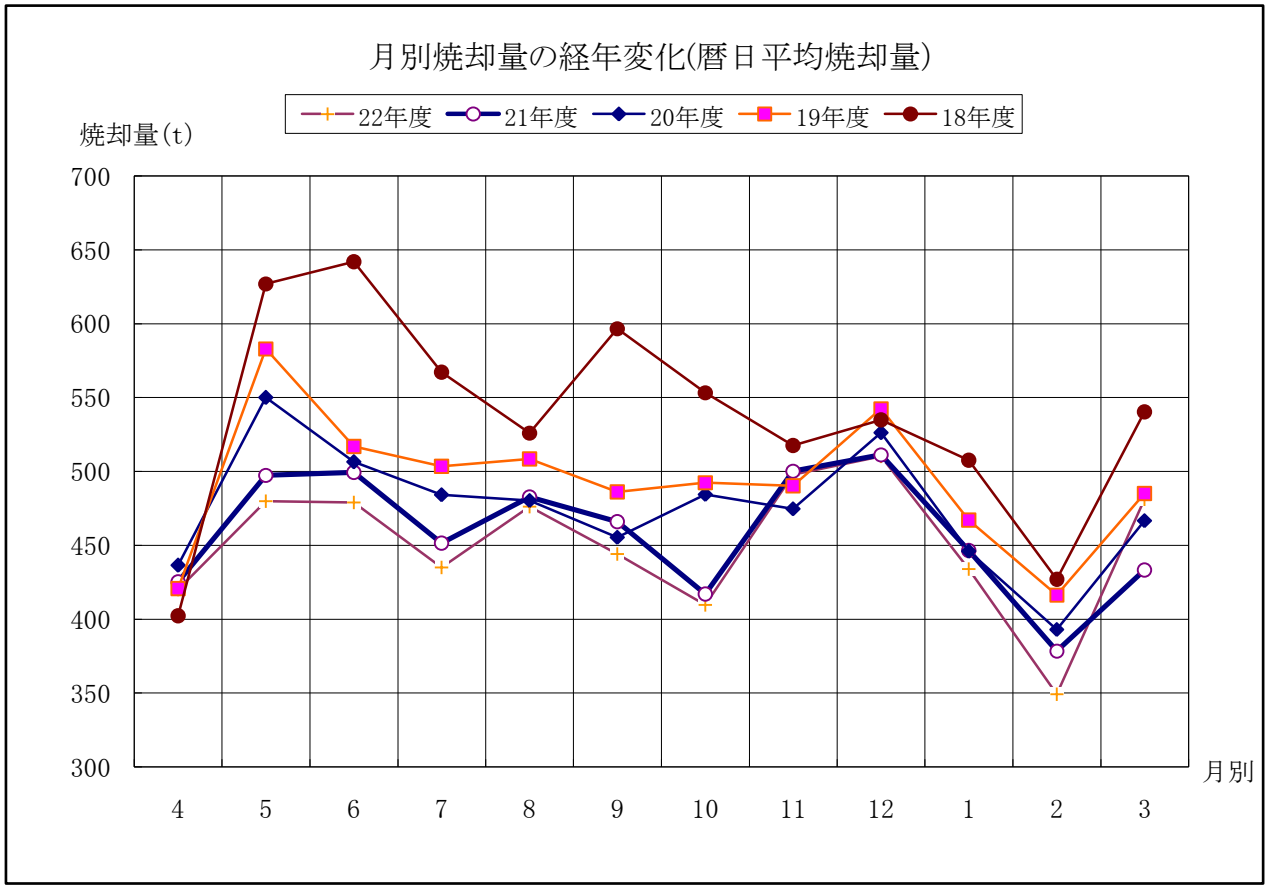

3. 管理薬剤の使用状況

3－1. 管理薬剤使用(購入)実績

項目 月別	液体 苛性ソーダ 48%	塩化 第二鉄	次亜塩素 酸ソーダ	硫酸	ヘラミン 90H-T	重金属捕集剤 エポフロック L1	塩酸 35%
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	16,694	3,580	0	3,490	150	0	54,220
5	16,667	3,500	2,940	0	0	0	61,520
6	13,114	7,090	1,490	3,530	0	0	56,220
7	16,659	6,980	2,980	0	150	0	49,250
8	11,589	5,560	2,990	3,540	0	400	54,130
9	18,176	3,500	0	0	150	0	47,140
10	16,624	3,520	1,550	3,550	0	0	51,850
11	11,569	7,050	1,510	0	150	0	55,460
12	26,731	3,520	1,520	3,600	0	0	57,770
1	3,072	6,980	1,490	0	70	400	53,090
2	10,086	3,520	0	0	0	0	41,480
3	13,102	7,030	1,540	3,490	60	400	59,120
計	174,083	61,830	18,010	21,200	730	1,200	641,250
月平均	14,507	5,153	1,501	1,767	61	100	53,438

項目 月別	塩酸 35% 20kg缶	凝集助剤 EDPﾌﾛｯｸ 351	塩素除去剤 ダイクリーン F504	防食剤 タワークリン S-112	次亜塩素酸 ナトリウム 溶液	防食剤 タワークリン パックマルチ
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(個)
4	0	50	0	0	40	0
5	0	0	20	0	0	0
6	0	50	0	0	0	0
7	100	50	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	50	20	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	50	20	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
1	0	50	20	0	0	0
2	100	50	0	0	0	0
3	0	0	10	0	0	0
計	200	350	90	0	40	0
月平均	17	29	8	0	3	0

項目 月別	飛灰装置用 ポルトランド セメント	飛灰用 キレート剤 エポルバ810	尿素水 40%	消石灰 アートクリーンS	特殊反応剤 クリアエイドS	重金属捕集剤 ジオスタ L-310
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	20,280	14,110	40,610	91,860	29,640	13,520
5	28,850	10,710	30,310	102,340	29,540	8,290
6	38,830	17,760	30,460	102,460	35,270	16,800
7	18,410	10,670	30,270	102,400	35,090	16,460
8	30,260	16,800	30,200	92,300	24,820	16,430
9	30,550	10,620	30,320	82,160	25,070	16,360
10	30,780	10,660	20,230	112,960	40,460	8,280
11	10,200	10,640	30,410	82,240	25,040	16,680
12	30,680	14,100	39,990	133,340	45,320	16,570
1	30,710	7,030	20,260	93,320	34,730	16,400
2	20,210	7,010	20,180	71,880	19,560	8,170
3	30,870	10,690	31,040	92,660	30,230	16,240
計	320,630	140,800	354,280	1,159,920	374,770	170,200
月平均	26,719	11,733	29,523	96,660	31,231	14,183

4. ボイラー・タービン関係

4－1. ボイラー運転状況（1～4号炉合計）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数（最大値）	起動回数	停止回数	灯油使用量	
											助燃バーナー	温水ボイラー
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)	(ℓ)
4	12,599.60	11,329	41,599.0	70.5	56.0	1,970	50	26	4	4	19,069	589
5	14,872.49	10,739	46,801.5	69.9	61.0	2,241	31	31	1	1	3,862	2,216
6	14,369.65	10,715	46,370.1	69.8	62.5	2,086	30	30	1	1	3,121	0
7	13,482.44	10,772	43,658.2	70.7	56.9	1,941	40	31	1	1	2,901	0
8	14,762.06	11,024	48,735.3	53.1	63.5	2,130	56	31	0	1	0	0
9	13,322.20	11,237	44,921.1	71.1	60.5	2,033	37	30	2	1	8,410	0
10	12,695.28	11,254	38,886.8	65.5	50.7	1,766	14	31	1	2	2,983	0
11	14,935.48	10,922	49,166.5	71.0	66.2	2,138	53	30	2	2	8,769	0
12	15,816.69	11,279	51,192.1	67.1	66.7	2,253	25	30	2	4	6,758	200
1	13,447.27	11,116	43,801.5	52.0	57.1	1,947	39	28	3	1	12,685	500
2	9,773.19	11,445	28,798.3	30.5	41.6	1,344	0	28	0	0	2,330	0
3	14,915.96	11,106	49,378.4	69.3	64.4	2,150	39	31	2	1	5,822	0
計	164,992.31	―	533,308.8	―	―	24,005	54	357	19	19	76,710	3,505
平均	13,749.36	11,078	44,442.4	63.4	58.93	2,000	30	30	2	2	6,393	292

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（1～3号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（4号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－2. ボイラー運転状況（1号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,806.77	11,269	12,567.1	69.6	71.53	597	20	26	1	1	3,295
5	4,063.43	11,080	13,133.1	69.3	72.34	637	20	27	0	1	0
6	708.69	10,317	2,077.8	68.1	11.83	121	15	6	1	0	3,121
7	4,798.60	10,798	15,006.3	68.6	82.66	744	0	31	0	0	0
8	4,744.01	11,005	14,957.2	67.8	82.39	744	0	31	0	0	0
9	4,439.23	11,361	14,549.0	68.3	82.82	720	0	30	0	0	0
10	883.43	11,179	2,641.3	62.8	14.55	140	25	6	0	1	0
11	1,827.34	10,745	5,828.2	70.8	33.18	290	55	13	1	0	4,216
12	4,835.40	11,290	14,810.1	64.5	81.58	713	30	30	0	1	0
1	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
3	3,170.14	11,132	10,313.6	69.4	56.81	505	20	22	1	0	3,222
計	33,277.04	―	105,883.7	―	―	5,214	5	222	4	4	13,854
平均	2,773.09	9,181	8,823.6	56.6	49.14	434	30	19	0	0	1,155

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－3. ボイラー運転状況（2号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,772.56	11,221	12,032.0	67.5	68.49	595	20	26	1	1	3,360
5	4,855.50	10,874	14,796.8	66.4	81.51	744	0	31	0	0	0
6	4,650.93	10,775	14,234.4	67.2	81.02	720	0	30	0	0	0
7	2,332.91	10,710	7,133.9	67.2	39.30	380	40	16	0	1	0
8	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
9	2,165.04	10,767	7,080.4	72.4	40.30	360	0	15	1	0	3,061
10	5,295.00	11,414	15,864.5	62.2	87.39	744	0	31	0	0	0
11	2,829.60	10,991	9,334.0	70.9	53.13	453	25	19	0	1	0
12	4,183.27	11,221	13,117.2	66.6	72.26	642	36	28	1	1	3,547
1	4,184.54	11,052	13,094.2	67.3	72.13	653	0	28	1	0	3,179
2	4,780.75	11,272	14,121.8	62.1	83.16	672	0	28	0	0	0
3	4,842.22	11,065	15,340.2	68.0	84.50	744	0	31	0	0	0
計	43,892.32	―	136,149.4	―	―	6,709	1	283	4	4	13,147
平均	3,657.69	10,114	11,345.8	61.5	63.60	559	5	24	0	0	1,096

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－4. ボイラー運転状況（3号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,707.50	11,347	12,296.6	69.3	69.99	596	30	26	1	1	6,526
5	5,020.88	10,913	15,957.6	68.9	68.90	744	0	31	0	0	0
6	3,348.85	10,968	10,741.6	69.0	61.14	525	15	22	0	1	0
7	403.72	10,810	1,262.2	71.9	6.95	73	0	4	1	0	2,901
8	5,001.33	11,039	16,120.5	69.3	88.80	744	0	31	0	0	0
9	2,463.56	11,704	8,150.6	67.5	46.39	377	35	16	0	1	0
10	4,338.27	11,500	12,603.0	59.9	69.42	576	14	25	1	0	2,983
11	4,863.84	11,008	15,217.7	67.0	86.62	701	25	30	0	1	0
12	1,204.34	11,530	3,618.5	62.0	19.93	186	22	9	1	1	3,211
1	4,361.44	11,317	13,698.9	65.9	75.46	656	20	28	1	0	3,242
2	4,992.44	11,617	14,676.5	60.0	86.42	672	0	28	0	0	0
3	1,084.85	11,054	3,357.4	65.3	18.49	158	10	7	0	1	0
計	40,791.02	―	127,701.1	―	―	6,010	51	257	5	6	18,863
平均	3,399.25	11,234	10,641.8	66.3	58.21	500	54	21	0	1	1,572

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－5. ボイラー運転状況（4号炉）

項目 / 月別	焼却量	平均低位発熱量	蒸　気発生量	ﾎﾞｲﾗｰ効率	ﾎﾞｲﾗｰ利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃ﾊﾞｰﾅｰ
	(t)	(KJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	1,312.77	11,480	4,703.3	75.7	21.85	181	40	8	1	1	5,888
5	932.68	10,089	2,914.0	74.8	13.10	116	11	5	1	0	3,862
6	5,661.18	10,801	19,316.3	74.9	89.73	720	0	30	0	0	0
7	5,947.21	10,771	20,255.8	74.9	91.06	744	0	31	0	0	0
8	5,016.72	11,029	17,657.6	75.4	79.38	642	56	27	0	1	0
9	4,254.37	11,115	15,141.1	76.1	70.33	576	2	25	1	0	5,349
10	2,178.58	10,922	7,778.0	77.0	34.96	305	35	13	0	1	0
11	5,414.70	10,942	18,786.6	75.1	87.27	693	8	29	1	0	4,553
12	5,593.68	11,073	19,646.3	75.1	88.32	710	57	30	0	1	0
1	4,901.29	10,980	17,008.4	74.6	76.46	638	19	27	1	1	6,264
2	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	2,330
3	5,818.75	11,171	20,367.2	74.4	91.56	743	9	31	1	0	2,600
計	47,031.93	―	163,574.6	―	―	6,071	57	256	6	5	30,846
平均	3,919.33	10,031	13,631.2	69.0	62.00	505	60	21	1	0	2,571

※灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－6. タービン稼働状況

項目 / 月別	蒸　気 発生量 (A)	蒸気発生量 ―――― 焼却量	1号タービン(2000KW) 運転日数	運転時間		タービン入口蒸気量 (ア)	発生蒸気利用率 (ア／A)	発電量 (B)	運転日数	運転時間	
	(t)	(t)	(日)	(時間)	(分)	(t)	(%)	(kwh)	(日)	(時間)	(分)
4	41,599.0	3.30	16	346	34	9,510.2	22.86	629,502	18	400	37
5	46,801.5	3.15	0	0	0	0.0	0.00	0	31	744	0
6	46,370.1	3.23	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
7	43,658.2	3.24	3	61	10	784.4	1.80	38,350	31	744	0
8	48,735.3	3.30	27	634	30	7,941.2	16.29	400,759	31	744	0
9	44,921.1	3.37	24	564	5	7,466.3	16.62	392,216	30	720	0
10	38,886.8	3.06	6	130	0	1,799.9	4.63	98,214	31	744	0
11	49,166.5	3.29	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
12	51,192.1	3.24	18	407	41	8,002.1	15.63	496,070	30	707	54
1	43,801.5	3.26	10	215	40	3,120.8	7.12	172,380	27	635	24
2	28,798.3	2.95	0	0	0	0.0	0.00	0	28	672	0
3	49,378.4	3.31	0	0	0	0.0	0.00	0	31	744	0
計	533,308.8	38.69	104	2,359	40	38,624.9	―	2,227,491	348	8,295	55
月平均	44,442.4	3.22	9	196	38	3,218.7	7.24	185,624	29	691	20
最大	51,192.1	3.37	27	634	30	9,510.2	22.86	629,502	31	744	0
最小	28,798.3	2.95	0	0	0	0.0	0.00	0	18	400	37

2号タービン（5000KW）			合計（7000KW）			蒸気	1kwh	
タービン入口蒸気量（イ）	発生蒸気利用率（イ／A）	発電量（C）	タービン入口蒸気量（ア＋イ）＝（ウ）	発生蒸気利用率（ウ／A）	発電量（B＋C）	1トン当り発電量	当り蒸気消費量	発電量／焼却量
(t)	(%)	(kwh)	(t)	(%)	(kwh)	(kwh／t)	(kg／kwh)	(kwh／t)
21,706.4	52.18	1,826,416	31,216.6	75.04	2,455,918	78.7	12.71	194.9
39,509.2	84.42	3,318,731	39,509.2	84.42	3,318,731	84.0	11.90	223.1
39,237.3	84.62	3,305,072	39,237.3	84.62	3,305,072	84.2	11.87	230.0
36,919.3	84.56	3,045,812	37,703.7	86.36	3,084,162	81.8	12.22	228.8
34,521.6	70.83	2,806,654	42,462.8	87.13	3,207,413	75.5	13.24	217.3
32,036.5	71.32	2,576,071	39,502.8	87.94	2,968,287	75.1	13.31	222.8
31,738.6	81.62	2,511,859	33,538.5	86.25	2,610,073	77.8	12.85	205.6
40,436.2	82.24	3,418,921	40,436.2	82.24	3,418,921	84.6	11.83	228.9
35,738.6	69.81	2,962,283	43,740.7	85.44	3,458,353	79.1	12.65	218.7
33,454.7	76.38	2,793,586	36,575.5	83.50	2,965,966	81.1	12.33	220.6
24,141.6	83.83	1,815,629	24,141.6	83.83	1,815,629	75.2	13.30	185.8
41,194.9	83.43	3,468,777	41,194.9	83.43	3,468,777	84.2	11.88	232.6
410,634.9	—	33,849,811	449,259.8	—	36,077,302	—	—	—
34,219.6	77.10	2,820,818	37,438.3	84.24	3,006,442	80.3	12.45	218.7
41,194.9	84.62	3,468,777	43,740.7	87.94	3,468,777	84.6	13.31	232.6
21,706.4	52.18	1,815,629	24,141.6	75.04	1,815,629	75.1	11.83	185.8

4－7. 純水及び薬剤使用実績

項目 / 月別	純水使用量	純水使用量 暦日平均	苛性ソーダ（24%）	塩酸	亜硫酸ソーダ	ヘラミン 90H-T
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(kg)	(kg)
4	1,713.4	57.11	3.20	2.50	8	55
5	1,844.4	59.50	4.10	3.20	8	58
6	1,749.4	58.31	4.10	3.20	10	60
7	1,787.0	57.65	4.10	3.20	8	56
8	2,187.6	70.57	3.60	2.80	8	71
9	1,995.8	66.53	4.10	3.20	10	72
10	1,602.1	51.68	3.15	2.45	8	52
11	1,768.9	58.96	3.60	2.80	8	69
12	1,940.3	62.59	4.05	3.15	10	68
1	1,758.0	56.71	3.15	2.45	8	58
2	1,396.8	49.89	2.70	2.10	8	41
3	1,793.2	57.85	4.05	3.15	10	63
計	21,536.9	—	43.90	34.20	104	723
月平均	1,794.7	58.84	3.66	2.85	9	60

5. 洗煙装置関係

5－1. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計）

項目	1～4号炉合計													
	洗煙装置稼働時焼却量（A）	稼働日数（最大値）	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	12,599.60	26	2,003	42	876	18	876	18	0	0	0	0	0	0
5	14,872.49	31	2,259	24	716	36	716	36	0	0	0	0	0	0
6	14,369.65	30	2,094	29	785	31	785	31	0	0	0	0	0	0
7	13,482.44	31	1,949	13	1,026	47	1,026	47	0	0	0	0	0	0
8	14,762.06	31	2,132	25	843	35	843	35	0	0	0	0	0	0
9	13,322.20	30	2,048	38	831	22	831	22	0	0	0	0	0	0
10	12,695.28	31	1,775	48	1,200	12	1,200	12	0	0	0	0	0	0
11	14,932.11	30	2,172	48	707	12	706	48	0	0	0	24	0	0
12	15,816.69	30	2,268	8	707	52	707	52	0	0	0	0	0	0
1	13,447.27	28	1,970	42	1,005	18	1,005	18	0	0	0	0	0	0
2	9,773.19	28	1,352	32	1,335	28	1,335	28	0	0	0	0	0	0
3	14,915.96	31	2,160	47	815	13	815	13	0	0	0	0	0	0
計	164,988.94	357	24,188	36	10,851	24	10,851	0	0	0	0	24	0	0
月平均	13,749.08	30	2,015	43	904	17	904	15	0	0	0	2	0	0

5－2. 洗煙装置稼働実績(1号炉)

項目	1　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,806.77	26	605	7	114	53	114	53	0	0	0	0	0	0
5	4,063.43	27	642	38	101	22	101	22	0	0	0	0	0	0
6	708.69	6	128	42	591	18	591	18	0	0	0	0	0	0
7	4,798.60	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4,744.01	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4,439.23	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	883.43	6	136	39	607	21	607	21	0	0	0	0	0	0
11	1,827.34	14	305	23	414	37	414	37	0	0	0	0	0	0
12	4,835.40	30	713	11	30	49	30	49	0	0	0	0	0	0
1	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
2	0.00	0	0	0	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	3,170.14	22	512	45	231	15	231	15	0	0	0	0	0	0
計	33,277.04	223	5,252	25	3,507	35	3,507	35	0	0	0	0	0	0
月平均	2,773.09	19	437	42	292	18	292	18	0	0	0	0	0	0

5－3. 洗煙装置稼働実績(2号炉)

項目	2　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,772.56	26	602	9	117	51	117	51	0	0	0	0	0	0
5	4,855.50	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4,650.93	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2,332.91	16	380	32	363	28	363	28	0	0	0	0	0	0
8	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	2,165.04	16	367	46	352	14	352	14	0	0	0	0	0	0
10	5,295.00	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2,829.60	19	449	14	270	46	270	46	0	0	0	0	0	0
12	4,183.27	28	649	38	94	22	94	22	0	0	0	0	0	0
1	4,184.54	28	660	38	83	22	83	22	0	0	0	0	0	0
2	4,780.75	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4,842.22	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	43,892.32	284	6,733	57	2,026	3	2,026	3	0	0	0	0	0	0
月平均	3,657.69	24	561	10	168	50	168	50	0	0	0	0	0	0

5－4. 洗煙装置稼働実績(3号炉)

項目	3　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,707.50	26	603	30	116	30	116	30	0	0	0	0	0	0
5	5,020.88	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3,348.85	22	525	47	194	13	194	13	0	0	0	0	0	0
7	403.72	4	80	41	663	19	663	19	0	0	0	0	0	0
8	5,001.33	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2,463.56	16	376	20	343	40	343	40	0	0	0	0	0	0
10	4,338.27	25	584	37	159	23	159	23	0	0	0	0	0	0
11	4,863.84	30	714	40	5	20	5	20	0	0	0	0	0	0
12	1,204.34	9	191	51	552	9	552	9	0	0	0	0	0	0
1	4,361.44	28	660	5	83	55	83	55	0	0	0	0	0	0
2	4,992.44	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1,084.85	7	160	2	583	58	583	58	0	0	0	0	0	0
計	40,791.02	257	6,057	33	2,702	27	2,702	27	0	0	0	0	0	0
月平均	3,399.25	21	504	48	225	12	225	12	0	0	0	0	0	0

5－5. 洗煙装置稼働実績(4号炉)

項目	4　号　炉													
					停止及びバイパス時間									
							内訳							
	洗煙装置稼働時焼却量(A)	稼働日数	稼働時間		合計		炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月別	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	1,312.77	9	192	56	527	4	527	4	0	0	0	0	0	0
5	932.68	6	128	46	615	14	615	14	0	0	0	0	0	0
6	5,661.18	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5,947.21	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5,016.72	27	644	25	99	35	99	35	0	0	0	0	0	0
9	4,254.37	25	584	32	135	28	135	28	0	0	0	0	0	0
10	2,178.58	13	310	32	433	28	433	28	0	0	0	0	0	0
11	5,411.33	30	703	31	16	29	16	5	0	0	0	24	0	0
12	5,593.68	30	713	28	30	32	30	32	0	0	0	0	0	0
1	4,901.29	28	649	59	94	1	94	1	0	0	0	0	0	0
2	0.00	1	8	32	663	28	663	28	0	0	0	0	0	0
3	5,818.75	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	47,028.56	261	6,144	41	2,615	19	2,614	55	0	0	0	24	0	0
月平均	3,919.05	22	512	3	217	57	217	55	0	0	0	2	0	0

5－6. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績

項目	3% 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量 FS－710	焼却量 1ﾄﾝ当り 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量	稼働率 洗煙装置稼働時間／焼却炉稼働時間					稼働率 洗煙装置稼働時焼却量／総焼却量				
	(B)	(B／A)	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(m³)	(m³)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	336.24	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	411.69	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
6	369.84	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7	367.59	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8	384.04	0.03	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0
9	360.81	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	351.34	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11	389.65	0.03	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9
12	426.81	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	219.43	0.02	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0
2	181.88	0.02	－	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0
3	275.64	0.02	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
計	4,074.96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	339.58	0.02	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	99.9

5－7. 洗煙装置暦日数平均稼働率

項目	稼働率 洗煙装置稼働日数／暦日数					稼働率 洗煙装置稼働時間／暦日数×24時間				
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	全体
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	86.7	86.7	86.7	30.0	72.5	84.0	83.6	83.8	26.8	69.6
5	87.1	100.0	100.0	19.4	76.6	86.4	100.0	100.0	17.3	75.9
6	20.0	100.0	73.3	100.0	73.3	17.9	100.0	73.0	100.0	72.7
7	100.0	51.6	12.9	100.0	66.1	100.0	51.1	10.8	100.0	65.5
8	100.0	0.0	100.0	87.1	71.8	100.0	0.0	100.0	86.6	71.7
9	100.0	53.3	53.3	83.3	72.5	100.0	51.1	52.3	81.2	71.1
10	19.4	100.0	80.6	41.9	60.5	18.4	100.0	78.6	41.7	59.7
11	46.7	63.3	100.0	100.0	77.5	42.4	62.4	99.3	97.7	75.4
12	96.8	90.3	29.0	96.8	78.2	95.9	87.3	25.8	95.9	76.2
1	0.0	90.3	90.3	90.3	67.7	0.0	88.8	88.7	87.4	66.2
2	0.0	100.0	100.0	3.6	50.9	0.0	100.0	100.0	1.3	50.3
3	71.0	100.0	22.6	100.0	73.4	68.9	100.0	21.5	100.0	72.6
計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	61.1	77.8	70.4	71.5	70.2	60.0	76.9	69.2	70.1	69.0

6. 排水処理関係

6－1. 排水処理実績

項目	放流水量						排水処理関係薬剤使用量					
	総放流水量 FRS-708	暦日平均	プラント放流水量 FRS-707	暦日平均	生活排水等（余熱利用施設排水量含）	暦日平均	苛性ソーダ 3%	硫酸	塩化第二鉄	凝集助剤EDP 351	次亜塩素酸ソーダ	重金属捕集剤 L－1
月別	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	15,239.3	508.0	9,484.4	316.1	5,754.9	191.8	33,289	890	3,280	18,200	1,070	1,820
5	17,461.7	563.3	10,824.3	349.2	6,637.4	214.1	42,806	900	3,750	21,000	2,130	1,450
6	18,932.8	631.1	10,999.3	366.6	7,933.5	264.5	30,812	1,620	3,730	21,000	1,500	2,100
7	19,890.4	641.6	11,490.5	370.7	8,399.9	271.0	43,114	1,400	3,970	19,600	1,690	1,880
8	20,670.1	666.8	11,099.0	358.0	9,571.1	308.7	32,573	1,460	3,880	22,400	2,340	1,580
9	17,758.4	591.9	10,650.6	355.0	7,107.8	236.9	36,679	1,260	3,680	18,200	1,400	2,090
10	16,701.2	538.7	10,595.3	341.8	6,105.9	197.0	30,033	940	3,580	19,600	1,200	1,390
11	16,163.6	538.8	11,219.2	374.0	4,944.4	164.8	19,675	1,050	3,720	18,200	1,100	1,320
12	16,941.9	546.5	11,183.3	360.8	5,758.6	185.8	17,888	1,400	3,750	19,600	1,180	1,720
1	17,184.2	554.3	9,433.5	304.3	7,750.7	250.0	20,929	770	3,410	18,200	850	1,280
2	17,690.4	631.8	8,525.9	304.5	9,164.5	327.3	24,167	580	3,130	16,800	420	2,000
3	17,422.2	562.0	10,774.3	347.6	6,647.9	214.4	20,257	870	3,900	21,000	630	1,940
計	212,056.2	―	126,279.6	―	85,776.6	―	352,222	13,140	43,780	233,800	15,510	20,570
月平均	17,671.4	581.0	10,523.3	346.0	7,148.1	235.0	29,352	1,095	3,648	19,483	1,293	1,714

6－2. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績

項目	脱水機				処理薬剤
	汚泥供給量 FS-709	脱水機運転時間		脱水汚泥排出量	ジオスタ L-310
月別	(㎥)	(時間)	(分)	(kg)	(kg)
4	17.04	5	56	3,330	14,310.0
5	0.00	0	0	0	15,390.0
6	0.00	0	0	1,060	14,580.0
7	0.00	0	0	0	15,255.0
8	0.00	0	0	0	16,807.5
9	0.28	0	9	0	15,727.5
10	0.41	0	10	0	13,972.5
11	1.97	2	5	0	14,850.0
12	10.01	3	2	1,650	13,297.5
1	0.00	0	0	0	14,040.0
2	15.10	3	29	0	9,720.0
3	6.84	4	50	3,600	16,902.0
計	51.65	19	41	9,640	174,852.0
月平均	4.30	1	38	803	14,571.0

7. 電力関係

7－1. 電力使用実績

項目	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A	暦日平均1時間当り電力量	発電量 DCS B	暦日平均1時間当り電力量	計 A＋B＝C	暦日平均1時間当り電力量	（売電）取引メータ D	暦日平均1時間当り電力量
月別	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)
4	358,788	498	2,455,918	3,411	2,814,706	3,909	781,281	1,085
5	4,553	6	3,318,731	4,461	3,323,284	4,467	1,058,655	1,423
6	9,234	13	3,305,072	4,590	3,314,306	4,603	1,106,779	1,537
7	15,239	20	3,084,162	4,145	3,099,401	4,166	996,413	1,339
8	20,243	27	3,207,413	4,311	3,227,656	4,338	964,256	1,296
9	27,534	38	2,968,287	4,123	2,995,821	4,161	906,871	1,260
10	55,344	74	2,610,073	3,508	2,665,417	3,583	653,144	878
11	8,504	12	3,418,921	4,749	3,427,425	4,760	1,246,320	1,731
12	56,001	75	3,458,353	4,648	3,514,354	4,724	1,271,549	1,709
1	161,382	217	2,965,966	3,987	3,127,348	4,203	1,023,963	1,376
2	103,243	154	1,815,629	2,702	1,918,872	2,855	199,308	297
3	12,161	16	3,468,777	4,662	3,480,938	4,679	1,252,652	1,684
計	832,226	－	36,077,302	－	36,909,528	－	11,461,191	－
月平均	69,352	95	3,006,442	4,118	3,075,794	4,213	955,099	1,308

項目	総需要電力量								電力自給率 B－D / C－D
	ごみ焼却施設電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	粗大ごみ処理施設電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	余熱利用施設電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	計	暦日平均1時間当り電力量	
月別	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(kwh)	(%)
4	1,787,638	2,483	166,163	231	41,671	58	1,995,472	2,771	82.4
5	1,951,983	2,624	170,056	229	87,803	118	2,209,842	2,970	99.8
6	1,883,157	2,615	175,824	244	94,040	131	2,153,021	2,990	99.6
7	1,806,023	2,427	177,861	239	68,663	92	2,052,547	2,759	99.3
8	1,934,745	2,600	182,929	246	92,125	124	2,209,799	2,970	99.1
9	1,783,764	2,477	179,624	249	75,133	104	2,038,521	2,831	98.7
10	1,772,374	2,382	164,835	222	32,022	43	1,969,231	2,647	97.2
11	1,852,347	2,573	168,751	234	96,523	134	2,117,621	2,941	99.6
12	1,937,403	2,604	179,139	241	68,238	92	2,184,780	2,937	97.5
1	1,822,607	2,450	163,635	220	67,782	91	2,054,024	2,761	92.3
2	1,543,209	2,296	150,912	225	0	0	1,694,121	2,521	94.0
3	1,910,384	2,568	176,157	237	81,664	110	2,168,205	2,914	99.5
計	21,985,634	－	2,055,886	－	805,664	－	24,847,184	－	－
月平均	1,832,136	2,510	171,324	235	67,139	92	2,070,599	2,836	96.7

8. 市水・工水・防臭薬剤関係

8－1. 市水・工水・防臭薬剤の使用実績

項目	市水					
	使用水量		認定使用水量			
	(管理月報)	暦日平均	伊丹市水道局	暦日平均	豊中市水道局	暦日平均
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	10,571.0	352.4	23,863.0	391.2	40.5	1.4
5	10,711.8	345.5		—	59.1	1.9
6	10,225.8	340.9	20,902.0	342.7	70.5	2.4
7	10,808.8	348.7		—	91.5	3.0
8	10,984.3	354.3	21,339.0	349.8	104.9	3.4
9	10,099.4	336.6		—	103.7	3.5
10	9,766.6	315.1	20,713.0	339.6	94.7	3.1
11	10,515.6	350.5		—	83.9	2.8
12	9,837.2	317.3	20,582.0	332.0	81.7	2.6
1	8,063.9	260.1		—	82.6	2.7
2	5,149.5	183.9	12,331.0	209.0	91.7	3.3
3	7,442.5	240.1		—	79.3	2.6
計	114,176.4	—	119,730.0	—	984.1	—
月平均	9,514.7	312.8	19,955.0	328.0	82.0	2.7

*伊丹市水道局の認定市水量は、2ヶ月分です。(例) 4・5月は3/10～5/10の使用量です。

項目	工水／下水高度処理水						
	使用水量		認定使用水量		基本使用水量		超過水量
	(管理月報)	暦日平均	(伊丹市水道局/猪名川流域下水道事務所)	暦日平均	(伊丹市水道局)	暦日平均	(伊丹市水道局)
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	14,326.0	477.5	14,134.00	471.13	48,000	1,600	4
5	16,968.0	547.4	17,016.00	548.90	49,600	1,600	0
6	15,530.0	517.7	16,545.00	551.50	48,000	1,600	0
7	14,323.0	462.0	14,017.00	452.16	49,600	1,600	0
8	16,469.0	531.3	17,066.00	550.52	49,600	1,600	0
9	16,305.0	543.5	16,645.00	554.83	48,000	1,600	0
10	18,480.0	596.1	17,643.00	569.13	49,600	1,600	0
11	16,355.0	545.2	17,589.00	586.30	48,000	1,600	0
12	11,710.0	557.6	12,472.00	593.90	49,600	1,600	0
	6,919.0	629.0	7,278.00	661.64	－	－	－
1	16,192.0	522.3	16,554.00	534.00	－	－	－
2	17,922.0	640.1	17,853.00	637.61	－	－	－
3	18,934.0	610.8	19,311.00	622.94	－	－	－
計	200,433.0	—	204,123.00	—	440,000	—	4
月平均	15,417.9	548.9	15,701.77	558.9	48,889	1,600	0

*12月21日に猪名川流域下水道事務所の下水高度処理水への切替に伴い、1月分より基本使用量、超過水量は削除し、認定使用水量については、猪名川流域下水道事務所の認定使用水量へ変更。
12月 工水・下水高度処理水使用量:上段　～12月21日(工水)、下段　12月22日～(下水高度処理水)

項目	防臭薬剤
	強力無臭元
	(ℓ)
4	0
5	0
6	360
7	560
8	330
9	400
10	520
11	390
12	460
1	370
2	230
3	360
計	3,980
月平均	332

9. 焼却残渣(灰)関係

9－1. 飛灰安定化装置稼働実績

(東)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	173.9	11.7	36.6	5,919	96	20
5	180.0	12.2	42.9	5,100	99	56
6	197.0	15.8	45.9	7,132	109	11
7	196.9	17.0	44.5	7,503	109	7
8	53.0	4.9	11.2	1,970	29	23
9	158.7	12.0	33.0	5,523	88	23
10	203.8	14.3	47.9	5,484	112	48
11	95.8	6.4	22.8	2,412	53	13
12	149.2	9.9	37.8	3,912	82	43
1	69.2	4.8	18.4	1,809	38	19
2	0.0	0.0	0.0	0	0	0
3	84.7	6.0	23.4	2,189	46	48
計	1,562.2	115.0	364.4	48,953	866	11
月平均	130.2	9.6	30.4	4,079	72	11

(西)

項目 / 月別	飛灰処理量	セメント使用量	汚泥流量	飛灰キレート剤流量	飛灰安定化装置運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	151.7	10.9	41.5	3,915	87	36
5	187.2	14.9	59.1	6,160	119	46
6	163.2	12.3	51.5	5,263	105	34
7	116.4	9.8	36.0	3,880	77	51
8	266.9	19.5	84.0	9,848	180	38
9	133.7	9.7	42.9	5,117	91	5
10	98.3	7.3	30.7	2,851	66	36
11	221.2	16.1	63.9	6,183	153	23
12	182.8	14.2	59.2	4,993	126	27
1	224.8	15.9	71.0	6,195	153	13
2	210.2	15.5	66.4	6,102	145	31
3	231.4	18.1	63.9	6,325	158	27
計	2,187.8	164.2	670.1	66,832.0	1,466	7
月平均	182.3	13.7	55.8	5,569.3	122	11

9－2. 焼却残渣(灰)処分実績

項目	焼却残渣(灰)処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	145	1,357	65.5	77	716	34.5	222	2,073	100	2,171	95.5
5	168	1,537	68.5	77	706	31.5	245	2,243	100	2,383	94.1
6	165	1,539	68.4	77	712	31.6	242	2,251	100	2,284	98.6
7	147	1,369	66.9	74	676	33.1	221	2,045	100	2,238	91.4
8	156	1,424	66.8	78	708	33.2	234	2,132	100	2,127	100.2
9	151	1,394	69.8	66	603	30.2	217	1,997	100	2,132	93.7
10	154	1,416	69.0	70	636	31.0	224	2,052	100	2,041	100.5
11	152	1,420	68.7	71	647	31.3	223	2,067	100	2,228	92.8
12	190	1,822	68.8	88	828	31.2	278	2,650	100	2,437	108.7
1	141	1,332	70.7	59	553	29.3	200	1,885	100	1,945	96.9
2	111	1,058	65.7	60	553	34.3	171	1,611	100	1,676	96.1
3	169	1,641	70.0	72	702	30.0	241	2,343	100	2,068	113.3
計	1,849	17,309		869	8,040		2,718	25,349		25,730	
月平均	154	1,442	68.3	72	670	31.7	227	2,112	100	2,144	98.5

9－3. 焼却残渣(灰)測定結果

項目	焼却残渣(灰)測定結果											
	1号炉		2号炉		3号炉		4号炉		全体		灰ﾋﾟｯﾄ	
	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分
月別	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	1.5	26.0	2.6	28.1	3.4	27.5	－	－	2.5	27.2	9.8	20.9
5	5.5	29.5	3.4	23.3	6.0	26.9	2.8	44.0	4.4	30.9	－	－
6	－	－	1.4	23.9	3.4	38.0	3.8	52.8	2.9	38.2	3.3	27.1
7	2.9	37.7	4.5	33.0	－	－	2.4	40.3	3.3	37.0	2.3	20.7
8	5.1	49.2	－	－	6.4	39.7	7.1	42.8	6.2	43.9	3.5	23.8
9	3.1	38.8	2.6	28.6	3.9	39.5	2.4	47.0	3.0	38.5	3.9	23.7
10	4.1	43.3	1.7	23.6	－	－	3.5	43.3	3.1	36.7	3.3	38.0
11	3.2	43.3	2.1	32.0	4.6	41.1	2.0	30.7	3.0	36.8	－	－
12	2.5	29.7	6.2	50.0	－	－	3.7	43.7	4.1	41.1	2.8	29.6
1	－	－	3.0	32.4	4.4	45.4	2.5	44.9	3.3	40.9	2.8	29.9
2	－	－	3.0	26.3	4.0	24.6	－	－	3.5	25.5	2.6	28.5
3	2.6	46.1	1.7	32.5	－	－	2.4	39.3	2.2	39.3	2.4	29.2
平均	3.4	38.2	2.9	30.3	4.5	35.3	3.3	42.9	3.5	36.3	3.7	27.1
最大	5.5	49.2	6.2	50.0	6.4	45.4	7.1	52.8	6.2	43.9	9.8	38.0
最小	1.5	26.0	1.4	23.3	3.4	24.6	2.0	30.7	2.2	25.5	2.3	20.7

10. 公害関係

10－1. 敷地境界線における臭気測定結果（悪臭防止法に基づく）

（単位：ppm）

測定点 / 測定項目	測定日： 平成22年 8月30日（月）				
	東 側	西 側	南 側	北 側	基準値
アンモニア	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
メチルメルカプタン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.002
硫化水素	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.01
二硫化メチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
トリメチルアミン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.005
アセトアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.05
プロピオンアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
イソブチルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.009
イソバレルアルデヒド	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.003
イソブタノール	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.9
酢酸エチル	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	3
メチルイソブチルケトン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
トルエン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	10
スチレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.4
キシレン	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	1
プロピオン酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.03
ノルマル酪酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.001
ノルマル吉草酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.0009
イソ吉草酸	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	0.001
臭気指数	11	＜11	＜11	14	―

※臭気指数の単位：希釈倍数で無次元
※定量下限値未満はN. D. とした。

測定箇所概略図

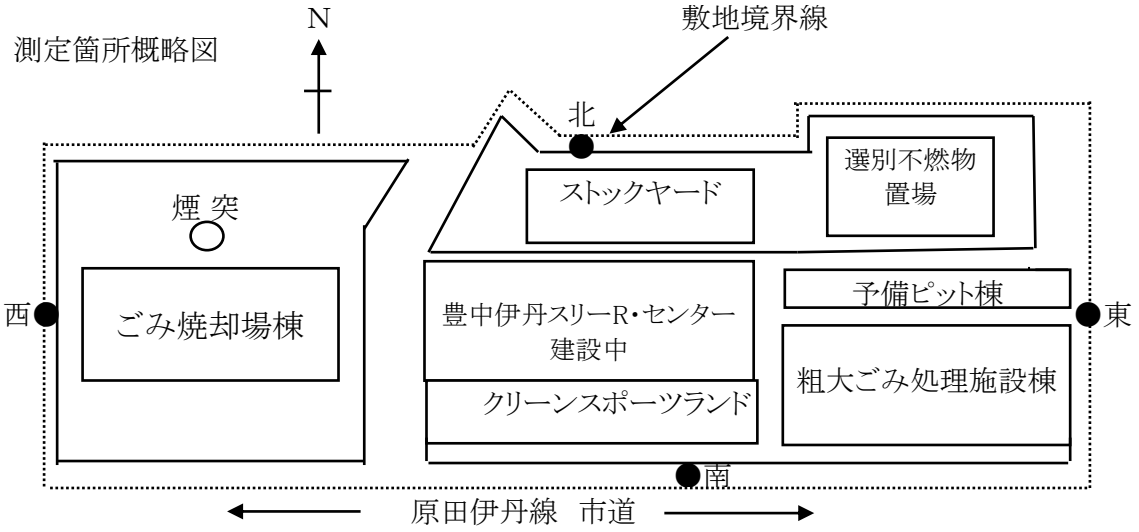

10－2. 排ガス関係測定結果　　（大気汚染防止法に基づく）

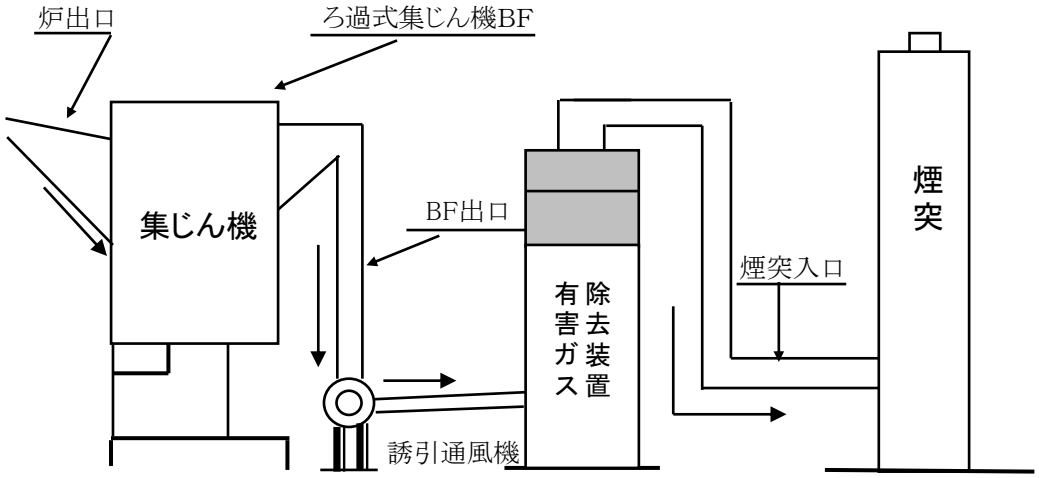

○ばいじん量

炉 出 口　　（g/Nm³）

測定炉	1月
1号炉	1.0
2号炉	1.9
3号炉	1.6
4号炉	0.93

※ 1，4号炉記入は11月測定結果

BF出口　　（g/Nm³）

測 定 炉	7月	1月
1 号 炉	＜0.001	＜0.0009
2 号 炉	＜0.001	＜0.001
3 号 炉	＜0.001	＜0.001
4 号 炉	＜0.0008	＜0.0008

※ 3号炉7月記入分は8月測定結果

1，4号炉1月記入分は11月測定結果

煙突入口　　（g/Nm³）

測定炉	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
1号炉	0.003	0.001	<0.0008	<0.001	－	<0.001	0.08
2号炉	0.003	<0.001	<0.0009	<0.001	<0.001	<0.001	
3号炉	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.001	<0.001	<0.0009	
4号炉	<0.001	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.001	<0.0009	

※ 3号炉7月記入分は8月測定結果、3号炉3月記入分は2月測定結果

（全炉、年平均）



◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物

1号炉炉出口

項	目	11月
排ガス量(wet)	Nm³／h	54,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,100
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	250
いおう酸化物	Nm³／h	1.2
	cm³／Nm³	27

1号炉集じん機出口

項	目	7月	11月
排ガス量(wet)	Nm³／h	69,700	61,400
排ガス量(dry)	Nm³／h	57,000	49,400
塩化水素	※ mg／Nm³	170	59
いおう酸化物	Nm³／h	1.3	1.2
	cm³／Nm³	22	24

1号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	3月		規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	69,400	65,600	65,300	57,000	64,900		
排ガス量(dry)	Nm³／h	51,500	50,100	46,700	43,400	49,500		
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.6	4.6	3.0	4.3	3.8		
	※cm³／Nm³	91	96	51	97	83		300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	6.0	0.7	0.5	1.5	0.7		700
いおう酸化物	Nm³／h	0.04	0.12	0.04	0.06	＜0.02		8.54 ～ 9.20
	cm³／Nm³	0.8	2.3	0.8	1.3	＜0.5		

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

2号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	58,100
排ガス量(dry)	Nm³／h	48,500
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	200
いおう酸化物	Nm³／h	0.92
	cm³／Nm³	19

2号炉集じん機出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	60,300	56,100
排ガス量(dry)	Nm³／h	49,400	46,900
塩化水素	※ mg／Nm³	27	18
いおう酸化物	Nm³／h	0.15	0.16
	cm³／Nm³	3.0	3.5

2号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	72,500	65,800	58,600	51,900	59,800	64,600	
排ガス量(dry)	Nm³／h	55,000	49,500	44,500	40,900	47,600	49,800	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.2	3.8	4.9	4.9	3.3	2.4	
	※cm³／Nm³	100	86	100	110	71	50	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	4.1	1.0	＜0.4	4.3	1.5	0.6	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.06	＜0.02	0.04	0.27	＜0.02	＜0.02	8.26～ 9.29
	cm³／Nm³	1.1	＜0.5	1.0	6.7	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

3号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	63,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	49,300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	200
いおう酸化物	Nm³／h	1.1
	cm³／Nm³	22

3号炉集じん機出口

項	目	8月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	59,000	60,600
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,500	47,500
塩化水素	※ mg／Nm³	24	26
いおう酸化物	Nm³／h	0.37	0.16
	cm³／Nm³	8.0	3.3

3号炉煙突入口

項	目	5月	8月	9月	11月	1月	2月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	64,500	62,300	63,800	72,900	65,300	54,300	
排ガス量(dry)	Nm³／h	48,700	47,900	46,200	54,800	50,600	43,300	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.9	5.3	3.3	5.5	2.8	2.1	
	※cm³／Nm³	98	100	61	92	55	41	300
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	＜0.5	1.5	＜0.4	0.6	1.3	＜0.5	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.05	＜0.02	0.02	＜0.03	＜0.03	＜0.02	8.54～9.35
	cm³／Nm³	1.0	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

4号炉炉出口

項	目	11月
排ガス量(wet)	Nm³／h	54,700
排ガス量(dry)	Nm³／h	37,400
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	440
いおう酸化物	Nm³／h	1.8
	cm³／Nm³	47

4号炉集じん機出口

項	目	7月	11月
排ガス量(wet)	Nm³／h	61,800	57,000
排ガス量(dry)	Nm³／h	48,200	36,700
塩化水素	※ mg／Nm³	75	56
いおう酸化物	Nm³／h	1.3	0.95
	cm³／Nm³	26	26

4号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	50,900	62,700	52,800	57,300	52,700	61,400	
排ガス量(dry)	Nm³／h	38,600	47,900	41,900	43,700	39,900	46,900	
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	2.9	5.7	5.4	5.7	6.8	4.7	
	※cm³／Nm³	56	82	100	97	170	95	250
塩 化 水 素	※ mg／Nm³	＜0.5	＜0.4	＜0.4	0.8	9.2	0.7	700
いおう酸化物	Nm³／h	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	3.30 ～ 3.55
	cm³／Nm³	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

※窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12％換算値

（全炉、年平均）

排ガス量
wet 60,700 Nm³/h
dry 47,700 Nm³/h

塩化水素 57 mg/Nm³
SOx 14 cm³/Nm³

有害ガス除去装置

（洗 煙 塔 ）

除去率
塩化水素 97.2 %
SOx 93.6 %

排ガス量
wet 61,600 Nm³/h
dry 46,900 Nm³/h

◎塩化水素 1.6 mg/Nm³
◎SOx 0.89 cm³/Nm³

◎測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量

項目（稼働炉数）		5月(4)	7月(3)	9月(4)
窒素酸化物（NOx）	Nm³／h	17.6	14.2	16.6
いおう酸化物（SOx）	Nm³／h	＜0.17	＜0.16	＜0.12

項目（稼働炉数）		11月 (4)	1月(3)	3月(3)	総量規制値
NOx	Nm³／h	20.4	12.9	10.9	39.28
SOx	Nm³／h	＜0.38	＜0.07	＜0.06	19.35

10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化 （煙突入口）

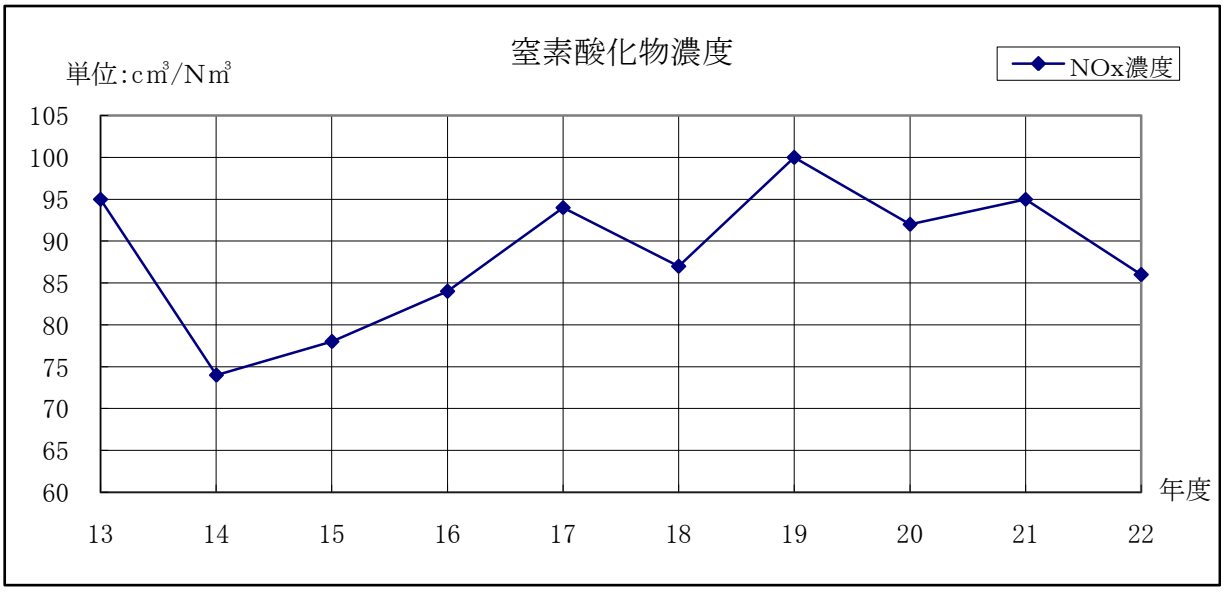

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
NOx 濃度	95	74	78	84	94	87	100	92	95	86

10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

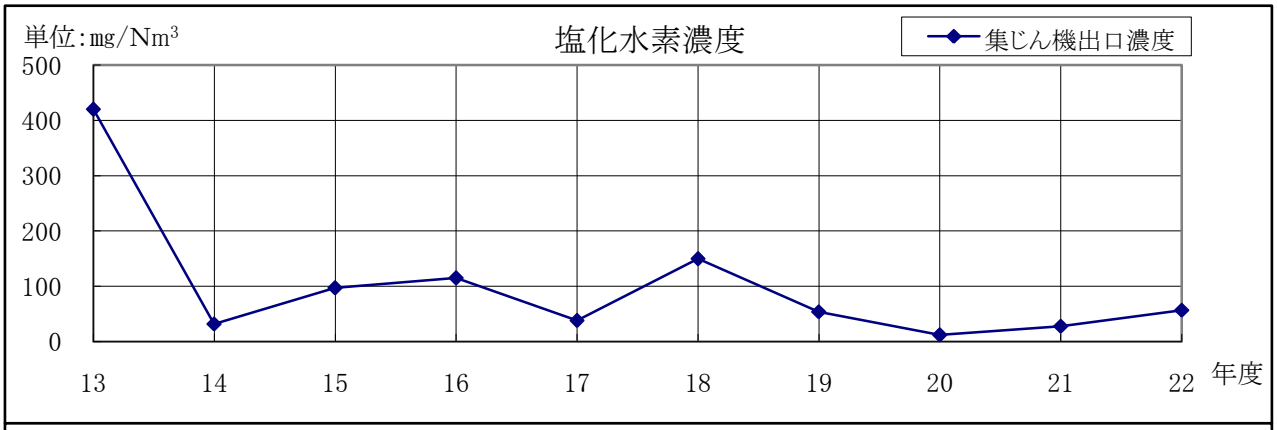

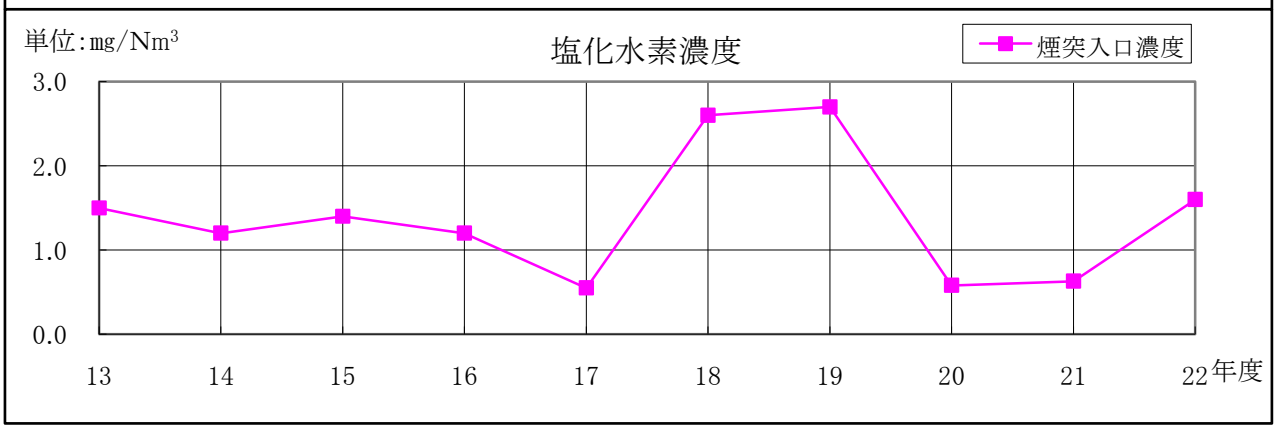

年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
集じん機出口濃度	420	32	97	115	38	150	54	12	28	57
煙突入口濃度	1.5	1.2	1.4	1.2	0.55	2.6	2.7	0.58	0.63	1.6
除去率（％）	99.6	96.3	98.6	99.0	98.6	98.3	95.0	95.2	97.8	97.2

10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん機出口、煙突入口）

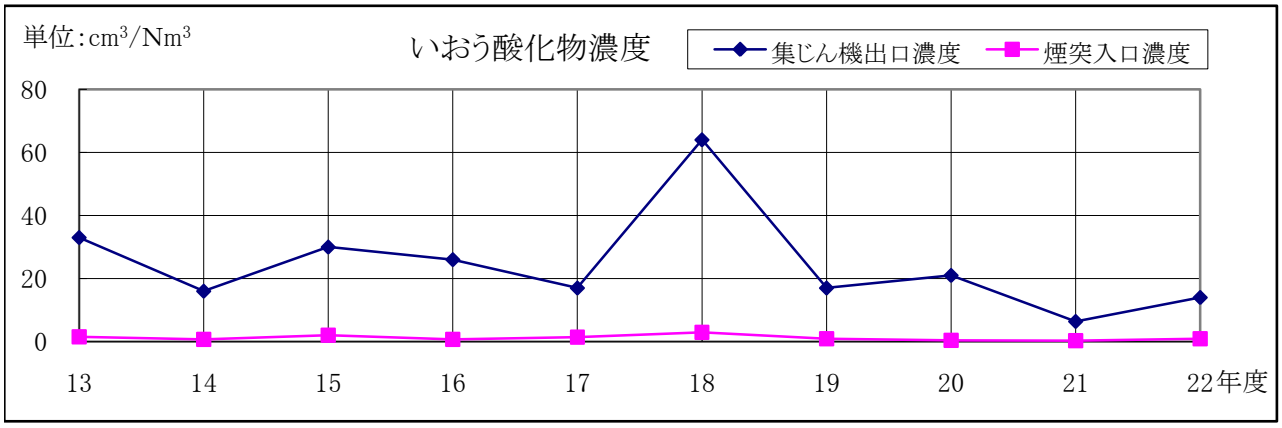

年　　度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
集じん機出口濃度	33	16	30	26	17	64	17	21	6.4	14
煙突入口濃度	1.5	0.66	2.0	0.66	1.4	2.9	0.89	0.36	0.30	0.89
除　去　率	95.5	95.9	93.3	97.5	91.7	95.5	94.8	98.3	95.3	93.6

10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む)

(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく)

		1 号 炉	2 号 炉
測 定 日		9月7日	9月21日
当日分	焼 却 量 t／日	153.46	151.80
	炉出口温度 ℃	961	946
	集じん機入口温度 ℃	190	191
測定時	排ガス温度 ℃	70	66
	湿り排ガス量 Nm³/h	65,300	58,600
	乾き排ガス量 Nm³/h	46,700	44,500
	平均水分量 %	28.1	24.2
	酸素濃度 (4時間平均値) %	10.5	10.7
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	16	16
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.0008	<0.0009
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.065	0.070

		3 号 炉	4 号 炉
測 定 日		9月7日	9月21日
当日分	焼 却 量 t／日	167.04	180.57
	炉出口温度 ℃	912	1051
	集じん機入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	70	67
	湿り排ガス量 Nm³/h	63,800	52,800
	乾き排ガス量 Nm³/h	46,200	41,900
	平均水分量 %	27.6	20.3
	酸素濃度 (4時間平均値) %	10.1	9.2
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	24	9
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	<0.0008	<0.0008
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.043	0.040

● 基準値 (ng-TEQ/Nm³)

	1, 2, 3号炉	4 号 炉
大気汚染防止法 平成10年12月 1日～平成14年11月30日	80	80
〃 平成14年12月 1日～	1	1
ガイドライン恒久対策	1	0.5

10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化 （煙突入口）

基準値:1ng-TEQ/Nm³

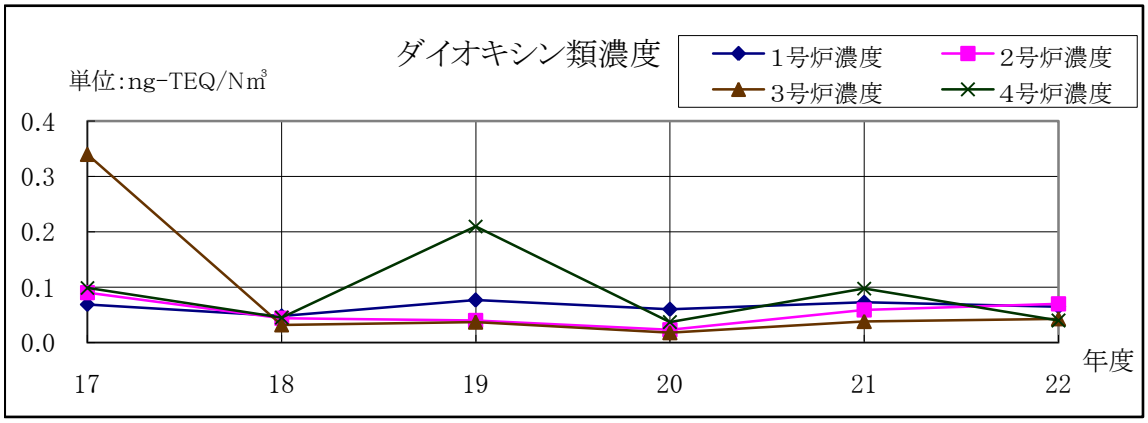

年 度	17	18	19	20	21	22
1 号 炉 濃 度	0.069	0.048	0.077	0.060	0.073	0.065
2 号 炉 濃 度	0.090	0.044	0.040	0.023	0.059	0.070
3 号 炉 濃 度	0.34	0.032	0.037	0.018	0.038	0.043
4 号 炉 濃 度	0.099	0.045	0.21	0.037	0.098	0.040

※毒性等価係数について、平成20年度よりWHO（2006）－TEFを適用

10－8. その他のダイオキシン類測定結果（コプラナーPCB含む）

（ダイオキシン類対策特別措置法に基づく）

①ばいじん及び焼却灰関係

サンプル	測定日	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 ng-TEQ/g	基準値
1 号 炉 焼 却 灰	9月7日	0.0026	3ng-TEQ/g
2 号 炉 焼 却 灰	9月21日	0.00081	
3 号 炉 焼 却 灰	9月7日	0.0016	
4 号 炉 焼 却 灰	9月21日	0.0044	
東 側 バ グ 灰 固 化 物	9月7日	0.93	
西 側 バ グ 灰 固 化 物	9月21日	0.23	
脱 水 ケ ー キ	9月7日	0.15	
ピ ッ ト 残 灰	9月21日	0.069	

②排水関係

サンプル	測定日	浮遊物質量 mg/ℓ	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 pg-TEQ/ℓ	基準値
※下水放流水	9月8日	3.7	0.80	10pg-TEQ/ℓ
西側放流水	9月8日	2.5	0.76	
東側放流水	9月8日	24	0.14	

※下水放流水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時の流量、1系9．5m³/h、2系3．6m³/h、総放流17．7m³/h

10－9. 排水関係測定結果　　（下水道法に基づく）

①原水水質測定結果

●洗灰処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	24.1	27.8	31.5	32.1	36.0	34.8	30.2	25.1	22.9	19.5	20.7	19.6
水素イオン濃度	11.5	11.2	11.0	11.0	11.2	11.3	11.2	11.3	11.6	11.3	11.5	11.4
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	75	60	78	100	94	78	66	66	68	88	76	62
化学的酸素要求量 (〃)	56	64	66	66	66	56	52	56	55	79	71	58
浮遊物質量 (〃)	31	120	110	80	20	17	110	73	69	62	39	64
全蒸発残留物 (〃)	1,300	9,900	8,700	7,600	8,200	6,400	7,300	7,200	7,800	6,600	6,500	6,600
よう素消費量 (〃)	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－
シアン含有量 (〃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛含有量 (〃)	0.07	0.03	0.02	0.4	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	N.D.	0.03	0.03
総水銀含有量 (〃)	0.001	0.0005	0.04	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.0007	N.D.	N.D.
クロム含有量 (〃)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
銅含有量 (〃)	0.2	0.2	0.08	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
亜鉛含有量 (〃)	0.2	N.D.	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	N.D.	N.D.	0.1
鉄含有量 (〃)	0.3	N.D.	0.5	0.6	N.D.	0.2	N.D.	N.D.	0.7	N.D.	0.1	N.D.
ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ふっ素含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素含有量 (〃)	0.78	0.38	0.34	0.31	0.24	0.21	N.D.	N.D.	N.D.	0.24	0.21	N.D.

●洗煙処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温度 (℃)	26.5	38.2	28.3	30.8	35.8	35.0	30.2	22.6	33.6	35.0	29.5	31.3
水素ｲｵﾝ濃度	7.7	7.3	7.7	7.5	8.0	8.1	7.8	7.6	8.3	7.8	7.7	7.5
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	110	11	12	19	22	15	20	17	13	26	64	12
化学的酸素要求量 (〃)	127	33	20	24	31	29	31	35	26	45	39	36
浮遊物質量 (〃)	52	37	50	8.0	4.8	9.6	N.D.	16	8.4	82	91	86
全蒸発残留物 (〃)	1,300	7,100	4,000	4,700	8,200	5,200	5,500	6,400	7,000	6,800	4,300	5,700
よう素消費量 (〃)	−	−	−	−	−	11	−	−	−	−	−	−
シアン含有量 (〃)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛含有量 (〃)	0.09	0.02	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03	0.02	N.D.
総水銀含有量 (〃)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.8	0.4	1.1	0.5	0.9
クロム含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
銅含有量 (〃)	0.04	0.01	0.02	N.D.	N.D.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05
亜鉛含有量 (〃)	0.6	N.D.	0.6	0.2	0.1	0.4	N.D.	0.1	N.D.	0.4	0.4	0.3
鉄含有量 (〃)	2.1	1.5	3.0	0.8	0.5	1.6	0.5	1.1	1.3	11	7.0	5.3
ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 (〃)	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	0.5	0.1	N.D.	0.1	0.1	N.D.	0.1	0.1
ふっ素含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素含有量 (〃)	1.1	1.9	2.1	3.2	4.0	3.2	3.5	1.2	1.4	1.9	1.2	1.3

②放流水水質測定結果

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
温　度　(℃)	23.5	27.1	29.1	31.7	33.8	32.9	27.7	24.1	21.9	22.0	19.6	21.9	45
水素イオン濃度	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5～9
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	64	24	37	44	47	56	35	44	75	91	54	35	600
化学的酸素要求量 (〃)	48	22	31	43	40	30	33	39	50	53	51	33	—
浮遊物質量 (〃)	14	13	13	15	21	11	8.1	12	20	16	11	8.5	600
全蒸発残留物 (〃)	880	4,200	4,900	5,800	3,400	5,800	2,900	5,900	7,300	5,700	5,700	5,800	—
ようそ消費量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	220
シアン含有量 (〃)	−	−	−	−	−	<1	−	−	−	−	−	−	1
カドミウム含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
鉛含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0006	0.001	0.0006	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.005
クロム含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.2	0.2	N.D.	N.D.	N.D.	2
銅含有量 (〃)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	N.D.	3
亜鉛含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2
鉄含有量 (〃)	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	N.D.	0.4	0.4	0.3	0.4	(溶) 10
マンガン含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	(溶) 10
ふっ素含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8
n−ヘキサン抽出物質 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	30
ほう素含有量 (〃)	0.36	0.42	0.42	0.37	0.24	0.46	0.47	0.38	0.47	0.56	0.47	0.41	10

③水素イオン濃度の経月変化

放流水の基準値:5～9

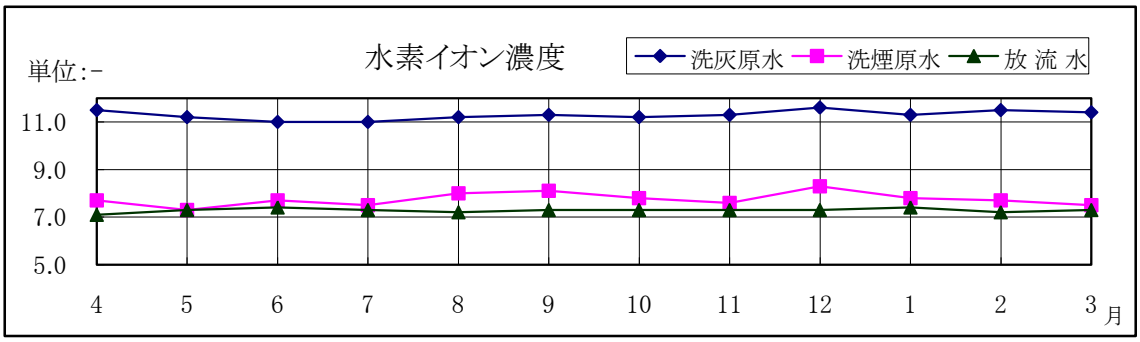

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	11.5	11.2	11.0	11.0	11.2	11.3	11.2	11.3	11.6	11.3	11.5	11.4
洗煙原水	7.7	7.3	7.7	7.5	8.0	8.1	7.8	7.6	8.3	7.8	7.7	7.5
放 流 水	7.1	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3

④水銀濃度の経月変化

放流水の基準値:0.005mg/ℓ

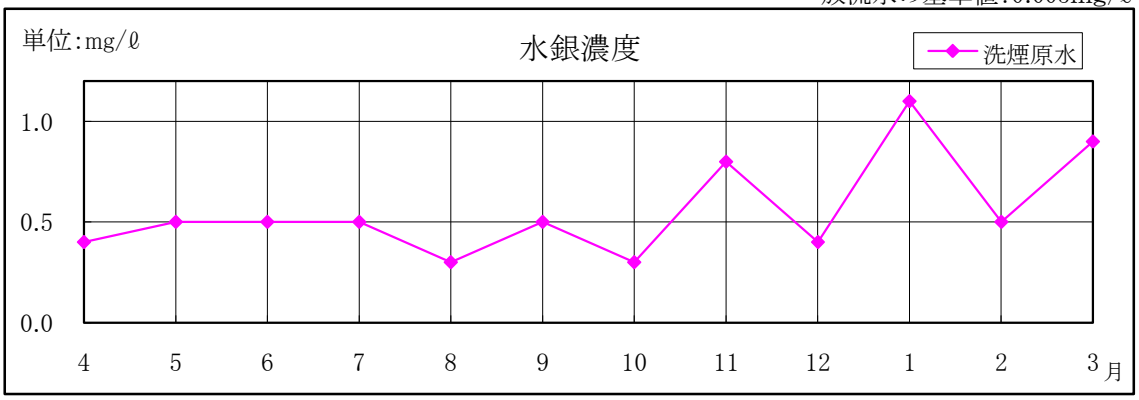

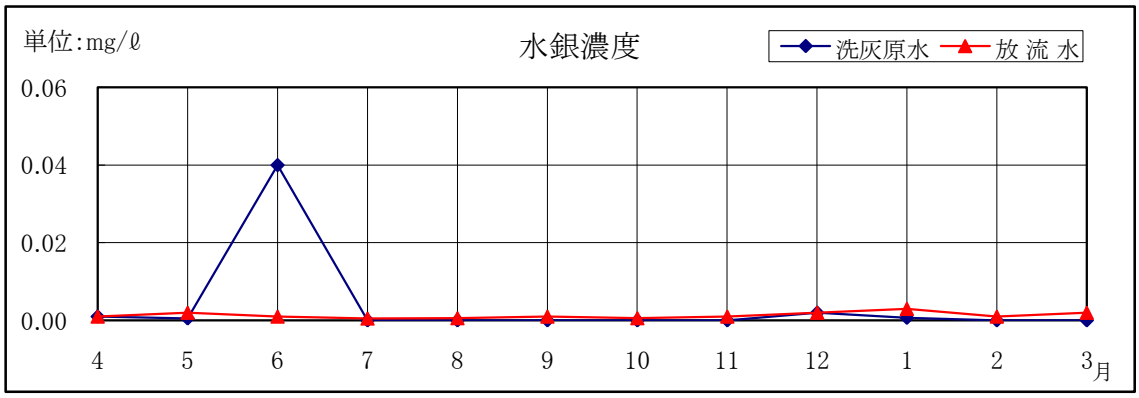

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.001	0.0005	0.04	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.0007	N.D.	N.D.
洗煙原水	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.8	0.4	1.1	0.5	0.9
放 流 水	0.001	0.002	0.001	0.0005	0.0006	0.001	0.0006	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002

⑤鉛濃度の経月変化

放流水の基準値:0.1mg/ℓ

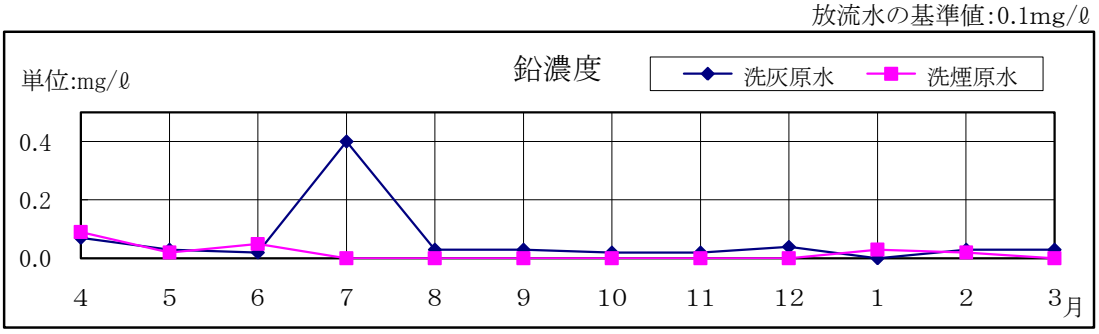

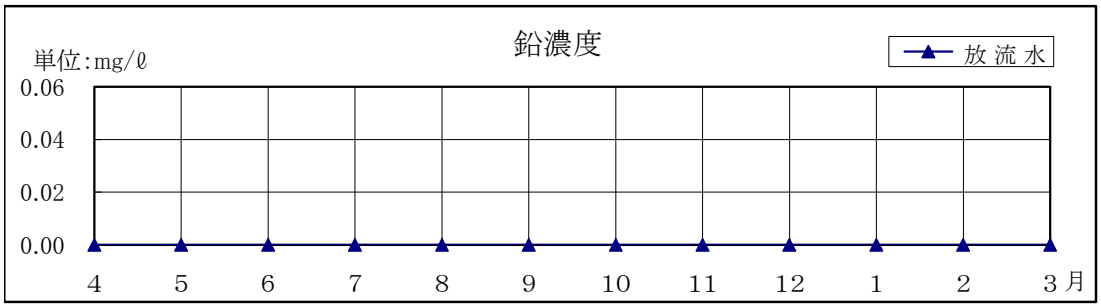

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.07	0.03	0.02	0.4	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	N.D.	0.03	0.03
洗煙原水	0.09	0.02	0.05	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03	0.02	N.D.
放 流 水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

⑥亜鉛濃度の経月変化

放流水の基準値:2mg/ℓ

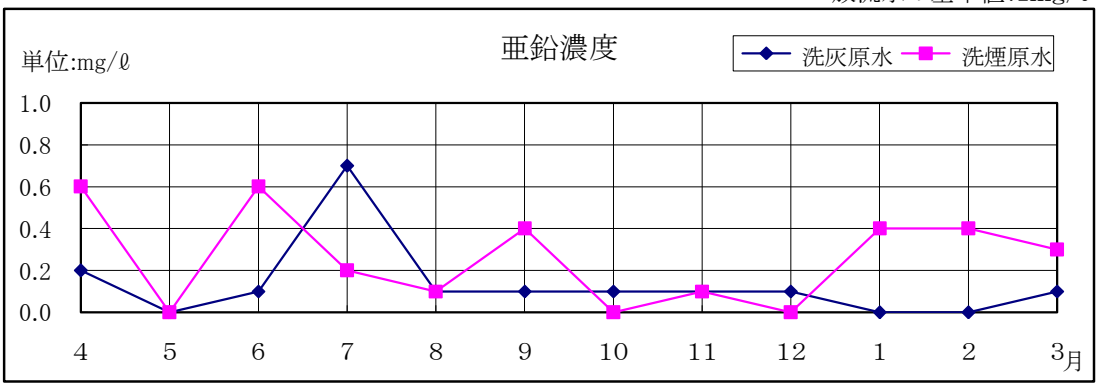

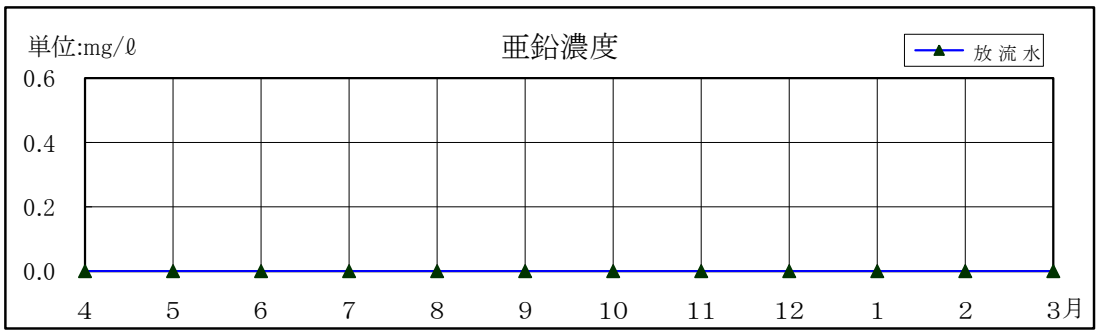

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.2	N.D.	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	N.D.	N.D.	0.1
洗煙原水	0.6	N.D.	0.6	0.2	0.1	0.4	N.D.	0.1	N.D.	0.4	0.4	0.3
放 流 水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

11. 維持管理経費の状況(ごみ焼却施設)

11－1. 処理経費

(単位:円)

区分 ＼ 年度			平成22年度	平成21年度	前年比(%)
	人件費		806,454,421	830,833,947	97.1
	物件費		1,016,308,739	972,182,289	104.5
	内訳	消耗品費	182,251,618	180,890,909	100.8
		光熱水費	107,892,117	116,550,495	92.6
		工事・修繕料	407,328,038	394,891,670	103.1
		残灰処分委託料	190,331,595	193,289,476	98.5
		その他	128,505,371	86,559,739	148.5
合計			1,822,763,160	1,803,016,236	101.1
処理経費	総可燃ごみ搬入量(t)		148,333	151,441	97.9
	トン当り処理経費(円)		12,288	11,906	103.2
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,283	1,276	100.5
	焼却量(t)		164,992	167,729	98.4
	トン当り処理経費(円)		11,048	10,750	102.8
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,154	1,152	100.1
人口(10月1日現在)			585,427	584,409	100.2
市民一人当り負担額			3,114	3,085	100.9

11－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費(円)	可燃ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費(円)	焼却量(t)	焼却量トン当り処理経費(円)
9	2,519,867,176	210,295	11,983	216,634	11,632
10	2,533,845,618	208,417	12,158	219,148	11,562
11	2,334,019,645	207,934	11,225	216,930	10,759
12	2,279,856,950	208,327	10,944	218,101	10,453
13	2,363,998,879	205,876	11,483	215,930	10,948
14	2,312,448,257	202,922	11,396	210,632	10,979
15	2,247,159,678	196,260	11,450	207,472	10,831
16	1,953,146,295	188,328	10,371	204,441	9,554
17	1,925,753,315	182,420	10,557	195,785	9,836
18	2,084,674,962	181,106	11,511	196,246	10,623
19	2,013,723,060	164,927	12,210	180,524	11,155
20	1,932,179,682	158,017	12,228	173,771	11,119
21	1,803,016,236	151,441	11,906	167,729	10,750
22	1,822,763,160	148,333	12,288	164,992	11,048

Ⅲ. 粗大ごみ処理状況

1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績

1－1. 不燃・粗大ごみの搬入量実績(両市合計)

項目 / 月別	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)
4	4,197	1,844.26	174	32.59	4,371	1,876.85
5	4,295	1,845.37	163	27.40	4,458	1,872.77
6	4,304	1,803.46	171	27.30	4,475	1,830.76
7	4,457	1,914.80	160	27.30	4,617	1,942.10
8	4,390	1,874.86	154	29.62	4,544	1,904.48
9	4,390	1,841.20	162	29.60	4,552	1,870.80
10	4,188	1,743.05	158	31.16	4,346	1,774.21
11	4,281	1,779.44	165	29.54	4,446	1,808.98
12	5,043	2,226.01	173	34.67	5,216	2,260.68
1	3,858	1,639.03	145	25.01	4,003	1,664.04
2	3,876	1,543.54	153	22.30	4,029	1,565.84
3	4,874	1,952.42	153	21.42	5,027	1,973.84
計	52,153	22,007.44	1,931	337.91	54,084	22,345.35
月平均	4,346	1,833.95	161	28.16	4,507	1,862.11

1－2. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（豊中市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	3,232	1,238.60	174	32.59	3,406	1,271.19
5	3,319	1,239.82	163	27.40	3,482	1,267.22
6	3,411	1,225.67	171	27.30	3,582	1,252.97
7	3,429	1,276.00	160	27.30	3,589	1,303.30
8	3,407	1,273.08	154	29.62	3,561	1,302.70
9	3,444	1,258.32	162	29.60	3,606	1,287.92
10	3,300	1,167.67	158	31.16	3,458	1,198.83
11	3,369	1,192.28	165	29.54	3,534	1,221.82
12	3,966	1,492.10	173	34.67	4,139	1,526.77
1	2,994	1,105.49	145	25.01	3,139	1,130.50
2	3,037	1,041.18	153	22.30	3,190	1,063.48
3	3,857	1,342.94	153	21.42	4,010	1,364.36
計	40,765	14,853.15	1,931	337.91	42,696	15,191.06
月平均	3,397	1,237.76	161	28.16	3,558	1,265.92

1－3. 不燃・粗大ごみの搬入量実績（伊丹市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		合計	
	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量
月別	（台）	(t)	（台）	(t)	（台）	(t)
4	965	605.66	0	0.00	965	605.66
5	976	605.55	0	0.00	976	605.55
6	893	577.79	0	0.00	893	577.79
7	1,028	638.80	0	0.00	1,028	638.80
8	983	601.78	0	0.00	983	601.78
9	946	582.88	0	0.00	946	582.88
10	888	575.38	0	0.00	888	575.38
11	912	587.16	0	0.00	912	587.16
12	1,077	733.91	0	0.00	1,077	733.91
1	864	533.54	0	0.00	864	533.54
2	839	502.36	0	0.00	839	502.36
3	1,017	609.48	0	0.00	1,017	609.48
計	11,388	7,154.29	0	0	11,388	7,154.29
月平均	949	596.19	0.00	0.00	949	596.19

2. 粗大ごみ処理施設の運転・管理実績

2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績

項目 / 月別	処理実績			回転破砕機稼働時間		処理運転時間（試運転含む）		せん断破砕機稼働時間		稼働日数
	クレーン投入量	直接投入量	計							
	(t)	(t)	(t)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(日)
4	1,639.78	148.46	1,788.24	130	18	87	35	0	0	17
5	1,710.76	173.34	1,884.10	138	1	90	34	0	0	19
6	1,704.33	175.63	1,879.96	137	56	87	9	0	0	19
7	1,723.70	172.42	1,896.12	138	41	85	3	0	0	19
8	1,727.27	178.73	1,906.00	151	21	87	45	0	0	20
9	1,783.47	204.59	1,988.06	147	48	91	8	0	0	20
10	1,672.24	189.15	1,861.39	134	36	79	30	0	0	19
11	1,673.99	146.79	1,820.78	138	20	84	46	0	0	19
12	1,855.95	184.33	2,040.28	144	42	92	23	0	0	19
1	1,668.90	175.58	1,844.48	135	3	84	17	0	0	18
2	1,453.57	197.62	1,651.19	123	23	78	21	0	0	17
3	1,786.81	233.78	2,020.59	144	2	91	8	0	0	20
計	20,400.77	2,180.42	22,581.19	1,664	11	1,039	39	0	0	226
月平均	1,700.06	181.70	1,881.77	138	41	86	38	0	0	19
実日平均	90.27	9.65	99.92	7	21	4	36	0	0	

項目 / 月別	処理選別物搬出量									
	可燃物	台数	不燃物	台数	鉄類	台数	非鉄類	台数	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	台数
	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	1,135.60	447	260.53	59	205.44	73	9.92	18	176.75	56
5	1,200.20	474	283.92	63	219.61	80	11.29	20	169.08	42
6	1,217.30	478	279.52	61	214.98	83	10.54	19	157.62	41
7	1,242.40	486	277.31	58	206.72	76	9.23	20	160.46	40
8	1,239.10	504	291.29	62	216.90	83	7.83	21	150.88	41
9	1,275.00	523	310.47	66	221.45	88	12.22	20	168.92	41
10	1,221.90	480	269.09	58	205.75	83	11.68	20	152.97	39
11	1,155.60	474	266.54	60	215.28	82	10.79	19	172.57	40
12	1,250.00	510	331.14	70	244.85	90	11.01	20	203.28	49
1	1,158.20	480	288.26	59	198.13	82	10.72	19	189.17	47
2	993.00	422	253.24	52	177.33	73	11.50	18	216.12	51
3	1,239.80	499	310.62	70	226.83	83	11.08	20	232.26	56
計	14,328.10	5,777	3,421.93	738	2,553.27	976	127.81	234	2,150.08	543
月平均	1,194.01	481	285.16	62	212.77	81	10.65	20	179.17	45
実日平均	63.40	26	15.14	3	11.30	4	0.57	1	9.51	2
構成比	63.45 %		15.15 %		11.31 %		0.57 %		9.52 %	

2－2. 用水・蒸気使用量実績

項目 / 月別	処理量	工水使用量/下水高度処理水		上水使用量		蒸気使用量	
			トン当り使用量		トン当り使用量		トン当り使用量
	(t)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(t)	(t)
4	1,788.24	114.66	0.06	511.47	0.29	284.19	0.16
5	1,884.10	115.17	0.06	692.89	0.37	330.92	0.18
6	1,879.96	106.95	0.06	929.60	0.49	299.49	0.16
7	1,896.12	98.08	0.05	1,089.64	0.57	272.51	0.14
8	1,906.00	77.04	0.04	1,092.74	0.57	286.37	0.15
9	1,988.06	108.53	0.05	1,024.12	0.52	280.00	0.14
10	1,861.39	82.75	0.04	876.65	0.47	256.76	0.14
11	1,820.78	95.04	0.05	911.54	0.50	262.99	0.14
12	2,040.28	87.72	0.04	876.04	0.43	274.67	0.13
		40.56	0.02				
1	1,844.48	112.47	0.06	941.26	0.51	256.29	0.14
2	1,651.19	126.62	0.08	872.96	0.53	233.55	0.14
3	2,020.59	126.86	0.06	893.86	0.44	273.14	0.14
計	22,581.19	1,292.45		10,712.77		3,310.88	
月平均	1,881.77	107.70		892.73		275.91	
暦日平均	61.87	3.54		29.35		9.07	
実日平均	99.92	5.72		47.40		14.65	

*12月21日に猪名川流域下水道事務所の下水高度処理水への切替
12月工水・下水高度処理水使用量:上段　～12月21日(工水)、下段　12月22日～(下水高度処理水)

3. 不 燃 ・ 粗 大 ご み の 処 理 残 渣 等 の 状 況

3－1. 不燃･粗大ごみの処理残渣の処分実績

項目 / 月別	不燃・粗大ごみの処理残渣処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合　計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	24	191	47	25	218	53	49	409	100	515	79.4
5	19	150	30	38	342	70	57	492	100	572	86.0
6	16	130	34	30	256	66	46	386	100	541	71.3
7	18	150	35	30	274	65	48	424	100	453	93.6
8	17	130	32	30	275	68	47	405	100	456	88.8
9	19	149	33	33	296	67	52	445	100	395	112.7
10	18	142	32	34	304	68	52	446	100	545	81.8
11	20	154	37	29	263	63	49	417	100	424	98.3
12	21	165	38	30	275	63	51	440	100	566	77.7
1	24	178	35	37	337	65	61	515	100	445	115.7
2	22	170	44	25	220	56	47	390	100	417	93.5
3	30	239	50	28	243	50	58	482	100	485	99.4
計	248	1,948	37	369	3,303	63	617	5,251	100	5,814	
月平均	21	162		31	275		51	438		485	91.5

3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績

項目	鉄類			非鉄(アルミ)類			発泡スチロール		
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)
4	24	207.03	92.5	3	10.22	4.6	3	6.68	2.9
5	30	245.94	90.7	5	16.63	6.1	4	8.63	3.2
6	25	214.43	92.4	3	10.87	4.7	3	6.76	2.9
7	25	210.05	92.2	3	10.88	4.8	3	6.77	3.0
8	26	190.06	92.1	3	9.38	4.5	3	7.01	3.4
9	32	253.35	93.0	4	12.25	4.5	3	6.92	2.5
10	26	199.27	91.1	4	12.85	5.9	3	6.63	3.0
11	28	230.69	92.1	4	13.35	5.3	3	6.57	2.6
12	22	228.16	93.2	4	10.07	4.1	3	6.54	2.7
1	21	229.46	91.9	6	13.51	5.4	3	6.65	2.7
2	16	159.66	91.1	5	10.94	6.2	2	4.67	2.7
3	20	229.47	92.0	6	13.04	5.2	3	6.85	2.8
計	295	2,597.57		50	143.99		36	80.68	
月平均	25	216.46	92.0	4	12.00	5.1	3	6.72	2.9

項目	コンプレッサー			合計			前年度	前年比
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	処分量	
月別	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	0	0.00	0.0	30	223.93	100.0	194.76	115.0
5	0	0.00	0.0	39	271.20	100.0	310.97	87.2
6	0	0.00	0.0	31	232.06	100.0	286.79	80.9
7	0	0.00	0.0	31	227.70	100.0	276.74	82.3
8	0	0.00	0.0	32	206.45	100.0	256.50	80.5
9	0	0.00	0.0	39	272.52	100.0	225.59	120.8
10	0	0.00	0.0	33	218.75	100.0	290.62	75.3
11	0	0.00	0.0	35	250.61	100.0	226.51	110.6
12	0	0.00	0.0	29	244.77	100.0	288.69	84.8
1	0	0.00	0.0	30	249.62	100.0	203.04	122.9
2	0	0.00	0.0	23	175.27	100.0	239.59	73.2
3	0	0.00	0.0	29	249.36	100.0	254.57	98.0
計	0	0.00		381	2,822.24		3,054.37	
月平均	0	0.00	0.0	32	235.19		254.53	92.4

3-3. 適正処理困難物処分量実績

項目 / 月別	バッテリー		消火器	塗料・廃液	マットレス	金属・プラスチック類	プロパンボンベ	その他ボンベ	単車類
	(kg)	(個)	(本)	(缶)	(㎥)	(㎥)	(本)	(本)	(台)
4	0	0	0	0	66	13	0	0	0
5	0	0	0	0	44	13	0	0	0
6	0	0	56	0	66	0	0	0	0
7	0	0	0	0	66	26	0	0	0
8	0	0	0	0	66	0	0	0	0
9	830	96	63	25	66	13	0	0	32
10	0	0	0	0	44	13	0	0	0
11	0	0	0	0	66	13	0	0	0
12	0	0	0	0	66	13	0	0	0
1	820	84	0	0	44	13	0	0	0
2	0	0	0	0	44	13	0	0	0
3	0	0	50	27	66	13	0	0	18
計	1,650	180	169	52	704	143	0	0	50
月平均	138	15	14	4	59	12	0	0	4

4. 維持管理経費の状況(粗大ごみ処理施設)

4－1. 処理経費

(単位:円)

区分 ＼ 年度			平成22年度	平成21年度	前年比(%)
	人件費		93,318,088	89,508,079	104.3
	物件費		333,839,050	325,190,313	102.7
	内訳	消耗品費	20,909,198	19,968,904	104.7
		光熱水費	22,069,681	20,427,035	108.0
		工事・修繕料	118,175,010	102,966,981	114.8
		不燃物等処分委託料	47,794,362	52,493,458	91.0
		その他	124,890,799	129,333,935	96.6
合計			427,157,138	414,698,392	103.0
処理経費	不燃・粗大ごみ搬入量(t) ※1		27,735	27,218	101.9
	トン当り処理経費(円)		15,401	15,236	101.1
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,723	1,929	89.4
	粗大ごみ処理施設処理量(t)		22,581	22,536	100.2
	トン当り処理経費(円)		18,917	18,402	102.8
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		2,117	2,329	90.9
人口(10月1日現在)			585,427	584,409	100.2
市民一人当り負担額			730	710	102.8

※1 不燃・粗大ごみ搬入量はガラス、ペット、その他プラ、家電四品目(換算値)の搬入量を含んでいます。

4－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費(円)	不燃・粗大ごみ搬入量(t)	搬入量トン当り処理経費(円)	粗大ごみ処理施設処理量(t)	処理量トン当り処理経費(円)
9	560,474,566	30,855	18,165	28,355	19,766
10	544,109,885	30,595	17,784	27,123	20,061
11	535,890,773	30,421	17,616	26,948	19,886
12	458,261,024	32,266	14,202	28,291	16,198
13	455,689,752	30,439	14,971	26,898	16,941
14	489,680,208	30,075	16,282	26,248	18,656
15	487,731,850	30,578	15,950	25,197	19,357
16	444,934,966	30,288	14,690	23,543	18,899
17	455,316,866	29,788	15,285	24,126	18,872
18	443,243,380	29,707	14,920	24,876	17,818
19	478,003,595	27,136	17,615	22,348	21,389
20	474,523,965	26,857	17,669	22,547	21,046
21	414,698,392	27,218	15,236	22,536	18,402
22	427,157,138	27,735	15,401	22,581	18,917

※平成9年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はガラス・ペットの搬入量を含んでいます。
※平成13年度以降の不燃・粗大ごみ搬入量はその他プラ、家電四品目(換算値)の搬入量を含んでいます。

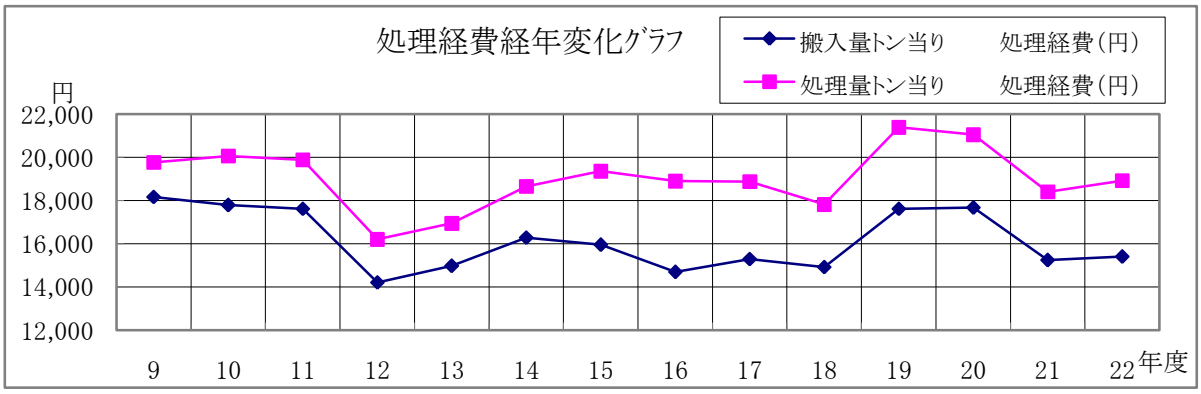

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 容器包装搬入・搬出・再商品化実績

1－1. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出量実績

項目	搬入量 (t)								
	豊中市			伊丹市			両市合計		
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ
4	135.16	21.98	59.55	92.58	27.50	92.99	227.74	49.48	152.54
5	135.24	24.77	58.23	96.45	31.96	95.88	231.69	56.73	154.11
6	126.00	26.77	59.62	103.58	36.21	102.56	229.58	62.98	162.18
7	142.38	33.80	56.95	106.03	42.86	99.27	248.41	76.66	156.22
8	137.07	39.04	52.44	108.92	49.96	92.35	245.99	89.00	144.79
9	136.02	38.59	53.76	103.83	49.76	98.24	239.85	88.35	152.00
10	133.35	28.56	51.25	92.28	35.54	90.12	225.63	64.10	141.37
11	118.16	23.18	52.71	95.65	28.01	95.35	213.81	51.19	148.06
12	152.10	22.00	59.61	112.50	28.66	104.00	264.60	50.66	163.61
1	149.99	18.24	55.91	108.88	24.26	96.13	258.87	42.50	152.04
2	124.69	16.26	49.59	88.90	22.89	91.57	213.59	39.15	141.16
3	117.11	19.73	55.30	100.25	26.90	107.59	217.36	46.63	162.89
計	1,607.27	312.92	664.92	1,209.85	404.51	1,166.05	2,817.12	717.43	1,830.97
月平均	133.94	26.08	55.41	100.82	33.71	97.17	234.76	59.79	152.58

項目	搬出量 (t)						
	ガラスびん			ペットボトル		その他プラスチック	
月別	再商品化	残渣	計	再商品化	残渣	再商品化	残渣
4	180.64	20.27	200.91	40.05	1.62	153.27	11.04
5	194.11	21.73	215.84	52.30	1.61	156.46	11.81
6	178.47	19.97	198.44	59.04	1.56	157.47	11.70
7	203.65	22.82	226.47	71.58	1.70	167.93	12.61
8	196.85	22.11	218.96	74.71	1.31	146.98	12.70
9	201.07	22.53	223.60	74.15	1.51	146.17	11.81
10	183.17	20.55	203.72	68.17	1.54	146.19	10.64
11	173.87	19.52	193.39	48.58	1.77	138.98	10.69
12	209.38	23.53	232.91	37.04	1.62	171.29	11.29
1	215.82	24.21	240.03	46.60	1.24	148.19	10.87
2	177.46	19.93	197.39	31.63	1.39	136.65	8.12
3	171.80	19.30	191.10	49.17	1.66	166.19	10.21
計	2,286.29	256.47	2,542.76	653.02	18.53	1,835.77	133.49
月平均	190.52	21.37	211.90	54.42	1.54	152.98	11.12

1－2. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）搬入・搬出台数実績

項目	搬入台数(台)									搬出台数(台)		
	豊中市			伊丹市			両市合計			ガラスびん	ペットボトル	その他プラスチック
月別	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ	ガラスびん	ペット	その他プラ			
4	263	140	115	82	74	177	345	214	292	26	7	48
5	244	146	112	88	84	197	332	230	309	29	9	53
6	232	156	125	90	90	215	322	246	340	25	10	62
7	249	170	115	92	99	210	341	269	325	35	12	54
8	237	174	114	91	113	213	328	287	327	44	13	52
9	236	170	122	92	120	214	328	290	336	36	13	60
10	248	159	116	84	85	205	332	244	321	28	12	52
11	233	144	110	87	85	213	320	229	323	37	9	51
12	252	146	117	99	90	220	351	236	337	44	7	65
1	237	130	111	92	74	192	329	204	303	36	9	47
2	231	124	105	80	68	193	311	192	298	40	6	51
3	228	143	121	92	82	225	320	225	346	36	9	63
計	2,890	1,802	1,383	1,069	1,064	2,474	3,959	2,866	3,857	416	116	658
月平均	241	150	115	89	89	206	330	239	321	35	10	55

1－3. 容器包装（ガラスびん・ペットボトル・その他プラスチック）再商品化実績

項目 / 月別	容器包装の種類					
	無色ガラスびん	茶色ガラスびん	その他ガラスびん	ガラスびん合計	ペットボトル	その他プラスチック
	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4	68.15	50.03	62.46	180.64	40.05	153.27
5	73.20	53.82	67.09	194.11	52.30	156.46
6	67.32	49.50	61.65	178.47	59.04	157.47
7	76.82	56.43	70.40	203.65	71.58	167.93
8	74.21	54.53	68.11	196.85	74.71	146.98
9	75.86	55.71	69.50	201.07	74.15	146.17
10	69.06	50.75	63.36	183.17	68.17	146.19
11	65.51	48.20	60.16	173.87	48.58	138.98
12	78.96	57.97	72.45	209.38	37.04	171.29
1	81.38	59.81	74.63	215.82	46.60	148.19
2	66.86	49.17	61.43	177.46	31.63	136.65
3	64.77	47.59	59.44	171.80	49.17	166.19
計	862.10	633.51	790.68	2,286.29	653.02	1,835.77
月平均	71.84	52.79	65.89	190.52	54.42	152.98
色別混入率(%)	37.71%	27.71%	34.58%	100%		

2. 家電四品目搬入・搬出実績

2－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器)搬入実績（両市合計）

両市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	2	8	20	2	3	1	1	11	26	37	1.35	0
5	0	0	13	22	3	4	0	3	16	29	45	1.63	0
6	2	0	13	33	2	5	1	3	18	41	59	2.09	0
7	0	0	20	32	4	8	1	4	25	44	69	2.55	0
8	0	0	16	55	4	7	2	0	22	62	84	2.96	0
9	0	0	10	26	5	2	0	0	15	28	43	1.57	0
10	0	0	8	14	1	3	1	1	10	18	28	1.00	0
11	1	0	6	15	2	4	0	2	9	21	30	1.16	0
12	0	1	12	23	1	6	6	0	19	30	49	1.77	0
1	0	0	11	23	1	0	1	1	13	24	37	1.15	0
2	1	0	12	19	2	4	0	1	15	24	39	1.43	0
3	0	0	6	10	2	3	2	3	10	16	26	0.98	0
合計	4	3	135	292	29	49	15	19	183	363	546	19.64	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

両市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	1	1	4	2	1	3	1	6	7	13	0.53
5	0	0	1	1	0	2	0	2	1	5	6	0.26
6	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	3	0.13
7	0	0	0	2	0	1	1	1	1	4	5	0.19
8	0	1	2	6	1	3	2	0	5	10	15	0.63
9	0	0	2	2	1	1	2	0	5	3	8	0.32
10	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	3	0.13
11	0	0	3	2	1	0	0	3	4	5	9	0.31
12	0	1	2	5	3	1	1	1	6	8	14	0.60
1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	4	0.16
2	0	1	3	4	1	3	1	3	5	11	16	0.66
3	0	1	0	0	1	2	3	0	4	3	7	0.35
合計	0	5	15	30	10	17	14	12	39	64	103	4.27

両市　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	3	9	24	4	4	4	2	17	33	50	1.88	0
5	0	0	14	23	3	6	0	5	17	34	51	1.89	0
6	2	0	14	33	2	6	2	3	20	42	62	2.22	0
7	0	0	20	34	4	9	2	5	26	48	74	2.74	0
8	0	1	18	61	5	10	4	0	27	72	99	3.59	0
9	0	0	12	28	6	3	2	0	20	31	51	1.89	0
10	0	0	8	15	1	4	1	2	10	21	31	1.13	0
11	1	0	9	17	3	4	0	5	13	26	39	1.47	0
12	0	2	14	28	4	7	7	1	25	38	63	2.37	0
1	0	0	11	26	1	1	1	1	13	28	41	1.31	0
2	1	1	15	23	3	7	1	4	20	35	55	2.09	0
3	0	1	6	10	3	5	5	3	14	19	33	1.33	0
合計	4	8	150	322	39	66	29	31	222	427	649	23.91	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器)搬入実績（豊中市分）

豊中市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	2	7	11	1	1	1	0	9	14	23	0.81	0
5	0	0	8	10	3	2	0	3	11	15	26	0.98	0
6	2	0	10	27	2	5	1	3	15	35	50	1.82	0
7	0	0	14	21	2	4	1	4	17	29	46	1.62	0
8	0	0	10	32	3	0	2	0	15	32	47	1.53	0
9	0	0	8	15	3	2	0	0	11	17	28	1.04	0
10	0	0	6	13	1	3	1	1	8	17	25	0.91	0
11	1	0	4	7	2	3	0	1	7	11	18	0.76	0
12	0	0	7	9	1	2	3	0	11	11	22	0.78	0
1	0	0	8	20	1	0	1	1	10	21	31	0.97	0
2	0	0	6	13	1	3	0	0	7	16	23	0.85	0
3	0	0	6	10	1	2	2	2	9	14	23	0.81	0
合計	3	2	94	188	21	27	12	15	130	232	362	12.88	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

豊中市　リサイクル券搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)
4	0	1	1	2	0	1	1	0	2	4	6	0.24
5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	3	0.13
6	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	3	0.13
7	0	0	0	2	0	1	1	1	1	4	5	0.19
8	0	1	2	6	1	3	2	0	5	10	15	0.63
9	0	0	2	2	1	1	2	0	5	3	8	0.32
10	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	3	0.13
11	0	0	3	2	1	0	0	3	4	5	9	0.31
12	0	1	2	5	3	1	1	1	6	8	14	0.60
1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	4	0.16
2	0	1	3	4	1	3	1	3	5	11	16	0.66
3	0	1	0	0	1	2	3	0	4	3	7	0.35
合計	0	5	15	27	8	16	12	10	35	58	93	3.85

豊中市搬入分　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値　(0.05t/台)		換算値　(0.03t/台)		換算値(0.07t／台)		換算値　(0.03t/台)		合　　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(t)	(台)
4	0	3	8	13	1	2	2	0	11	18	29	1.05	0
5	0	0	9	10	3	3	0	4	12	17	29	1.11	0
6	2	0	11	27	2	6	2	3	17	36	53	1.95	0
7	0	0	14	23	2	5	2	5	18	33	51	1.81	0
8	0	1	12	38	4	3	4	0	20	42	62	2.16	0
9	0	0	10	17	4	3	2	0	16	20	36	1.36	0
10	0	0	6	14	1	4	1	2	8	20	28	1.04	0
11	1	0	7	9	3	3	0	4	11	16	27	1.07	0
12	0	1	9	14	4	3	4	1	17	19	36	1.38	0
1	0	0	8	23	1	1	1	1	10	25	35	1.13	0
2	0	1	9	17	2	6	1	3	12	27	39	1.51	0
3	0	1	6	10	2	4	5	2	13	17	30	1.16	0
合計	3	7	109	215	29	43	24	25	165	290	455	16.73	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－3. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器）搬入実績（伊丹市分）

伊丹市　不法投棄搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	A不法投棄	B不法投棄	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	1	9	1	2	0	1	2	12	14	0.54	0
5	0	0	5	12	0	2	0	0	5	14	19	0.65	0
6	0	0	3	6	0	0	0	0	3	6	9	0.27	0
7	0	0	6	11	2	4	0	0	8	15	23	0.93	0
8	0	0	6	23	1	7	0	0	7	30	37	1.43	0
9	0	0	2	11	2	0	0	0	4	11	15	0.53	0
10	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	3	0.09	0
11	0	0	2	8	0	1	0	1	2	10	12	0.40	0
12	0	1	5	14	0	4	3	0	8	19	27	0.99	0
1	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	6	0.18	0
2	1	0	6	6	1	1	0	1	8	8	16	0.58	0
3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	0.17	0
合計	1	1	41	104	8	22	3	4	53	131	184	6.76	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

伊丹市　リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		リサイクル券有り		総搬入	搬入
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量
	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	A 市収集	B 市収集	合計	
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)
4	0	0	0	2	2	0	2	1	4	3	7	0.29
5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	3	0.13
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	3	2	1	2	2	4	6	10	0.42

伊丹市　不法投棄搬入分+リサイクル券有り搬入分

	エアコン		テ　レ　ビ		冷蔵庫・冷凍庫		洗濯機・衣類乾燥機		不法投棄＋券有り		総搬入	搬入	粗大施設
	換算値（0.05t/台）		換算値（0.03t/台）		換算値(0.07t／台)		換算値（0.03t/台）		合　計		台数	総重量	処理台数
	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	A 合計	B 合計	合計		
月	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	（台）	(t)	（台）
4	0	0	1	11	3	2	2	2	6	15	21	0.83	0
5	0	0	5	13	0	3	0	1	5	17	22	0.78	0
6	0	0	3	6	0	0	0	0	3	6	9	0.27	0
7	0	0	6	11	2	4	0	0	8	15	23	0.93	0
8	0	0	6	23	1	7	0	0	7	30	37	1.43	0
9	0	0	2	11	2	0	0	0	4	11	15	0.53	0
10	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	3	0.09	0
11	0	0	2	8	0	1	0	1	2	10	12	0.40	0
12	0	1	5	14	0	4	3	0	8	19	27	0.99	0
1	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	6	0.18	0
2	1	0	6	6	1	1	0	1	8	8	16	0.58	0
3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	0.17	0
合計	1	1	41	107	10	23	5	6	57	137	194	7.18	0

注）粗大施設処理台数とはリサイクル不可能品でごみとして搬入。

2－4. 家電四品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥器)搬出実績

家電リサイクル品Aグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	10	18	1	8	2	2	3	1	4	1	2	0	16	21	6	9	52	1.88
6	0	2	0	0	0	12	0	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	18	0	7	25	0.91
7	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	11	0	1	12	0.44
8	0	0	0	0	0	14	0	9	0	3	0	2	0	0	0	0	0	17	0	11	28	1.04
9	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	3	9	0.35
10	0	0	0	0	0	5	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	9	0	3	12	0.52
11	0	0	0	0	7	10	0	2	3	1	0	1	6	1	0	0	16	12	0	3	31	1.13
12	0	1	0	0	0	6	0	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	11	0	4	15	0.59
1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	8	0	6	14	0.42
2	0	0	0	0	0	7	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	3	12	0.40
3	0	0	0	1	6	9	0	6	5	2	0	1	5	1	0	0	16	12	0	8	36	1.42
合計	0	3	0	1	23	99	1	47	10	21	3	7	15	11	2	3	48	134	6	58	246	9.10

家電リサイクル品Bグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	0	0	4	19	3	18	4	2	0	4	5	2	1	2	14	26	4	24	68	2.52
6	0	0	0	0	0	31	0	18	0	3	0	2	0	1	0	0	0	35	0	20	55	1.85
7	0	0	0	0	0	14	0	4	0	6	0	0	0	4	0	0	0	24	0	4	28	1.08
8	0	0	0	0	0	24	0	17	0	1	0	7	0	3	0	0	0	28	0	24	52	1.88
9	0	0	0	0	0	14	0	13	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	0	17	31	1.09
10	0	0	0	0	0	15	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	11	28	0.92
11	1	0	0	0	12	18	0	3	7	3	1	0	2	1	1	0	22	22	2	3	49	1.93
12	0	0	0	0	0	8	0	10	0	4	0	1	0	1	0	1	0	13	0	12	25	0.95
1	0	0	0	1	0	10	0	10	0	1	0	4	0	0	0	0	0	11	0	15	26	1.00
2	0	0	0	0	0	20	0	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	22	0	6	28	0.92
3	3	0	0	0	13	12	0	4	7	3	0	0	7	0	0	1	30	15	0	5	50	1.96
合計	5	3	0	1	29	185	3	113	18	26	1	23	14	13	2	4	66	227	6	141	440	16.1

家電リサイクル品　A+Bグループ搬出実績

	エアコン 換算値(0.05t/台)				テレビ 換算値(0.03t/台)				冷蔵庫・冷凍庫 換算値(0.07t/台)				洗濯機・衣類乾燥機 換算値(0.03t/台)				搬出総台数(台)					搬出総重量
	豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		豊中市		伊丹市		両市	
	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	市収集	不法投棄	合計	(t)
月	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	1	3	0	0	14	37	4	26	6	4	3	5	9	3	3	2	30	47	10	33	120	4.40
6	0	2	0	0	0	43	0	25	0	6	0	2	0	2	0	0	0	53	0	27	80	2.76
7	0	0	0	0	0	22	0	5	0	8	0	0	0	5	0	0	0	35	0	5	40	1.52
8	0	0	0	0	0	38	0	26	0	4	0	9	0	3	0	0	0	45	0	35	80	2.92
9	0	0	0	0	0	18	0	15	0	1	0	5	0	1	0	0	0	20	0	20	40	1.44
10	0	0	0	0	0	20	0	13	0	5	0	1	0	1	0	0	0	26	0	14	40	1.44
11	1	0	0	0	19	28	0	5	10	4	1	1	8	2	1	0	38	34	2	6	80	3.06
12	0	1	0	0	0	14	0	14	0	7	0	1	0	2	0	1	0	24	0	16	40	1.54
1	0	0	0	1	0	16	0	13	0	1	0	4	0	2	0	3	0	19	0	21	40	1.42
2	0	0	0	0	0	27	0	8	0	2	0	1	0	2	0	0	0	31	0	9	40	1.32
3	3	0	0	1	19	21	0	10	12	5	0	1	12	1	0	1	46	27	0	13	86	3.38
合計	5	6	0	2	52	284	4	160	28	47	4	30	29	24	4	7	114	361	12	199	686	25.20

3. その他のリサイクル等の状況

3－1. 逆送電力量経年変化

項目 / 年度	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引メータ A (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	発電量 DCS B (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	計 A＋B＝C (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)	（売電）取引メータ D (kwh)	暦日平均1時間当り電力量 (kwh)
8	361,513	41	41,856,006	4,778	42,217,519	4,819	18,580,353	2,121
9	409,925	47	42,281,716	4,827	42,691,641	4,873	18,380,734	2,098
10	496,744	57	42,571,772	4,860	43,068,516	4,916	17,506,450	1,998
11	323,664	37	43,120,481	4,909	43,444,145	4,946	17,589,645	2,002
12	487,752	56	43,406,606	4,955	43,894,358	5,011	17,593,062	2,008
13	686,469	78	44,004,813	5,023	44,691,282	5,102	15,685,688	1,791
14	900,856	103	43,473,907	4,963	44,374,763	5,066	14,760,644	1,685
15	784,492	89	42,625,080	4,853	43,409,572	4,942	12,714,266	1,447
16	597,960	68	42,369,054	4,837	42,967,014	4,905	14,180,628	1,619
17	619,240	71	41,533,755	4,741	42,152,995	4,812	13,785,531	1,574
18	729,890	83	41,194,963	4,703	41,924,853	4,786	13,610,873	1,554
19	621,150	71	38,402,326	4,384	39,023,476	4,455	11,781,284	1,345
20	949,300	108	36,223,331	4,135	37,172,631	4,243	10,769,322	1,229
21	853,676	97	34,704,171	3,962	35,557,847	4,059	9,871,809	1,127
22	832,226	95	36,077,302	4,118	36,909,528	4,213	11,461,191	1,308

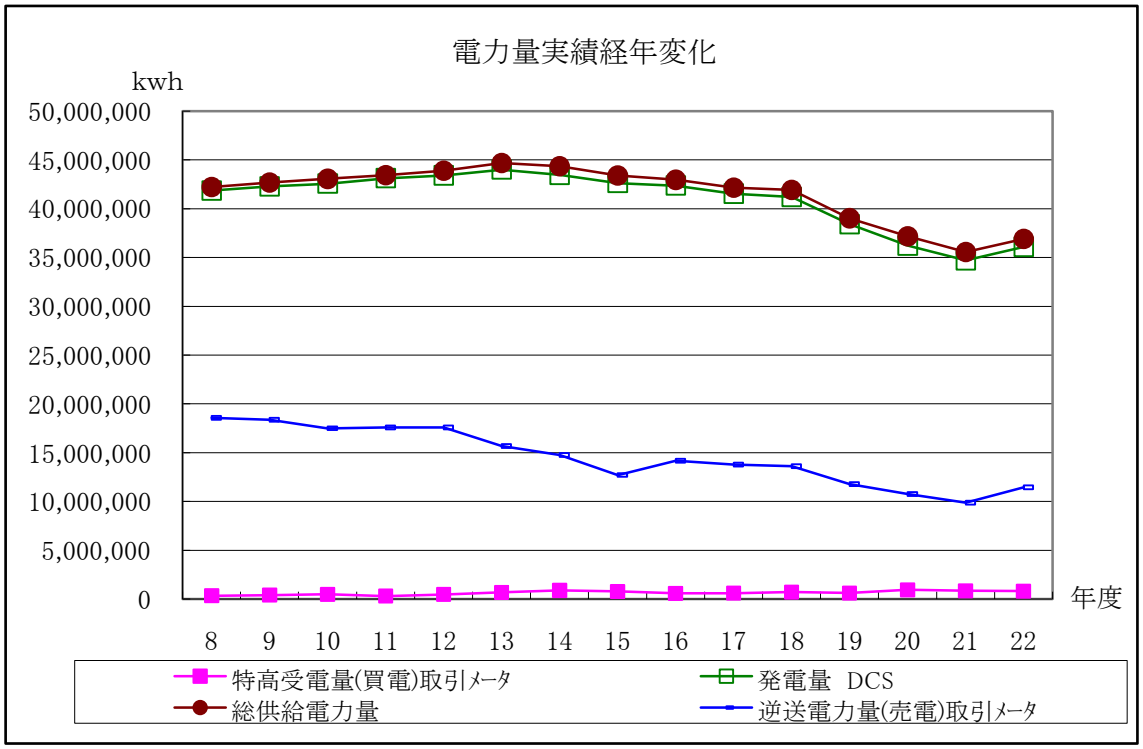

３－２.搬入廃木材等の薪によるリサイクル実績

区分 月別	申込件数(件)	薪ﾘｻｲｸﾙ量(kg)
4	0	0
5	2	80
6	8	320
7	3	130
8	3	150
9	1	100
10	3	130
11	6	250
12	5	200
1	0	0
2	1	30
3	0	0
計	32	1,390
月 平 均	3	116

３－３. 古紙類の資源化実績

区分 月別	新聞(kg)	雑誌(kg)	ダンボール(kg)	合計(kg)	前年度合計(kg)	前年比(%)
4	630	4,910	4,330	9,870	10,120	97.5
5	560	7,150	4,000	11,710	9,350	125.2
6	570	4,090	3,740	8,400	6,730	124.8
7	520	3,050	2,710	6,280	9,950	63.1
8	540	4,230	3,190	7,960	6,820	116.7
9	360	5,390	3,120	8,870	9,250	95.9
10	520	3,260	2,770	6,550	4,960	132.1
11	540	4,300	3,230	8,070	6,540	123.4
12	1030	6,350	4,640	12,020	10,600	113.4
1	190	2,490	2,170	4,850	5,890	82.3
2	480	2,450	2,410	5,340	7,940	67.3
3	510	6,640	5,090	12,240	15,380	79.6
計	6,450	54,310	41,400	102,160	103,530	98.7
月 平 均	538	4,526	3,450	8,513	8,628	

Ⅴ. 予算・決算

1．予算･決算の状況

1－1．共通経費勘定の予算･決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	568,386,000	568,386,000	100.0	0
豊中市負担金	331,909,000	331,909,000	100.0	0
伊丹市負担金	236,477,000	236,477,000	100.0	0
使用料及び手数料	74,114,000	68,255,180	92.1	△ 5,858,820
余熱利用施設使用料	72,154,000	66,334,520	91.9	△ 5,819,480
総務管理使用料	1,960,000	1,920,660	98.0	△ 39,340
繰越金	5,000,000	18,572,826	371.5	13,572,826
諸収入	6,245,000	8,513,545	136.3	2,268,545
組合預金利子	100,000	78,578	78.6	△ 21,422
雑入	6,145,000	8,434,967	137.3	2,289,967
歳入合計	653,745,000	663,727,551	101.5	9,982,551

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
議会費	2,097,000	1,358,336	64.8	738,664
議会費	2,097,000	1,358,336	64.8	738,664
議会費	2,097,000	1,358,336	64.8	738,664
報酬	1,053,000	1,010,000	95.9	43,000
職員手当等	288,000	271,350	94.2	16,650
旅費	641,500	0	0.0	641,500
交際費	30,000	0	0.0	30,000
需用費	7,514	0	0.0	7,514
役務費	3,486	3,486	100.0	0
使用料及び賃借料	73,500	73,500	100.0	0
総務費	331,116,000	302,772,482	91.4	28,343,518
総務管理費	164,056,000	138,051,214	84.1	26,004,786
一般管理費	138,695,020	112,690,234	81.3	26,004,786
報酬	1,375,000	900,000	65.5	475,000
給料	57,418,020	48,642,616	84.7	8,775,404
職員手当等	46,652,000	34,900,122	74.8	11,751,878
共済費	21,367,000	17,106,951	80.1	4,260,049
賃金	3,209,910	3,209,910	100.0	0
旅費	285,000	13,230	4.6	271,770
交際費	50,000	0	0.0	50,000
需用費	466,000	424,414	91.1	41,586
役務費	1,650,000	1,414,244	85.7	235,756
委託料	1,882,039	1,747,724	92.9	134,315
使用料及び賃借料	4,269,660	4,269,660	100.0	0
備品購入費	20,000	10,972	54.9	9,028
負担金補助及び交付金	50,391	50,391	100.0	0
総務管理退職負担金	25,360,980	25,360,980	100.0	0
負担金補助及び交付金	25,360,980	25,360,980	100.0	0
監査委員費	26,000	25,000	96.2	1,000
公平委員会費	39,000	33,000	84.6	6,000

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
余熱利用施設費	166,995,000	164,663,268	98.6	2,331,732
管理費	166,995,000	164,663,268	98.6	2,331,732
報酬	2,386,400	2,386,400	100.0	0
給料	8,222,720	8,222,720	100.0	0
職員手当等	3,666,524	3,107,120	84.7	559,404
共済費	2,023,356	2,023,356	100.0	0
賃金	0	0	－	0
旅費	0	0	－	0
需用費	43,745,447	42,087,763	96.2	1,657,684
役務費	1,400,240	1,319,161	94.2	81,079
委託料	103,038,313	103,038,313	100.0	0
使用料及び賃借料	2,496,000	2,462,435	98.7	33,565
工事請負費	0	0	－	0
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	16,000	16,000	100.0	0
公債費	320,432,000	320,430,998	99.9	1,002
公債費	320,432,000	320,430,998	99.9	1,002
元金	307,603,000	307,602,595	99.9	405
利子	12,829,000	12,828,403	99.9	597
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	653,745,000	624,561,816	95.5	29,183,184

［歳入歳出差引額　　39,165,735 円］

１－２. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	2,268,029,000	2,268,029,000	100.0	0
豊中市負担金	1,520,146,000	1,520,146,000	100.0	0
伊丹市負担金	747,883,000	747,883,000	100.0	0
使用料及び手数料	419,644,000	419,072,280	99.9	△ 571,720
国庫支出金	10,383,000	10,833,000	104.3	450,000
府県支出金	21,334,000	21,105,272	98.9	△ 228,728
財産収入	82,102,000	118,469,338	144.3	36,367,338
繰越金	122,585,000	248,260,985	202.5	125,675,985
諸収入	99,753,000	146,149,975	146.5	46,396,975
売電収入	82,966,000	108,446,018	130.7	25,480,018
雑入	16,787,000	37,703,957	224.6	20,916,957
組合債	187,200,000	187,200,000	100.0	0
歳入合計	3,211,030,000	3,419,119,850	106.5	208,089,850

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	2,939,092,000	2,774,262,896	94.4	164,829,104
ごみ処理施設費	2,478,342,000	2,347,105,758	94.7	131,236,242
管理費	1,906,012,000	1,822,763,160	95.6	83,248,840
報酬	16,708,784	16,708,784	100.0	0
給料	379,839,216	361,956,579	95.3	17,882,637
職員手当等	327,355,000	298,952,539	91.3	28,402,461
共済費	134,858,000	128,836,519	95.5	6,021,481
賃金	19,402,778	19,402,778	100.0	0
報償費	229,000	226,000	98.7	3,000
旅費	724,000	335,830	46.4	388,170
需用費	315,701,313	310,462,901	98.3	5,238,412
消耗品費	184,082,722	182,251,618	99.0	1,831,104
燃料費	4,834,853	4,834,853	100.0	0
食糧費	68,000	37,800	55.6	30,200
印刷製本費	237,000	236,775	99.9	225
光熱水費	111,269,000	107,892,117	97.0	3,376,883
修繕料	15,209,738	15,209,738	100.0	0
役務費	10,516,938	9,491,424	90.2	1,025,514
委託料	234,621,595	230,401,805	98.2	4,219,790
灰最終処分委託料	133,082,250	133,082,250	100.0	0
灰搬送委託料	57,249,345	57,249,345	100.0	0
その他	44,290,000	40,070,210	90.5	4,219,790
使用料及び賃借料	15,998,000	14,924,042	93.3	1,073,958
工事請負費	411,000,000	392,118,300	95.4	18,881,700
原材料費	150,000	84,283	56.2	65,717
備品購入費	517,314	517,314	100.0	0
負担金補助及び交付金	38,204,062	38,204,062	100.0	0
補償補填及び賠償金	0	0	－	0
公課費	186,000	140,000	75.3	46,000
ごみ処理施設退職負担金	249,629,000	216,810,437	86.9	32,818,563
負担金補助及び交付金	249,629,000	216,810,437	86.9	32,818,563
ごみ処理整備費	17,353,000	5,954,000	34.3	11,399,000
負担金補助及び交付金	17,353,000	5,954,000	34.3	11,399,000
新ごみ処理施設整備費	305,348,000	301,578,161	98.8	3,769,839
職員手当等	0	0	－	0
報償費	265,171	220,800	83.3	44,371
旅費	366,420	366,420	100.0	0
需用費	198,000	126,210	63.7	71,790
役務費	30,000	14,000	46.7	16,000
委託料	54,134,000	50,516,322	93.3	3,617,678
使用料及び賃借料	627,409	627,409	100.0	0
工事請負費	249,707,000	249,707,000	100.0	0
備品購入費	20,000	0	0.0	20,000
負担金補助及び交付金	0	0	－	0

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
粗大ごみ処理施設費	460,750,000	427,157,138	92.7	33,592,862
管理費	455,750,000	427,157,138	93.7	28,592,862
報酬	15,989,791	15,989,791	100.0	0
給料	36,576,436	35,686,524	97.6	889,912
職員手当等	27,597,223	27,597,223	100.0	0
共済費	14,044,550	14,044,550	100.0	0
賃金	0	0	－	0
旅費	55,000	5,460	9.9	49,540
需用費	66,483,000	57,631,056	86.7	8,851,944
消耗品費	25,295,000	20,909,198	82.7	4,385,802
燃料費	586,000	496,467	84.7	89,533
食糧費	0	0	－	0
印刷製本費	0	0	－	0
光熱水費	23,966,000	22,069,681	92.1	1,896,319
修繕料	16,636,000	14,155,710	85.1	2,480,290
役務費	2,863,000	2,523,516	88.1	339,484
委託料	178,355,000	165,692,694	92.9	12,662,306
不燃物処分委託料	6,000,000	5,238,660	87.3	761,340
不燃物最終処分委託料	33,700,000	27,567,750	81.8	6,132,250
不燃物搬送委託料	18,036,000	14,987,952	83.1	3,048,048
諸委託料	116,594,000	114,485,570	98.2	2,108,430
その他	4,025,000	3,412,762	84.8	612,238
使用料及び賃借料	333,000	311,319	93.5	21,681
工事請負費	107,000,000	104,019,300	97.2	2,980,700
原材料費	100,000	60,847	60.8	39,153
備品購入費	10,000	0	0.0	10,000
負担金補助及び交付金	6,217,000	3,494,858	56.2	2,722,142
公課費	126,000	100,000	79.4	26,000
粗大ごみ処理施設退職負担金	5,000,000	0	0.0	5,000,000
負担金補助及び交付金	5,000,000	0	0.0	5,000,000
公債費	271,838,000	271,744,957	99.9	93,043
公債費	271,838,000	271,744,957	99.9	93,043
元金	261,237,762	261,237,762	100.0	0
利子	10,600,238	10,507,195	99.1	93,043
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	3,211,030,000	3,046,007,853	94.9	165,022,147

［歳入歳出差引額　373,111,997円］

1－3. リサイクル施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	233,063,000	233,063,000	100.0	0
豊中市負担金	171,684,000	171,684,000	100.0	0
伊丹市負担金	61,379,000	61,379,000	100.0	0
国庫支出金	922,590,000	953,343,000	103.3	30,753,000
繰越金	1,000	4,445,490	444549.0	4,444,490
諸収入	1,000	0	0.0	△ 1,000
組合債	1,694,700,000	1,675,500,000	98.9	△ 19,200,000
歳入合計	2,850,355,000	2,866,351,490	100.6	15,996,490

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	2,845,681,000	2,843,477,321	99.9	2,203,679
リサイクル施設費	2,845,681,000	2,843,477,321	99.9	2,203,679
リサイクル施設整備費	2,845,681,000	2,843,477,321	99.9	2,203,679
報酬	0	0	－	0
給料	9,042,000	9,037,728	99.9	4,272
職員手当等	7,726,000	6,856,116	88.7	869,884
共済費	3,192,000	3,153,557	98.8	38,443
旅費	128,000	85,920	67.1	42,080
需用費	0	0	－	0
役務費	0	0	－	0
委託料	15,300,000	14,051,000	91.8	1,249,000
使用料及び賃借料	0	0	－	0
工事請負費	2,810,293,000	2,810,293,000	100.0	0
公債費	4,574,000	4,286,324	93.7	287,676
公債費	4,574,000	4,286,324	93.7	287,676
元金	3,647,428	3,647,428	100.0	0
利子	926,572	638,896	69.0	287,676
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	2,850,355,000	2,847,763,645	99.9	2,591,355

［歳入歳出差引額　　18,587,845円］

2. 歳入歳出決算の状況

2－1. 共通経費勘定

［歳入］

項目＼年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	568,386,000	587,383,000	96.8	△ 18,997,000
豊中市負担金	331,909,000	343,002,000	96.8	△ 11,093,000
伊丹市負担金	236,477,000	244,381,000	96.8	△ 7,904,000
使用料及び手数料	68,255,180	74,211,660	92.0	△ 5,956,480
余熱利用施設使用料	66,334,520	72,251,100	91.8	△ 5,916,580
総務管理使用料	1,920,660	1,960,560	98.0	△ 39,900
繰越金	18,572,826	15,558,293	119.4	3,014,533
諸収入	8,513,545	7,163,893	118.8	1,349,652
組合預金利子	78,578	93,079	84.4	△ 14,501
雑入	8,434,967	7,070,814	119.3	1,364,153
歳入合計	663,727,551	684,316,846	97.0	△ 20,589,295

［歳出］

項目＼年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
議会費	1,358,336	1,334,436	101.8	23,900
議会費	1,358,336	1,334,436	101.8	23,900
議会費	1,358,336	1,334,436	101.8	23,900
報酬	1,010,000	1,038,000	97.3	△ 28,000
職員手当等	271,350	282,450	96.1	△ 11,100
旅費	0	0	－	0
交際費	0	10,500	皆減	△ 10,500
役務費	3,486	3,486	100.0	0
使用料及び賃借料	73,500	0	皆増	73,500
総務費	302,772,482	338,713,461	89.4	△ 35,940,979
総務管理費	138,051,214	172,821,163	79.9	△ 34,769,949
一般管理費	112,690,234	149,556,785	75.3	△ 36,866,551
報酬	900,000	992,000	90.7	△ 92,000
給料	48,642,616	61,025,271	79.7	△ 12,382,655
職員手当等	34,900,122	46,764,739	74.6	△ 11,864,617
共済費	17,106,951	20,440,285	83.7	△ 3,333,334
賃金	3,209,910	1,426,000	225.1	1,783,910
旅費	13,230	45,990	28.8	△ 32,760
交際費	0	0	－	0
需用費	424,414	371,482	114.2	52,932
役務費	1,414,244	1,580,315	89.5	△ 166,071
委託料	1,747,724	12,241,372	14.3	△ 10,493,648
使用料及び賃借料	4,269,660	4,155,964	102.7	113,696
備品購入費	10,972	0	皆増	10,972
負担金補助及び交付金	50,391	513,367	9.8	△ 462,976

項目 ＼ 年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
総務管理退職負担金	25,360,980	23,264,378	109.0	2,096,602
負担金補助及び交付金	25,360,980	23,264,378	109.0	2,096,602
監査委員費	25,000	24,000	104.2	1,000
公平委員会費	33,000	36,000	91.7	△ 3,000
余熱利用施設費	164,663,268	165,832,298	99.3	△ 1,169,030
管理費	164,663,268	165,832,298	99.3	△ 1,169,030
報酬	2,386,400	0	皆増	2,386,400
給料	8,222,720	10,294,400	79.9	△ 2,071,680
職員手当等	3,107,120	3,840,212	80.9	△ 733,092
共済費	2,023,356	2,019,144	100.2	4,212
賃金	0	0	－	0
旅費	0	0	－	0
需用費	42,087,763	45,441,794	92.6	△ 3,354,031
役務費	1,319,161	1,474,592	89.5	△ 155,431
委託料	103,038,313	100,385,611	102.6	2,652,702
使用料及び賃借料	2,462,435	2,313,095	106.5	149,340
工事請負費	0	0	－	0
備品購入費	0	51,450	皆減	△ 51,450
負担金補助及び交付金	16,000	12,000	133.3	4,000
公債費	320,430,998	325,696,123	98.4	△ 5,265,125
公債費	320,430,998	325,696,123	98.4	△ 5,265,125
元金	307,602,595	307,540,992	100.0	61,603
償還金利子及び割引料	307,602,595	307,540,992	100.0	61,603
利子	12,828,403	18,155,131	70.7	△ 5,326,728
償還金利子及び割引料	12,828,403	18,155,131	70.7	△ 5,326,728
歳出合計	624,561,816	665,744,020	93.8	△ 41,182,204

２－2.ごみ処理施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成22年度決算額（円）	平成21年度決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	2,268,029,000	2,549,601,000	89.0	△ 281,572,000
豊中市負担金	1,520,146,000	1,706,958,000	89.1	△ 186,812,000
伊丹市負担金	747,883,000	842,643,000	88.8	△ 94,760,000
使用料及び手数料	419,072,280	426,802,872	98.2	△ 7,730,592
国庫支出金	10,833,000	8,642,000	125.4	2,191,000
府県支出金	21,105,272	13,788,871	153.1	7,316,401
財産収入	118,469,338	64,910,337	182.5	53,559,001
繰越金	248,260,985	146,556,433	169.4	101,704,552
諸収入	146,149,975	90,973,696	160.7	55,176,279
売電収入	108,446,018	81,341,633	133.3	27,104,385
雑入	37,703,957	9,632,063	391.4	28,071,894
組合債	187,200,000	19,200,000	975.0	168,000,000
歳入合計	3,419,119,850	3,320,475,209	103.0	98,644,641

[歳出]

項目＼年度	平成22年度決算額（円）	平成21年度決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	2,774,262,896	2,389,698,437	116.1	384,564,459
ごみ処理施設費	2,347,105,758	1,975,000,045	118.8	372,105,713
管理費	1,822,763,160	1,803,016,236	101.1	19,746,924
報酬	16,708,784	16,068,730	104.0	640,054
給料	361,956,579	373,292,495	97.0	△ 11,335,916
職員手当等	298,952,539	314,791,136	95.0	△ 15,838,597
共済費	128,836,519	126,681,586	101.7	2,154,933
賃金	19,402,778	14,220,563	136.4	5,182,215
報償費	226,000	129,510	174.5	96,490
旅費	335,830	533,610	62.9	△ 197,780
需用費	310,462,901	314,909,877	98.6	△ 4,446,976
消耗品費	182,251,618	180,890,909	100.8	1,360,709
燃料費	4,834,853	3,536,940	136.7	1,297,913
食糧費	37,800	38,499	98.2	△ 699
印刷製本費	236,775	215,204	110.0	21,571
光熱水費	107,892,117	116,550,495	92.6	△ 8,658,378
修繕料	15,209,738	13,677,830	111.2	1,531,908
役務費	9,491,424	8,752,941	108.4	738,483

項目 ＼ 年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
委託料	230,401,805	236,560,737	97.4	△ 6,158,932
灰最終処分委託料	133,082,250	135,082,500	98.5	△ 2,000,250
灰搬送委託料	57,249,345	58,206,976	98.4	△ 957,631
その他	40,070,210	43,271,261	92.6	△ 3,201,051
使用料及び賃借料	14,924,042	12,529,598	119.1	2,394,444
工事請負費	392,118,300	381,213,840	102.9	10,904,460
原材料費	84,283	44,268	190.4	40,015
備品購入費	517,314	580,125	89.2	△ 62,811
負担金補助及び交付金	38,204,062	2,436,590	1,567.9	35,767,472
補償補填及び賠償金	0	67,830	皆減	△ 67,830
公課費	140,000	202,800	69.0	△ 62,800
ごみ処理施設退職負担金	216,810,437	65,732,986	329.8	151,077,451
負担金補助及び交付金	216,810,437	65,732,986	329.8	151,077,451
ごみ処理整備費	5,954,000	21,479,000	27.7	△ 15,525,000
負担金補助及び交付金	5,954,000	21,479,000	27.7	△ 15,525,000
新ごみ処理施設整備費	301,578,161	84,771,823	355.8	216,806,338
職員手当等	0	0	－	0
報償費	220,800	926,600	23.8	△ 705,800
旅費	366,420	488,410	75.0	△ 121,990
需用費	126,210	414,584	30.4	△ 288,374
役務費	14,000	27,220	51.4	△ 13,220
委託料	50,516,322	38,547,441	131.0	11,968,881
使用料及び賃借料	627,409	702,268	89.3	△ 74,859
工事請負費	249,707,000	43,665,300	571.9	206,041,700
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0

項目＼年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
粗大ごみ処理施設費	427,157,138	414,698,392	103.0	12,458,746
管理費	427,157,138	414,698,392	103.0	12,458,746
報酬	15,989,791	12,949,397	123.5	3,040,394
給料	35,686,524	35,762,316	99.8	△ 75,792
職員手当等	27,597,223	27,718,064	99.6	△ 120,841
共済費	14,044,550	13,078,302	107.4	966,248
賃金	0	2,194,437	皆減	△ 2,194,437
旅費	5,460	13,260	41.2	△ 7,800
需用費	57,631,056	55,605,772	103.6	2,025,284
消耗品費	20,909,198	19,968,904	104.7	940,294
燃料費	496,467	642,352	77.3	△ 145,885
印刷製本費	0	0	－	0
光熱水費	22,069,681	20,427,035	108.0	1,642,646
修繕料	14,155,710	14,567,481	97.2	△ 411,771
役務費	2,523,516	2,562,608	98.5	△ 39,092
委託料	165,692,694	170,010,968	97.5	△ 4,318,274
不燃物処分委託料	5,238,660	5,446,906	96.2	△ 208,246
不燃物最終処分委託料	27,567,750	30,523,500	90.3	△ 2,955,750
不燃物搬送委託料	14,987,952	16,523,052	90.7	△ 1,535,100
諸委託料	114,485,570	113,969,350	100.5	516,220
その他	3,412,762	3,548,160	96.2	△ 135,398
使用料及び賃借料	311,319	321,819	96.7	△ 10,500
工事請負費	104,019,300	88,399,500	117.7	15,619,800
原材料費	60,847	97,156	62.6	△ 36,309
備品購入費	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	3,494,858	5,820,993	60.0	△ 2,326,135
公課費	100,000	163,800	61.1	△ 63,800
粗大ごみ処理施設退職金	0	0	－	0
負担金補助及び交付金	0	0	－	0
公債費	271,744,957	682,515,787	39.8	△ 410,770,830
公債費	271,744,957	682,515,787	39.8	△ 410,770,830
元金	261,237,762	657,008,654	39.8	△ 395,770,892
償還金利子及び割引料	261,237,762	657,008,654	39.8	△ 395,770,892
利子	10,507,195	25,507,133	41.2	△ 14,999,938
償還金利子及び割引料	10,507,195	25,507,133	41.2	△ 14,999,938
歳出合計	3,046,007,853	3,072,214,224	99.1	△ 26,206,371

2－3. リサイクル施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	233,063,000	31,046,000	750.7	202,017,000
豊中市負担金	171,684,000	22,870,000	750.7	148,814,000
伊丹市負担金	61,379,000	8,176,000	750.7	53,203,000
国庫支出金	953,343,000	33,500,000	2,845.8	919,843,000
繰越金	4,445,490	0	皆増	4,445,490
諸収入	0	0	－	0
組合債	1,675,500,000	60,000,000	2,792.5	1,615,500,000
歳入合計	2,866,351,490	124,546,000	2,301.4	2,741,805,490

[歳出]

項目＼年度	平成22年度 決算額（円）	平成21年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	2,843,477,321	120,100,510	2367.6	2,723,376,811
リサイクル施設費	2,843,477,321	120,100,510	2367.6	2,723,376,811
リサイクル施設整備費	2,843,477,321	120,100,510	2367.6	2,723,376,811
報酬	0	0	－	0
給料	9,037,728	9,010,204	100.3	27,524
職員手当等	6,856,116	7,584,593	90.4	△ 728,477
共済費	3,153,557	3,005,713	104.9	147,844
旅費	85,920	0	皆増	85,920
需用費	0	0	－	0
役務費	0	0	－	0
委託料	14,051,000	500,000	2810.2	13,551,000
使用料及び賃借料	0	0	－	0
工事請負費	2,810,293,000	100,000,000	2810.3	2,710,293,000
公債費	4,286,324	0	皆増	4,286,324
公債費	4,286,324	0	皆増	4,286,324
元金	3,647,428	0	皆増	3,647,428
償還金利子及び割引料	3,647,428	0	皆増	3,647,428
利子	638,896	0	皆増	638,896
償還金利子及び割引料	638,896	0	皆増	638,896
予備費	0	0	－	0
歳出合計	2,847,763,645	120,100,510	2371.2	2,727,663,135

VI. その他

1. 啓発活動の状況

1－1. 施設見学者実績

区分 / 月別	小・中学校		自治会・市民等		他市等		その他		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	6	350	0	0	0	0	0	0	6	350
5	24	1,581	0	0	0	0	0	0	24	1,581
6	27	1,833	0	0	0	0	0	0	27	1,833
7	19	1,233	1	1	2	21	1	70	23	1,325
8	0	0	8	136	0	0	5	164	13	300
9	4	171	3	38	0	0	0	0	7	209
10	10	552	1	54	0	0	1	74	12	680
11	3	15	4	73	0	0	0	0	7	88
12	0	0	6	104	0	0	0	0	6	104
1	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30
2	0	0	2	47	0	0	1	26	3	73
3	0	0	3	53	0	0	0	0	3	53
計	93	5,735	28	506	2	21	9	364	132	6,626
月平均	8	478	2	42	0	2	1	30	11	552

※「自治会・市民等」は、老人クラブ・婦人会・PTA・個人見学者等、「その他」は、両市議会議員・職員・両市内の企業等の見学者。小学校の見学の下見は含まない。

1－2. 体験学習受入れの実績

実施日	団体名	日数	人数	内容	備考
5月17日～21日	伊丹市立北中学校	5	5	○保全業務作業 ○ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾔｰﾄﾞ作業 ○粗大業務 ○ｸﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ作業 ○薪割り作業 ○小学校社会見学対応 ○出前講座補助	トライやるウイーク
7月6日～8日	豊中市立第十六中学校	3	2		CUL地域体験
9月7日～9日	豊中市立第一中学校	3	2		CUL地域体験
9月7日～9日	豊中市立第十五中学校	3	4		CUL地域体験
10月19日～21日	豊中市立第四中学校	3	6		CUL地域体験
10月26日～28日	豊中市立第三中学校	3	3		CUL地域体験
10月26日～28日	豊中市立第六中学校	3	3		CUL地域体験
11月2日～5日	豊中市立第十七中学校	3	5		CUL地域体験
11月9日～11日	豊中市立第二中学校	3	4		CUL地域体験
11月16日～18日	豊中市立第十中学校	3	3		CUL地域体験
11月16日～18日	豊中市立第十二中学校	3	3		CUL地域体験
計 11 校	延べ日数 35 日			人数計 40 人	

1－3. 出前講座の実績

実　施　日	事業名 テーマ	市域	対象	人 数	主　　催
6月5日	粗大ごみ処理施設及び(仮称)リサイクルセンターでのごみ処理について	豊中	電機連合大阪地協	15	クリーンランド業務管理課
6月25日	クリーンランドのごみ処理について	豊中	上野婦人会	19	クリーンランド業務管理課
10月15日	クリーンランドのごみ処理について	伊丹	市立神津小学校PTA	20	クリーンランド業務管理課
11月5日	クリーンランドのごみ処理と3Rについて	豊中	市立第四中学校	20	クリーンランド業務管理課
2月9日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	私立ゆたか保育園	35	クリーンランド業務管理課
2月10日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	私立あけぼのぽんぽこ保育園	138	クリーンランド業務管理課
2月18日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	市立東豊中保育所	90	クリーンランド業務管理課
2月21日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	市立原田保育所	30	クリーンランド業務管理課
2月22日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	私立蛍池文化幼稚園	142	クリーンランド業務管理課
2月23日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	私立のばたけ保育園	162	クリーンランド業務管理課
2月25日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	市立野田保育所	60	クリーンランド業務管理課
3月1日	みんなで分けよう資源ごみ	伊丹	市立稲野幼稚園	75	クリーンランド業務管理課
3月2日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	市立旭丘保育所	80	クリーンランド業務管理課
3月7日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	私立あけぼの保育園	41	クリーンランド業務管理課
3月11日	みんなで分けよう資源ごみ	豊中	市立豊南保育所	70	クリーンランド業務管理課
計	15 件			997　人	

1－4. イベント等の実績

実　施　日	事業名 目的	内容	人 数	主　　催
8月7日	豊中まつり2010 市民との協働イベントをとおして、持続可能な地域社会づくりをめざす。	ごみ分別輪投げ チラシ配布 パネル展示	来店者 720人	豊中まつり実行委員会
9月19･20日	伊丹市シルバーフェスティバル クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	チラシ配布 パネル展示		伊丹市シルバーフェスティバル実行委員会
10月16日	第5回とよっぴーまつり 市民との協働をとおして、「クリーンランドのPR」を推進する。	ごみ分別輪投げ	来店者 270人	NPO花と緑のネットワーク
10月24日	第5回クリーンランドフェスティバル 「3Rの実践～ごみを減らして環境にやさしく～」をテーマにクリーンランドから3R推進を発信する。	ごみ分別輪投げ、パネル展示、施設見学会、ガレージセール、エコカー試乗会	来場者 920人	クリーンランドフェスティバル実行委員会
12月10日･11日	とよなか市民環境展2010 クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	リユースコーナー パネル展示	申込者 41人	NPOとよなか市民環境会議アジェンダ21

1－5. 搬入ごみ検査状況

検査日	検査結果	処置
6月24日 9月13日～17日 12月9日 12月14日 3月9日	検査対象を両市許可業者の全社とすることを目標に9回／年の実施を行いました。搬入物の内容では、可燃物中に資源化物の混入や産業廃棄物の混入が見受けられました。	鉄類やプラスチック類の産業廃棄物は、持ち帰らせ適正な処理をするよう指導をしました。排出先の特定ができた不適正搬入物においては、両市を通じて指導・啓発へとつなげています。

2.余熱利用施設（クリーンスポーツランド）利用者の状況

2－1. 施設利用者実績

	大人					小人				高齢者			
	一回使用	回数券	定期券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計	一回使用	回数券	団体扱	計
4	1,290	237	2,140	0	3,667	691	20	0	711	192	717	0	909
5	2,476	364	2,908	0	5,748	1,254	241	0	1,495	265	969	0	1,234
6	2,669	344	3,081	0	6,094	1,243	301	0	1,544	308	1,138	0	1,446
7	3,418	438	2,975	0	6,831	2,395	313	0	2,708	433	1,069	0	1,502
8	5,112	598	2,667	49	8,426	3,580	310	0	3,890	641	1,011	0	1,652
9	2,582	403	2,502	0	5,487	1,022	263	0	1,285	286	992	0	1,278
10	1,976	311	2,619	0	4,906	548	277	0	825	268	1,022	0	1,290
11	1,544	269	2,530	0	4,343	428	245	0	673	227	956	0	1,183
12	1,257	237	2,209	0	3,703	385	130	0	515	177	772	0	949
1	1,550	289	2,076	0	3,915	435	179	0	614	178	823	0	1,001
2	1,741	282	2,354	0	4,377	592	100	0	692	176	976	0	1,152
3	1,779	294	2,738	0	4,811	621	158	0	779	197	964	0	1,161
計	27,394	4,066	30,799	49	62,308	13,194	2,537	0	15,731	3,348	11,409	0	14,757

	障害者大人			障害者小人			幼児	介助者	合計
	一回使用	回数券	計	一回使用	回数券	計			
4	73	104	177	32	4	36	467	175	6,142
5	90	145	235	44	0	44	909	223	9,888
6	112	153	265	46	0	46	1,148	253	10,796
7	121	163	284	62	0	62	1,361	286	13,034
8	150	139	289	94	0	94	2,478	312	17,141
9	101	119	220	48	0	48	1,274	252	9,844
10	107	143	250	45	0	45	966	251	8,533
11	62	125	187	35	0	35	792	191	7,404
12	51	96	147	25	0	25	618	164	6,121
1	49	108	157	22	0	22	742	153	6,604
2	56	130	186	18	1	19	756	169	7,351
3	55	133	188	24	2	26	876	183	8,024
計	1,027	1,558	2,585	495	7	502	12,387	2,612	110,882

2－2. 年間の利用者の割合

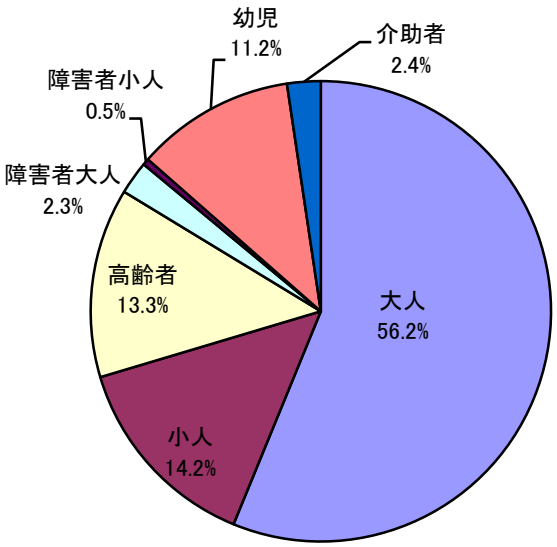

2－3. 施設利用状況の経年変化

	大人		小人		高齢者		障害者大人		障害者小人		幼児		介助者		合計	
		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数		指数
10	87,524	100.0	16,145	100.0	5,716	100.0	1,122	100.0	196	100.0	10,873	100.0	659	100.0	122,235	100.0
11	107,470	122.8	15,624	96.8	8,726	152.7	1,903	169.6	261	133.2	11,212	103.1	1,083	164.3	146,279	119.7
12	100,149	114.4	13,657	84.6	10,275	179.8	1,802	160.6	170	86.7	10,141	93.3	1,114	169.0	137,308	112.3
13	96,297	110.0	14,227	88.1	10,194	178.3	1,729	154.1	170	86.7	10,310	94.8	1,118	169.7	134,045	109.7
14	95,243	108.8	15,101	93.5	11,206	196.0	2,370	211.2	149	76.0	11,907	109.5	1,462	221.9	137,438	112.4
15	94,700	108.2	16,350	101.3	12,395	216.8	2,815	250.9	341	174.0	11,769	108.2	2,065	313.4	140,435	114.9
16	91,233	104.2	14,726	91.2	11,235	196.6	2,934	261.5	433	220.9	10,203	93.8	2,341	355.2	133,105	108.9
17	84,270	96.3	14,228	88.1	11,325	198.1	2,939	261.9	643	328.1	8,501	78.2	2,719	412.6	124,625	102.0
18	81,394	93.0	13,760	85.2	13,587	237.7	2,921	260.3	621	316.8	8,182	75.3	2,805	425.6	123,270	100.8
19	76,085	86.9	14,587	90.3	13,588	237.7	2,826	251.9	630	321.4	9,939	91.4	2,807	425.9	120,462	98.5
20	71,697	81.9	15,589	96.6	14,511	253.9	2,694	240.1	491	250.5	10,755	98.9	2,566	389.4	118,303	96.8
21	68,698	78.5	15,470	95.8	14,593	255.3	2,537	226.1	457	233.2	11,320	104.1	2,378	360.8	115,453	94.5
22	62,308	71.2	15,731	97.4	14,757	258.2	2,585	230.4	502	256.1	12,387	113.9	2,612	396.4	110,882	90.7

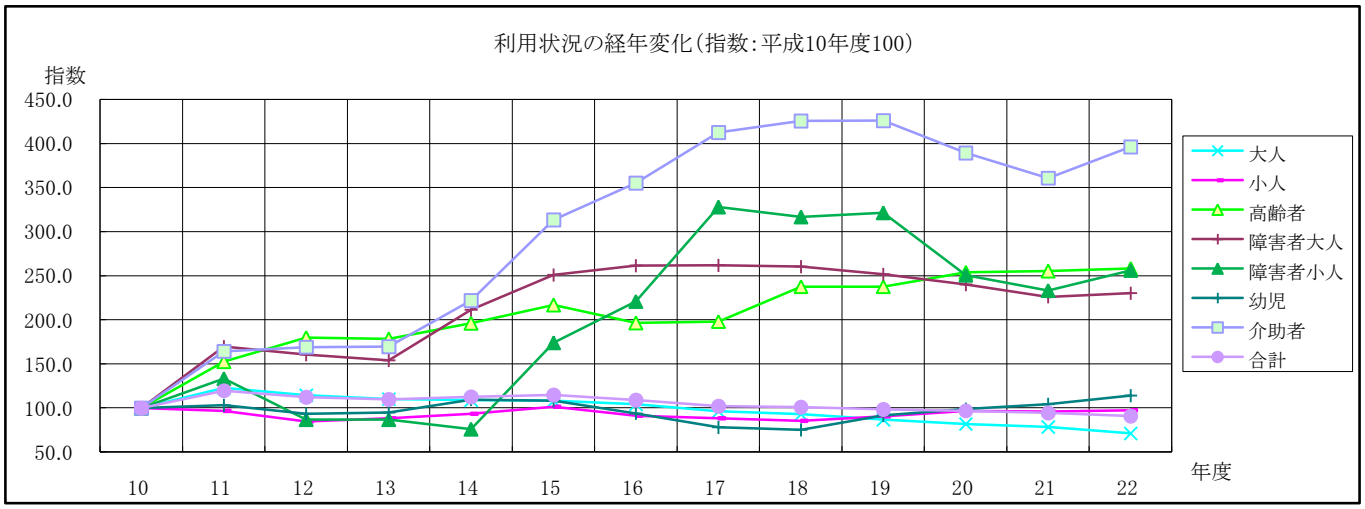

3. 組織及び職員数

3－1. 組織図（平成23年3月31日現在）

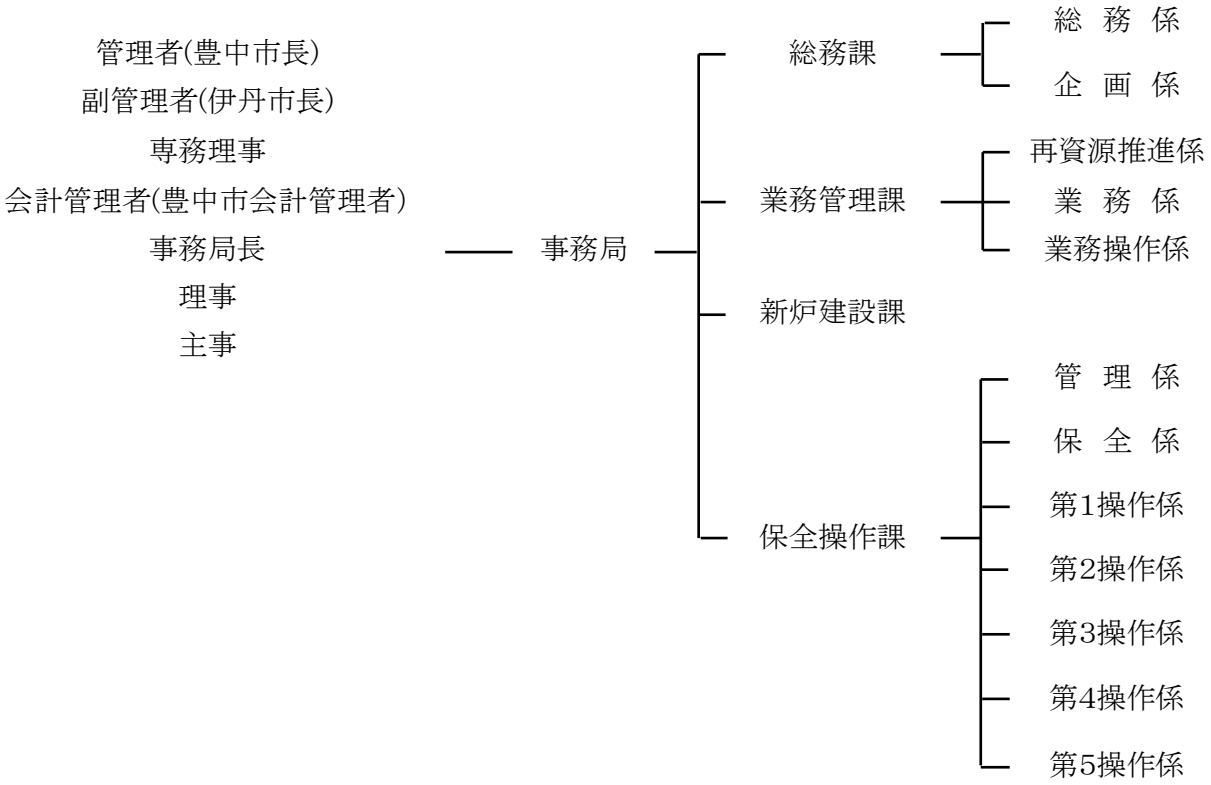

3－2. 職種別人員配置（平成23年3月31日現在）

単位（人）

	事務職員	技術職員	技能職員	計	再任用	任期付	嘱託	臨職	パート	計
総務課	8	2	2	12	4	0	1	1	1	19
総務係	6	1	2	9					1	10
企画係	2	1		3	4		1	1		9
業務管理課	3	5	5	13	3	2	10	4	1	33
再資源推進係	3	1	3	7			4	4	1	16
業務係		1		1	3		5			9
業務操作係		3	2	5		2	1			8
新炉建設課	1	7	1	9	0	0	0	0	1	10
保全操作課	1	38	33	72	3	0	2	2	1	80
管理係	1	7	1	9					1	10
保全係		6	6	12	1		1	1		15
第1操作係		5	5	10			1			11
第2操作係		5	4	9	1			1		11
第3操作係		5	5	10	1					11
第4操作係		5	6	11						11
第5操作係		5	6	11						11
合計	13	52	41	106	10	2	13	7	4	142

平成22年度(2010年度)ごみ処理事業年報

平成23年(2011年)9月発行

豊中市伊丹市クリーンランド
〒561-0806　豊中市原田西町２－１
TEL　06-6841-5395

編集　　総務課　企画係

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
