平成26年度（2014年度）

ごみ処理事業年報

平成27年（2015年）11月

豊中市伊丹市クリーンランド

凡例

一部数値の単位未満、平均値及び指数などの算出方法は四捨五入を原則としたため、合計数値とその内訳の小計とが一致しない場合がある。

目　　次

Ⅰ. 総括

1. 一般廃棄物処理実績フロー図
1－1. 平成26年度一般廃棄物処理実績フロー図（両市） …… 3
1－2. ごみ焼却施設フローシート(1～4号炉) …… 4
1－3. リサイクルプラザフローシート …… 5

2. ごみ搬入量
2－1. ごみ搬入量実績（総括） …… 8
2－2. 月別ごみ搬入量実績（両市合計） …… 10
2－3. 月別ごみ搬入量実績（豊中市分） …… 14
2－4. 月別ごみ搬入量実績（伊丹市分） …… 18

3. ごみ搬入量の経年変化
3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化 …… 22
3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化 …… 23
3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化 …… 23
3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 24
3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 25
3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化 …… 25

4. ごみ質
4－1. 可燃ごみの物理組成（重量%・WET基準） …… 26
4－2. 可燃ごみの物理組成（重量%・DRY基準） …… 26
4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準） …… 27
4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・DRY基準） …… 27
4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ（重量%・WET基準） …… 28
4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ（重量%・DRY基準） …… 28
4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量 …… 29
4－8. ごみの三成分（可燃分・灰分・水分）の経年変化（%） …… 29
4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化（MJ/kg） …… 29
4－10. 不燃ごみの物理組成（重量%・WET基準） …… 30
4－11. 不燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準） …… 30

Ⅱ. ごみ焼却施設処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化
1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化 …… 32
1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化 …… 33

2. 焼却関係
2－1. 焼却炉稼働状況（1～4号炉合計） …… 34
2－2. 焼却炉稼働状況（1号炉） …… 36
2－3. 焼却炉稼働状況（2号炉） …… 36

２－4. 焼却炉稼働状況（3号炉） …… 38
２－5. 焼却炉稼働状況（4号炉） …… 38
２－6. ごみ焼却量と低位発熱量（熱精算法）の経年変化 …… 40
２－7. 月別焼却量の経年変化 …… 41

3. 管理薬剤の使用状況
３－1. 管理薬剤使用（購入）実績 …… 42

4. ボイラー・タービン関係
４－1. ボイラー運転状況（1～4号炉合計） …… 43
４－2. ボイラー運転状況（1号炉） …… 44
４－3. ボイラー運転状況（2号炉） …… 44
４－4. ボイラー運転状況（3号炉） …… 45
４－5. ボイラー運転状況（4号炉） …… 45
４－6. タービン稼働状況 …… 46
４－7. 純水及び薬剤使用実績 …… 48

5. 洗煙装置関係
５－1. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計） …… 49
５－2. 洗煙装置稼働実績（1号炉） …… 50
５－3. 洗煙装置稼働実績（2号炉） …… 50
５－4. 洗煙装置稼働実績（3号炉） …… 51
５－5. 洗煙装置稼働実績（4号炉） …… 51
５－6. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績 …… 52
５－7. 洗煙装置暦日数平均稼働率 …… 52

6. 排水処理関係
６－1. 排水処理実績 …… 53
６－2. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績 …… 53

7. 電力関係
７－1. 電力量実績 …… 54
７－2. 電力量実績　経年変化…… 55

8. 市水・防臭薬剤関係
８－1. 市水・防臭薬剤の使用実績 …… 56

9. 焼却残渣（灰）関係
９－1. 飛灰安定化装置稼働実績 …… 57
９－2. 焼却残渣（灰）処分実績 …… 58
９－3. 焼却残渣（灰）測定結果 …… 58

10. 公害関係
10－1. 敷地境界線における臭気測定結果 …… 59

10－2. 排ガス関係測定結果
○ばいじん量…… 60
○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物…… 61
○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量…… 63
10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口） …… 63
10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん器出口・煙突入口） …… 64
10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん器出口・煙突入口） …… 64
10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 65
10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化（煙突入口） …… 66
10－8. その他のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む) …… 66
10－9. 排水関係測定結果
①原水水質測定結果 …… 67
②放流水水質測定結果 …… 69
③水素イオン濃度の経月変化 …… 70
④水銀濃度の経月変化 …… 70
⑤鉛濃度の経月変化 …… 71
⑥亜鉛濃度の経月変化 …… 71

11. 維持管理経費の状況
11－1. 処理経費 …… 72
11－2. 処理経費の経年変化 …… 72

Ⅲ. リサイクルプラザ処理状況（豊中伊丹スリーR・センター）

1. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績
1－1. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（両市合計） …… 76
1－2. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（豊中市分） …… 77
1－3. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（伊丹市分） …… 78

2. 運転・管理実績
2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績 …… 79
2－2. プラスチック容器包装処理・運転実績 …… 79
2－3. 不燃・粗大搬出実績 …… 80
2－4. 資源ごみ処理・再商品化実績 …… 81
2－5. 用水・電力・蒸気使用量実績 …… 83

3. 不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況
3－1. 不燃・粗大ごみの処理残渣の処分実績 …… 84
3－2. 不燃・粗大ごみの選別有価物等の処分実績 …… 85
3－3. 適正処理困難物処分量実績 …… 85

4. 維持管理経費の状況
4－1. 処理経費 …… 86

4－2. 処理経費の経年変化 …… 86

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 家電四品目搬入・搬出実績
1－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）搬入実績 …… 88
1－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）搬出実績 …… 89

2. その他品目のリサイクル実績
2－1. 搬入廃木材・剪定枝の薪・剪定枝チップ化によるリサイクル実績 …… 90
2－2. リサイクルBOXによる古紙類の資源化実績 …… 90

Ⅴ. 予算・決算

1. 予算・決算の状況
1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況 …… 92
1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況 …… 94
1－3. リサイクル施設勘定の予算・決算状況 …… 96
1－4. ごみ焼却施設勘定の予算・決算状況 …… 97
1－5. 単独品目勘定の予算・決算状況 …… 97

2. 歳入歳出決算の状況
2－1. 共通経費勘定 …… 98
2－2. ごみ処理施設勘定 …… 100
2－3. リサイクル施設勘定 …… 102
2－4. ごみ焼却施設勘定 …… 103
2－5. 単独品目勘定 …… 104

Ⅵ. その他

1. 啓発活動の状況
1－1. 施設見学者実績 …… 106
1－2. 体験学習受入れの実績 …… 106
1－3. 出前講座の実績 …… 107
1－4. リユースコーナー開催状況 …… 107
1－5. 搬入ごみ検査状況 …… 107
1－6. イベント等の実績 …… 108
1－7. 企画講座実施状況 …… 109

2. 組織及び職員数
2－1. 組織図 …… 110
2－2. 職種別人員配置 …… 110

Ⅰ．総　　括

1. 一般廃棄物処理実績フロー図

1－1. 平成26年度一般廃棄物処理実績フロー図（両市）

（単位:t）

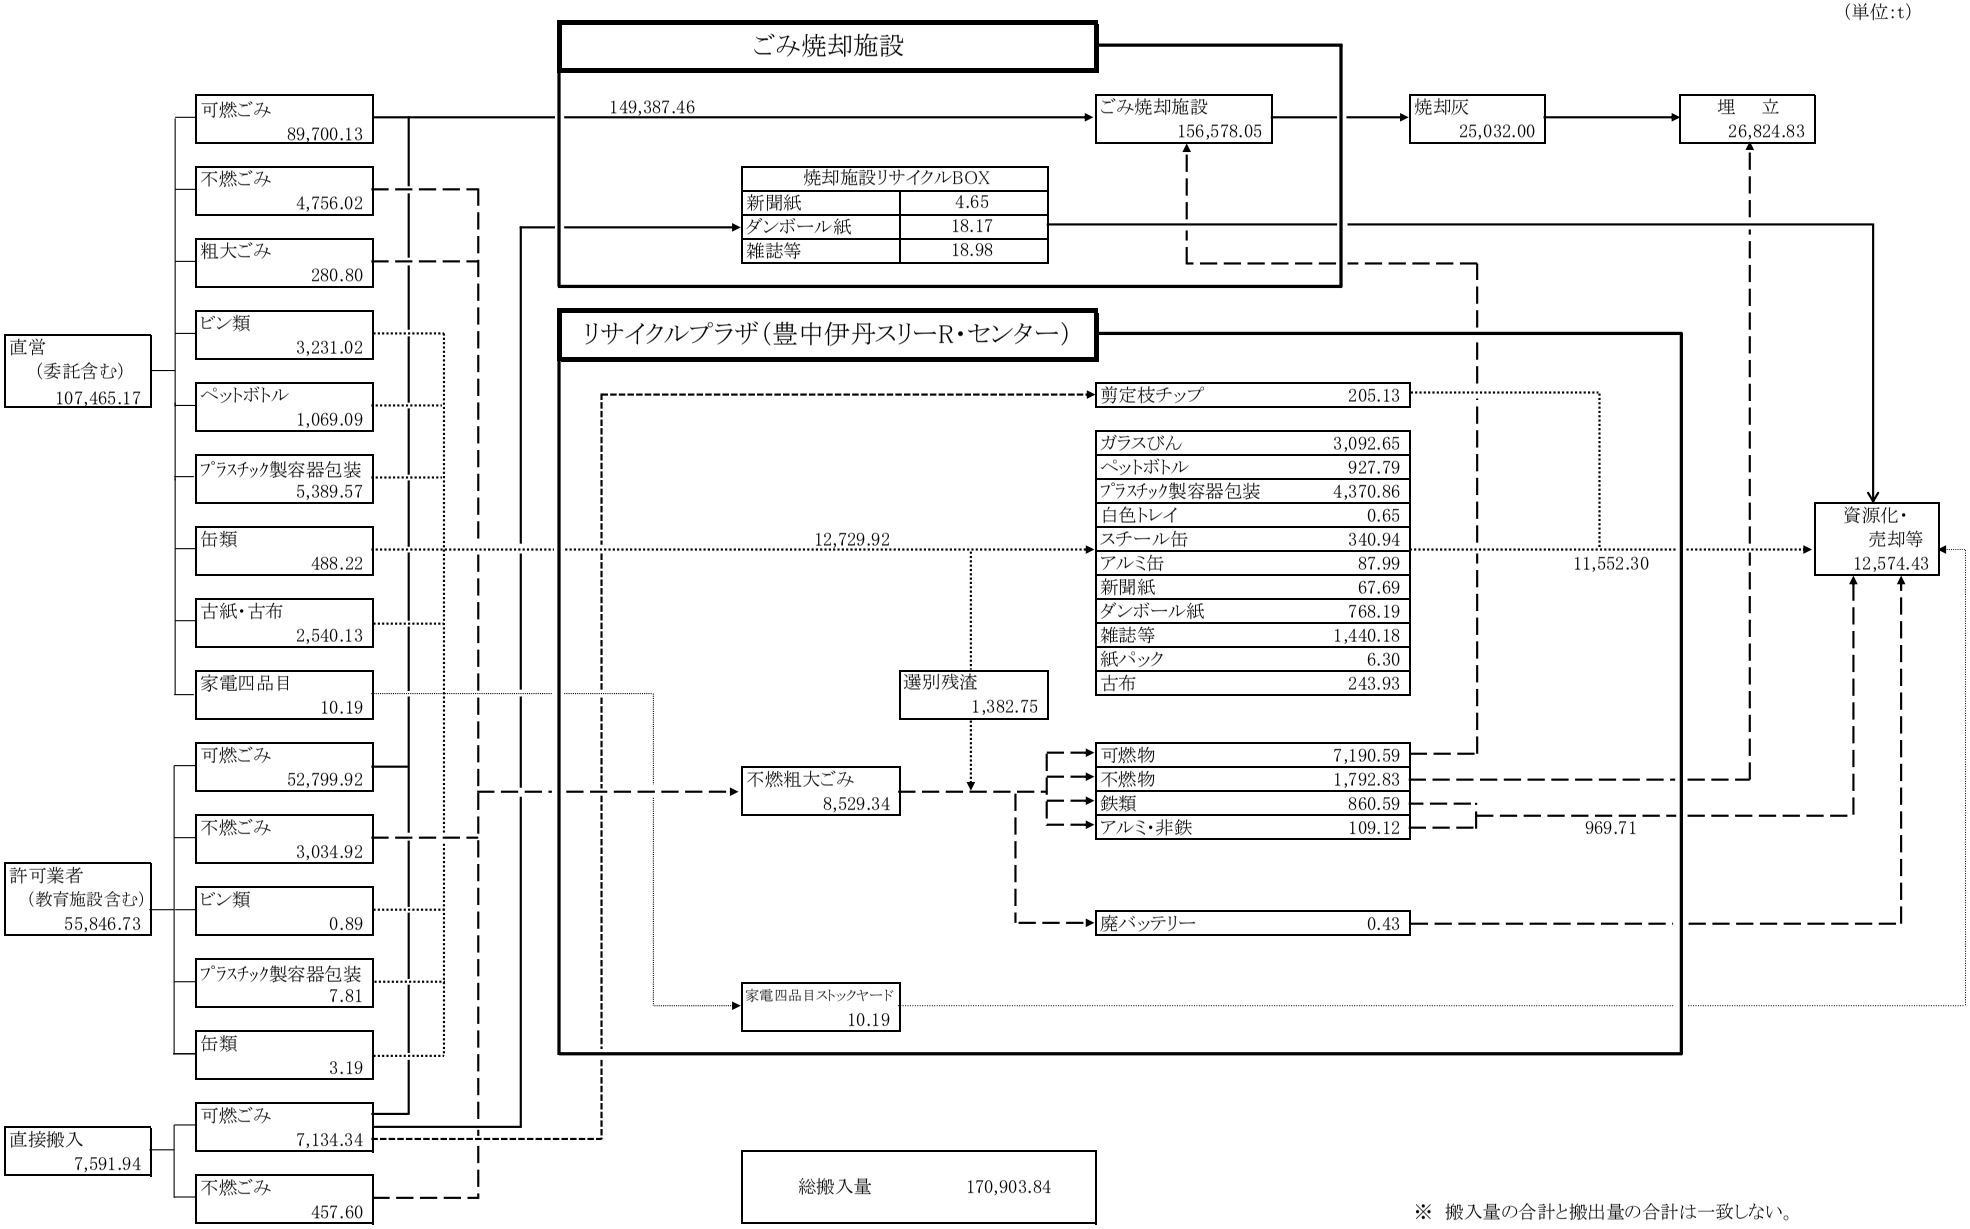

※ 搬入量の合計と搬出量の合計は一致しない。

1－2. ごみ焼却施設フローシート（1～4号炉）

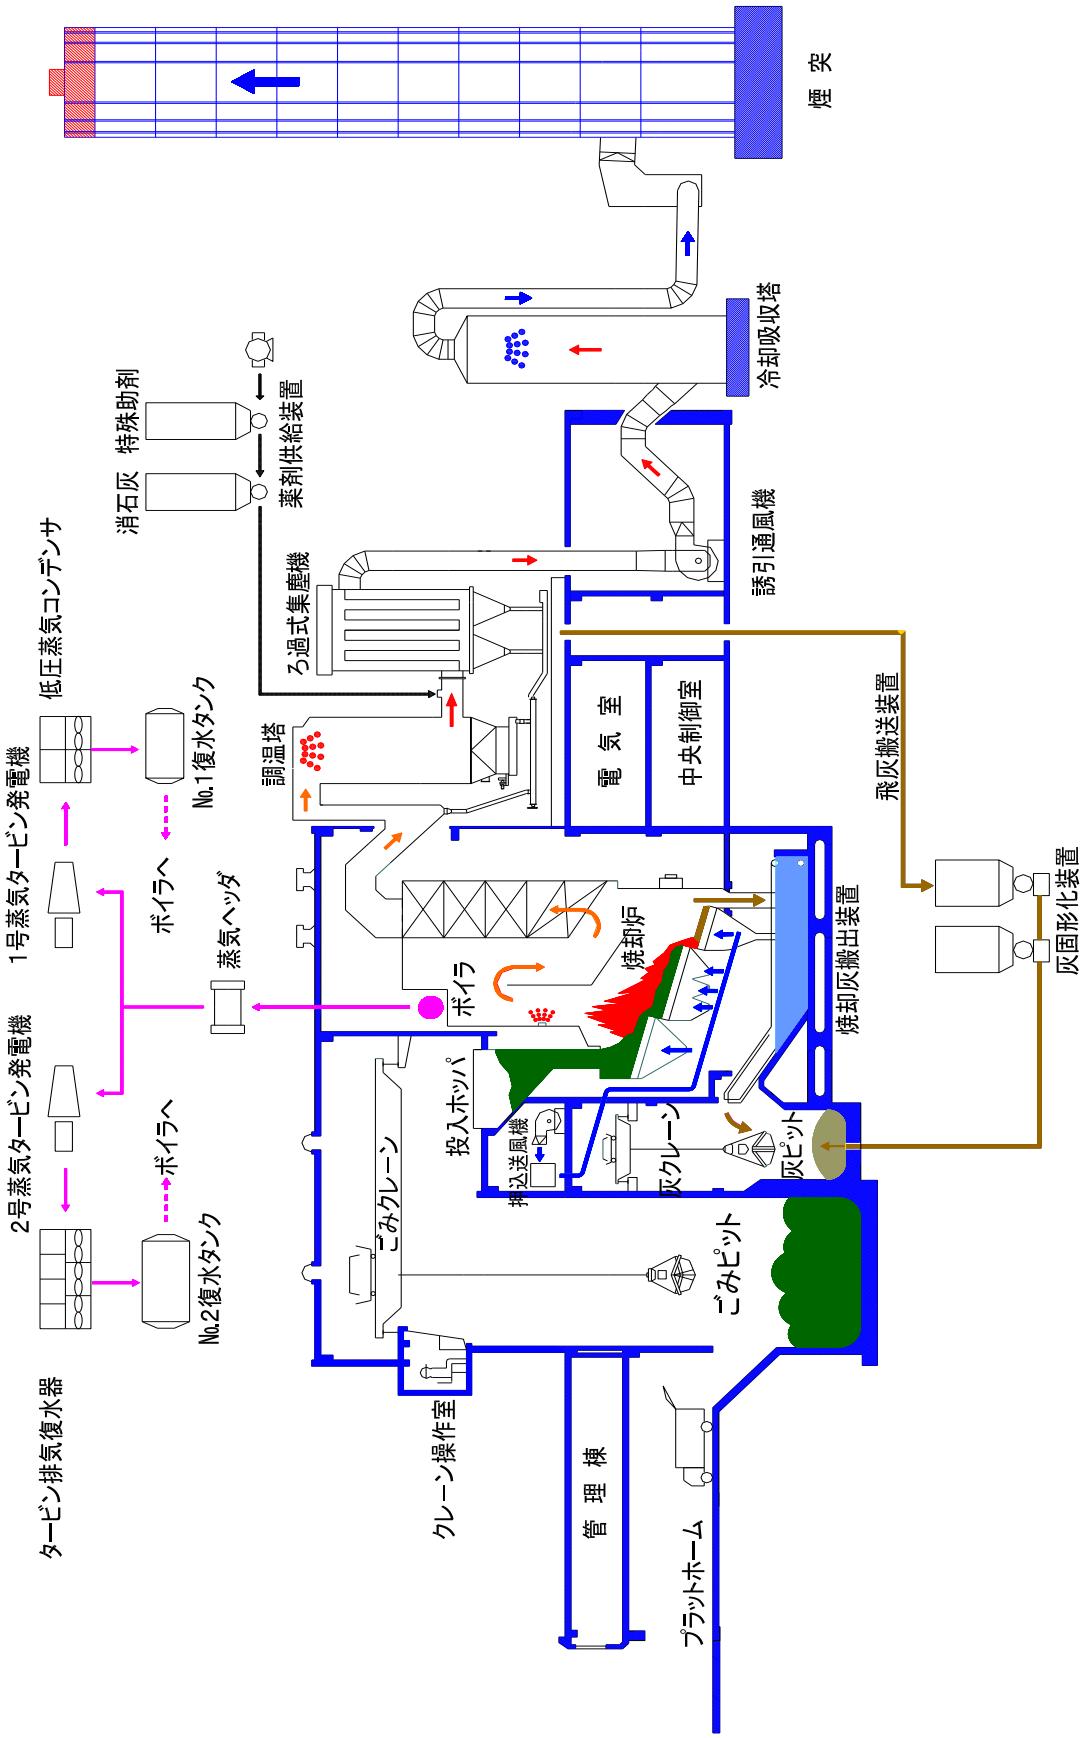

1－3. リサイクルプラザフローシート

(1) 不燃ごみ類系統

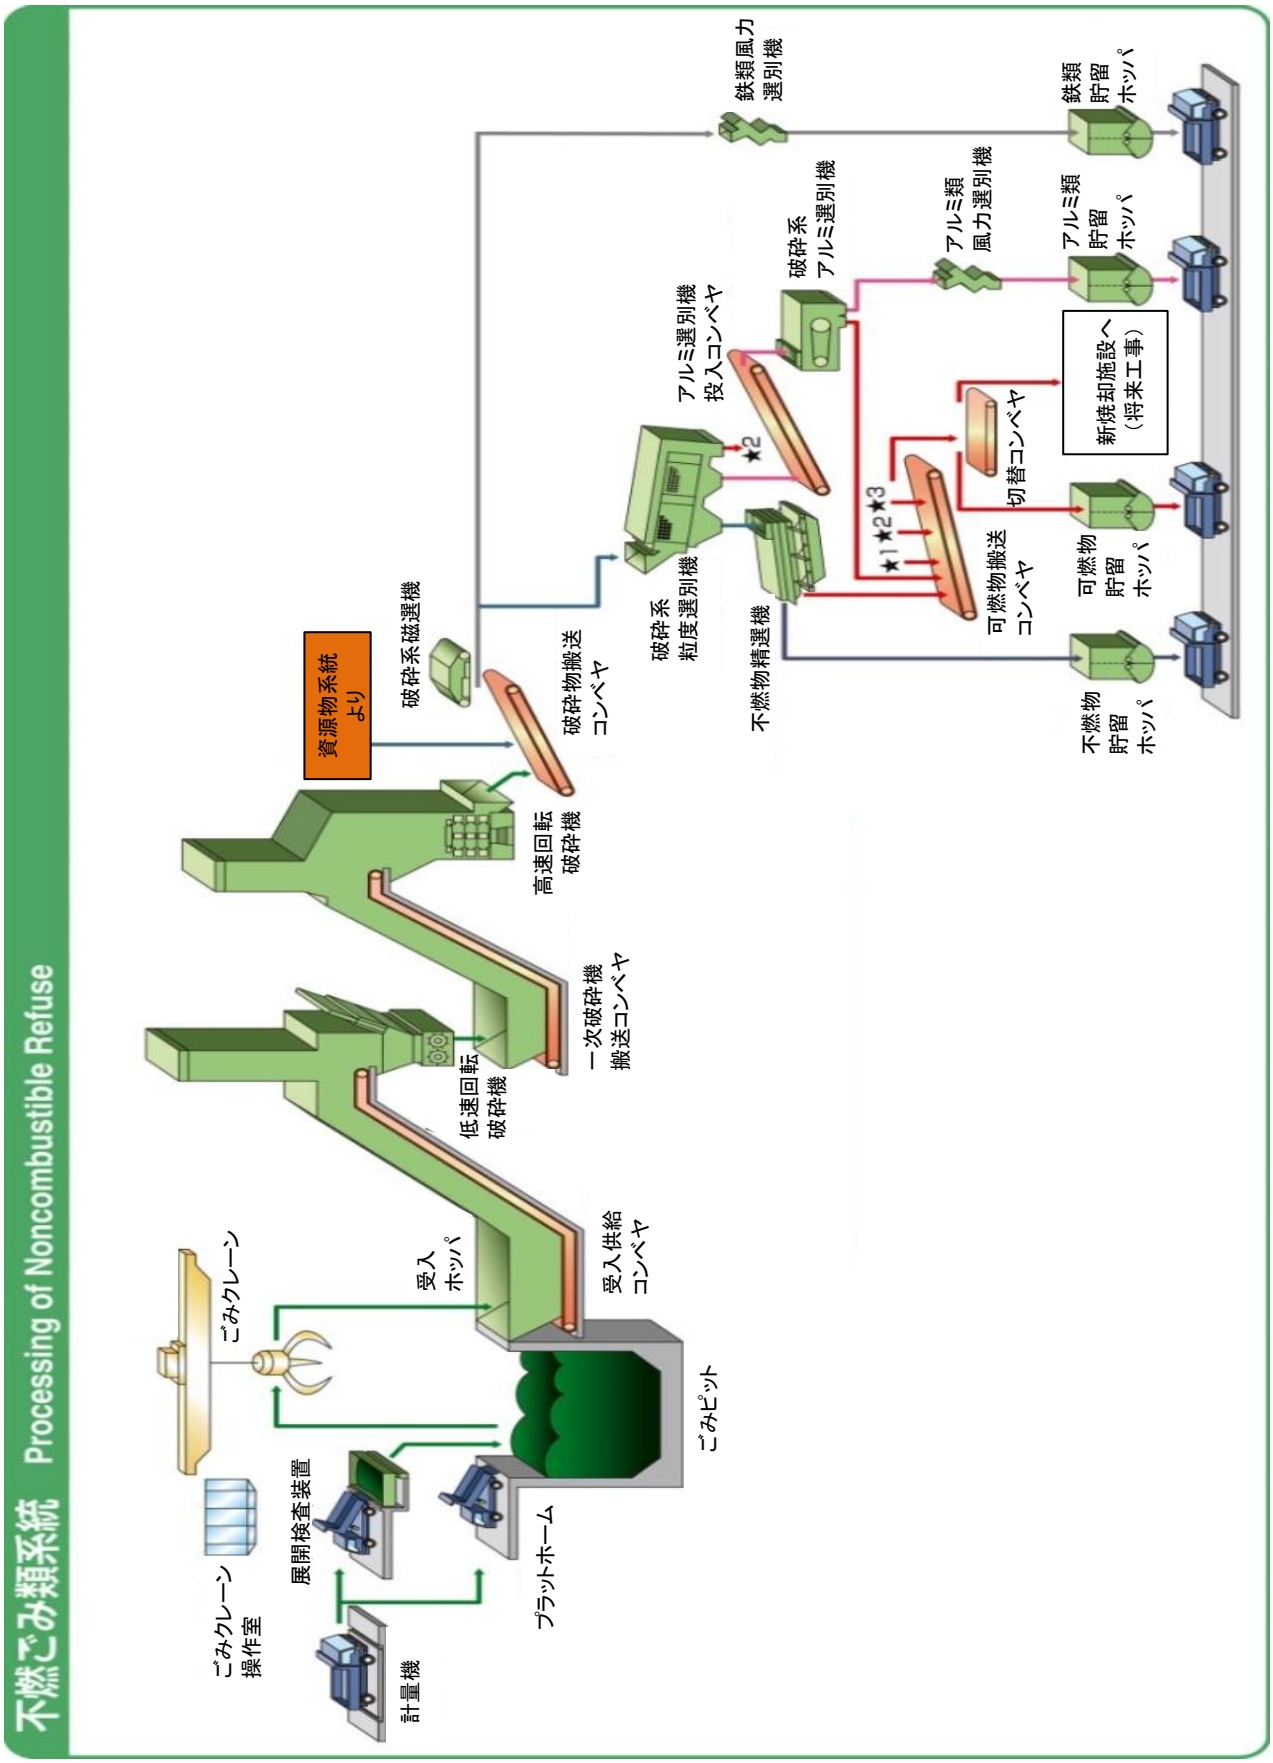

(2)資源ごみ類系統

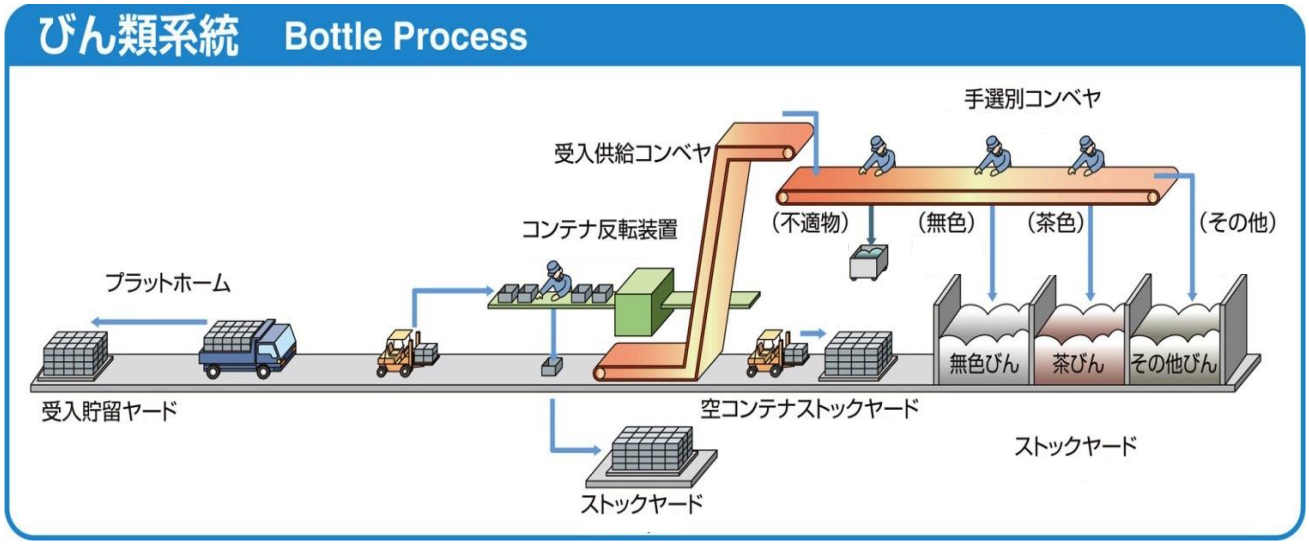
びん類系統　Bottle Process
手選別コンベヤ
受入供給コンベヤ
コンテナ反転装置
(不適物)
(無色)
(茶色)
(その他)
プラットホーム
無色びん
茶びん
その他びん
受入貯留ヤード
空コンテナストックヤード
ストックヤード
ストックヤード

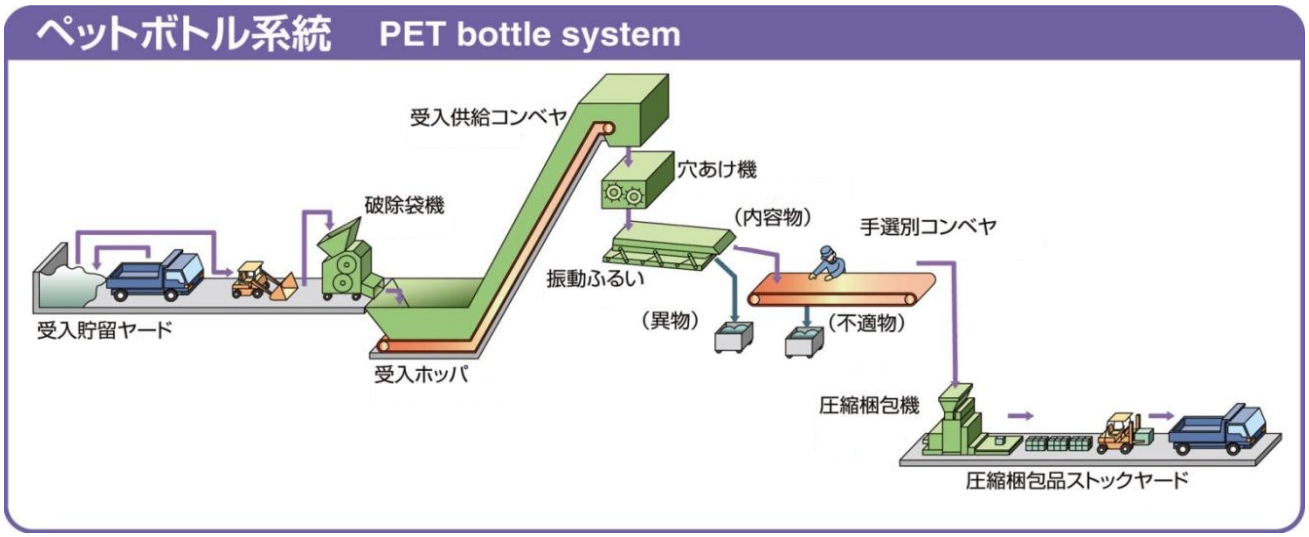
ペットボトル系統　PET bottle system
受入供給コンベヤ
穴あけ機
破除袋機
(内容物)
手選別コンベヤ
振動ふるい
(異物)
(不適物)
受入貯留ヤード
受入ホッパ
圧縮梱包機
圧縮梱包品ストックヤード

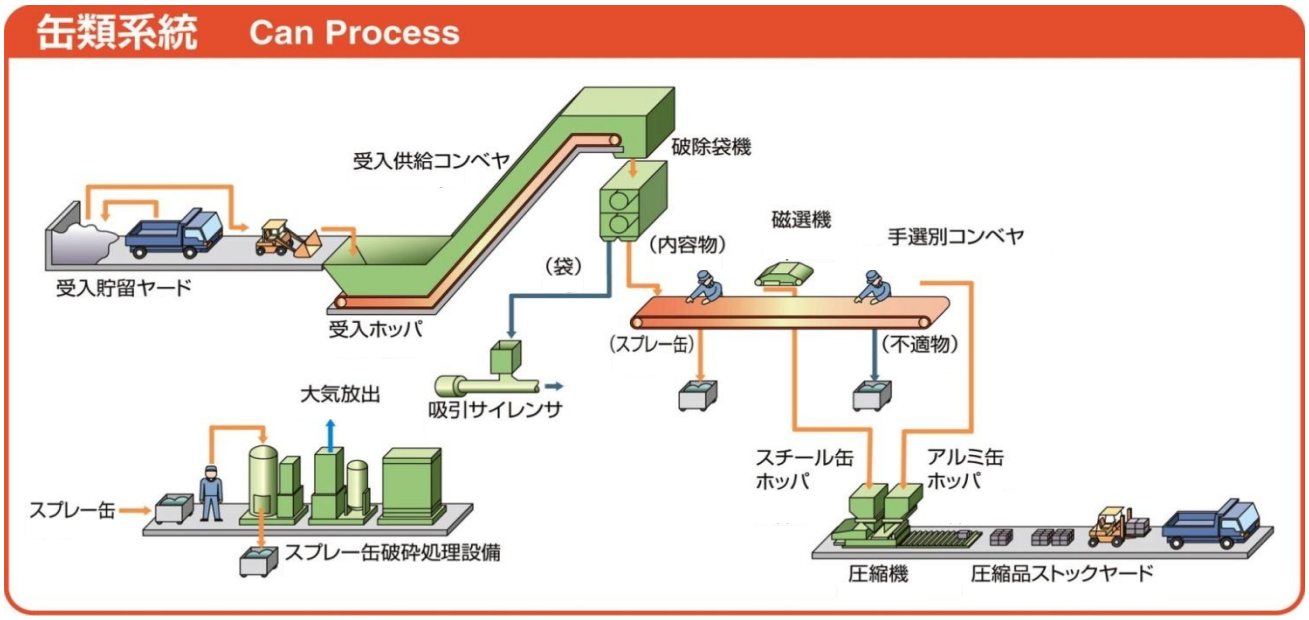
缶類系統　Can Process
受入供給コンベヤ
破除袋機
磁選機
手選別コンベヤ
(内容物)
(袋)
受入貯留ヤード
受入ホッパ
(スプレー缶)
(不適物)
大気放出
吸引サイレンサ
スチール缶ホッパ
アルミ缶ホッパ
スプレー缶
スプレー缶破砕処理設備
圧縮機
圧縮品ストックヤード

プラスチック製容器包装系統　Processing of Plastic Containers and Packaging

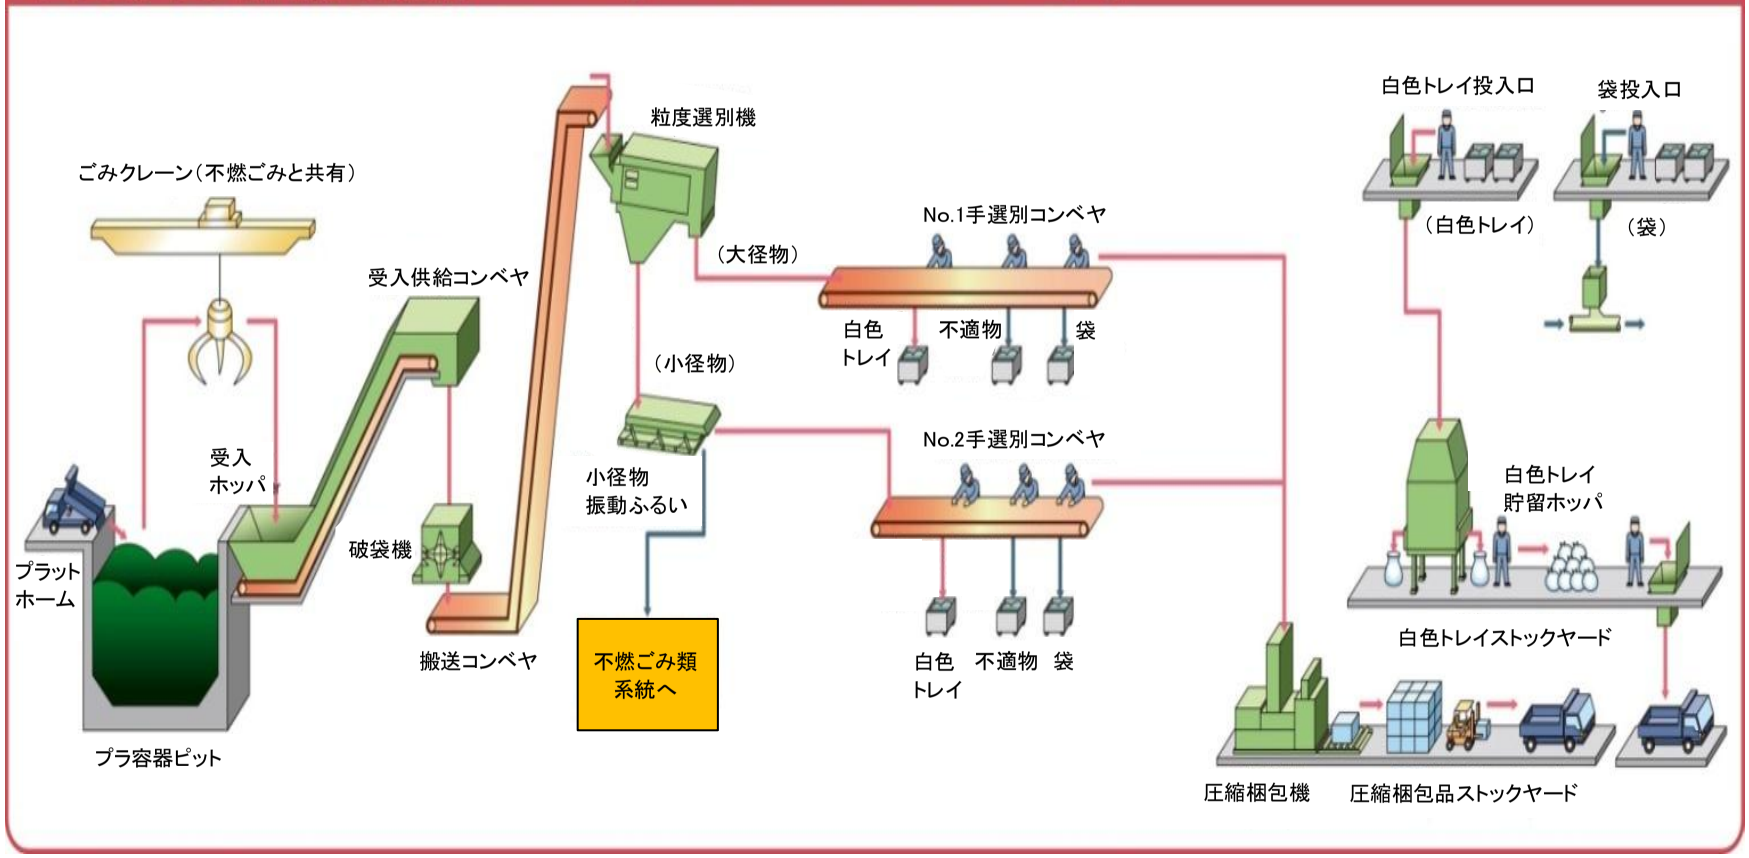

剪定枝系統　Processing of Tree Trimmings



古紙・古布系統　Processing of Paper and Textiles



2. ごみ搬入量

2－1. ごみ搬入量実績(総括)

	両市搬入量					豊
	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合(市別)	搬入台数
	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)	(台)
可燃ごみ	114,989	149,634.39	100.00	87.55	100.00	82,154
市扱い	63,266	89,700.13	59.95	83.47	100.00	45,380
許可業者	39,019	52,799.92	35.29	94.54	100.00	27,813
直接搬入	12,704	7,134.34	4.77	93.97	100.00	8,961
不燃ごみ	27,848	8,248.54	100.00	4.83	100.00	19,305
市扱い	10,610	4,756.02	57.66	4.43	100.00	6,152
許可業者	6,624	3,034.92	36.79	5.43	100.00	4,137
直接搬入	10,614	457.60	5.55	6.03	100.00	9,016
粗大ごみ	2,052	280.80	100.00	0.16	100.00	1,680
市扱い	2,052	280.80	100.00	0.26	100.00	1,680
ビン類	6,204	3,231.91	100.00	1.89	100.00	5,113
市扱い	6,158	3,231.02	99.97	3.01	100.00	5,067
許可業者	46	0.89	0.03	0.00	100.00	46
ペットボトル	5,044	1,069.09	100.00	0.63	100.00	4,011
市扱い	5,044	1,069.09	100.00	0.99	100.00	4,011
プラスチック製容器包装	13,950	5,397.38	100.00	3.16	100.00	11,169
市扱い	13,754	5,389.57	99.86	5.02	100.00	10,973
許可業者	196	7.81	0.14	0.01	100.00	196
缶類	4,740	491.41	100.00	0.29	100.00	4,740
市扱い	4,653	488.22	99.35	0.45	100.00	4,653
許可業者	87	3.19	0.65	0.01	100.00	87
古紙・古布	4,745	2,540.13	100.00	1.49	100.00	4,745
市扱い	4,745	2,540.13	100.00	2.36	100.00	4,745
家電四品目	150	10.19	100.00	0.01	100.00	99
市扱い	150	10.19	100.00	0.01	100.00	99
合　　計	179,722	170,903.84	100.00	100.00	100.00	133,016
市扱い	110,432	107,465.17	62.88	100.00	100.00	82,760
許可業者	45,972	55,846.73	32.68	100.00	100.00	32,279
直接搬入	23,318	7,591.94	4.44	100.00	100.00	17,977
人口(平成26年10月1日現在)		592,563				
一人1日平均排出量(g)		790				
可燃ごみ		692				
不燃ごみ		38				
粗大ごみ		1				
ビン類		15				
ペットボトル		5				
プラスチック製容器包装		25				
缶類		2				
古紙・古布		12				
家電四品目		0				

中市搬入量				伊丹市搬入量				
搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合（市別）	搬入台数	搬入量	搬入者別構成割合	ごみ別構成割合	搬入割合（市別）
(t)	(%)	(%)	(%)	(台)	(t)	(%)	(%)	(%)
99,917.34	100.00	88.35	66.77	32,835	49,717.05	100.00	86.00	33.23
59,870.41	59.92	83.64	66.75	17,886	29,829.72	60.00	83.13	33.25
34,860.50	34.89	96.98	66.02	11,206	17,939.42	36.08	90.14	33.98
5,186.43	5.19	93.17	72.70	3,743	1,947.91	3.92	96.18	27.30
3,056.56	100.00	2.70	37.06	8,543	5,191.98	100.00	8.98	62.94
1,602.99	52.44	2.24	33.70	4,458	3,153.03	60.73	8.79	66.30
1,073.31	35.11	2.99	35.37	2,487	1,961.61	37.78	9.86	64.63
380.26	12.44	6.83	83.10	1,598	77.34	1.49	3.82	16.90
241.93	100.00	0.21	86.16	372	38.87	100.00	0.07	13.84
241.93	100.00	0.34	86.16	372	38.87	100.00	0.11	13.84
2,256.52	100.00	2.00	69.82	1,091	975.39	100.00	1.69	30.18
2,255.63	99.96	3.15	69.81	1,091	975.39	100.00	2.72	30.19
0.89	0.04	0.00	100.00	－	－	－	0.00	0.00
696.30	100.00	0.62	65.13	1,033	372.79	100.00	0.64	34.87
696.30	100.00	0.97	65.13	1,033	372.79	100.00	1.04	34.87
3,890.63	100.00	3.44	72.08	2,781	1,506.75	100.00	2.61	27.92
3,882.82	99.80	5.42	72.04	2,781	1,506.75	100.00	4.20	27.96
7.81	0.20	0.02	100.00	－	－	－	0.00	0.00
491.41	100.00	0.43	100.00	－	－	－	0.00	0.00
488.22	99.35	0.68	100.00	－	－	－	0.00	0.00
3.19	0.65	0.01	100.00	－	－	－	0.00	0.00
2,540.13	100.00	2.25	100.00	－	－	－	0.00	0.00
2,540.13	100.00	3.55	100.00	－	－	－	0.00	0.00
5.52	100.00	0.00	54.17	51	4.67	100.00	0.01	45.83
5.52	100.00	0.01	54.17	51	4.67	100.00	0.01	45.83
113,096.34	100.00	100.00	66.18	46,706	57,807.50	100.00	100.00	33.82
71,583.95	63.29	100.00	66.61	27,672	35,881.22	62.07	100.00	33.39
35,945.70	31.78	100.00	64.36	13,693	19,901.03	34.43	100.00	35.64
5,566.69	4.92	100.00	73.32	5,341	2,025.25	3.50	100.00	26.68
394,983					197,580			
784					802			
693					689			
21					72			
2					1			
16					14			
5					5			
27					21			
3					0			
18					0			
0					0			

２－２. 月別ごみ搬入量実績（両市合計）

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	12,291.99	94.6	13,033.10	98.6	12,400.43	100.8
市扱い	7,511.26	93.5	7,924.48	99.0	7,363.70	103.8
許可業者	4,449.09	98.8	4,521.79	99.3	4,319.72	99.7
直接搬入	331.64	72.0	586.83	89.7	717.01	82.0
不燃ごみ	727.89	95.5	730.30	95.0	650.58	95.4
市扱い	432.55	98.4	450.28	95.6	387.00	96.0
許可業者	254.76	101.8	234.93	96.8	232.39	103.9
直接搬入	40.58	56.2	45.09	82.5	31.19	56.6
粗大ごみ	26.43	99.2	22.82	90.2	23.86	88.0
市扱い	26.43	99.2	22.82	90.2	23.86	88.0
ビン類	258.68	98.1	275.66	96.1	268.49	95.3
市扱い	258.62	98.1	275.60	96.1	268.35	95.3
許可業者	0.06	60.0	0.06	85.7	0.14	175.0
ペットボトル	76.77	101.0	92.67	103.8	97.41	93.7
市扱い	76.77	101.0	92.67	103.8	97.41	93.7
プラスチック製容器包装	457.79	93.5	466.33	88.9	437.06	96.9
市扱い	456.87	93.5	465.78	88.9	436.40	97.0
許可業者	0.92	88.5	0.55	67.9	0.66	61.7
缶類	44.29	99.3	43.71	92.9	43.31	85.7
市扱い	43.95	99.3	43.41	92.5	43.05	86.0
許可業者	0.34	97.1	0.30	272.7	0.26	53.1
古紙・古布	262.77	110.0	248.99	100.9	197.42	85.5
市扱い	262.77	110.0	248.99	100.9	197.42	85.5
家電四品目	0.73	62.4	1.19	90.8	1.15	129.2
市扱い	0.73	62.4	1.19	90.8	1.15	129.2
総搬入量						
市扱い	9,069.95	94.4	9,525.22	98.2	8,818.34	102.0
許可業者	4,705.17	98.9	4,757.63	99.1	4,553.17	99.9
直接搬入	372.22	69.9	631.92	89.2	748.20	80.5
合　計	14,147.34	94.9	14,914.77	98.1	14,119.71	99.9
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	26	9,140	27	9,430	25	9,174
許可業者搬入	26	3,821	27	3,943	25	3,691
直接搬入	26	1,702	27	2,084	25	2,045
合　計		14,663		15,457		14,910

（両市合計）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
13,044.89	96.7	12,368.06	97.7	12,969.72	104.4	12,767.96	97.6
7,750.82	97.5	7,310.70	98.5	7,739.35	106.1	7,516.64	98.3
4,574.22	96.9	4,387.91	97.4	4,417.91	100.3	4,460.63	96.9
719.85	88.3	669.45	91.5	812.46	111.4	790.69	95.6
707.29	97.6	714.33	99.2	722.05	103.9	696.70	96.5
398.39	94.5	408.74	97.3	410.19	97.1	395.13	93.0
271.46	104.5	260.57	102.6	274.21	115.6	265.34	102.8
37.44	86.7	45.02	97.7	37.65	106.4	36.23	92.0
23.43	89.9	23.81	85.5	21.83	84.5	24.09	88.8
23.43	89.9	23.81	85.5	21.83	84.5	24.09	88.8
266.09	97.1	287.45	94.8	265.28	96.2	262.49	100.6
266.07	97.2	287.36	94.8	265.21	96.2	262.38	100.6
0.02	28.6	0.09	450.0	0.07	100.0	0.11	366.7
112.08	98.4	125.33	91.7	109.15	95.5	95.68	96.1
112.08	98.4	125.33	91.7	109.15	95.5	95.68	96.1
480.18	93.6	440.47	93.6	450.81	98.3	466.89	95.9
479.46	93.6	439.95	93.6	450.18	98.3	466.13	95.9
0.72	100.0	0.52	96.3	0.63	86.3	0.76	104.1
42.32	97.1	48.99	90.0	41.81	82.2	39.24	93.3
42.11	97.1	48.78	90.1	41.54	81.9	38.99	93.5
0.21	91.3	0.21	72.4	0.27	150.0	0.25	73.5
191.82	89.7	219.13	98.7	178.13	97.0	175.56	99.6
191.82	89.7	219.13	98.7	178.13	97.0	175.56	99.6
0.84	52.8	0.54	60.0	1.00	119.0	1.30	180.6
0.84	52.8	0.54	60.0	1.00	119.0	1.30	180.6
9,265.02	96.9	8,864.34	97.8	9,216.58	104.5	8,975.90	97.9
4,846.63	97.3	4,649.30	97.7	4,693.09	101.1	4,727.09	97.2
757.29	88.2	714.47	91.9	850.11	111.2	826.92	95.5
14,868.94	96.6	14,228.11	97.5	14,759.78	103.7	14,529.91	97.5
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	9,599	26	9,207	26	9,579	27	9,625
27	3,940	26	3,748	26	3,869	27	3,970
27	2,187	26	2,144	26	2,164	27	2,285
	15,726		15,099		15,612		15,880

（両市合計）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	11,831.18	94.6	14,122.84	101.8	11,934.14	99.7
市扱い	6,912.81	94.9	8,428.48	102.2	7,379.38	98.3
許可業者	4,189.39	96.5	5,023.39	102.4	4,117.90	101.6
直接搬入	728.98	82.9	670.97	92.8	436.86	105.2
不燃ごみ	640.76	93.6	763.85	98.3	653.06	101.2
市扱い	365.81	88.4	423.47	89.0	395.62	98.4
許可業者	239.40	104.7	302.68	115.7	222.24	106.6
直接搬入	35.55	84.4	37.70	94.2	35.20	100.7
粗大ごみ	24.99	92.8	27.40	73.4	18.18	117.2
市扱い	24.99	92.8	27.40	73.4	18.18	117.2
ビン類	252.11	96.3	276.44	89.3	307.60	108.1
市扱い	252.05	96.3	276.40	89.3	307.54	108.1
許可業者	0.06	150.0	0.04	66.7	0.06	200.0
ペットボトル	79.61	98.4	72.47	102.2	74.69	108.4
市扱い	79.61	98.4	72.47	102.2	74.69	108.4
プラスチック製容器包装	400.02	89.8	466.04	99.4	481.41	96.6
市扱い	399.33	89.7	465.45	99.4	480.83	96.6
許可業者	0.69	98.6	0.59	89.4	0.58	138.1
缶類	37.56	81.1	43.71	80.5	36.02	90.1
市扱い	37.31	81.0	43.42	80.6	35.76	89.7
許可業者	0.25	119.0	0.29	65.9	0.26	200.0
古紙・古布	221.09	81.2	244.86	95.9	229.86	111.7
市扱い	221.09	81.2	244.86	95.9	229.86	111.7
家電四品目	0.25	21.9	1.26	103.3	0.57	62.6
市扱い	0.25	21.9	1.26	103.3	0.57	62.6
総搬入量						
市扱い	8,293.25	93.9	9,983.21	100.7	8,922.43	98.9
許可業者	4,429.79	96.9	5,326.99	103.1	4,341.04	101.8
直接搬入	764.53	83.0	708.67	92.9	472.06	104.8
合　計	13,487.57	94.1	16,018.87	101.1	13,735.53	100.0
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	25	8,761	26	9,829	24	8,651
許可業者搬入	25	3,715	27	4,299	24	3,612
直接搬入	25	2,131	24	2,150	22	1,429
合　計		14,607		16,278		13,692

（両市合計）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量(t)	搬入日平均搬入量(t)
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)		
10,434.23	99.5	12,435.85	101.8	149,634.39	98.9	409.96	482.69
6,277.87	99.1	7,584.64	104.3	89,700.13	99.6	245.75	290.29
3,816.66	100.1	4,521.31	99.9	52,799.92	99.1	144.66	170.32
339.70	101.3	329.90	78.7	7,134.34	90.7	19.55	23.39
574.21	101.8	667.52	96.8	8,248.54	97.8	22.60	26.61
324.85	96.4	363.99	94.2	4,756.02	94.8	13.03	15.39
218.32	110.8	258.62	102.5	3,034.92	105.6	8.31	9.79
31.04	103.0	44.91	88.0	457.60	84.1	1.25	1.50
21.00	87.1	22.96	91.3	280.80	89.2	0.77	0.91
21.00	87.1	22.96	91.3	280.80	89.2	0.77	0.91
263.11	101.4	248.51	100.8	3,231.91	97.7	8.85	10.43
263.04	101.4	248.40	100.8	3,231.02	97.7	8.85	10.46
0.07	350.0	0.11	157.1	0.89	134.8	0.00	0.00
63.16	96.4	70.07	100.8	1,069.09	98.1	2.93	3.46
63.16	96.4	70.07	100.8	1,069.09	98.1	2.93	3.46
401.22	98.3	449.16	100.2	5,397.38	95.3	14.79	17.41
400.75	98.4	448.44	100.2	5,389.57	95.3	14.77	17.44
0.47	71.2	0.72	109.1	7.81	89.4	0.02	0.03
36.72	83.7	33.73	86.6	491.41	88.3	1.35	1.59
36.53	83.9	33.37	86.2	488.22	88.2	1.34	1.58
0.19	55.9	0.36	180.0	3.19	96.4	0.01	0.01
173.10	77.9	197.40	93.1	2,540.13	94.8	6.96	8.22
173.10	77.9	197.40	93.1	2,540.13	94.8	6.96	8.22
0.43	37.1	0.93	117.7	10.19	80.6	0.03	0.03
0.43	37.1	0.93	117.7	10.19	80.6	0.03	0.03
7,560.73	98.2	8,970.20	103.1	107,465.17	98.8	294.43	347.78
4,035.71	100.6	4,781.12	100.0	55,846.73	99.5	153.00	180.15
370.74	101.5	374.81	79.7	7,591.94	90.3	20.80	24.89
11,967.18	99.1	14,126.13	101.3	170,903.84	98.6	468.23	551.30
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日平均搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	8,314	26	9,123	309	110,432	303	357
24	3,497	26	3,867	310	45,972	126	148
24	1,331	26	1,666	305	23,318	64	76
	13,142		14,656		179,722	492	580

2－3. 月別ごみ搬入量実績(豊中市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	8,256.16	93.8	8,712.62	98.1	8,261.33	100.5
市扱い	5,059.09	93.0	5,269.87	98.9	4,910.96	104.1
許可業者	2,959.27	97.9	2,997.06	98.5	2,854.16	98.0
直接搬入	237.80	69.7	445.69	86.9	496.21	84.6
不燃ごみ	264.27	84.6	278.35	96.1	246.43	88.7
市扱い	140.12	92.6	159.33	104.3	139.21	94.7
許可業者	89.75	91.5	82.19	91.4	82.03	98.2
直接搬入	34.40	54.7	36.83	78.7	25.19	53.1
粗大ごみ	22.14	94.6	19.96	92.0	20.87	86.4
市扱い	22.14	94.6	19.96	92.0	20.87	86.4
ビン類	177.95	96.5	193.75	98.7	190.69	93.0
市扱い	177.89	96.5	193.69	98.7	190.55	93.0
許可業者	0.06	60.0	0.06	85.7	0.14	175.0
ペットボトル	48.51	98.1	61.19	110.6	63.22	89.8
市扱い	48.51	98.1	61.19	110.6	63.22	89.8
プラスチック製容器包装	328.65	91.4	339.26	89.1	318.26	97.0
市扱い	327.73	91.4	338.71	89.2	317.60	97.1
許可業者	0.92	88.5	0.55	67.9	0.66	61.7
缶類	44.29	99.3	43.71	92.9	43.31	85.7
市扱い	43.95	99.3	43.41	92.5	43.05	86.0
許可業者	0.34	97.1	0.30	272.7	0.26	53.1
古紙・古布	262.77	110.0	248.99	100.9	197.42	85.5
市扱い	262.77	110.0	248.99	100.9	197.42	85.5
家電四品目	0.41	50.6	0.60	82.2	0.49	158.1
市扱い	0.41	50.6	0.60	82.2	0.49	158.1
総搬入量						
市扱い	6,082.61	93.7	6,335.75	98.6	5,883.37	101.9
許可業者	3,050.34	97.7	3,080.16	98.3	2,937.25	97.9
直接搬入	272.20	67.4	482.52	86.2	521.40	82.2
合　計	9,405.15	93.9	9,898.43	97.8	9,342.02	99.3
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	26	6,937	27	7,086	25	6,833
許可業者搬入	26	2,650	27	2,766	25	2,595
直接搬入	26	1,357	27	1,620	25	1,507
合　計		10,944		11,472		10,935

（豊中市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
8,672.21	96.2	8,105.66	95.0	8,617.74	103.6	8,521.41	96.8
5,147.47	97.6	4,739.22	96.1	5,109.22	105.1	4,995.43	97.7
3,019.33	95.3	2,893.70	95.4	2,890.24	99.3	2,946.42	95.4
505.41	88.3	472.74	83.0	618.28	113.1	579.56	96.7
246.81	94.6	277.60	101.5	264.66	98.5	248.33	96.6
125.29	96.3	145.43	108.5	140.51	97.3	121.11	93.4
90.12	95.3	94.66	95.5	91.00	96.7	95.91	102.9
31.40	87.0	37.51	93.2	33.15	110.1	31.31	92.2
20.11	95.1	20.15	84.7	18.59	80.2	20.34	86.7
20.11	95.1	20.15	84.7	18.59	80.2	20.34	86.7
178.90	98.5	206.57	96.6	185.09	94.6	180.18	101.0
178.88	98.6	206.48	96.6	185.02	94.6	180.07	101.0
0.02	28.6	0.09	450.0	0.07	100.0	0.11	366.7
69.24	98.4	83.81	94.9	70.80	94.2	60.80	95.9
69.24	98.4	83.81	94.9	70.80	94.2	60.80	95.9
345.59	92.7	318.92	93.3	327.66	97.8	333.87	95.6
344.87	92.7	318.40	93.3	327.03	97.8	333.11	95.6
0.72	100.0	0.52	96.3	0.63	86.3	0.76	104.1
42.32	97.1	48.99	90.0	41.81	82.2	39.24	93.3
42.11	97.1	48.78	90.1	41.54	81.9	38.99	93.5
0.21	91.3	0.21	72.4	0.27	150.0	0.25	73.5
191.82	89.7	219.13	98.7	178.13	97.0	175.56	99.6
191.82	89.7	219.13	98.7	178.13	97.0	175.56	99.6
0.56	49.1	0.36	100.0	0.42	66.7	0.69	121.1
0.56	49.1	0.36	100.0	0.42	66.7	0.69	121.1
6,120.35	97.0	5,781.76	96.2	6,071.26	103.4	5,926.10	97.5
3,110.40	95.3	2,989.18	95.4	2,982.21	99.2	3,043.45	95.6
536.81	88.3	510.25	83.6	651.43	113.0	610.87	96.4
9,767.56	95.9	9,281.19	95.2	9,704.90	102.7	9,580.42	96.8
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	7,092	26	6,779	26	7,102	27	7,144
27	2,747	26	2,617	26	2,697	27	2,786
27	1,648	26	1,625	26	1,678	27	1,751
	11,487		11,021		11,477		11,681

（豊中市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	7,840.38	94.3	9,492.69	102.1	8,042.81	98.3
市扱い	4,580.84	94.5	5,664.10	103.4	4,987.33	96.3
許可業者	2,769.23	95.0	3,348.11	102.0	2,705.53	100.4
直接搬入	490.31	89.2	480.48	88.8	349.95	112.7
不燃ごみ	248.73	97.2	299.54	99.4	218.25	105.5
市扱い	132.60	97.0	152.45	90.2	111.03	107.5
許可業者	87.25	105.0	115.97	118.3	79.10	107.2
直接搬入	28.88	80.3	31.12	91.2	28.12	94.6
粗大ごみ	21.54	91.0	23.78	73.9	15.96	127.2
市扱い	21.54	91.0	23.78	73.9	15.96	127.2
ビン類	183.23	97.3	199.08	86.4	204.03	111.5
市扱い	183.17	97.3	199.04	86.4	203.97	111.5
許可業者	0.06	150.0	0.04	66.7	0.06	200.0
ペットボトル	55.30	99.4	48.99	103.1	47.48	113.5
市扱い	55.30	99.4	48.99	103.1	47.48	113.5
プラスチック製容器包装	287.31	88.7	345.33	98.8	336.31	95.1
市扱い	286.62	88.6	344.74	98.8	335.73	95.1
許可業者	0.69	98.6	0.59	89.4	0.58	138.1
缶類	37.56	81.1	43.71	80.5	36.02	90.1
市扱い	37.31	81.0	43.42	80.6	35.76	89.7
許可業者	0.25	119.0	0.29	65.9	0.26	200.0
古紙・古布	221.09	81.2	244.86	95.9	229.86	111.7
市扱い	221.09	81.2	244.86	95.9	229.86	111.7
家電四品目	0.16	31.4	0.65	69.1	0.31	79.5
市扱い	0.16	31.4	0.65	69.1	0.31	79.5
総搬入量						
市扱い	5,518.63	93.6	6,722.03	101.6	5,967.43	97.5
許可業者	2,857.48	95.3	3,465.00	102.5	2,785.53	100.6
直接搬入	519.19	88.6	511.60	89.0	378.07	111.1
合　計	8,895.30	93.8	10,698.63	101.2	9,131.03	98.9
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	25	6,574	26	7,470	24	6,493
許可業者搬入	25	2,616	27	3,061	24	2,555
直接搬入	25	1,567	24	1,628	22	1,172
合　計		10,757		12,159		10,220

（豊中市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量(t)	搬入日平均搬入量(t)
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)		
7,002.38	99.2	8,391.95	101.8	99,917.34	98.3	273.75	322.31
4,238.62	98.7	5,168.26	104.3	59,870.41	99.1	164.03	193.76
2,516.84	99.9	2,960.61	99.7	34,860.50	98.0	95.51	112.45
246.92	98.8	263.08	83.2	5,186.43	91.1	14.21	17.00
217.93	105.5	245.66	99.6	3,056.56	96.8	8.37	9.86
116.94	100.5	118.97	97.6	1,602.99	97.9	4.39	5.19
76.18	117.0	89.15	105.7	1,073.31	101.6	2.94	3.46
24.81	98.8	37.54	92.9	380.26	82.1	1.04	1.25
18.44	88.5	20.05	94.3	241.93	89.2	0.66	0.78
18.44	88.5	20.05	94.3	241.93	89.2	0.66	0.78
188.79	100.4	168.26	97.6	2,256.52	97.4	6.18	7.28
188.72	100.3	168.15	97.6	2,255.63	97.4	6.18	7.30
0.07	350.0	0.11	157.1	0.89	134.8	0.00	0.00
41.80	94.1	45.16	100.6	696.30	98.5	1.91	2.25
41.80	94.1	45.16	100.6	696.30	98.5	1.91	2.25
286.53	97.5	322.94	99.3	3,890.63	94.6	10.66	12.55
286.06	97.6	322.22	99.3	3,882.82	94.6	10.64	12.57
0.47	71.2	0.72	109.1	7.81	89.4	0.02	0.03
36.72	83.7	33.73	86.6	491.41	88.3	1.35	1.59
36.53	83.9	33.37	86.2	488.22	88.2	1.34	1.58
0.19	55.9	0.36	180.0	3.19	96.4	0.01	0.01
173.10	77.9	197.40	93.1	2,540.13	94.8	6.96	8.22
173.10	77.9	197.40	93.1	2,540.13	94.8	6.96	8.22
0.34	44.2	0.53	93.0	5.52	71.4	0.02	0.02
0.34	44.2	0.53	93.0	5.52	71.4	0.02	0.02
5,100.55	97.7	6,074.11	103.1	71,583.95	98.5	196.12	231.66
2,593.75	100.3	3,050.95	99.9	35,945.70	98.1	98.48	115.95
271.73	98.8	300.62	84.3	5,566.69	90.4	15.25	18.25
7,966.03	98.6	9,425.68	101.3	113,096.34	97.9	309.85	364.83
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日平均搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	6,324	26	6,926	309	82,760	227	268
24	2,471	26	2,718	310	32,279	88	104
24	1,049	26	1,375	305	17,977	49	59
	9,844		11,019		133,016	364	429

2－4. 月別ごみ搬入量実績(伊丹市分)

［その1］

	4月		5月		6月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	4,035.83	96.2	4,320.48	99.7	4,139.10	101.3
市扱い	2,452.17	94.5	2,654.61	99.1	2,452.74	103.1
許可業者	1,489.82	100.6	1,524.73	100.9	1,465.56	103.3
直接搬入	93.84	78.4	141.14	100.0	220.80	76.6
不燃ごみ	463.62	103.1	451.95	94.4	404.15	100.0
市扱い	292.43	101.5	290.95	91.4	247.79	96.7
許可業者	165.01	108.4	152.74	100.0	150.36	107.2
直接搬入	6.18	66.7	8.26	105.1	6.00	78.2
粗大ごみ	4.29	133.2	2.86	79.4	2.99	101.0
市扱い	4.29	133.2	2.86	79.4	2.99	101.0
ビン類	80.73	101.9	81.91	90.6	77.80	101.5
市扱い	80.73	101.9	81.91	90.6	77.80	101.5
許可業者	－	－	－	－	－	－
ペットボトル	28.26	106.4	31.48	92.7	34.19	101.9
市扱い	28.26	106.4	31.48	92.7	34.19	101.9
プラスチック製容器包装	129.14	99.2	127.07	88.3	118.80	96.8
市扱い	129.14	99.2	127.07	88.3	118.80	96.8
許可業者	―	―	―	―	―	―
缶類	―	―	―	―	―	―
市扱い	―	―	―	―	―	―
許可業者	―	―	―	―	―	―
古紙・古布	―	―	―	―	―	―
市扱い	―	―	―	―	―	―
家電四品目	0.32	88.9	0.59	101.7	0.66	113.8
市扱い	0.32	88.9	0.59	101.7	0.66	113.8
総搬入量						
市扱い	2,987.34	95.7	3,189.47	97.5	2,934.97	102.2
許可業者	1,654.83	101.4	1,677.47	100.8	1,615.92	103.7
直接搬入	100.02	77.6	149.40	100.3	226.80	76.7
合　計	4,742.19	97.1	5,016.34	98.7	4,777.69	101.1
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	26	2,203	27	2,344	25	2,341
許可業者搬入	26	1,171	27	1,177	25	1,096
直接搬入	26	345	27	464	25	538
合　計		3,719		3,985		3,975

（伊丹市分）　　［その2］

7月		8月		9月		10月	
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
4,372.68	97.8	4,262.40	103.3	4,351.98	106.0	4,246.55	99.2
2,603.35	97.3	2,571.48	103.1	2,630.13	108.3	2,521.21	99.4
1,554.89	100.2	1,494.21	101.6	1,527.67	102.4	1,514.21	99.9
214.44	88.1	196.71	121.6	194.18	106.4	211.13	92.9
460.48	99.3	436.73	97.8	457.39	107.3	448.37	96.4
273.10	93.6	263.31	92.1	269.68	97.1	274.02	92.9
181.34	109.8	165.91	107.2	183.21	128.0	169.43	102.8
6.04	85.4	7.51	129.5	4.50	85.1	4.92	91.1
3.32	67.5	3.66	90.1	3.24	122.7	3.75	102.5
3.32	67.5	3.66	90.1	3.24	122.7	3.75	102.5
87.19	94.4	80.88	90.5	80.19	100.2	82.31	99.7
87.19	94.4	80.88	90.5	80.19	100.2	82.31	99.7
－	－	－	－	－	－	－	－
42.84	98.3	41.52	85.8	38.35	98.0	34.88	96.5
42.84	98.3	41.52	85.8	38.35	98.0	34.88	96.5
134.59	95.8	121.55	94.4	123.15	99.8	133.02	96.8
134.59	95.8	121.55	94.4	123.15	99.8	133.02	96.8
―	―	―	―	―	―	―	－
―	―	―	―	―	―	―	－
―	―	―	―	―	―	―	－
―	―	―	―	―	―	―	－
―	―	―	―	―	―	―	－
―	―	―	―	―	―	―	－
0.28	62.2	0.18	33.3	0.58	276.2	0.61	406.7
0.28	62.2	0.18	33.3	0.58	276.2	0.61	406.7
3,144.67	96.8	3,082.58	101.0	3,145.32	106.5	3,049.80	98.7
1,736.23	101.2	1,660.12	102.2	1,710.88	104.6	1,683.64	100.2
220.48	88.1	204.22	121.9	198.68	105.8	216.05	92.9
5,101.38	97.8	4,946.92	102.1	5,054.88	105.8	4,949.49	98.9
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
27	2,507	26	2,428	26	2,477	27	2,481
27	1,193	26	1,131	26	1,172	27	1,184
27	539	26	519	26	486	27	534
	4,239		4,078		4,135		4,199

（伊丹市分）　　［その3］

	11月		12月		1月	
	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率
	(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)
可燃ごみ	3,990.80	95.1	4,630.15	101.3	3,891.33	102.7
市扱い	2,331.97	95.6	2,764.38	100.0	2,392.05	102.9
許可業者	1,420.16	99.6	1,675.28	103.1	1,412.37	103.8
直接搬入	238.67	72.5	190.49	104.6	86.91	82.8
不燃ごみ	392.03	91.4	464.31	97.5	434.81	99.2
市扱い	233.21	84.1	271.02	88.4	284.59	95.3
許可業者	152.15	104.5	186.71	114.2	143.14	106.3
直接搬入	6.67	108.3	6.58	111.1	7.08	135.4
粗大ごみ	3.45	106.2	3.62	70.6	2.22	75.0
市扱い	3.45	106.2	3.62	70.6	2.22	75.0
ビン類	68.88	93.8	77.36	97.8	103.57	102.1
市扱い	68.88	93.8	77.36	97.8	103.57	102.1
許可業者	—	—	—	—	—	—
ペットボトル	24.31	96.3	23.48	100.6	27.21	100.5
市扱い	24.31	96.3	23.48	100.6	27.21	100.5
プラスチック製容器包装	112.71	92.7	120.71	101.0	145.10	100.1
市扱い	112.71	92.7	120.71	101.0	145.10	100.1
許可業者	—	—	—	—	—	—
缶類	—	—	—	—	—	—
市扱い	—	—	—	—	—	—
許可業者	—	—	—	—	—	—
古紙・古布	—	—	—	—	—	—
市扱い	—	—	—	—	—	—
家電四品目	0.09	14.3	0.61	217.9	0.26	50.0
市扱い	0.09	14.3	0.61	217.9	0.26	50.0
総搬入量						
市扱い	2,774.62	94.3	3,261.18	98.8	2,955.00	101.9
許可業者	1,572.31	100.0	1,861.99	104.1	1,555.51	104.1
直接搬入	245.34	73.2	197.07	104.8	93.99	85.3
合　計	4,592.27	94.7	5,320.24	100.8	4,604.50	102.2
	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数
市扱い搬入	25	2,187	25	2,359	24	2,158
許可業者搬入	25	1,099	27	1,238	24	1,057
直接搬入	25	564	24	522	22	257
合　計		3,850		4,119		3,472

（伊丹市分）　　［その4］

2月		3月		合計		暦日平均搬入量(t)	搬入日平均搬入量(t)
搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率	搬入量	対前年比率		
(t)	(%)	(t)	(%)	(t)	(%)		
3,431.85	100.3	4,043.90	101.7	49,717.05	100.3	136.21	160.38
2,039.25	99.8	2,416.38	104.2	29,829.72	100.5	81.73	96.85
1,299.82	100.5	1,560.70	100.3	17,939.42	101.4	49.15	57.87
92.78	108.7	66.82	64.9	1,947.91	89.9	5.34	6.39
356.28	99.7	421.86	95.2	5,191.98	98.4	14.22	16.75
207.91	94.3	245.02	92.6	3,153.03	93.3	8.64	10.24
142.14	107.7	169.47	100.9	1,961.61	108.0	5.37	6.33
6.23	123.6	7.37	69.6	77.34	95.1	0.21	0.25
2.56	77.8	2.91	75.2	38.87	89.2	0.11	0.13
2.56	77.8	2.91	75.2	38.87	89.2	0.11	0.13
74.32	104.3	80.25	108.0	975.39	98.5	2.67	3.17
74.32	104.3	80.25	108.0	975.39	98.5	2.67	3.17
—	—	—	—	—	—	—	—
21.36	101.4	24.91	101.1	372.79	97.4	1.02	1.21
21.36	101.4	24.91	101.1	372.79	97.4	1.02	1.21
114.69	100.3	126.22	102.6	1,506.75	97.2	4.13	4.89
114.69	100.3	126.22	102.6	1,506.75	97.2	4.13	4.89
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0.09	23.1	0.40	181.8	4.67	95.1	0.01	0.02
0.09	23.1	0.40	181.8	4.67	95.1	0.01	0.02
2,460.18	99.4	2,896.09	103.1	35,881.22	99.6	98.30	116.50
1,441.96	101.2	1,730.17	100.4	19,901.03	102.0	54.52	64.20
99.01	109.6	74.19	65.4	2,025.25	90.0	5.55	6.64
4,001.15	100.3	4,700.45	101.2	57,807.50	100.0	158.38	186.48
搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	搬入日数	搬入台数	暦日平均搬入台数	搬入日平均搬入台数
24	1,990	26	2,197	308	27,672	76	90
24	1,026	26	1,149	310	13,693	38	44
24	282	26	291	305	5,341	15	18
	3,298		3,637		46,706	128	151

3. ごみ搬入量の経年変化

3－1. 両市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	可燃ごみ (t)	可燃ごみ 指数	不燃・粗大・資源ごみ (t)	不燃・粗大・資源ごみ 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数	総搬入量 前年度比(%)
7	225,769.12	100.0	33,704.89	100.0	259,474.01	100.0	
8	208,147.11	92.2	31,573.80	93.7	239,720.91	92.4	92.4
9	210,295.27	93.1	30,854.57	91.5	241,149.84	92.9	100.6
10	208,417.72	92.3	30,594.55	90.8	239,012.27	92.1	99.1
11	207,933.60	92.1	30,421.13	90.3	238,354.73	91.9	99.7
12	208,327.37	92.3	32,266.45	95.7	240,593.82	92.7	100.9
13	205,876.02	91.2	30,415.19	90.2	236,291.21	91.1	98.2
14	202,921.78	89.9	30,044.98	89.1	232,966.76	89.8	98.6
15	196,259.56	86.9	30,546.30	90.6	226,805.86	87.4	97.4
16	188,327.73	83.4	30,252.67	89.8	218,580.40	84.2	96.4
17	182,419.59	80.8	29,731.66	88.2	212,151.25	81.8	97.1
18	181,105.87	80.2	29,672.75	88.0	210,778.62	81.2	99.4
19	164,926.69	73.1	27,111.39	80.4	192,038.08	74.0	91.1
20	158,016.80	70.0	26,838.61	79.6	184,855.41	71.2	96.3
21	151,440.62	67.1	27,197.83	80.7	178,638.45	68.8	96.6
22	148,333.78	65.7	27,710.87	82.2	176,044.65	67.8	98.5
23	149,429.88	66.2	27,897.99	82.8	177,327.87	68.3	100.7
24	152,702.12	67.6	23,311.26	69.2	176,013.38	67.8	99.3
25	151,226.81	67.0	22,047.68	65.4	173,274.49	66.8	98.4
26	149,634.39	66.3	21,259.26	63.1	170,893.65	65.9	98.6

※ 平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

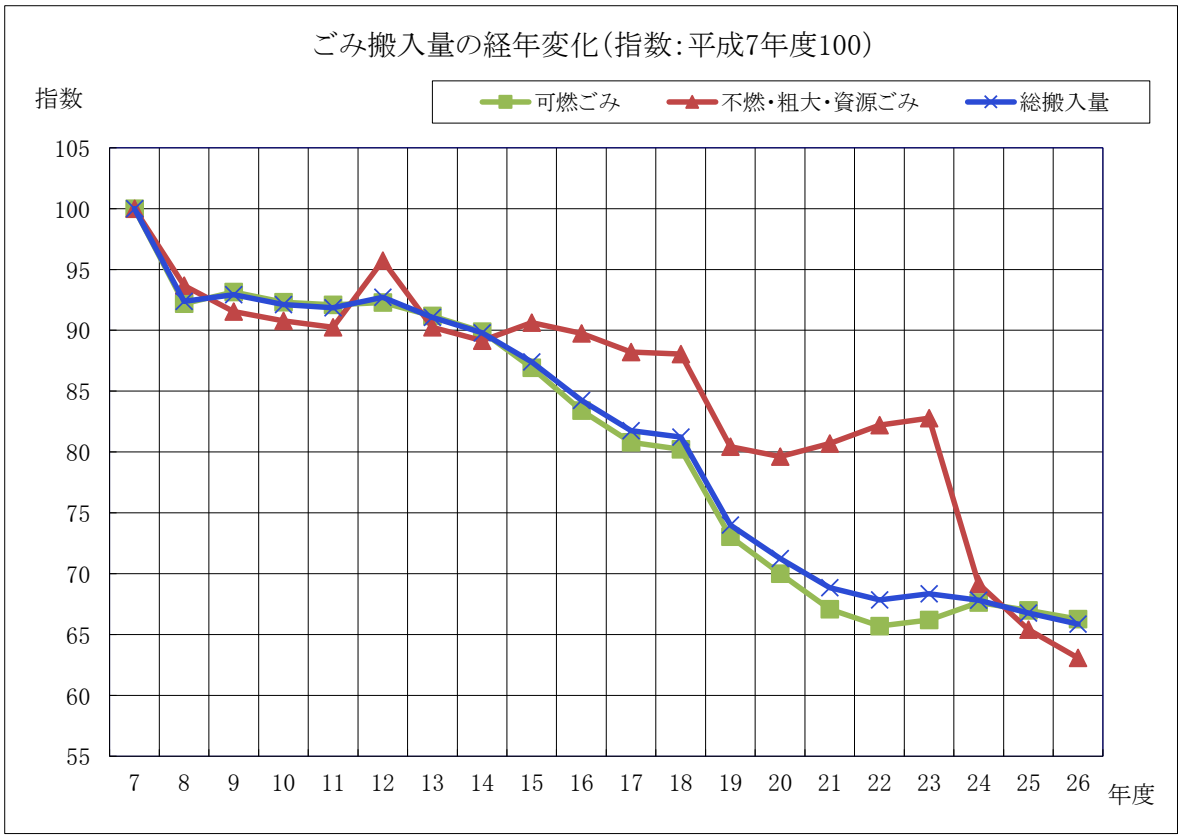

3－2. 豊中市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	可燃ごみ (t)	可燃ごみ 指数	不燃・粗大・資源ごみ (t)	不燃・粗大・資源ごみ 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数	総搬入量 前年度比(%)
17	118,892.73	100.0	19,044.58	100.0	137,937.31	100.0	
18	120,462.38	101.3	19,364.22	101.7	139,826.60	101.4	101.4
19	111,338.98	93.6	17,530.50	92.0	128,869.48	93.4	92.2
20	106,942.23	89.9	17,398.26	91.4	124,340.49	90.1	96.5
21	102,333.64	86.1	17,477.49	91.8	119,811.13	86.9	96.4
22	100,120.86	84.2	17,776.17	93.3	117,897.03	85.5	98.4
23	100,437.46	84.5	18,115.62	95.1	118,553.08	85.9	100.6
24	102,780.86	86.4	14,773.03	77.6	117,553.89	85.2	99.2
25	101,679.03	85.5	13,802.25	72.5	115,481.28	83.7	98.2
26	99,917.34	84.0	13,173.48	69.2	113,090.82	82.0	97.9

※ 家電四品目の搬入量は含まない。

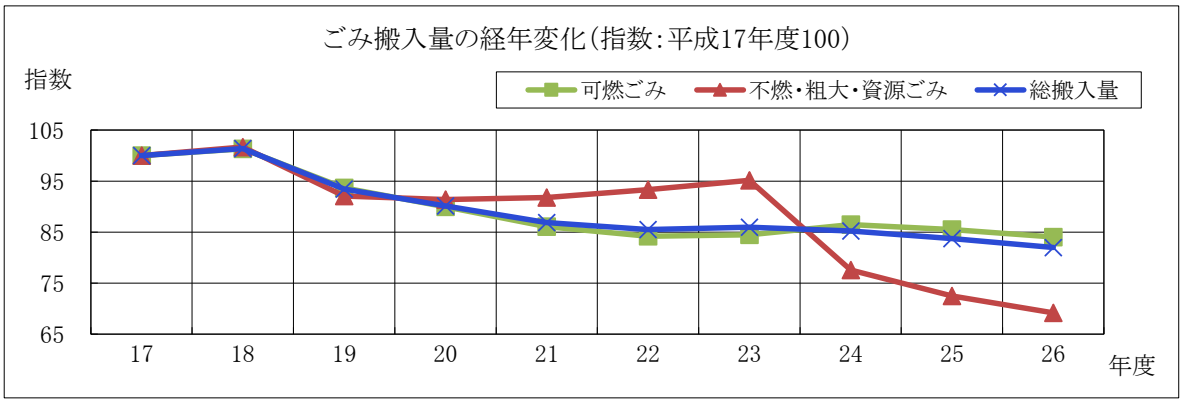

3－3. 伊丹市ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	可燃ごみ (t)	可燃ごみ 指数	不燃・粗大・資源ごみ (t)	不燃・粗大・資源ごみ 指数	総搬入量 (t)	総搬入量 指数	総搬入量 前年度比(%)
17	63,526.86	100.0	10,687.08	100.0	74,213.94	100.0	
18	60,643.49	95.5	10,308.53	96.5	70,952.02	95.6	95.6
19	53,587.71	84.4	9,580.89	89.6	63,168.60	85.1	89.0
20	51,074.57	80.4	9,440.35	88.3	60,514.92	81.5	95.8
21	49,106.98	77.3	9,720.34	91.0	58,827.32	79.3	97.2
22	48,212.92	75.9	9,934.70	93.0	58,147.62	78.4	98.8
23	48,992.42	77.1	9,782.37	91.5	58,774.79	79.2	101.1
24	49,921.26	78.6	8,538.23	79.9	58,459.49	78.8	99.5
25	49,547.78	78.0	8,245.43	77.2	57,793.21	77.9	98.9
26	49,717.05	78.3	8,085.78	75.7	57,802.83	77.9	100.0

※ 家電四品目の搬入量は含まない。

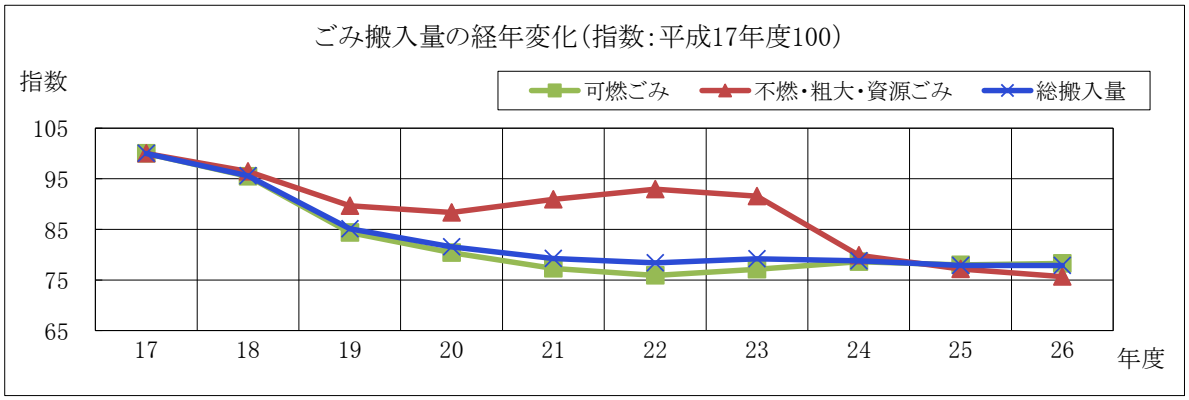

3－4. 両市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市　扱　い		許可業者		直接搬入		総 搬 入 量	
	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数
7	175,064.05	100.0	75,661.21	100.0	8,748.75	100.0	259,474.01	100.0
8	152,231.45	87.0	77,755.48	102.8	9,733.98	111.3	239,720.91	92.4
9	150,501.64	86.0	80,313.59	106.1	10,334.61	118.1	241,149.84	92.9
10	147,630.23	84.3	80,509.50	106.4	10,872.54	124.3	239,012.27	92.1
11	147,290.41	84.1	80,157.14	105.9	10,907.18	124.7	238,354.73	91.9
12	148,598.01	84.9	82,389.97	108.9	9,605.84	109.8	240,593.82	92.7
13	144,438.65	82.5	81,534.28	107.8	10,318.28	117.9	236,291.21	91.1
14	139,502.39	79.7	82,918.69	109.6	10,545.68	120.5	232,966.76	89.8
15	130,377.85	74.5	84,057.55	111.1	12,370.46	141.4	226,805.86	87.4
16	125,664.38	71.8	80,960.90	107.0	11,955.12	136.6	218,580.40	84.2
17	123,476.36	70.5	76,142.32	100.6	12,532.57	143.2	212,151.25	81.8
18	123,197.61	70.4	71,474.82	94.5	16,106.19	184.1	210,778.62	81.2
19	116,586.98	66.6	64,763.28	85.6	10,687.82	122.2	192,038.08	74.0
20	113,688.60	64.9	60,403.98	79.8	10,762.83	123.0	184,855.41	71.2
21	111,715.19	63.8	56,338.86	74.5	10,584.40	121.0	178,638.45	68.8
22	110,054.80	62.9	55,240.82	73.0	10,749.03	122.9	176,044.65	67.8
23	110,572.93	63.2	55,860.40	73.8	10,894.54	124.5	177,327.87	68.3
24	109,534.31	62.6	56,254.70	74.4	10,224.37	116.9	176,013.38	67.8
25	108,717.06	62.1	56,149.24	74.2	8,408.19	96.1	173,274.49	66.8
26	107,454.98	61.4	55,846.73	73.8	7,591.94	86.8	170,893.65	65.9

※ 平成13年度より家電四品目の搬入量は含まない。

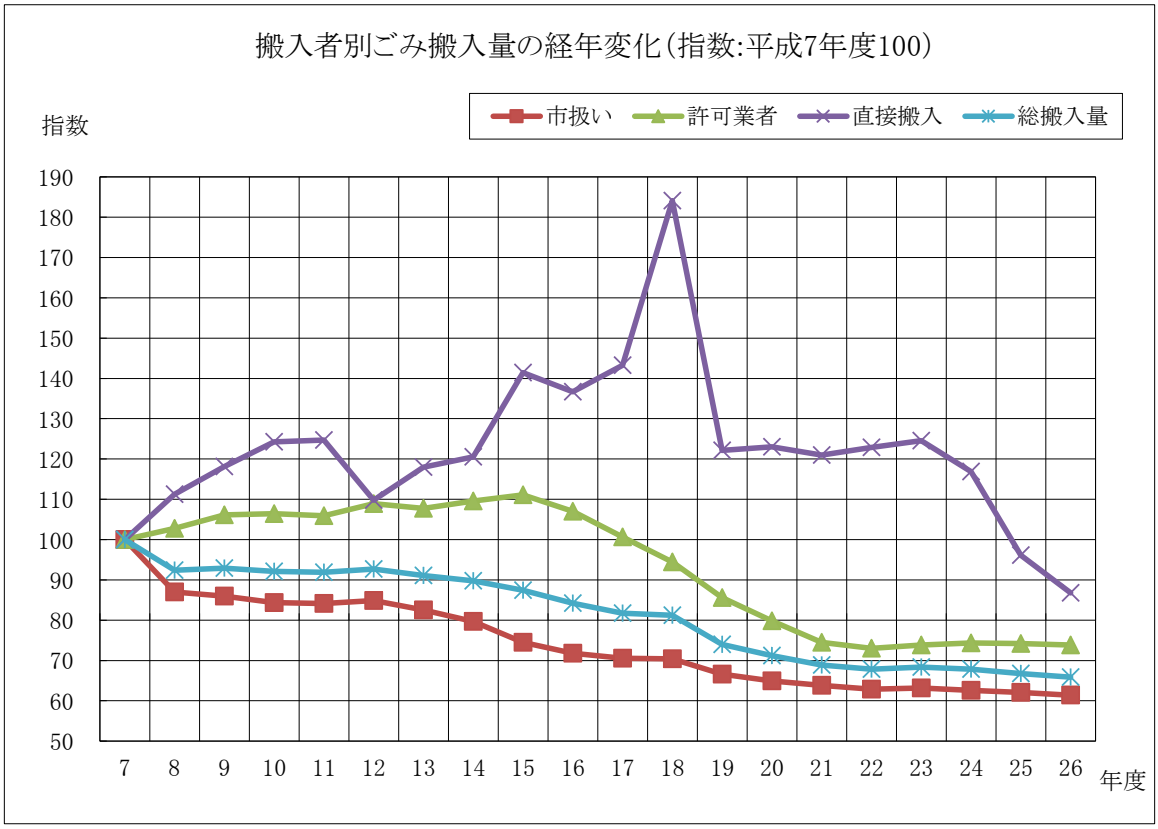

3－5. 豊中市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市　扱　い		許可業者		直接搬入		総 搬 入 量	
	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数
17	81,499.74	100.0	48,003.06	100.0	8,434.51	100.0	137,937.31	100.0
18	82,083.96	100.7	46,618.32	97.1	11,124.32	131.9	139,826.60	101.4
19	77,776.53	95.4	44,167.11	92.0	6,925.84	82.1	128,869.48	93.4
20	75,742.54	92.9	41,347.00	86.1	7,250.95	86.0	124,340.49	90.1
21	74,542.57	91.5	38,144.48	79.5	7,124.08	84.5	119,811.13	86.9
22	73,517.30	90.2	37,244.12	77.6	7,135.61	84.6	117,897.03	85.5
23	73,833.51	90.6	37,230.85	77.6	7,488.72	88.8	118,553.08	85.9
24	73,025.66	89.6	37,208.02	77.5	7,320.21	86.8	117,553.89	85.2
25	72,689.08	89.2	36,633.25	76.3	6,158.95	73.0	115,481.28	83.7
26	71,578.43	87.8	35,945.70	74.9	5,566.69	66.0	113,090.82	82.0

※ 家電四品目の搬入量は含まない。

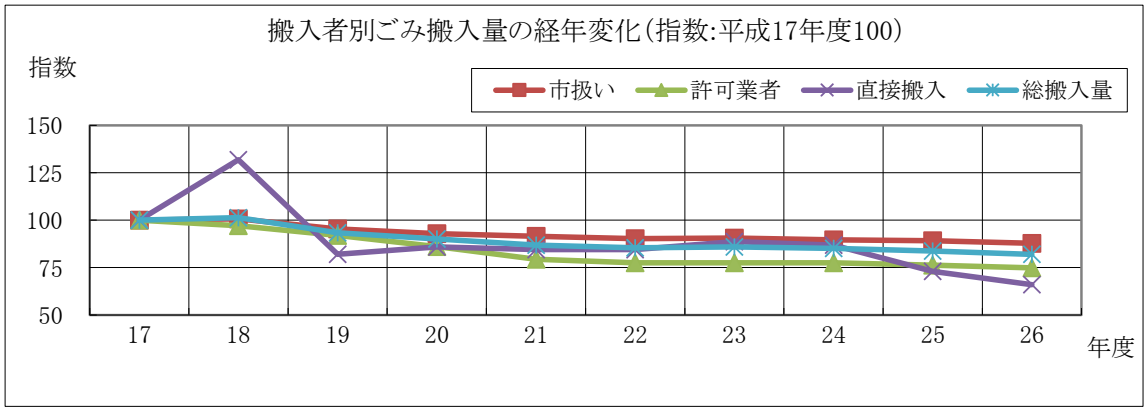

3－6. 伊丹市の搬入者別ごみ搬入量の経年変化

区分 / 年度	市　扱　い		許可業者		直接搬入		総 搬 入 量	
	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数	(t)	指数
17	41,976.62	100.0	28,139.26	100.0	4,098.06	100.0	74,213.94	100.0
18	41,113.65	97.9	24,856.50	88.3	4,981.87	121.6	70,952.02	95.6
19	38,810.45	92.5	20,596.17	73.2	3,761.98	91.8	63,168.60	85.1
20	37,946.06	90.4	19,056.98	67.7	3,511.88	85.7	60,514.92	81.5
21	37,172.62	88.6	18,194.38	64.7	3,460.32	84.4	58,827.32	79.3
22	36,537.50	87.0	17,996.70	64.0	3,613.42	88.2	58,147.62	78.4
23	36,739.42	87.5	18,629.55	66.2	3,405.82	83.1	58,774.79	79.2
24	36,508.65	87.0	19,046.68	67.7	2,904.16	70.9	58,459.49	78.8
25	36,027.98	85.8	19,515.99	69.4	2,249.24	54.9	57,793.21	77.9
26	35,876.55	85.5	19,901.03	70.7	2,025.25	49.4	57,802.83	77.9

※ 家電四品目の搬入量は含まない。

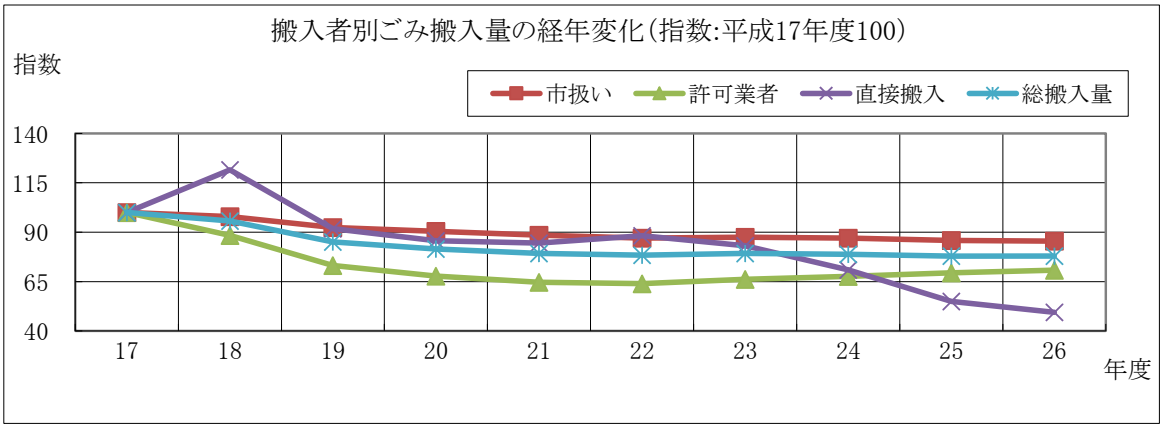

4. ご　み　質

4－1. 可燃ごみの物理組成（重量％・WET基準）

(WET：%)

物理組成 ＼ 月日		5月1日	7月14日	10月20日	1月16日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	52.6	58.1	45.4	45.2	50.3
	植物性厨芥	20.6	14.0	23.4	29.5	21.9
	動物性厨芥	1.9	1.2	2.6	0.3	1.5
	卵殻・骨類	1.0	0.2	0.9	0.4	0.6
	木・竹類	1.1	3.3	0.9	0.4	1.4
	草・わら類	1.9	1.3	2.2	0.8	1.6
	繊維類	4.0	5.1	7.4	1.9	4.6
	プラスチック類	3.0	8.5	7.9	7.0	6.6
	プラスチック製容器包装・PETボトル	9.3	6.9	8.1	9.4	8.4
	ゴム類	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2
	皮革類	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2
	その他（細塵）	2.5	0.8	0.5	3.0	1.7
可燃物計		98.7	99.5	99.7	98.0	99.0
焼却不適物	金属類	0.7	0.3	0.2	1.6	0.7
	ガラス・陶器類	0.5	0.2	0.1	0.4	0.3
	土・石塊類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		1.3	0.5	0.3	2.0	1.0
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－2. 可燃ごみの物理組成（重量％・DRY基準）

(DRY:%)

物理組成 ＼ 月日		5月1日	7月14日	10月20日	1月16日	平均値
可燃物	紙・セロファン類	60.1	61.6	46.9	46.4	53.7
	植物性厨芥	7.4	3.2	9.1	13.1	8.2
	動物性厨芥	0.8	0.8	2.6	0.3	1.1
	卵殻・骨類	1.3	0.2	1.2	0.6	0.8
	木・竹類	1.0	3.7	1.3	0.6	1.7
	草・わら類	1.0	1.9	3.4	0.7	1.8
	繊維類	5.7	7.8	12.3	3.2	7.3
	プラスチック類	3.8	10.6	10.0	12.3	9.2
	プラスチック製容器包装・PETボトル	13.7	8.8	11.2	16.0	12.4
	ゴム類	0.0	0.1	0.7	0.1	0.2
	皮革類	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3
	その他（細塵）	2.1	0.7	0.5	3.1	1.6
可燃物計		98.1	99.4	99.2	96.4	98.3
焼却不適物	金属類	0.9	0.3	0.6	2.9	1.2
	ガラス・陶器類	0.9	0.3	0.2	0.7	0.5
	土・石塊類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
焼却不適物計		1.9	0.6	0.8	3.6	1.7
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4－3. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

（WET：%）

物理組成＼年度		19	20	21	22	23
可燃物	紙・セロファン類	47.3	36.5	42.8	36.6	44.9
	植物性厨芥	26.4	30.2	25.8	34.2	29.6
	動物性厨芥	1.5	4.0	1.3	2.3	1.3
	卵殻・骨類	1.1	0.7	0.2	1.0	0.6
	木・竹類	1.0	2.0	2.4	4.7	3.0
	草・わら類	2.3	5.4	8.4	5.1	1.7
	繊維類	3.6	2.8	5.5	4.4	5.3
	その他（細塵）	0.9	1.6	1.0	1.5	1.0
可燃物計		84.1	83.2	87.4	89.8	87.4
焼却不適物	プラスチック類	13.9	14.8	11.9	9.5	11.0
	ゴム類	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
焼却不適物計		14.0	15.2	12.0	9.7	11.4
焼却不適物＋可燃物合計		98.1	98.4	99.4	99.5	98.8
不燃物	金属類	1.2	0.7	0.2	0.3	0.7
	ガラス・陶器類	0.5	0.7	0.3	0.1	0.1
	土・石塊類	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4
不燃物合計		1.9	1.6	0.6	0.5	1.2
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

物理組成＼年度		24	25	26
可燃物	紙・セロファン類	45.7	44.7	50.3
	植物性厨芥	26.6	21.8	21.9
	動物性厨芥	0.5	2.0	1.5
	卵殻・骨類	0.6	1.0	0.6
	木・竹類	2.7	2.9	1.4
	草・わら類	1.5	5.1	1.6
	繊維類	4.7	5.4	4.6
	プラスチック類	6.1	5.5	6.6
	プラスチック製容器包装・PETボトル	8.1	8.2	8.4
	ゴム類	0.0	0.1	0.2
	皮革類	0.1	0.5	0.2
	その他（細塵）	1.7	2.1	1.7
可燃物計		98.3	99.3	99.0
焼却不適物	金属類	1.2	0.6	0.7
	ガラス・陶器類	0.2	0.1	0.3
	土・石塊類	0.3	0.0	0.0
焼却不適物合計		1.7	0.7	1.0
総合計		100.0	100.0	100.0

4－4. 可燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・DRY基準）

（DRY：%）

物理組成＼年度		19	20	21	22	23
可燃物	紙・セロファン類	55.6	43.2	51.9	45.1	50.7
	植物性厨芥	11.6	16.9	10.5	17.9	15.8
	動物性厨芥	1.0	2.8	0.8	1.8	1.1
	卵殻・骨類	1.4	1.0	0.2	1.4	0.9
	木・竹類	1.4	2.7	3.1	6.1	3.1
	草・わら類	1.6	3.4	7.8	3.1	0.8
	繊維類	5.1	4.1	7.0	7.0	8.1
	その他（細塵）	0.8	1.7	1.2	2.0	1.0
可燃物計		78.5	75.8	82.5	84.4	81.5
焼却不適物	プラスチック類	18.1	20.4	16.4	14.3	15.8
	ゴム類	0.2	0.7	0.2	0.4	0.3
	皮革類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
焼却不適物計		18.3	21.1	16.6	14.7	16.5
焼却不適物＋可燃物合計		96.8	96.9	99.1	99.1	98.0
不燃物	金属類	1.9	1.3	0.3	0.6	1.3
	ガラス・陶器類	1.0	1.4	0.4	0.1	0.2
	土・石塊類	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5
不燃物合計		3.2	3.1	0.9	0.9	2.0
総合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

物理組成＼年度		24	25	26
可燃物	紙・セロファン類	48.0	49.0	53.7
	植物性厨芥	13.2	10.5	8.2
	動物性厨芥	0.4	1.9	1.1
	卵殻・骨類	0.8	1.1	0.8
	木・竹類	3.1	2.8	1.7
	草・わら類	0.8	2.9	1.8
	繊維類	7.1	8.3	7.3
	プラスチック類	9.0	7.8	9.2
	プラスチック製容器包装・PETボトル	12.8	11.6	12.4
	ゴム類	0.0	0.1	0.2
	皮革類	0.1	0.7	0.3
	その他（細塵）	2.0	2.1	1.6
可燃物計		97.3	98.8	98.3
焼却不適物	金属類	2.0	0.9	1.2
	ガラス・陶器類	0.3	0.2	0.5
	土・石塊類	0.4	0.1	0.0
焼却不適物合計		2.7	1.2	1.7
総合計		100.0	100.0	100.0

※ 4－3、4－4 とも平成24年度より分別収集および受入形態変更に伴い区分変更

4－5. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ（重量%・WET基準）

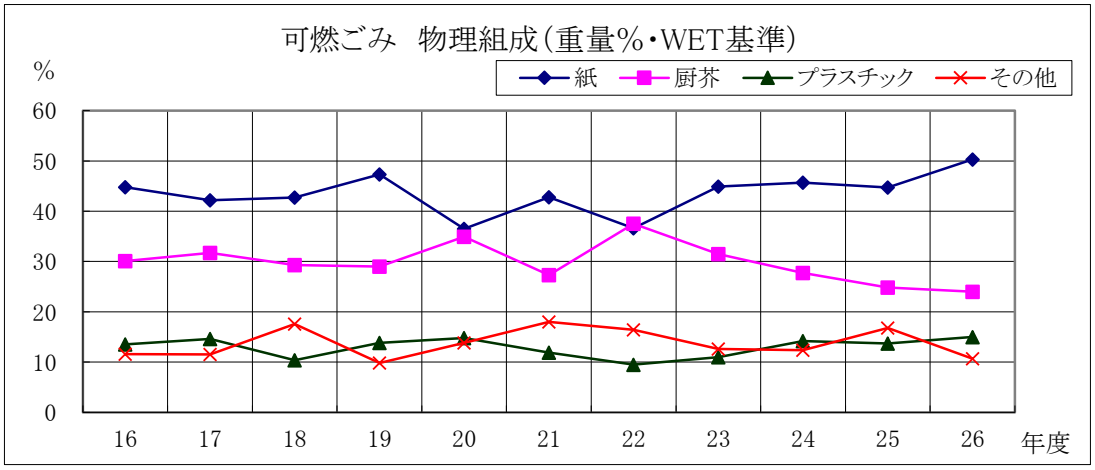

項目＼年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
紙	44.8	42.2	42.7	47.3	36.5	42.8	36.6	44.9	45.7	44.7	50.3
厨　　芥	30.1	31.7	29.3	29.0	34.9	27.3	37.5	31.5	27.7	24.8	24.0
プ ラ ス チ ッ ク （内プラスチック製容器包装・PETボトル）	13.5	14.6	10.4	13.9	14.8	11.9	9.5	11.0	14.2 (8.1)	13.7 (8.2)	15.0 (8.4)
そ　の　他	11.6	11.5	17.6	9.8	13.8	18.0	16.4	12.6	12.4	16.8	10.7

4－6. 可燃ごみの物理組成の経年変化グラフ(重量%・DRY基準)

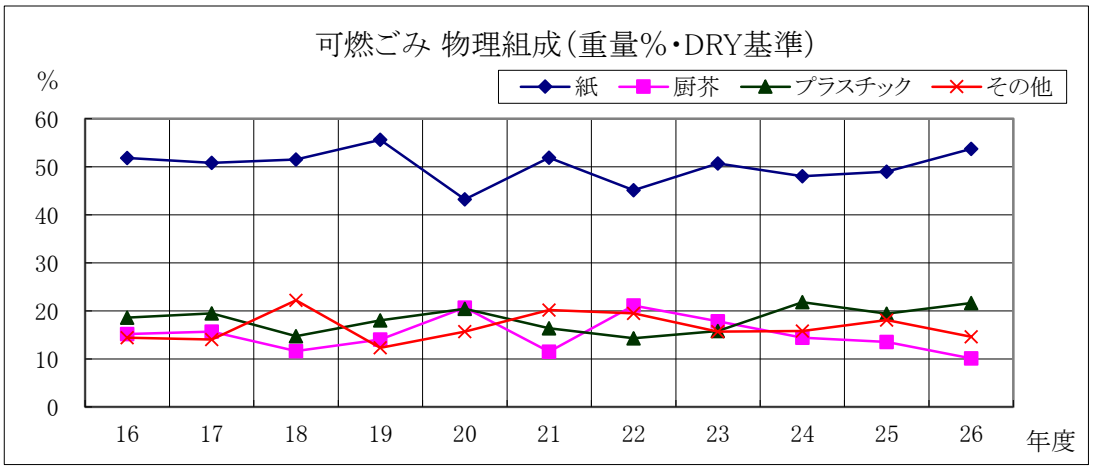

項目＼年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
紙	51.8	50.8	51.5	55.6	43.2	51.9	45.1	50.7	48.0	49.0	53.7
厨　　芥	15.2	15.7	11.6	14.0	20.7	11.5	21.1	17.8	14.4	13.5	10.1
プ ラ ス チ ッ ク （内プラスチック製容器包装・PETボトル）	18.6	19.5	14.7	18.1	20.4	16.4	14.3	15.8	21.8 (12.8)	19.4 (11.6)	21.6 (12.4)
そ　の　他	14.4	14.0	22.2	12.3	15.7	20.2	19.5	15.7	15.8	18.1	14.6

4－7. 可燃ごみの見掛比重・ごみ質・低位発熱量

項目 ＼ 月日			5月1日	7月14日	10月20日	1月16日	平均値
見掛比重 t/m³			0.169	0.136	0.152	0.156	0.153
ごみ質	可燃分(B) %	プラスチック(Xpl)%	17.8	19.5	21.4	29.4	22.0
		プラスチック以外(Xpa)%	82.2	80.5	78.6	70.6	78.0
			51.9	53.8	48.1	43.1	49.2
	灰分(a)%		9.4	4.0	4.0	7.3	6.2
	水分(W)%		38.7	42.2	47.9	49.6	44.6
低位発熱量 MJ/kg	(1)三成分法による発熱量		8.79	9.08	7.87	6.87	8.15
	(2)ボンブ法による発熱量		9.46	10.00	9.08	7.87	9.10
	(3)四成分法による発熱量		10.47	10.97	9.71	9.17	10.08
	(4)熱精算法による発熱量		11.33	10.33	10.34	9.98	10.50

※ (1)(45×B－6×W)kcal/kg をMJ/kgに換算
(2)実測発熱量
(3){(88.45×Xpl＋45×Xpa)×B/100－6×W}kcal/kgをMJ/kgに換算
(4)1～4号炉における熱精算法による日平均(運転状況)

4－8. ごみの三成分(可燃分・灰分・水分)の経年変化(%)

区分 ＼ 年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
可燃分	47.8	48.5	48.0	46.3	39.5	56.0	39.9	41.1	46.0	50.9	49.2
灰分	5.3	5.1	7.7	5.8	5.8	6.3	4.9	6.1	5.6	5.0	6.2
水分	46.9	46.4	44.3	47.9	54.7	37.7	55.2	52.8	48.4	44.1	44.6

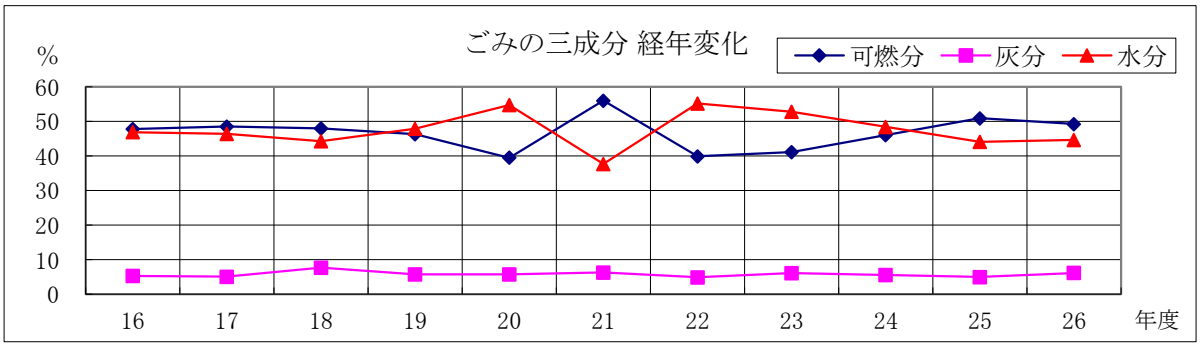

4－9. 可燃ごみの低位発熱量の経年変化(MJ／kg)

区分 ＼ 年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ボンブ法	9.36	9.84	9.09	8.73	6.62	9.97	7.00	7.35	9.03	9.77	9.10
三成分法	7.82	7.98	7.92	7.52	6.07	9.61	6.14	6.43	7.47	8.49	8.15

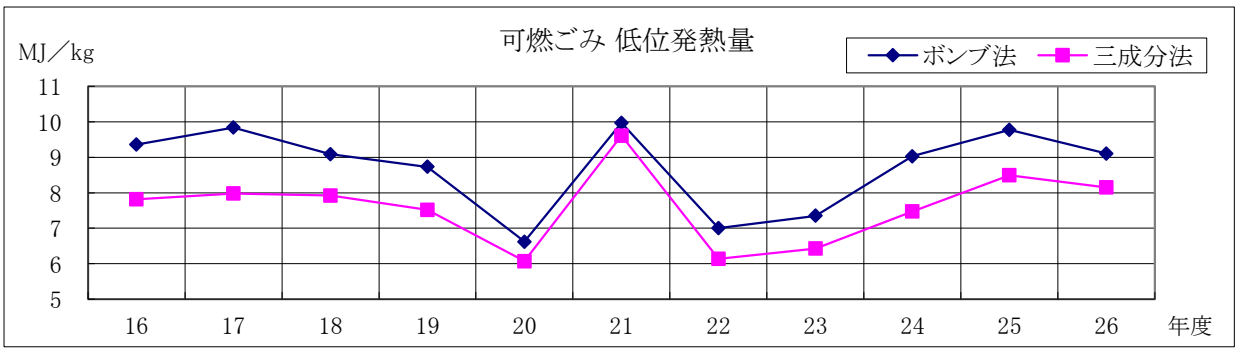

4－10. 不燃ごみの物理組成（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 月 日		5月20日	8月19日	11月18日	2月17日	平均値
可燃物	プラスチック類	31.2	37.6	24.6	33.0	31.6
	その他可燃物	7.0	21.7	6.5	9.7	11.2
可燃物計		38.2	59.3	31.1	42.7	42.8
不燃物	鉄類	9.9	19.9	35.7	16.5	20.5
	非鉄金属類	1.3	2.2	10.9	1.5	4.0
	ガラス類	34.7	9.9	7.6	20.1	18.1
	陶磁器・土・石塊	15.9	8.7	14.7	19.2	14.6
不燃物計		61.8	40.7	68.9	57.3	57.2
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

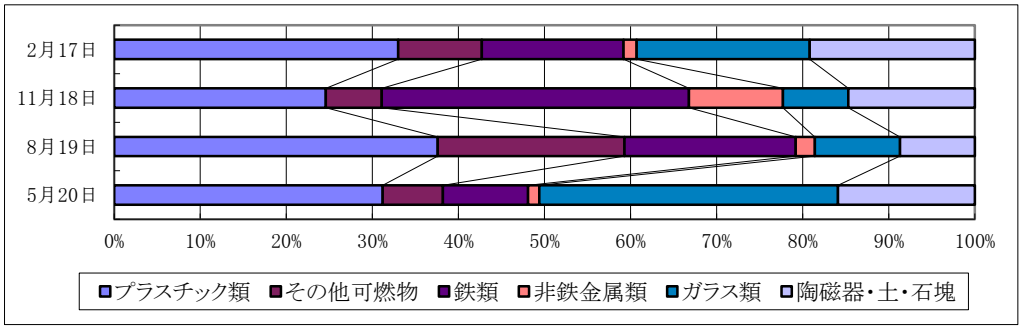

4－11. 不燃ごみの物理組成の経年変化（重量%・WET基準）

物理組成 ＼ 年 度		22	23	24	25	26
可燃物	プラスチック類	34.2	45.2	34.8	31.9	31.6
	ゴム・皮革類	3.1	1.8	0.0	0.0	0.0
	紙類・その他可燃物	15.9	13.5	11.9	6.1	11.2
	細塵・その他	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
可燃物計		53.6	61.0	46.7	38.0	42.8
不燃物	鉄類	18.2	14.2	17.6	39.0	20.5
	非鉄金属類	4.4	4.8	2.9	7.4	4.0
	ガラス類	20.3	16.2	17.3	7.6	18.1
	陶磁器・土・石塊	3.5	3.8	15.5	8.0	14.6
不燃物計		46.4	39.0	53.3	62.0	57.2
合計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

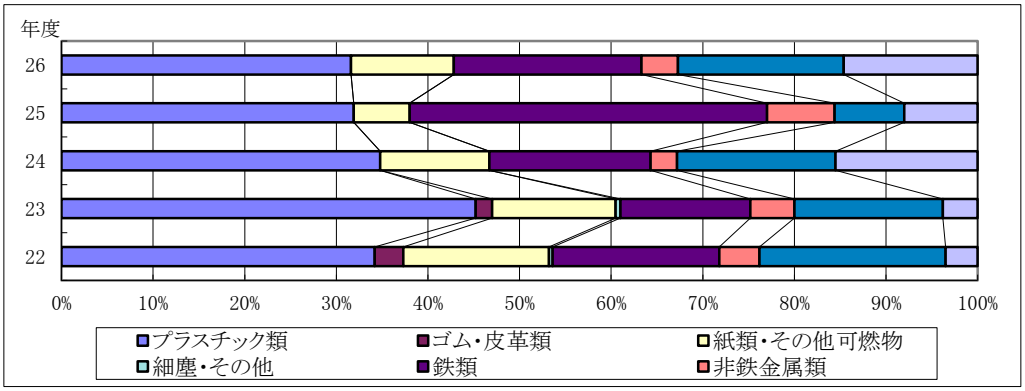

Ⅱ. ごみ焼却施設処理状況

1. 焼却対象ごみ量の経年変化

1－1. 焼却対象ごみ量及び焼却量の経年変化

区分	焼却対象ごみ量					焼却量		
年度	可燃ごみ搬入量（注1、2）	リサイクルプラザ/粗大選別可燃物（注3）	計	指数	暦日平均	焼却実績量	指数	暦日平均
	(t)	(t)	(t)	(-)	(t)	(t)	(-)	(t)
7	225,769.12	13,065.90	238,835.02	100.0	653	225,481.22	100.0	616
8	208,147.11	13,364.20	221,511.31	92.7	607	211,344.65	93.7	579
9	210,295.27	13,117.00	223,412.27	93.5	612	216,633.90	96.1	594
10	208,339.32	12,372.20	220,711.52	92.4	605	219,147.59	97.2	600
11	207,858.02	13,383.20	221,241.22	92.6	604	216,929.84	96.2	593
12	208,259.28	14,492.90	222,752.18	93.3	610	218,100.91	96.7	598
13	205,803.06	13,491.90	219,294.96	91.8	601	215,930.21	95.8	592
14	202,855.84	12,640.50	215,496.34	90.2	590	210,631.86	93.4	577
15	196,203.76	12,028.70	208,232.46	87.2	569	207,471.75	92.0	567
16	188,276.59	12,007.70	200,284.29	83.9	549	204,441.12	90.7	560
17	182,363.91	12,668.30	195,032.21	81.7	534	195,784.52	86.8	536
18	181,037.35	13,460.80	194,498.15	81.4	533	196,246.13	87.0	538
19	164,860.19	12,627.20	177,487.39	74.3	485	180,523.54	80.1	493
20	157,935.75	12,826.10	170,761.85	71.5	468	173,770.96	77.1	476
21	151,337.09	13,573.46	164,910.55	69.0	452	167,728.90	74.4	460
22	148,231.62	14,328.10	162,559.72	68.1	445	164,992.31	73.2	452
23	149,317.45	14,470.66	163,788.11	68.6	448	169,789.24	75.3	464
24	152,420.03	7,733.00	160,153.03	67.1	439	160,783.75	71.3	441
25	150,946.91	7,280.16	158,227.07	66.2	433	159,483.97	70.7	437
26	149,387.46	7,190.59	156,578.05	65.6	429	158,867.22	70.5	435

※ 平成10年度以降は、リサイクルボックスに投入された紙類を含まない。

※ 平成24年度以降はリサイクルプラザにおける剪定枝チップ分を含まない。

※ 平成23年度までは粗大選別可燃物、平成24年度以降はリサイクルプラザ選別可燃物。

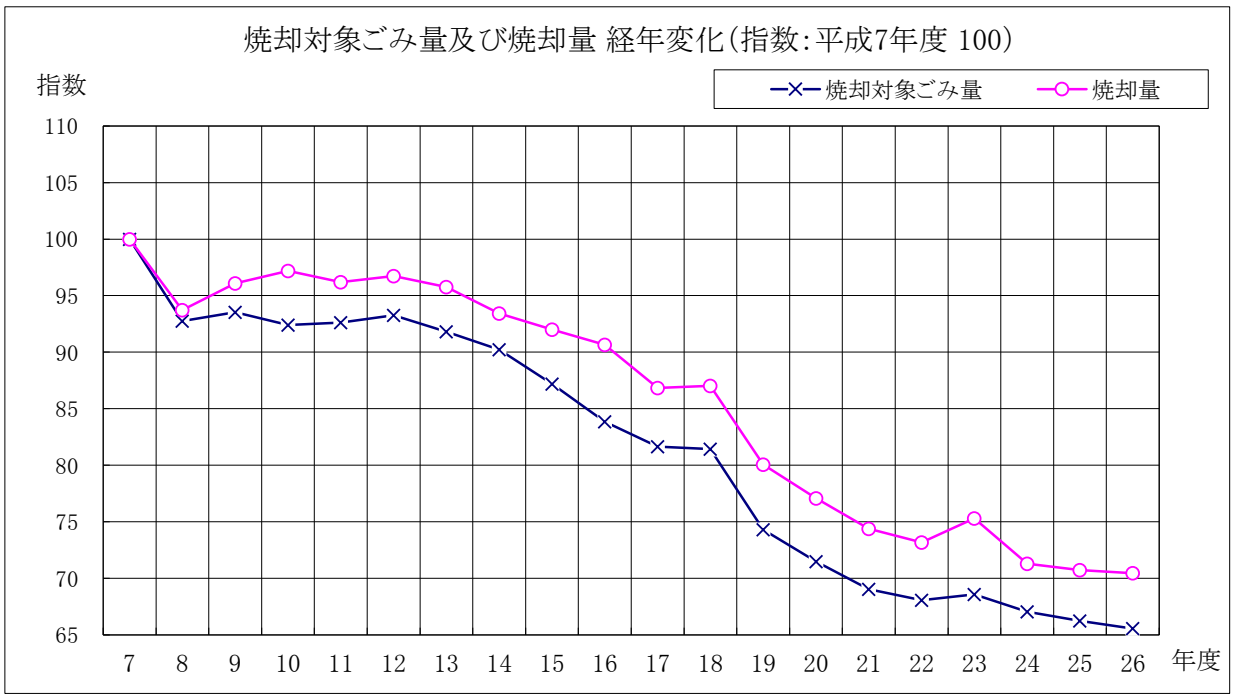

1－2. 月別焼却対象ごみ量の経年変化

年度 / 月	26年度		25年度		24年度		23年度		22年度	
	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)	焼却対象ごみ量(t)	暦日平均(t)
4	12,913.00	430	13,626.09	454	13,090.02	436	12,823.42	427	13,292.44	443
5	13,617.66	439	13,834.78	446	14,146.08	456	14,551.52	469	13,954.80	450
6	12,955.78	432	12,888.20	430	13,443.58	448	14,245.12	475	13,937.61	465
7	13,671.69	441	14,078.01	454	14,026.01	452	13,722.74	443	14,586.05	471
8	12,984.71	419	13,234.94	427	13,445.42	434	14,255.18	460	14,098.66	455
9	13,560.66	452	12,998.64	433	12,659.86	422	13,691.93	456	13,171.14	439
10	13,332.80	430	13,700.21	442	14,444.95	466	13,888.56	448	13,397.58	432
11	12,352.65	412	13,095.75	437	13,811.89	460	13,691.10	456	14,162.77	472
12	14,773.55	477	14,496.80	468	14,510.89	468	15,256.81	492	14,833.91	479
1	12,515.56	404	12,555.60	405	12,704.27	410	12,838.14	414	12,673.24	409
2	10,921.15	390	10,935.87	391	11,149.67	398	11,497.64	396	11,228.81	401
3	12,978.84	419	12,782.18	412	12,720.39	410	13,325.95	430	13,222.71	427
計	156,578.05	429	158,227.07	433	160,153.03	439	163,788.11	448	162,559.72	445

※ 焼却対象ごみ量は可燃ごみ搬入量から古紙・剪定枝を除いたごみ量。

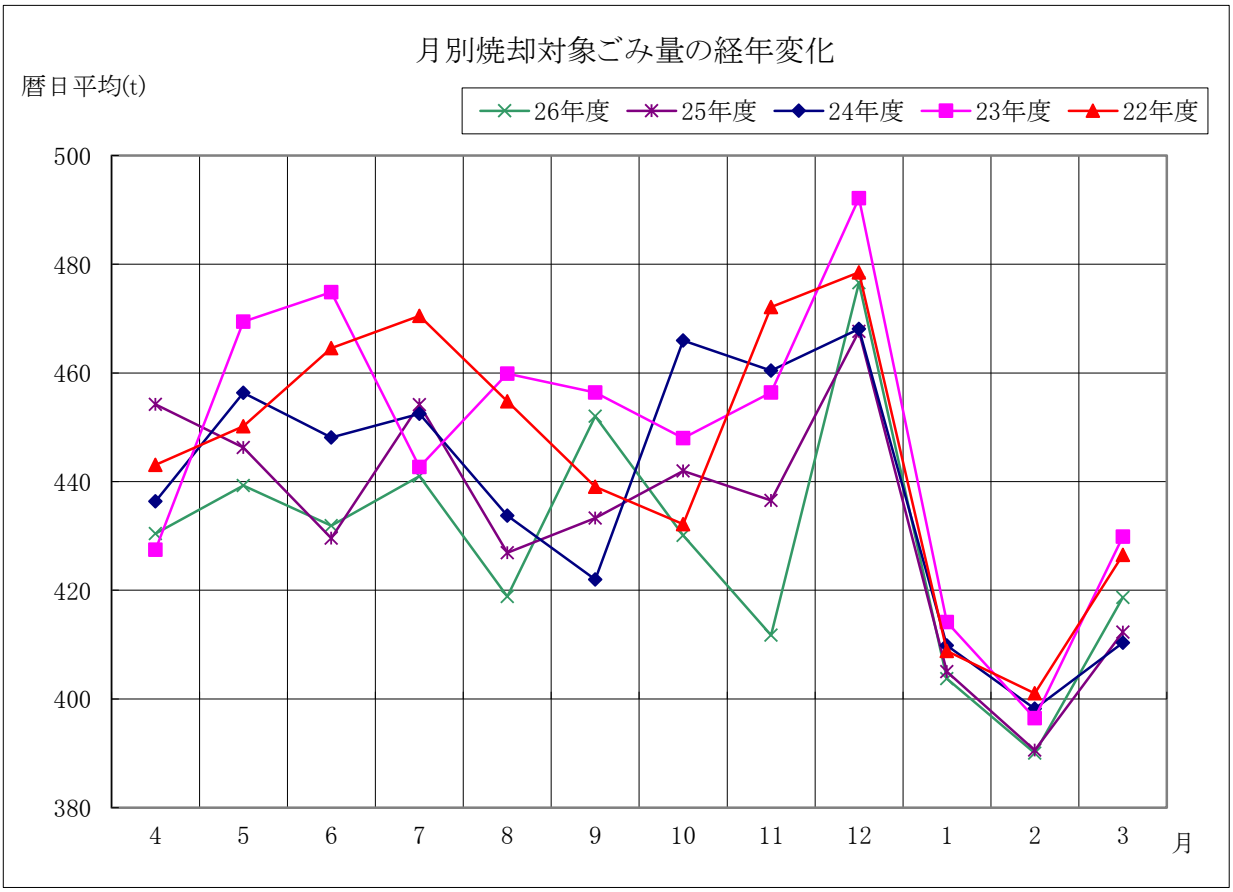

2. 焼 却 関 係

2－1. 焼却炉稼働状況（1～4号炉合計）

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均	(最大値)	炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	12,392.51	476.64	26	1,735	20	0	0	1,735	20	61	47	23	2	0	0
5	12,928.79	430.96	30	830	23	1,179	44	2,010	7	61	55	35	16	4	23
6	14,114.87	470.50	30	974	28	1,031	8	2,005	36	38	24	26	59	0	0
7	13,495.78	435.35	31	1,140	58	679	5	1,820	3	22	57	0	0	13	42
8	13,351.32	430.69	31	1,251	19	553	3	1,804	22	39	40	16	34	0	0
9	13,345.80	444.86	30	1,080	0	744	42	1,824	42	20	20	8	29	0	0
10	13,450.42	433.88	31	1,202	40	600	35	1,803	15	40	29	12	48	0	50
11	13,892.92	463.10	30	756	40	1,175	11	1,931	51	20	20	21	28	0	0
12	13,872.30	495.44	28	745	59	1,173	44	1,919	43	18	12	13	34	0	0
1	13,998.89	499.96	28	1,188	29	683	7	1,871	36	78	59	8	24	0	0
2	9,961.05	355.75	28	1,405	54	0	0	1,405	54	0	0	4	41	0	0
3	14,062.57	453.63	31	1,141	54	885	2	2,026	56	39	7	7	16	2	58
計	158,867.22	448.78	354	13,454	4	8,705	21	22,159	25	442	10	178	31	21	53
平均	13,238.94	－	30	1,121	10	725	27	1,846	37	36	51	14	53	1	49
最大	14,114.87	499.96	31	1,735	20	1,179	44	2,026	56	78	59	35	16	13	42
最小	9,961.05	355.75	26	745	59	0	0	1,405	54	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率
				O･H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	(C)/暦日数*24*4
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
84	49	1,820	9	0	0	0	0	1,059	51	1,059	51	3	3	0	63.2
101	34	2,111	41	744	0	120	19	0	0	864	19	3	3	1	71.0
65	23	2,070	59	282	37	99	29	426	55	809	1	2	3	0	71.9
36	39	1,856	42	744	0	0	0	375	18	1,119	18	1	0	3	62.4
56	14	1,860	36	447	7	0	0	668	17	1,115	24	2	2	0	62.5
28	49	1,853	31	591	5	0	0	435	24	1,026	29	1	1	0	64.4
54	7	1,857	22	744	0	233	3	141	35	1,118	38	2	2	1	62.4
41	48	1,973	39	303	10	0	0	603	11	906	21	1	2	0	68.5
31	46	1,951	29	0	0	0	0	1,024	31	1,024	31	1	3	0	65.6
87	23	1,958	59	0	0	0	0	1,017	1	1,017	1	4	1	0	65.8
4	41	1,410	35	0	0	0	0	1,277	25	1,277	25	0	1	0	52.5
49	21	2,076	17	0	0	0	0	899	43	899	43	2	1	3	69.8
642	34	22,801	59	3,855	59	452	51	7,929	11	12,238	1	22	22	8	—
53	33	1,900	10	321	20	37	44	660	46	1,019	50	2	2	1	65.1
101	34	2,111	41	744	0	233	3	1,277	25	1,277	25	4	3	3	71.9
4	41	1,410	35	0	0	0	0	0	0	809	1	0	0	0	52.5

2－2. 焼却炉稼働状況(1号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	4,031.50	155.06	26	580	27	0	0	580	27	20	11	8	40	0	0
5	4,335.77	144.53	30	275	46	394	37	670	23	21	49	12	12	0	0
6	1,783.15	137.17	13	120	0	144	1	264	1	20	5	8	59	0	0
7	5,294.91	170.80	31	402	32	333	20	735	52	0	0	0	0	8	8
8	5,382.74	173.64	31	480	0	264	0	744	0	0	0	0	0	0	0
9	1,922.50	160.21	12	0	0	276	7	276	7	0	0	8	29	0	0
10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2,837.94	157.66	18	144	0	252	30	396	30	20	20	0	0	0	0
12	4,586.40	163.80	28	72	0	587	1	659	1	0	0	3	33	0	0
1	3,999.72	159.99	25	208	24	347	7	555	31	20	2	8	24	0	0
2	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4,652.43	155.08	30	372	5	311	27	683	32	20	37	0	0	0	33
計	38,827.06	159.13	244	2,655	14	2,910	10	5,565	24	123	4	50	17	8	41
平均	3,235.59	－	20	221	16	242	31	463	47	10	15	4	11	0	43
最大	5,382.74	173.64	31	580	27	587	1	744	0	21	49	12	12	8	8
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2－3. 焼却炉稼働状況(2号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,940.84	151.57	26	574	2	0	0	574	2	21	29	8	54	0	0
5	4,291.23	143.04	30	277	11	390	31	667	42	20	2	11	55	4	23
6	4,108.96	158.04	26	216	0	395	28	611	28	0	0	9	3	0	0
7	2,352.77	147.05	16	0	0	345	45	345	45	22	57	0	0	0	0
8	64.89	64.89	1	0	0	12	14	12	14	0	0	6	39	0	0
9	734.37	122.40	6	0	0	108	35	108	35	20	20	0	0	0	0
10	3,345.24	152.06	22	183	0	300	40	483	40	19	52	7	25	0	0
11	4,072.50	162.90	25	120	0	466	41	586	41	0	0	9	46	0	0
12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4,598.37	164.23	28	305	18	336	0	641	18	20	9	0	0	0	0
2	4,702.49	167.95	28	672	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	1,891.64	157.64	12	275	22	0	0	275	22	0	0	7	16	0	0
計	34,103.30	155.02	220	2,622	53	2,355	54	4,978	47	124	49	60	58	4	23
平均	2,841.94	－	18	218	34	196	20	414	54	10	24	5	5	0	22
最大	4,702.49	167.95	30	672	0	466	41	672	0	22	57	11	55	4	23
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
28	51	609	18	0	0	0	0	110	42	110	42	1	1	0	84.6
34	1	704	24	0	0	39	36	0	0	39	36	1	1	0	94.7
29	4	293	5	0	0	0	0	426	55	426	55	1	1	0	40.7
8	8	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
8	29	284	36	0	0	0	0	435	24	435	24	0	1	0	39.5
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
20	20	416	50	303	10	0	0	0	0	303	10	1	0	0	57.9
3	33	662	34	0	0	0	0	81	26	81	26	0	1	0	89.1
28	26	583	57	0	0	0	0	160	3	160	3	1	1	0	78.5
0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	672	0	0	0	0	0.0
21	10	704	42	0	0	0	0	39	18	39	18	1	0	1	94.7
182	2	5,747	26	1,047	10	39	36	1,925	48	3,012	34	6	6	3	―
15	10	478	57	87	16	3	18	160	29	251	3	1	1	0	65.6
34	1	744	0	744	0	39	36	672	0	744	0	1	1	2	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
30	23	604	25	0	0	0	0	115	35	115	35	1	1	0	83.9
36	20	704	2	0	0	39	58	0	0	39	58	1	1	1	94.6
9	3	620	31	0	0	99	29	0	0	99	29	0	1	0	86.2
22	57	368	42	0	0	0	0	375	18	375	18	1	0	0	49.6
6	39	18	53	288	0	0	0	437	7	725	7	0	1	0	2.5
20	20	128	55	591	5	0	0	0	0	591	5	1	0	0	17.9
27	17	510	57	0	0	233	3	0	0	233	3	1	1	0	68.7
9	46	596	27	0	0	0	0	123	33	123	33	0	1	0	82.8
0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0.0
20	9	661	27	0	0	0	0	82	33	82	33	1	0	0	88.9
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
7	16	282	38	0	0	0	0	461	22	461	22	0	1	0	38.0
190	10	5,168	57	879	5	372	30	2,339	28	3,591	3	6	7	1	―
15	51	430	45	73	15	31	3	194	57	299	15	1	1	0	59.0
36	20	704	2	591	5	233	3	744	0	744	0	1	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－4. 焼却炉稼働状況(3号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	1,347.02	149.67	9	184	46	0	0	184	46	20	7	0	0	0	0
5	4,301.79	143.39	30	277	26	394	36	672	2	20	4	11	9	0	0
6	4,954.80	165.16	30	216	0	491	39	707	39	0	0	8	57	0	0
7	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4,093.34	163.73	25	288	0	276	49	564	49	20	4	0	0	0	0
9	5,069.88	169.00	30	360	0	360	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	4,163.48	160.13	26	276	30	299	55	576	25	20	37	5	23	0	0
11	5,209.22	173.64	30	264	0	456	0	720	0	0	0	0	0	0	0
12	4,690.58	167.52	28	72	0	586	43	658	43	0	0	3	36	0	0
1	286.38	95.46	3	36	44	0	0	36	44	20	14	0	0	0	0
2	4,811.41	171.84	28	672	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	5,207.84	167.99	31	456	0	286	35	742	35	0	0	0	0	1	25
計	44,135.74	163.47	270	3,103	26	3,152	17	6,255	43	101	6	29	5	1	25
平均	3,677.98	－	23	258	37	262	41	521	19	8	26	2	25	0	7
最大	5,209.22	173.64	31	672	0	586	43	742	35	20	37	11	9	1	25
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2－5. 焼却炉稼働状況(4号炉)

項目	焼却量		稼働日数	焼却炉稼働状況											
				炉稼働時間											
		1日平均		炉正常運転						炉正常外運転					
	(A)	(A)/(B)	(B)	正常運転		減量運転		計		昇温		降温		炉正常外	
月	(t)	(t)	(日)	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分
4	3,073.15	180.77	17	396	5	0	0	396	5	0	0	5	28	0	0
5	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3,267.96	172.00	19	422	28	0	0	422	28	18	19	0	0	0	0
7	5,848.10	188.65	31	738	26	0	0	738	26	0	0	0	0	5	34
8	3,810.35	173.20	22	483	19	0	0	483	19	19	36	9	55	0	0
9	5,619.05	187.30	30	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0
10	5,941.70	191.67	31	743	10	0	0	743	10	0	0	0	0	0	50
11	1,773.26	161.21	11	228	40	0	0	228	40	0	0	11	42	0	0
12	4,595.32	170.20	27	601	59	0	0	601	59	18	12	6	25	0	0
1	5,114.42	182.66	28	638	3	0	0	638	3	18	34	0	0	0	0
2	447.15	149.05	3	61	54	0	0	61	54	0	0	4	41	0	0
3	2,310.66	154.04	15	38	27	287	0	325	27	18	30	0	0	1	0
計	41,801.12	178.64	234	5,072	31	287	0	5,359	31	93	11	38	11	7	24
平均	3,483.43	－	20	422	43	23	55	446	38	7	46	3	11	0	37
最大	5,941.70	191.67	31	743	10	287	0	743	10	19	36	11	42	5	34
最小	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
20	7	204	53	0	0	0	0	515	7	515	7	1	0	0	28.5
31	13	703	15	0	0	40	45	0	0	40	45	1	1	0	94.5
8	57	716	36	3	24	0	0	0	0	3	24	0	1	0	99.5
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
20	4	584	53	159	7	0	0	0	0	159	7	1	0	0	78.6
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
26	0	602	25	0	0	0	0	141	35	141	35	1	1	1	81.0
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
3	36	662	19	0	0	0	0	81	41	81	41	0	1	0	89.0
20	14	56	58	0	0	0	0	687	2	687	2	1	0	0	7.7
0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
1	25	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
131	36	6,387	19	906	31	40	45	1,425	25	2,372	41	5	4	2	―
10	58	532	17	75	33	3	24	118	47	197	43	0	0	0	72.9
31	13	744	0	744	0	40	45	687	2	744	0	1	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

計		合計(C)		炉休止時間								正常外回数			稼働率 (C)/暦日数*24
				O・H		修繕		計画休止		計		昇温	降温	正常外	
時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	回	回	回	(%)
5	28	401	33	0	0	0	0	318	27	318	27	0	1	0	55.8
0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.0
18	19	440	47	279	13	0	0	0	0	279	13	1	0	0	61.2
5	34	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
29	31	512	50	0	0	0	0	231	10	231	10	1	1	0	68.9
0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
0	50	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
11	42	240	22	0	0	0	0	479	38	479	38	0	1	0	33.4
24	37	626	36	0	0	0	0	117	24	117	24	1	1	0	84.2
18	34	656	37	0	0	0	0	87	23	87	23	1	0	0	88.3
4	41	66	35	0	0	0	0	605	25	605	25	0	1	0	9.9
19	30	344	57	0	0	0	0	399	3	399	3	1	0	1	46.4
138	46	5,498	17	1,023	13	0	0	2,238	30	3,261	43	5	5	2	―
11	34	458	11	85	16	0	0	186	33	271	49	0	0	0	62.8
29	31	744	0	744	0	0	0	605	25	744	0	1	1	1	100.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

2－6. ごみ焼却量と低位発熱量(熱精算法)の経年変化

項目 / 年度	焼却量 (t)	焼却量 指数	焼却量 前年比(%)	低位発熱量 (MJ／kg)	低位発熱量 指数	低位発熱量 前年比(%)
7	225,481	100.0		10.47	100.0	
8	211,345	93.7	93.7	10.55	100.8	100.8
9	216,634	96.1	102.5	10.45	99.8	99.1
10	219,148	97.2	101.2	10.55	100.8	101.0
11	216,930	96.2	99.0	10.63	101.5	100.8
12	218,101	96.7	100.5	11.08	105.8	104.2
13	215,930	95.8	99.0	11.28	107.7	101.8
14	210,632	93.4	97.5	11.37	108.6	100.8
15	207,471	92.0	98.5	11.31	108.0	99.5
16	204,441	90.7	98.5	10.96	104.7	96.9
17	195,785	86.8	95.8	11.41	109.0	104.1
18	196,246	87.0	100.2	11.39	108.8	99.8
19	180,524	80.1	92.0	10.97	104.8	96.3
20	173,771	77.1	96.3	10.77	102.9	98.2
21	167,729	74.4	96.5	10.80	103.2	100.3
22	164,992	73.2	98.4	11.10	106.0	102.8
23	169,789	75.3	102.9	10.97	104.8	98.8
24	160,784	71.3	94.7	10.80	103.2	98.5
25	159,484	70.7	99.2	10.51	100.4	97.3
26	158,867	70.5	99.6	10.77	102.9	102.5

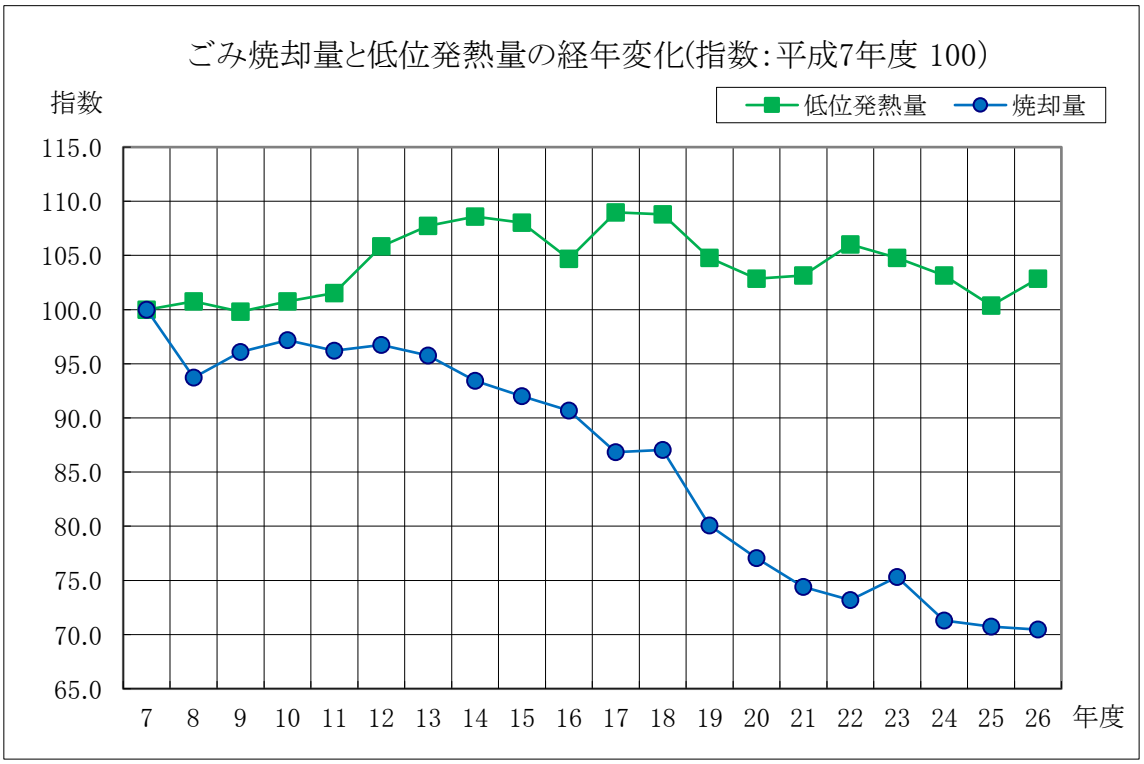

2－7. 月別焼却量の経年変化

年度 / 月	26年度		25年度		24年度		23年度		22年度	
	焼却量	暦日平均	焼却量	暦日平均	焼却量	暦日平均	焼却量	暦日平均	焼却量	暦日平均
	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4	12,393	413	12,296	410	11,645	388	11,710	390	12,600	420
5	12,929	417	15,966	515	15,598	503	15,831	511	14,872	480
6	14,115	470	13,430	448	13,804	460	13,767	459	14,370	479
7	13,496	435	13,094	422	12,976	419	15,150	489	13,482	435
8	13,351	431	12,483	403	13,650	440	13,618	439	14,762	476
9	13,346	445	14,502	483	12,893	430	14,985	500	13,322	444
10	13,450	434	12,503	403	15,099	487	14,023	452	12,695	410
11	13,893	463	14,069	469	13,173	439	14,113	470	14,935	498
12	13,872	447	14,425	465	15,364	496	16,418	530	15,817	510
1	13,999	452	12,854	415	11,647	376	13,248	427	13,447	434
2	9,961	356	9,744	348	12,814	458	12,193	420	9,773	349
3	14,063	454	14,117	455	12,122	391	14,732	475	14,916	481
計	158,867	435	159,484	437	160,784	441	169,789	464	164,992	452

※ 各月の焼却量については、小数点以下を四捨五入。

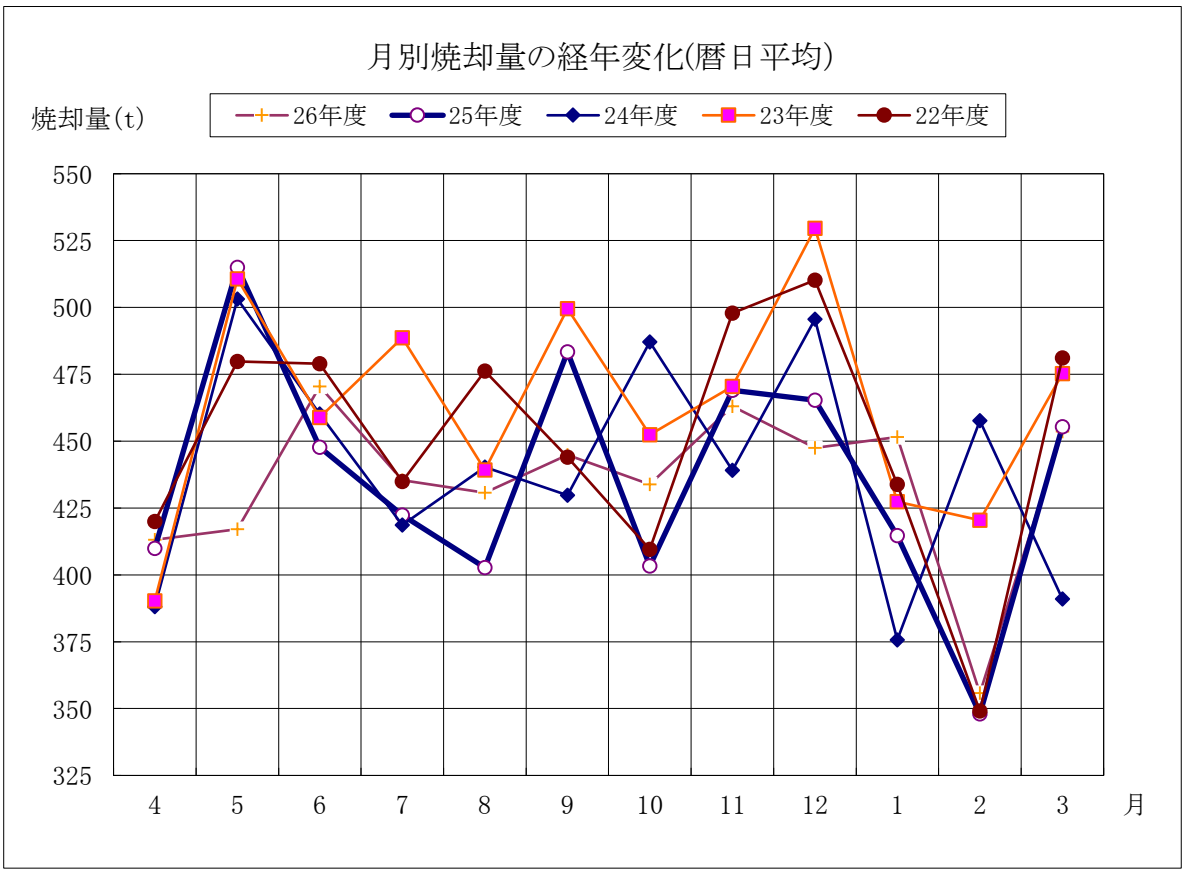

3. 管理薬剤の使用状況

3－1. 管理薬剤使用(購入)実績

項目 / 月	液体苛性ソーダ 48%	凝集剤 塩化第二鉄	排水殺菌用 次亜塩素酸ソーダ	硫酸	皮膜性ボイラー水処理剤 ヘラミン90H-T	重金属捕集剤 エポフロック L-1	塩酸 35%
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	6,595	3,470	0	0	0	0	58,200
5	21,838	10,510	1,530	3,510	150	0	53,200
6	11,654	6,960	0	0	0	400	51,600
7	23,258	7,050	0	3,520	0	0	44,570
8	21,709	6,950	1,530	0	140	50	44,480
9	16,663	6,960	1,550	3,340	0	400	50,510
10	26,786	6,980	1,550	3,500	140	0	55,500
11	18,152	6,990	0	0	0	0	41,910
12	23,282	7,070	1,560	3,480	0	400	20,630
1	16,706	3,500	1,560	3,470	140	50	0
2	10,895	3,490	0	0	0	0	3,560
3	16,730	6,980	0	3,570	0	0	3,510
計	214,268	76,910	9,280	24,390	570	1,300	427,670
月平均	17,856	6,409	773	2,033	48	108	35,639

項目 / 月	洗浄用 塩酸 35% 20kg缶	凝集助剤 EDPフロック 351	塩素除去剤 ダイクリーン F-504	防食剤 タワークリン S-112	上水殺菌用 次亜塩素酸ソーダ	防食剤 タワークリン パックマルチ	飛灰固化剤 ポルトランド セメント
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(個)	(kg)
4	0	0	0	0	0	0	10,400
5	0	50	20	0	40	0	30,140
6	0	0	0	0	0	0	20,310
7	0	50	20	0	0	0	20,600
8	0	0	0	0	0	0	20,350
9	0	0	20	0	0	0	21,170
10	200	0	0	0	0	0	20,700
11	0	0	0	0	0	0	10,330
12	0	0	20	0	0	0	20,240
1	0	50	0	0	0	0	30,640
2	0	0	20	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	30,680
計	200	150	100	0	40	0	235,560
月平均	17	13	8	0	3	0	19,630

項目 / 月	飛灰用 重金属処理剤 NHキレート Z-4	排ガス処理用 尿素水 40%	排ガス処理用 消石灰 ミクロライムSG	特殊反応助剤 クリアエイドS	燃滓用 重金属処理剤 ジオスタL	燃滓用 重金属処理剤 NHキレート Z-4
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
4	14,050	30,660	62,000	30,070	40,220	－
5	14,110	20,100	71,880	35,290	48,060	－
6	14,040	30,400	61,600	30,070	48,580	－
7	7,070	30,440	61,320	25,140	32,390	－
8	10,580	20,180	61,640	30,110	40,660	－
9	14,110	30,440	71,960	35,130	41,130	－
10	13,920	30,160	72,180	40,170	32,450	－
11	15,550	30,500	72,500	35,280	24,680	－
12	15,260	20,480	72,600	30,280	8,100	14,900
1	9,932	30,610	51,620	30,200	－	8,158
2	13,440	20,360	51,640	30,110	－	6,600
3	10,830	30,380	61,640	35,150	－	8,220
計	152,892	324,710	772,580	387,000	316,270	37,878
月平均	12,741	27,059	64,382	32,250	35,141	9,470

※ 12月途中より燃滓用重金属処理剤を変更

4. ボイラー・タービン関係

4－1. ボイラー運転状況（1～4号炉合計）

項目 / 月	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数（最大値）	起動回数	停止回数	灯油使用量	
											助燃バーナー	温水ボイラー
	(t)	(kJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)	(ℓ)
4	12,392.51	11,349	38,357.7	64.3	51.67	1,792	53	26	3	3	10,285	627
5	12,928.79	11,540	39,142.6	46.9	51.03	2,096	16	30	3	3	11,384	150
6	14,114.87	11,173	42,336.5	64.2	57.03	2,055	46	30	2	3	9,541	0
7	13,495.78	10,468	39,744.0	49.0	51.81	1,849	46	31	1	0	4,010	0
8	13,351.32	10,384	37,584.4	64.9	49.00	1,843	16	31	2	2	10,282	0
9	13,345.80	10,652	39,816.1	64.8	53.64	1,846	30	30	1	1	3,759	0
10	13,450.42	10,585	40,386.8	49.4	52.65	1,848	21	31	2	2	6,905	0
11	13,892.92	10,517	38,843.8	64.8	52.33	1,961	33	30	1	2	4,583	0
12	13,872.30	10,383	39,322.2	48.6	51.26	1,940	27	28	1	3	6,262	1,060
1	13,998.89	10,374	40,743.0	64.6	53.12	1,928	25	28	4	1	19,669	0
2	9,961.05	10,834	28,152.7	49.1	40.63	1,410	45	28	0	1	0	0
3	14,062.57	10,968	41,561.8	64.9	54.18	2,064	8	31	2	1	11,207	0
計	158,867.22	－	465,991.6	－	－	22,638	6	354	22	22	97,887	1,837
平均	13,238.94	10,769	38,832.6	58.0	51.53	1,886	31	30	2	2	8,157	153

※ 灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー} - \text{平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（1～3号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率（4号炉）} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－2. ボイラー運転状況（1号炉）

項目 / 月	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃バーナー
	(t)	(kJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	4,031.50	11,414	12,038.3	62.0	68.52	602	23	26	1	1	3,305
5	4,335.77	11,653	12,962.6	61.0	71.41	698	47	30	1	1	4,263
6	1,783.15	11,479	5,199.5	60.4	29.60	287	10	13	1	1	4,308
7	5,294.91	10,493	14,013.2	59.6	77.19	744	0	31	0	0	282
8	5,382.74	10,444	14,106.3	59.3	77.71	744	0	31	0	0	0
9	1,922.50	10,635	5,114.3	59.4	29.11	284	50	12	0	1	0
10	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
11	2,837.94	10,320	7,865.4	63.3	44.77	410	15	18	1	0	4,455
12	4,586.40	10,426	12,337.2	61.2	67.96	663	27	28	0	1	0
1	3,999.72	10,395	11,017.0	62.6	60.69	578	0	25	1	1	5,427
2	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
3	4,652.43	10,916	13,488.3	62.5	74.30	698	40	30	1	0	5,204
計	38,827.06	―	108,142.1	―	―	5,711	32	244	6	6	27,244
平均	3,235.59	9,015	9,011.8	50.9	50.11	475	58	20	1	1	2,270

※ 灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－3. ボイラー運転状況（2号炉）

項目 / 月	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃バーナー
	(t)	(kJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,940.84	11,499	11,612.0	60.7	66.10	597	17	25	1	1	3,339
5	4,291.23	11,469	12,676.2	61.2	69.83	698	42	30	1	1	3,453
6	4,108.96	11,274	11,943.1	61.3	67.98	620	48	26	0	1	0
7	2,352.77	10,473	6,502.4	62.0	35.82	361	46	16	1	0	3,482
8	64.89	12,463	221.5	64.6	1.22	20	56	1	0	1	0
9	734.37	10,402	2,125.0	64.8	12.10	121	40	6	1	0	3,759
10	3,345.24	10,723	9,651.5	63.4	53.17	505	57	23	1	1	3,257
11	4,072.50	10,615	11,295.8	62.0	64.30	597	20	25	0	1	128
12	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
1	4,598.37	10,477	12,583.7	61.6	69.32	654	25	28	1	0	3,544
2	4,702.49	10,855	13,295.5	61.5	81.09	672	0	28	0	0	0
3	1,891.64	11,068	5,444.3	62.1	29.90	285	2	12	0	1	0
計	34,103.30	―	97,351.0	―	―	5,135	53	220	6	7	20,962
平均	2,841.94	10,110	8,112.6	57.1	45.90	427	59	18	1	1	1,747

※ 灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－4. ボイラー運転状況（3号炉）

項目 / 月	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃バーナー
	(t)	(kJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	1,347.02	11,057	3,813.7	60.3	21.71	197	8	9	1	0	3,641
5	4,301.79	11,497	13,503.8	65.3	74.39	698	47	30	1	1	3,668
6	4,954.80	11,369	14,305.6	60.5	81.43	717	9	30	0	1	0
7	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
8	4,093.34	10,241	10,934.3	61.6	60.23	578	10	25	1	0	3,761
9	5,069.88	10,692	13,931.3	60.8	79.30	720	0	30	0	0	0
10	4,163.48	10,666	11,275.8	60.3	62.11	598	24	26	1	1	3,648
11	5,209.22	10,508	13,920.2	60.2	79.24	720	0	30	0	0	0
12	4,690.58	10,389	12,203.3	59.5	67.22	663	30	28	0	1	0
1	286.38	9,554	715.3	60.5	3.94	49	15	3	1	0	4,070
2	4,811.41	10,797	13,399.5	61.1	81.72	672	0	28	0	0	0
3	5,207.84	10,960	14,514.3	60.3	79.95	744	0	31	0	0	0
計	44,135.74	―	122,517.1	―	―	6,358	23	270	5	4	18,788
平均	3,677.98	9,811	10,209.8	55.9	57.60	529	52	23	0	0	1,566

※ 灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 24.4} \times 100$$

4－5. ボイラー運転状況（4号炉）

項目 / 月	焼却量	平均低位発熱量	蒸気発生量	ボイラー効率	ボイラー利用率	運転時間		運転日数	起動回数	停止回数	灯油使用量 助燃バーナー
	(t)	(kJ／kg)	(t)	(%)	(%)	(時間)	(分)	(日)	(回)	(回)	(ℓ)
4	3,073.15	11,169	10,893.7	74.3	50.60	396	5	17	0	1	0
5	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0
6	3,267.96	10,541	10,888.3	74.5	50.58	430	39	18	1	0	5,233
7	5,848.10	10,468	19,228.4	74.4	86.44	744	0	31	0	0	246
8	3,810.35	10,359	12,322.3	74.0	55.39	500	10	22	1	1	6,521
9	5,619.05	10,585	18,645.5	74.1	40.17	720	0	30	0	0	0
10	5,941.70	10,504	19,459.5	73.8	87.48	744	0	31	0	0	0
11	1,773.26	10,483	5,762.4	73.8	26.77	233	58	10	0	1	0
12	4,595.32	10,365	14,781.7	73.7	66.45	613	30	26	1	1	6,262
1	5,114.42	10,312	16,427.0	73.5	73.84	646	45	27	1	0	6,628
2	447.15	10,573	1,457.7	73.9	7.25	66	45	3	0	1	0
3	2,310.66	11,095	8,114.9	74.8	36.48	336	26	15	1	0	6,003
計	41,801.12	―	137,981.4	―	―	5,432	18	230	5	5	30,893
平均	3,483.43	9,705	11,498.5	67.9	48.45	452	42	19	0	0	2,574

※ 灯油使用量は、炉の昇温時等に伴うバーナー運転時間における使用量を記入

$$\text{ボイラー効率} = \frac{\text{平均蒸気量} \times (\text{平均蒸気エンタルピー平均給水エンタルピ})}{\text{平均焼却量} \times \text{平均低位発熱量}} \times 100$$

$$\text{ボイラー利用率} = \frac{\text{総蒸気量}}{\text{暦年運転時間} \times 29.9} \times 100$$

4－6. タービン稼働状況

項目	蒸　気 発生量 (A)	焼却量	焼却量 1トン当たり 蒸気発生量	1号タービン(2000KW)								
				運転 日数	運転時間		タービン 入口蒸気量 (ア)	発生蒸気 利用率 (ア／A)	発電量 (B)	運転 日数	運転時間	
月	(t)	(t)	(t/t)	(日)	(時間)	(分)	(t)	(%)	(kwh)	(日)	(時間)	(分)
4	38,357.7	12,392.51	3.10	8	181	11	5,209.1	13.58	343,848	17	395	43
5	39,142.6	12,928.79	3.03	5	87	39	2,496.7	6.38	163,299	26	580	42
6	42,336.5	14,114.87	3.00	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
7	39,744.0	13,495.78	2.94	4	71	18	1,022.4	2.57	55,848	31	737	55
8	37,584.4	13,351.32	2.82	0	0	0	0.0	0.00	0	31	744	0
9	39,816.1	13,345.80	2.98	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
10	40,386.8	13,450.42	3.00	0	0	0	0.0	0.00	0	31	744	0
11	38,843.8	13,892.92	2.80	0	0	0	0.0	0.00	0	30	720	0
12	39,322.2	13,872.30	2.83	0	0	0	0.0	0.00	0	28	659	6
1	40,743.0	13,998.89	2.91	0	0	0	0.0	0.00	0	27	638	23
2	28,152.7	9,961.05	2.83	0	0	0	0.0	0.00	0	28	672	0
3	41,561.8	14,062.57	2.96	0	0	0	0.0	0.00	0	31	744	0
計	465,991.6	158,867.22	－	17	340	8	8,728.2	―	562,995	340	8,075	49
月平均	38,832.6	13,238.94	2.93	1	28	21	727.4	1.87	46,916	28	672	59
最大	42,336.5	14,114.87	3.10	8	181	11	5,209.1	13.58	343,848	31	744	0
最小	28,152.7	9,961.05	2.80	0	0	0	0.0	0.00	0	17	395	43

2号タービン（5000KW）			合計（7000KW）			蒸気 1トン当たり 発電量	1kwhあたり 蒸気消費量	焼却量 1トンあたり 発電量
タービン 入口蒸気量 （イ）	発生蒸気 利用率 （イ／A）	発電量 （C）	タービン 入口蒸気 量 (ア+イ)=(ウ)	発生蒸気 利用率 （ウ／A）	発電量 （B＋C）			
(t)	(%)	(kwh)	(t)	(%)	(kwh)	(kwh/t)	(kg/kwh)	(kwh/t)
22,951.0	59.83	1,944,255	28,160.1	73.41	2,288,103	81.3	12.31	184.6
29,793.0	76.11	2,496,065	32,289.7	82.49	2,659,364	82.4	12.14	205.7
37,729.4	89.12	3,154,703	37,729.4	89.12	3,154,703	83.6	11.96	223.5
34,927.4	87.88	2,827,359	35,949.8	90.45	2,883,207	80.2	12.47	213.6
34,078.8	90.67	2,746,522	34,078.8	90.67	2,746,522	80.6	12.41	205.7
36,062.4	90.57	2,966,261	36,062.4	90.57	2,966,261	82.3	12.16	222.3
36,400.1	90.13	2,969,314	36,400.1	90.13	2,969,314	81.6	12.26	220.8
34,762.7	89.49	2,853,578	34,762.7	89.49	2,853,578	82.1	12.18	205.4
35,131.3	89.34	2,950,466	35,131.3	89.34	2,950,466	84.0	11.91	212.7
35,549.9	87.25	2,994,964	35,549.9	87.25	2,994,964	84.2	11.87	213.9
24,723.1	87.82	1,871,829	24,723.1	87.82	1,871,829	75.7	13.21	187.9
36,802.9	88.55	3,044,492	36,802.9	88.55	3,044,492	82.7	12.09	216.5
398,912.0	—	32,819,808	407,640.2	—	33,382,803	—	—	—
33,242.7	85.60	2,734,984	33,970.0	87.48	2,781,900	81.9	12.21	210.1
37,729.4	90.67	3,154,703	37,729.4	90.67	3,154,703	84.2	13.21	223.5
22,951.0	59.83	1,871,829	24,723.1	73.41	1,871,829	75.7	11.87	184.6

4－7. 純水及び薬剤使用実績

項目 / 月	純水使用量	暦日平均	苛性ソーダ（24%）	塩酸 35%	塩素除去剤 ダイクリーン F-504	皮膜性 ボイラー水 処理剤 ヘラミン90H-T
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(kg)	(kg)
4	1,277.1	42.57	3.60	2.80	12	52
5	1,415.0	45.65	3.60	2.80	8	49
6	1,311.2	43.71	3.15	2.45	8	58
7	1,403.7	45.28	3.60	2.80	10	51
8	1,373.8	44.32	3.15	2.45	8	50
9	1,322.1	44.07	3.15	2.45	8	52
10	1,301.2	41.97	3.15	2.45	10	50
11	1,386.1	46.20	3.15	2.45	8	52
12	1,338.1	43.16	3.60	2.80	8	56
1	1,257.1	40.55	3.15	2.45	8	50
2	1,243.8	44.42	2.25	1.75	8	42
3	1,434.7	46.28	3.15	2.45	8	50
計	16,063.9	44.01	38.70	30.10	104	612
月平均	1,338.7	—	3.23	2.51	9	51

5. 洗煙装置関係

5－1. 洗煙装置稼働実績（1～4号炉合計）

項目 / 月	1～4号炉合計													
	洗煙装置稼働時焼却量	稼働日数	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	12,392.51	26	1,820	9	1,059	51	1,059	51	0	0	0	0	0	0
5	12,928.79	30	2,111	41	864	19	864	19	0	0	0	0	0	0
6	14,114.87	30	2,070	59	809	1	809	1	0	0	0	0	0	0
7	13,495.78	31	1,856	42	1,119	18	1,119	18	0	0	0	0	0	0
8	13,351.32	31	1,860	36	1,115	24	1,115	24	0	0	0	0	0	0
9	13,345.80	30	1,853	31	1,026	29	1,026	29	0	0	0	0	0	0
10	13,450.32	31	1,857	21	1,118	39	1,118	38	0	0	0	0	0	1
11	13,892.92	30	1,973	39	906	21	906	21	0	0	0	0	0	0
12	13,872.30	28	1,951	29	1,024	31	1,024	31	0	0	0	0	0	0
1	13,998.89	28	1,958	59	1,017	1	1,017	1	0	0	0	0	0	0
2	9,961.05	28	1,410	35	1,277	25	1,277	25	0	0	0	0	0	0
3	14,057.79	31	2,074	32	901	28	899	43	0	0	1	45	0	0
計	158,862.34	354	22,800	13	12,239	47	12,238	1	0	0	1	45	0	1
月平均	13,238.53	30	1,900	1	1019	59	1019	50	0	0	0	9	0	0

5－2. 洗煙装置稼働実績（1号炉）

項目	1　号　炉													
	洗煙装置稼働時焼却量	稼働日数	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	4,031.50	26	609	18	110	42	110	42	0	0	0	0	0	0
5	4,335.77	30	704	24	39	36	39	36	0	0	0	0	0	0
6	1,783.15	13	293	5	426	55	426	55	0	0	0	0	0	0
7	5,294.91	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5,382.74	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,922.50	12	284	36	435	24	435	24	0	0	0	0	0	0
10	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
11	2,837.94	18	416	50	303	10	303	10	0	0	0	0	0	0
12	4,586.40	28	662	34	81	26	81	26	0	0	0	0	0	0
1	3,999.72	25	583	57	160	3	160	3	0	0	0	0	0	0
2	0.00	0	0	0	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0
3	4,651.86	30	704	30	39	30	39	18	0	0	0	12	0	0
計	38,826.49	244	5,747	14	3,012	46	3,012	34	0	0	0	12	0	0
月平均	3,235.54	20	478	56	251	4	251	3	0	0	0	1	0	0

5－3. 洗煙装置稼働実績（2号炉）

項目	2　号　炉													
	洗煙装置稼働時焼却量	稼働日数	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,940.84	26	604	25	115	35	115	35	0	0	0	0	0	0
5	4,291.23	30	704	2	39	58	39	58	0	0	0	0	0	0
6	4,108.96	26	620	31	99	29	99	29	0	0	0	0	0	0
7	2,352.77	16	368	42	375	18	375	18	0	0	0	0	0	0
8	64.89	1	18	53	725	7	725	7	0	0	0	0	0	0
9	734.37	6	128	55	591	5	591	5	0	0	0	0	0	0
10	3,345.24	22	510	57	233	3	233	3	0	0	0	0	0	0
11	4,072.50	25	596	27	123	33	123	33	0	0	0	0	0	0
12	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
1	4,598.37	28	661	27	82	33	82	33	0	0	0	0	0	0
2	4,702.49	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1,891.64	12	282	38	461	22	461	22	0	0	0	0	0	0
計	34,103.30	220	5,168	57	3,591	3	3,591	3	0	0	0	0	0	0
月平均	2,841.94	18	430	45	299	15	299	15	0	0	0	0	0	0

5－4. 洗煙装置稼働実績(3号炉)

項目	3　号　炉													
	洗煙装置稼働時焼却量	稼働日数	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	1,347.02	9	204	53	515	7	515	7	0	0	0	0	0	0
5	4,301.79	30	703	15	40	45	40	45	0	0	0	0	0	0
6	4,954.80	30	716	36	3	24	3	24	0	0	0	0	0	0
7	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
8	4,093.34	25	584	53	159	7	159	7	0	0	0	0	0	0
9	5,069.88	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4,163.38	26	602	24	141	36	141	35	0	0	0	0	0	1
11	5,209.22	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4,690.58	28	662	19	81	41	81	41	0	0	0	0	0	0
1	286.38	3	56	58	687	2	687	2	0	0	0	0	0	0
2	4,811.41	28	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5,205.28	31	743	15	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0
計	44,133.08	270	6,386	33	2,373	27	2,372	41	0	0	0	45	0	1
月平均	3,677.76	23	532	13	197	47	197	43	0	0	0	4	0	0

5－5. 洗煙装置稼働実績(4号炉)

項目	4　号　炉													
	洗煙装置稼働時焼却量	稼働日数	稼働時間		停止及びバイパス時間									
					合　計		内訳							
							炉計画停止及びオーバーホール		炉昇降温		他機器のトラブル		洗煙装置トラブル	
月	(t)	(日)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)	(時間)	(分)
4	3,073.15	17	401	33	318	27	318	27	0	0	0	0	0	0
5	0.00	0	0	0	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0
6	3,267.96	19	440	47	279	13	279	13	0	0	0	0	0	0
7	5,848.10	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3,810.35	22	512	50	231	10	231	10	0	0	0	0	0	0
9	5,619.05	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5,941.70	31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,773.26	11	240	22	479	38	479	38	0	0	0	0	0	0
12	4,595.32	27	626	36	117	24	117	24	0	0	0	0	0	0
1	5,114.42	28	656	37	87	23	87	23	0	0	0	0	0	0
2	447.15	3	66	35	605	25	605	25	0	0	0	0	0	0
3	2,309.01	15	344	9	399	51	399	3	0	0	0	48	0	0
計	41,799.47	234	5,497	29	3,262	31	3,261	43	0	0	0	48	0	0
月平均	3,483.29	20	458	7	271	53	271	49	0	0	0	4	0	0

5－6. 洗煙装置稼働率及び薬品使用実績

項目	苛性ｿｰﾀﾞ 3% 使用量 FS－710	焼却量	稼働率									
		1トン当り 苛性ｿｰﾀﾞ 使用量	洗煙装置稼働時間 / 焼却炉稼働時間					洗煙装置稼働時焼却量 / 総焼却量				
月	(㎥)	(㎥)	1号炉 (%)	2号炉 (%)	3号炉 (%)	4号炉 (%)	全体 (%)	1号炉 (%)	2号炉 (%)	3号炉 (%)	4号炉 (%)	全体 (%)
4	502.58	0.04	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	525.97	0.04	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0
6	557.47	0.04	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7	526.24	0.04	100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0
8	530.31	0.04	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9	558.35	0.04	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	497.53	0.04	—	100.0	99.9	100.0	99.9	—	100.0	99.9	100.0	99.9
11	462.59	0.03	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12	497.63	0.04	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0
1	513.81	0.04	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	303.31	0.03	—	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0
3	519.07	0.04	99.9	100.0	99.8	99.7	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9
計	5,994.86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	499.57	0.04	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9

5－7. 洗煙装置暦日数平均稼働率

項目	稼働率									
	洗煙装置稼働日数 / 暦日数					洗煙装置稼働時間 / 暦日数×24時間				
月	1号炉 (%)	2号炉 (%)	3号炉 (%)	4号炉 (%)	全体 (%)	1号炉 (%)	2号炉 (%)	3号炉 (%)	4号炉 (%)	全体 (%)
4	86.7	86.7	30.0	56.7	65.0	84.6	83.9	28.5	55.8	63.2
5	96.8	96.8	96.8	0.0	72.6	94.7	94.6	94.5	0.0	71.0
6	43.3	86.7	100.0	63.3	73.3	40.7	86.2	99.5	61.2	71.9
7	100.0	51.6	0.0	100.0	62.9	100.0	49.6	0.0	100.0	62.4
8	100.0	3.2	80.6	71.0	63.7	100.0	2.5	78.6	68.9	62.5
9	40.0	20.0	100.0	100.0	65.0	39.5	17.9	100.0	100.0	64.4
10	0.0	71.0	83.9	100.0	63.7	0.0	68.7	81.0	100.0	62.4
11	60.0	83.3	100.0	36.7	70.0	57.9	82.8	100.0	33.4	68.5
12	90.3	0.0	90.3	87.1	66.9	89.1	0.0	89.0	84.2	65.6
1	80.6	90.3	9.7	90.3	67.7	78.5	88.9	7.7	88.3	65.8
2	0.0	100.0	100.0	10.7	52.7	0.0	100.0	100.0	9.9	52.5
3	96.8	38.7	100.0	48.4	71.0	94.7	38.0	99.9	46.3	69.7
計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
月平均	66.8	60.3	74.0	64.1	66.3	65.6	59.0	72.9	62.8	65.1

6. 排水処理関係

6－1. 排水処理実績

項目 / 月	放流水量						排水処理関係薬剤使用量					
	総放流水量 FRS-708		プラント放流水量 FRS-707		生活排水等（余熱利用施設等水量含）		苛性ソーダ 3% FS-711	硫酸	凝集剤 塩化第二鉄	凝集助剤 EDPフロック 351	排水殺菌用次亜塩素酸ソーダ	重金属捕集剤 エポフロック L-1
		暦日平均		暦日平均		暦日平均						
	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)	(ℓ)
4	14,465.4	482.2	9,932.6	331.1	4,532.8	151.1	86,270	1,100	4,500	23,800	460	2,270
5	17,820.5	574.9	12,119.1	390.9	5,701.4	183.9	101,311	1,420	5,530	30,800	510	2,730
6	16,866.7	562.2	11,424.4	380.8	5,442.3	181.4	102,749	1,450	5,470	25,200	455	2,920
7	15,520.6	500.7	10,862.6	350.4	4,658.0	150.3	121,327	1,240	5,100	28,000	655	2,810
8	15,879.4	512.2	10,245.0	330.5	5,634.4	181.8	65,617	1,340	4,930	25,200	830	3,170
9	14,590.2	486.3	9,824.9	327.5	4,765.3	158.8	41,569	1,100	4,610	23,800	1,120	2,740
10	15,953.7	514.6	10,486.3	338.3	5,467.4	176.4	40,456	1,350	4,870	23,800	1,070	2,610
11	15,619.5	520.7	10,260.7	342.0	5,358.8	178.6	49,092	1,880	4,660	22,400	920	2,480
12	10,764.6	347.2	7,676.3	247.6	3,088.3	99.6	44,284	2,090	3,720	18,200	980	2,950
1	6,636.3	214.1	4,172.5	134.6	2,463.8	79.5	42,736	1,210	2,610	14,000	720	2,600
2	6,663.5	238.0	4,074.6	145.5	2,588.9	92.5	57,578	800	3,440	15,400	0	2,120
3	7,601.1	245.2	4,735.2	152.7	2,865.9	92.4	70,342	1,750	4,190	16,800	0	2,580
計	158,381.5	433.9	105,814.2	289.9	52,567.3	144.0	823,331	16,730	53,630	267,400	7,720	31,980
月平均	13,198.5	—	8,817.9	—	4,380.6	—	68,611	1,394	4,469	22,283	643	2,665

6－2. 汚泥処理実績及び灰ピット重金属処理実績

項目 / 月	脱水機				処理薬剤	
	汚泥供給量 FS-709	脱水機運転時間		脱水汚泥排出量	燃滓用重金属処理剤 ジオスタL	燃滓用重金属処理剤 NHキレート Z-4
	(㎥)	(時間)	(分)	(kg)	(kg)	(kg)
4	58.89	7	8	6,220	36,747	—
5	81.56	14	56	11,220	44,969	—
6	115.95	22	50	14,270	44,118	—
7	103.74	9	55	5,210	36,923	—
8	45.67	3	25	2,500	39,096	—
9	4.12	0	7	0	37,368	—
10	20.81	0	45	3,030	31,185	—
11	4.52	0	56	0	30,510	3,276
12	4.63	1	8	1,440	13,973	9,060
1	6.60	2	14	0	—	11,745
2	5.91	1	50	0	—	5,873
3	11.61	2	54	2,550	—	8,181
計	464.01	68	8	46,440	314,889	38,135
月平均	38.67	5	41	3,870	34,988	7,627

※ 12月途中より燃滓用重金属処理剤を変更

7. 電力関係

7－1. 電力量実績

項目 / 月	総供給電力量						逆送電力量		電力自給率
	特高受電量（買電）取引電力量計 (A)	暦日平均1時間当り電力量	発電量 DCS (B)	暦日平均1時間当り電力量	計 (A＋B＝C)	暦日平均1時間当り電力量	（売電）取引電力量計 (D)	暦日平均1時間当り電力量	$\left(\frac{B-D}{C-D}\right)$
	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(%)
4	352,332	489	2,288,103	3,178	2,640,435	3,667	788,582	1,095	81.0
5	192,141	258	2,659,364	3,574	2,851,505	3,833	898,922	1,208	90.2
6	5,336	7	3,154,703	4,382	3,160,039	4,389	1,162,594	1,615	99.7
7	15,906	21	2,883,207	3,875	2,899,113	3,897	1,013,222	1,362	99.2
8	15,963	21	2,746,522	3,692	2,762,485	3,713	866,247	1,164	99.2
9	957	1	2,966,261	4,120	2,967,218	4,121	1,150,989	1,599	99.9
10	812	1	2,969,314	3,991	2,970,126	3,992	1,115,890	1,500	100.0
11	4,896	7	2,853,578	3,963	2,858,474	3,970	1,002,008	1,392	99.7
12	122,304	164	2,950,466	3,966	3,072,770	4,130	1,208,576	1,624	93.4
1	141,318	190	2,994,964	4,025	3,136,282	4,215	1,261,009	1,695	92.5
2	24,629	37	1,871,829	2,785	1,896,458	2,822	316,777	471	98.4
3	3,841	5	3,044,492	4,092	3,048,333	4,097	1,117,936	1,503	99.8
計	880,435	101	33,382,803	3,811	34,263,238	3,911	11,902,752	1,359	96.1
月平均	73,370	－	2,781,900	－	2,855,270	－	991,896	－	－

項目 / 月	総需要電力量							
	ごみ焼却施設電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	リサイクルプラザ電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	余熱利用施設電力使用量	暦日平均1時間当り電力量	計	暦日平均1時間当り電力量
	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
4	1,724,065	2,395	95,085	132	1,156	2	1,820,306	2,528
5	1,811,782	2,435	102,451	138	2,198	3	1,916,431	2,576
6	1,841,472	2,558	107,977	150	2,128	3	1,951,577	2,711
7	1,731,203	2,327	111,797	150	1,639	2	1,844,639	2,479
8	1,743,005	2,343	112,930	152	1,251	2	1,857,186	2,496
9	1,657,587	2,302	111,414	155	2,949	4	1,771,950	2,461
10	1,700,376	2,285	108,178	145	1,614	2	1,810,168	2,433
11	1,719,499	2,388	93,310	130	2,333	3	1,815,142	2,521
12	1,717,106	2,308	102,241	137	0	0	1,819,347	2,445
1	1,730,999	2,327	98,572	132	0	0	1,829,571	2,459
2	1,465,411	2,181	89,866	134	0	0	1,555,277	2,314
3	1,792,091	2,409	94,974	128	0	0	1,887,065	2,536
計	20,634,596	2,356	1,228,795	140	15,268	2	21,878,659	2,498
月平均	1,719,550	－	102,400	－	1,272	－	1,823,222	－

7－2. 電力量実績　経年変化

項目 / 年度	総供給電力量						逆送電力量	
	特高受電量（買電）取引電力量計 (A) (kWh)	暦日平均1時間当り電力量 (kWh)	発電量 DCS (B) (kWh)	暦日平均1時間当り電力量 (kWh)	計 (A＋B＝C) (kWh)	暦日平均1時間当り電力量 (kWh)	（売電）取引電力量計 (D) (kWh)	暦日平均1時間当り電力量 (kWh)
12	487,752	56	43,406,606	4,955	43,894,358	5,011	17,593,062	2,008
13	686,469	78	44,004,813	5,023	44,691,282	5,102	15,685,688	1,791
14	900,856	103	43,473,907	4,963	44,374,763	5,066	14,760,644	1,685
15	784,492	89	42,625,080	4,853	43,409,572	4,942	12,714,266	1,447
16	597,960	68	42,369,054	4,837	42,967,014	4,905	14,180,628	1,619
17	619,240	71	41,533,755	4,741	42,152,995	4,812	13,785,531	1,574
18	729,890	83	41,194,963	4,703	41,924,853	4,786	13,610,873	1,554
19	621,150	71	38,402,326	4,372	39,023,476	4,443	11,781,284	1,341
20	949,300	108	36,223,331	4,135	37,172,631	4,243	10,769,322	1,229
21	853,676	97	34,704,171	3,962	35,557,847	4,059	9,871,809	1,127
22	832,226	95	36,077,302	4,118	36,909,528	4,213	11,461,191	1,308
23	859,153	98	35,669,950	4,061	36,529,103	4,159	10,631,340	1,210
24	558,894	64	34,602,262	3,950	35,161,156	4,014	11,267,248	1,286
25	655,729	75	33,904,849	3,870	34,560,578	3,945	11,516,753	1,315
26	880,435	101	33,382,803	3,811	34,263,238	3,911	11,902,752	1,359

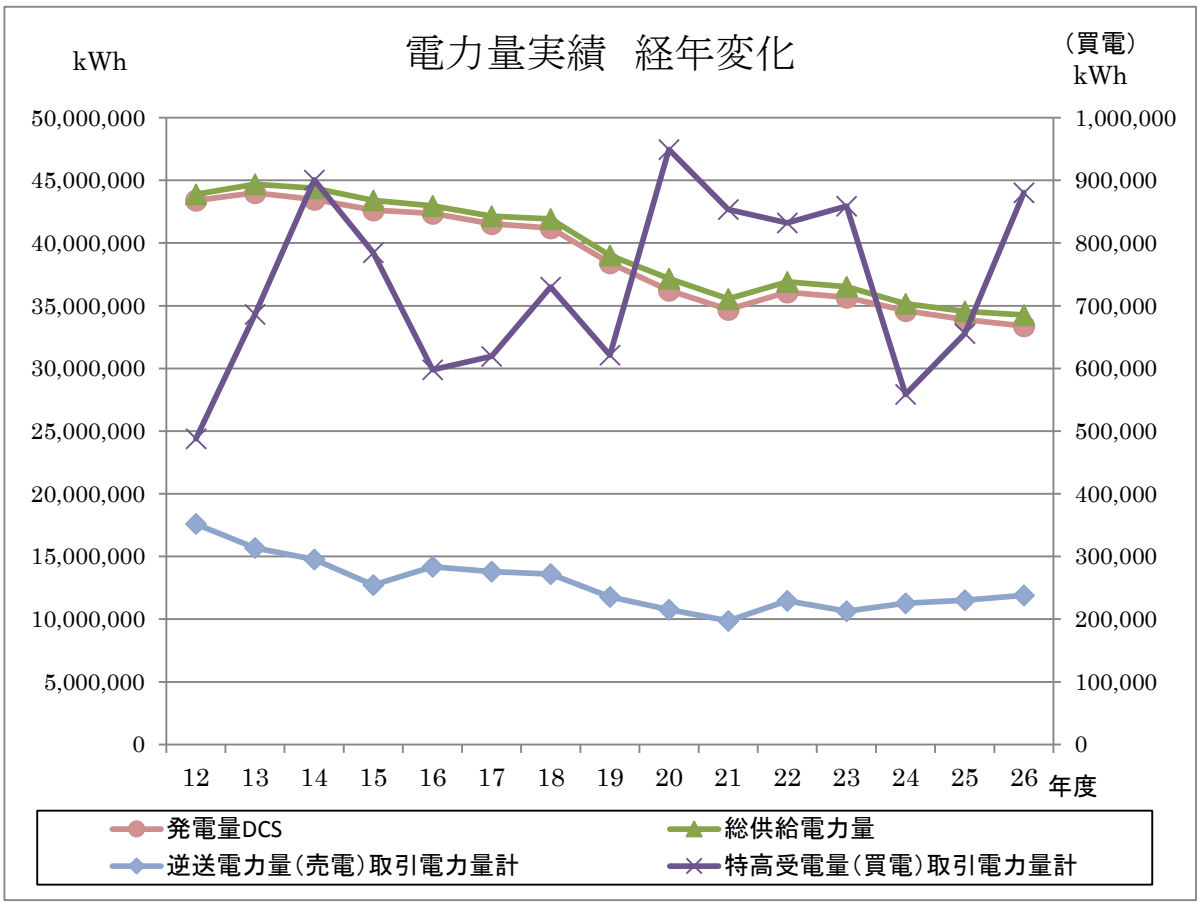

8. 市水・防臭薬剤関係

8－1. 市水・防臭薬剤の使用実績

項目	市水			
	使用水量		認定使用水量	
	(管理月報)	暦日平均	伊丹市水道局	暦日平均
月	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
4	6,362.8	212.1	12,766	209
5	7,013.9	226.3		
6	6,865.8	228.9	13,226	217
7	7,685.7	247.9		
8	6,098.6	196.7	13,109	215
9	6,668.2	222.3		
10	7,129.7	230.0	14,097	231
11	6,053.7	201.8		
12	5,979.6	192.9	11,391	184
1	5,229.8	168.7		
2	4,346.1	155.2	9,456	160
3	5,436.7	175.4		
計	74,870.6	205.1	74,045	203
月平均	6,239.2	―	6,170	―

※ 伊丹市水道局の認定市水量は2ヶ月分。(例) 4・5月は3/12～5/13の使用量

項目	下水高度処理水				防臭薬剤
	使用水量		認定使用水量		
	(管理月報)	暦日平均	(猪名川流域下水道事務所)	暦日平均	強力無臭元
月	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(ℓ)
4	21,455	715	21,411	714	140
5	25,474	822	25,532	824	230
6	24,692	823	24,300	810	100
7	19,762	637	19,803	639	210
8	20,796	671	20,783	670	190
9	19,122	637	19,090	636	180
10	18,948	611	18,959	612	250
11	21,839	728	21,697	723	200
12	18,072	583	17,806	574	190
1	15,110	487	15,376	496	180
2	13,637	487	13,617	486	210
3	17,539	566	17,472	564	190
計	236,446	648	235,846	646	2,270
月平均	19,704	―	19,654	―	189

9. 焼却残渣(灰)関係

9－1. 飛灰安定化装置稼働実績

(東)

項目 / 月	飛灰処理量	飛灰固化剤 ポルトランド セメント 使用量	汚泥流量	飛灰用 重金属処理剤 NHキレート Z-4 流量	飛灰安定化装置 運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	170.9	12.3	64.5	6,430	96	25
5	126.6	9.2	42.9	4,860	71	29
6	152.5	11.1	51.1	5,440	86	1
7	114.5	8.2	38.5	3,900	64	7
8	93.7	6.8	31.3	3,530	52	18
9	129.5	9.4	43.3	3,940	72	24
10	180.1	13.1	59.7	6,150	69	7
11	159.2	11.6	53.9	5,700	89	57
12	196.4	14.3	64.0	7,050	111	13
1	102.4	7.8	33.5	4,030	58	6
2	91.9	7.5	30.4	3,260	52	2
3	190.0	14.6	61.3	7,460	107	32
計	1,707.7	125.9	574.4	61,750	930	41
月平均	142.3	10.5	47.9	5,146	77	33

(西)

項目 / 月	飛灰処理量	飛灰固化剤 ポルトランド セメント 使用量	汚泥流量	飛灰用 重金属処理剤 NHキレート Z-4 流量	飛灰安定化装置 運転時間	
	(t)	(t)	(㎥)	(ℓ)	(時間)	(分)
4	88.5	6.4	34.5	3,640	63	3
5	164.5	11.8	63.8	6,080	115	57
6	150.5	10.9	56.7	5,650	109	6
7	140.0	10.2	52.8	5,440	103	22
8	160.5	11.8	57.7	5,860	127	0
9	137.3	10.0	53.0	5,310	102	58
10	95.1	6.9	37.9	3,840	101	2
11	112.5	8.1	47.0	4,180	81	37
12	73.9	5.3	29.3	3,020	54	26
1	144.5	10.3	58.1	5,330	105	14
2	107.4	7.7	40.4	4,550	79	6
3	87.2	6.3	33.5	3,320	71	16
計	1,461.9	105.7	564.7	56,220	1,114	7
月平均	121.8	8.8	47.1	4,685	92	51

9－2. 焼却残渣(灰)処分実績

項目	焼却残渣(灰)処分実績量									前年度処分量	前年比
	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地			合計				
	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合	台数	処分量	割合		
月	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(台)	(t)	(%)	(t)	(%)
4	190	1,553	66.9	95	767	33.1	285	2,320	100.0	1,949	119.0
5	195	1,595	68.5	90	732	31.5	285	2,327	100.0	2,537	91.7
6	168	1,403	66.8	84	696	33.2	252	2,099	100.0	2,048	102.5
7	158	1,362	65.7	83	711	34.3	241	2,073	100.0	2,057	100.8
8	156	1,351	66.5	78	682	33.5	234	2,033	100.0	1,947	104.4
9	173	1,503	65.7	89	783	34.3	262	2,286	100.0	1,952	117.1
10	171	1,509	67.1	92	740	32.9	263	2,249	100.0	1,990	113.0
11	150	1,333	67.0	75	656	33.0	225	1,989	100.0	2,059	96.6
12	153	1,330	66.4	77	673	33.6	230	2,003	100.0	2,219	90.3
1	161	1,411	66.9	79	697	33.1	240	2,108	100.0	2,077	101.5
2	125	1,093	70.9	50	448	29.1	175	1,541	100.0	1,428	107.9
3	160	1,434	71.6	64	570	28.4	224	2,004	100.0	2,054	97.6
計	1,960	16,877	67.4	956	8,155	32.6	2,916	25,032	100.0	24,317	102.9
月平均	163	1,406		80	680		243	2,086		2,026	

9－3. 焼却残渣(灰)測定結果

項目	焼却残渣(灰)測定結果											
	1号炉		2号炉		3号炉		4号炉		全体		灰ﾋﾟｯﾄ	
	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分	未燃分	水分
月	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
4	3.9	54.0	3.2	43.0	3.7	53.0	－	－	3.6	50.0	3.8	37.6
5	3.8	52.1	3.8	35.0	4.7	48.0	－	－	4.1	45.0	3.0	35.4
6	－	－	3.3	58.6	4.9	48.9	4.1	41.7	4.1	49.7	3.4	43.3
7	3.7	58.4	4.9	52.5	－	－	3.4	53.4	4.0	54.8	4.7	38.8
8	5.0	48.3	－	－	3.8	59.2	3.4	61.0	4.1	56.2	5.1	50.0
9	3.6	54.0	－	－	3.1	33.1	3.6	52.4	3.4	46.5	3.5	35.6
10	－	－	－	－	4.7	51.6	4.2	50.8	4.5	51.2	3.7	45.1
11	4.7	32.6	3.4	47.0	3.7	55.0	－	－	3.9	44.9	2.7	33.9
12	4.7	34.8	－	－	3.2	53.5	3.8	43.1	3.9	43.8	3.0	31.6
1	3.2	32.2	3.7	46.3	－	－	5.3	44.6	4.1	41.0	2.7	25.2
2	－	－	4.5	35.2	4.5	33.0	－	－	4.5	34.1	4.4	26.5
3	2.2	37.1	2.3	36.0	5.9	43.9	－	－	3.5	39.0	2.1	23.2
平均	3.9	44.8	3.6	44.2	4.2	47.9	4.0	49.6	4.0	46.4	3.5	35.5
最大	5.0	58.4	4.9	58.6	5.9	59.2	5.3	61.0	4.5	56.2	5.1	50.0
最小	2.2	32.2	2.3	35.0	3.1	33.0	3.4	41.7	3.4	34.1	2.1	23.2

※ 10月と2月の灰ﾋﾟｯﾄの測定値は2回の平均

10. 公害関係

10－1. 敷地境界線における臭気測定結果 （悪臭防止法に基づく）

（単位：ppm）

測定項目＼測定点	測定日： 平成26年10月8日（水）				
	玄関前	西 側	南 側	北 側	基準値
アンモニア	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
メチルメルカプタン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002
硫化水素	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.02
硫化メチル	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01
二硫化メチル	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009
トリメチルアミン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005
アセトアルデヒド	0.006	0.005	0.003	0.007	0.05
プロピオンアルデヒド	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009
イソブチルアルデヒド	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009
イソバレルアルデヒド	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.003
イソブタノール	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.9
酢酸エチル	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3
メチルイソブチルケトン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
トルエン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10
スチレン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.4
キシレン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1
プロピオン酸	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.03
ノルマル酪酸	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001
ノルマル吉草酸	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
イソ吉草酸	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001
臭気指数	<10	<10	<10	<10	―

※ 臭気指数の単位：希釈倍数で無次元

※ 定量下限値未満はN.D.とした。

測定箇所概略図

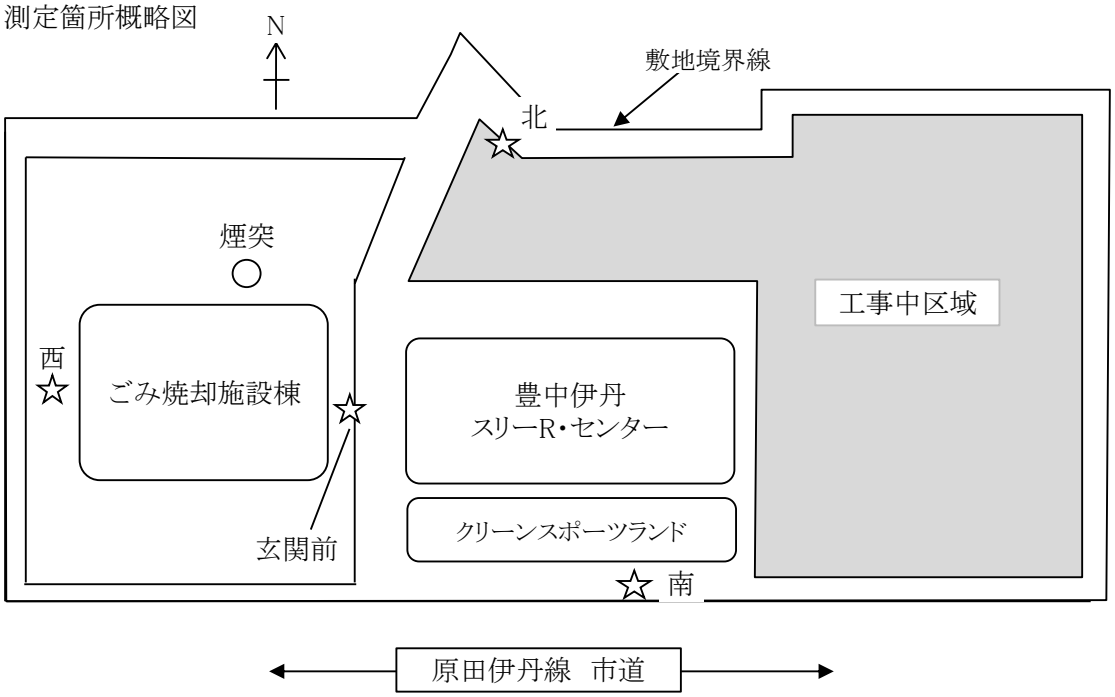

10－2. 排ガス関係測定結果(大気汚染防止法に基づく)

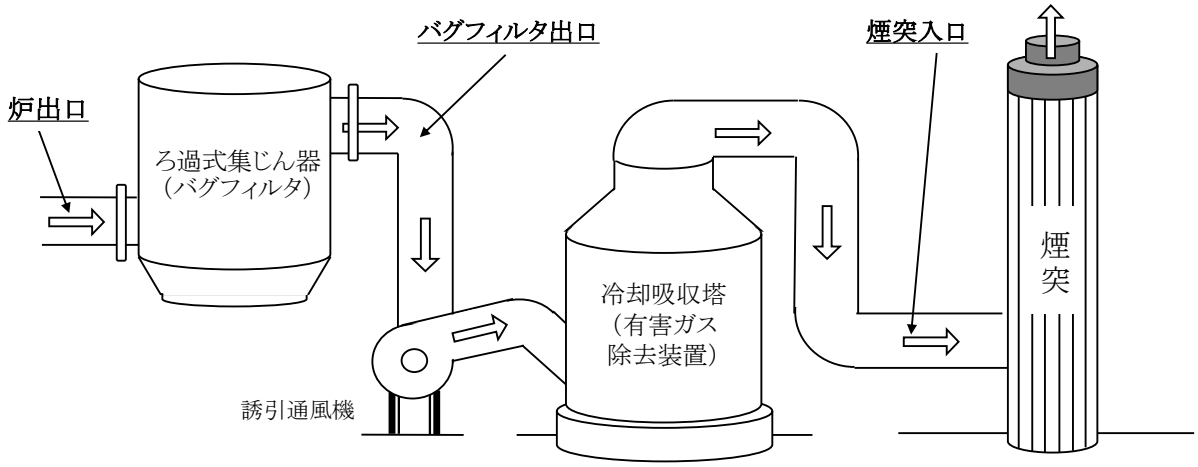

○ばいじん量

炉 出 口　　(g/Nm³)

測定炉	12月	1月	2月
1号炉	－	1.5	－
2号炉	－	－	0.54
3号炉	－	－	1.0
4号炉	1.5	－	－

バグフィルタ出口　　(g/Nm³)

測定炉	7月	8月	12月	1月	2月
1号炉	<0.001	－	－	<0.001	－
2号炉	<0.001	－	－	－	<0.001
3号炉	－	<0.001	－	－	<0.001
4号炉	<0.001	－	<0.001	－	－

煙突入口　　(g/Nm³)

測定炉	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
1号炉	0.002	－	0.001	－	0.006	－	0.001	－	0.002	－	0.001	0.08
2号炉	0.002	－	0.002	－	－	－	0.003	－	0.001	0.001	0.001	
3号炉	0.001	－	－	0.002	0.002	－	0.002	0.004	－	<0.001	－	
4号炉	－	<0.001	0.002	－	<0.001	<0.001	－	0.002	0.001	－	－	

※ 4月は、排ガスの測定をおこなっていない。

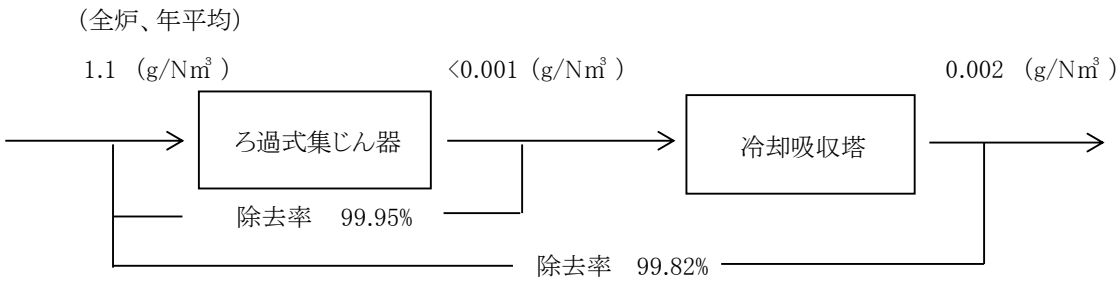

◎ 測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

※ ばいじん量については、酸素12%換算値。

○排ガス量、塩化水素・いおう酸化物・窒素酸化物

1号炉炉出口

項	目	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	54,900
排ガス量(dry)	Nm³／h	40,700
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	250
いおう酸化物	Nm³／h	2.4
	cm³／Nm³	58

1号炉集じん器出口

項	目	7月	1月
排ガス量(wet)	Nm³／h	56,600	48,700
排ガス量(dry)	Nm³／h	41,500	35,700
塩化水素	※ mg ／Nm³	75	97
いおう酸化物	Nm³／h	0.6	1.6
	cm³／Nm³	14	44

1号炉煙突入口

項	目	5月	7月	9月	11月	1月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	66,800	64,900	64,900	55,900	58,700	65,600	－
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,800	44,800	46,000	39,700	41,900	47,900	－
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.0	3.0	2.9	2.8	3.1	3.1	－
	※ cm³／Nm³	86	54	53	56	58	55	300
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	0.5	1.6	1.1	2.0	0.8	1.0	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.17	0.09	0.06	0.02	0.08	0.03	8.60～9.23
	cm³／Nm³	3.6	2.0	1.3	0.5	2.0	0.6	－

※ 窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

2号炉炉出口

項	目	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	55,000
排ガス量(dry)	Nm³／h	43,300
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	410
いおう酸化物	Nm³／h	1.6
	cm³／Nm³	37

2号炉集じん器出口

項	目	7月	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	53,900	60,200
排ガス量(dry)	Nm³／h	40,000	46,500
塩化水素	※ mg ／Nm³	110	80
いおう酸化物	Nm³／h	1.4	0.8
	cm³／Nm³	36	17

2号炉煙突入口

項	目	5月	7月	11月	1月	2月	3月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	72,100	59,800	66,200	63,000	61,200	66,700	－
排ガス量(dry)	Nm³／h	52,200	41,900	46,900	46,700	43,900	49,000	－
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	4.0	3.1	3.4	3.5	2.9	4.0	－
	※ cm³／Nm³	65	58	62	66	54	74	300
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	0.9	2.0	0.6	1.1	1.0	0.9	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.21	0.11	0.04	0.07	0.03	0.03	8.80～9.48
	cm³／Nm³	4.0	2.6	0.8	1.5	0.6	0.6	－

※ 窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

3号炉炉出口

項	目	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	57,100
排ガス量(dry)	Nm³／h	46,700
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	310
いおう酸化物	Nm³／h	1.6
	cm³／Nm³	35

3号炉集じん器出口

項	目	8月	2月
排ガス量(wet)	Nm³／h	53,800	59,300
排ガス量(dry)	Nm³／h	39,700	46,400
塩化水素	※ mg ／Nm³	65	45
いおう酸化物	Nm³／h	1.0	0.4
	cm³／Nm³	26	9.2

3号炉煙突入口

項	目	5月	8月	9月	11月	12月	2月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	72,400	63,300	59,500	70,200	56,500	60,000	－
排ガス量(dry)	Nm³／h	56,500	44,500	40,100	48,200	40,600	43,100	－
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	5.2	3.7	3.0	5.2	3.8	3.4	－
	※ cm³／Nm³	94	74	66	98	76	66	300
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	0.6	1.2	0.4	<0.4	0.9	1.4	700
いおう酸化物	Nm³／h	0.06	0.09	<0.02	<0.02	0.24	0.03	8.60～9.38
	cm³／Nm³	1.0	2.0	<0.5	<0.5	5.8	0.8	－

※ 窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

4号炉炉出口

項	目	12月
排ガス量(wet)	Nm³／h	50,600
排ガス量(dry)	Nm³／h	42,800
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	330
いおう酸化物	Nm³／h	1.7
	cm³／Nm³	39

4号炉集じん器出口

項	目	7月	12月
排ガス量(wet)	Nm³／h	59,900	50,500
排ガス量(dry)	Nm³／h	49,000	41,500
塩化水素	※ mg ／Nm³	100	42
いおう酸化物	Nm³／h	1.7	1.4
	cm³／Nm³	35	34

4号炉煙突入口

項	目	6月	7月	9月	10月	12月	1月	規制値
排ガス量(wet)	Nm³／h	68,000	69,200	61,500	62,300	57,800	63,200	－
排ガス量(dry)	Nm³／h	50,700	52,400	46,900	47,300	45,200	47,300	－
窒 素 酸 化 物	Nm³／h	3.1	6.6	4.6	5.0	4.6	5.2	－
	※ cm³／Nm³	47	93	80	81	81	83	250
塩 化 水 素	※ mg ／Nm³	0.5	1.3	0.9	1.2	0.4	0.6	700
いおう酸化物	Nm³／h	<0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.03	3.44～3.68
	cm³／Nm³	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	－

※ 窒素酸化物及び塩化水素濃度については、酸素12%換算値

（全炉、年平均）

排ガス量
wet　55,400　Nm³/h
dry　42,500　Nm³/h

塩化水素　77 mg /Nm³
SOx　27 cm³/Nm³

冷却吸収塔
（有害ガス除去装置）

除去率
塩化水素　98.8　%
SOx　94.8　%

排ガス量
wet　63,700　Nm³/h
dry　46,300　Nm³/h

◎塩化水素　0.96　mg /Nm³
◎SOx　1.4　cm³/Nm³

◎ 測定結果が定量下限未満の場合、定量下限値の1/2値を使用し計算した。

○NOx・SOx総量規制値に対する総排出量

項目（稼働炉数）		5月（3）	7月（3）	9月（3）
窒素酸化物（NOx）	Nm³／h	14.2	12.7	10.5
いおう酸化物（SOx）	Nm³／h	0.44	0.23	<0.10

項目（稼働炉数）		11月（3）	1月（3）	2月（2）	総量規制値
窒素酸化物（NOx）	Nm³／h	11.4	11.8	6.3	39.28
いおう酸化物（SOx）	Nm³／h	<0.08	0.18	0.06	19.35

10－3. 窒素酸化物排出濃度の経年変化（煙突入口）

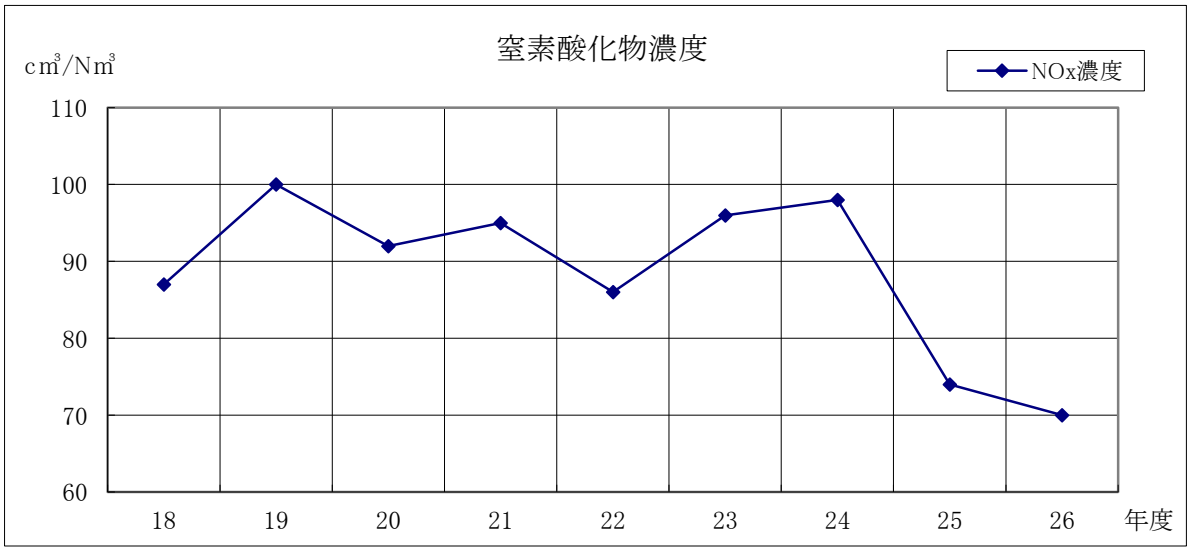

年度	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NOx濃度（cm³/Nm³）	87	100	92	95	86	96	98	74	70

10－4. 塩化水素排出濃度の経年変化（集じん器出口、煙突入口）

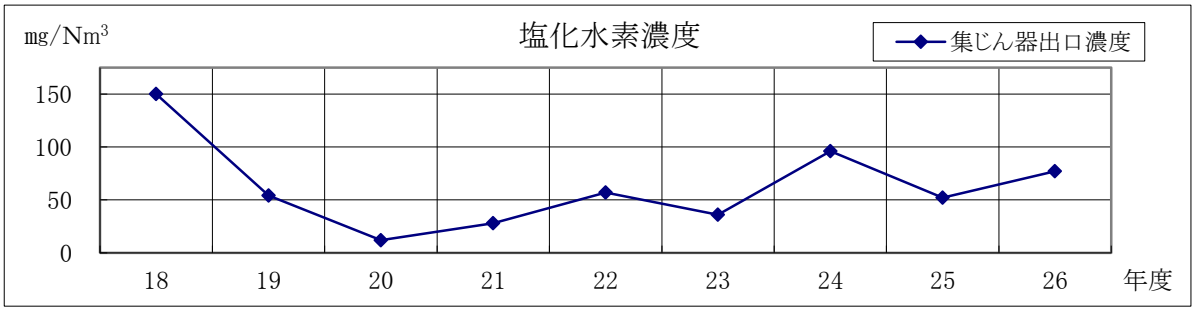

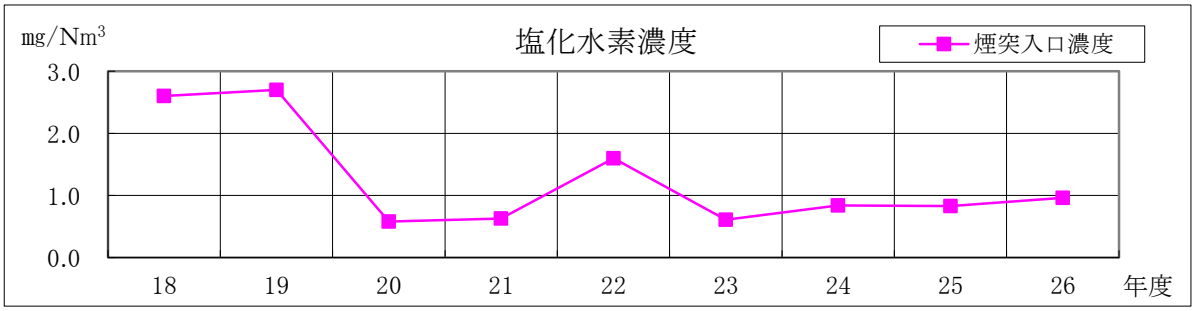

年　　度	18	19	20	21	22	23	24	25	26
集じん器出口濃度（mg/N㎥）	150	54	12	28	57	36	96	52	77
煙突入口濃度（mg/N㎥）	2.6	2.7	0.58	0.63	1.6	0.61	0.84	0.83	0.96
除　去　率　（　%　）	98.3	95.0	95.2	97.8	97.2	98.3	99.1	98.4	98.8

10－5. いおう酸化物排出濃度の経年変化（集じん器出口、煙突入口）

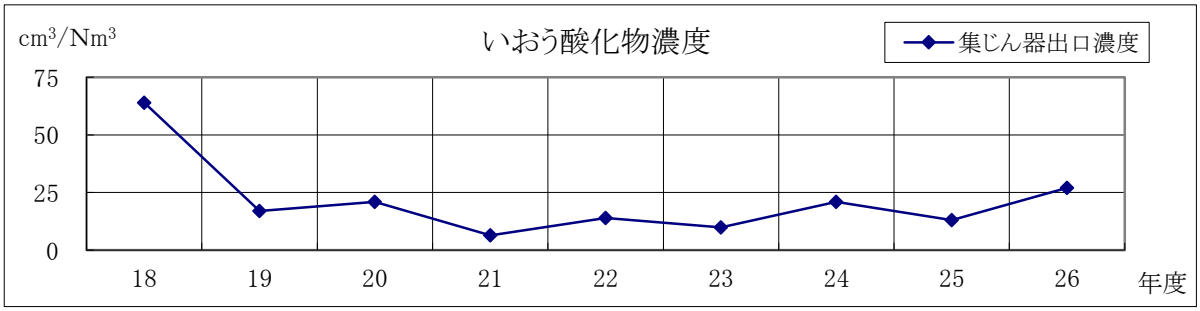

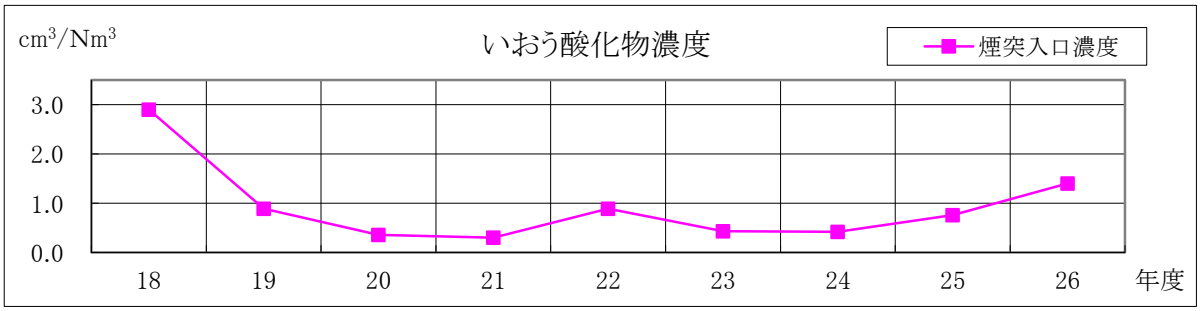

年　　度	18	19	20	21	22	23	24	25	26
集じん器出口濃度（㎥/N㎥）	64	17	21	6.4	14	9.8	21	13	27
煙突入口濃度（c㎥/N㎥）	2.9	0.89	0.36	0.30	0.89	0.43	0.42	0.76	1.4
除　去　率　（　%　）	95.5	94.8	98.3	95.3	93.6	95.6	98.0	94.2	94.8

10－6. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(コプラナーPCB含む)

(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく)

		1 号 炉	2 号 炉
測 定 日		平成26年9月9日	平成26年11月11日
当日分	焼 却 量 t／日	170.96	176.23
	炉出口温度 ℃	872	857
	集じん器入口温度 ℃	191	190
測定時	排ガス温度 ℃	71	69
	排ガス量(wet) Nm³/h	64,900	66,200
	排ガス量(dry) Nm³/h	46,000	46,900
	平均水分量 %	29.1	29.2
	酸素濃度 (4時間平均値) %	10.4	11.2
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	14	6
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	0.004	0.007
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.039	0.017

		3 号 炉	4 号 炉
測 定 日		平成26年9月16日	平成26年9月19日
当日分	焼 却 量 t／日	182.38	195.18
	炉出口温度 ℃	862	939
	集じん器入口温度 ℃	190	190
測定時	排ガス温度 ℃	71	66
	排ガス量(wet) Nm³/h	59,500	61,500
	排ガス量(dry) Nm³/h	40,100	46,900
	平均水分量 %	32.6	23.8
	酸素濃度 (4時間平均値) %	10.5	10.0
	CO濃度 (酸素換算、4時間平均値) ppm	19	4
	ばいじん濃度(酸素換算値) g/Nm³	0.002	0.001
ダイオキシン類濃度 (酸素換算値、毒性等量) WHO(2006)-TEFを適用、 ng-TEQ/Nm³		0.025	0.020

● 基準値 (ng-TEQ/Nm³)

	1，2，3号炉	4 号 炉
大気汚染防止法 平成10年12月 1日～平成14年11月30日	80	80
〃 平成14年12月 1日～	1	1
ガイドライン恒久対策	1	0.5

10－7. 排ガス中のダイオキシン類濃度の経年変化 （煙突入口）

基準値:1ng-TEQ/Nm³

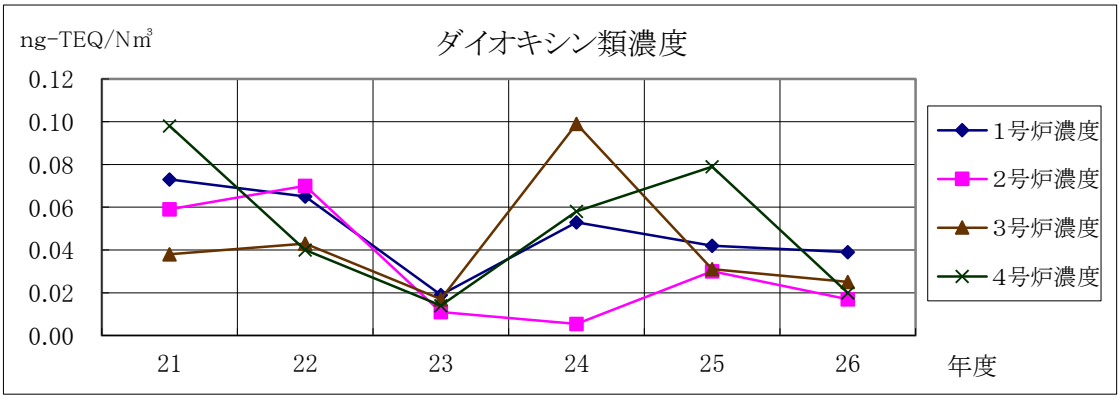

（単位:ng-TEQ/Nm³）

年 度	21	22	23	24	25	26
1 号 炉 濃 度	0.073	0.065	0.019	0.053	0.042	0.039
2 号 炉 濃 度	0.059	0.070	0.011	0.0054	0.030	0.017
3 号 炉 濃 度	0.038	0.043	0.017	0.099	0.031	0.025
4 号 炉 濃 度	0.098	0.040	0.014	0.058	0.079	0.020

※ 毒性等価係数はWHO（2006）－TEFを適用

10－8. その他のダイオキシン類測定結果（コプラナーPCB含む）

（ダイオキシン類対策特別措置法に基づく）

①ばいじん及び焼却灰関係

サンプル	測定日	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 (ng-TEQ/g)	基準値
1 号 炉 焼 却 灰	平成26年9月9日	0.0052	3ng-TEQ/g
2 号 炉 焼 却 灰	平成26年11月11日	0.057	
3 号 炉 焼 却 灰	平成26年9月16日	0.00091	
4 号 炉 焼 却 灰	平成26年9月19日	0.0069	
東 側 バ グ 灰 固 化 物	平成26年7月1日	0.27	
	平成26年9月9日	0.25	
西 側 バ グ 灰 固 化 物	平成26年7月1日	0.21	
	平成26年9月16日	0.24	
脱 水 ケ ー キ	平成26年10月8日	0.025	
ピ ッ ト 残 灰	平成26年7月1日	0.0046	
	平成26年9月9日	0.0020	

②排水関係

サンプル	測定日	浮遊物質量 (mg/ℓ)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 (pg-TEQ/ℓ)	基準値
※ 下 水 放 流 水	平成26年9月9日	23	0.055	10pg-TEQ/ℓ
西 側 放 流 水	平成26年9月9日	1.7	0.023	
東 側 放 流 水	平成26年9月9日	0.64	6.6	
	平成26年10月24日	<0.4	0.032	

※ 下水放流水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時の流量、洗灰系11.5m³/h、洗煙系6.0m³/h、総放流25.7m³/h、

10－9. 排水関係測定結果（下水道法に基づく）

①原水水質測定結果

●洗灰処理原水

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温　度 (℃)	27.6	28.8	26.9	30.8	32.3	31.7	27.9	25.2	20.7	22.5	25.0	25.6
水素イオン濃　度	10.6	10.8	8.8	10.3	7.3	10.1	10.4	10.6	9.7	11.0	10.7	11.1
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	72	68	94	40	14	34	49	76	28	38	58	62
化学的酸素要求量 (〃)	72	97	120	52	48	49	54	88	43	70	140	130
浮遊物質量 (〃)	48	50	47	18	52	55	110	23	85	33	55	54
全蒸発残留物 (〃)	5,300	5,800	8,000	6,400	6,100	7,400	5,600	8,000	2,500	5,900	8,300	5,400
よう素消費量 (〃)	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－
シアン含有量 (〃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム含有量 (〃)	0.007	0.01	0.01	N.D.	0.004	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛含有量 (〃)	0.1	0.2	0.3	N.D.	0.09	0.2	0.06	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
総水銀含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.005	0.006
クロム含有量 (〃)	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
銅含有量 (〃)	0.2	0.3	0.5	0.06	0.09	0.08	0.1	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01
亜鉛含有量 (〃)	0.6	1.4	3.7	N.D.	0.4	0.3	0.3	N.D.	N.D.	0.1	N.D.	N.D.
鉄含有量 (〃)	0.6	2.2	4.6	N.D.	0.3	0.3	0.3	N.D.	N.D.	0.6	0.8	1.4
マンガン含有量 (〃)	0.1	0.4	0.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ふっ素含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素含有量 (〃)	0.21	0.31	0.34	N.D.	0.20	0.21	N.D.	N.D.	N.D.	0.45	1.2	0.89

※ 平成27年1月より排水処理の方式を変更。

●洗煙処理原水

項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
温　度	(℃)	38.0	21.8	29.4	31.1	32.4	30.6	27.7	25.3	35.3	32.2	34.7	40.8
水素イオン濃　度		7.7	7.7	11.0	8.4	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1	7.9	7.7	7.6
生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	6.0	12	34	34	16	15	20	19	20	11	11	4.0
化学的酸素要求量	(〃)	35	35	45	68	40	22	42	35	38	33	30	28
浮遊物質量	(〃)	35	61	140	130	76	22	85	7.0	290	11	6.6	43
全蒸発残留物	(〃)	11,000	6,500	10,100	8,900	9,400	8,800	10,800	7,300	8,200	8,900	6,000	4,600
よう素消費量	(〃)	−	−	−	−	−	4.4	−	−	−	−	−	−
シアン含有量	(〃)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カドミウム含有量	(〃)	N.D.	0.003	0.006	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛含有量	(〃)	0.03	0.08	0.2	0.1	0.04	0.02	0.03	N.D.	0.07	N.D.	N.D.	N.D.
総水銀含有量	(〃)	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6
クロム含有量	(〃)	N.D.	N.D.	N.D.	1.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
銅含有量	(〃)	0.06	0.2	0.3	0.6	0.06	0.04	0.06	0.04	0.1	0.03	0.01	0.04
亜鉛含有量	(〃)	0.4	1.5	1.3	1.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4
鉄含有量	(〃)	4.2	7.0	62	220	21	7.2	10	1.2	74	1.2	0.6	4.5
マンガン含有量	(〃)	0.1	0.1	0.6	1.7	0.1	N.D.	0.1	N.D.	0.4	N.D.	N.D.	N.D.
ふっ素含有量	(〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
n−ヘキサン抽出物質	(〃)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素含有量	(〃)	2.1	0.97	1.3	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1	1.2	1.4	0.99	0.57

※ 平成27年1月より排水処理の方式を変更。

②放流水水質測定結果

項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値
温　度 (℃)	25.9	28.4	29.4	31.5	32.7	28.9	27.1	23.7	24.9	23.1	23.9	21.7	45
水素イオン濃度	7.0	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	8.0	7.9	5～9
生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	65	40	55	81	34	38	56	83	74	27	53	99	600
化学的酸素要求量 (〃)	47	46	48	65	26	25	55	99	22	22	33	140	－
浮遊物質量 (〃)	11	8.2	12	17	14	24	30	44	51	36	34	52	600
全蒸発残留物 (〃)	5,500	5,700	7,500	4,100	2,800	7,500	7,700	6,600	2,600	2,100	1,900	2,800	－
よう素消費量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8.5	N.D.	N.D.	－	－	－	－	220
シアン含有量 (〃)	－	－	－	－	－	N.D.	－	－	－	－	－	－	1
カドミウム含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
鉛含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
総水銀含有量 (〃)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0007	0.001	0.001	0.001	0.0008	N.D.	N.D.	N.D.	0.005
クロム含有量 (〃)	0.2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2
銅含有量 (〃)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	N.D.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	3
亜鉛含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2
鉄含有量 (〃)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	(溶) 10
マンガン含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	(溶) 10
ふっ素含有量 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8
n－ヘキサン抽出物質 (〃)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	30
ほう素含有量 (〃)	0.36	0.38	0.45	0.36	N.D.	0.42	0.33	0.44	0.31	0.55	0.29	0.43	10

※ 平成27年1月より排水処理の方式を変更。

③水素イオン濃度の経月変化

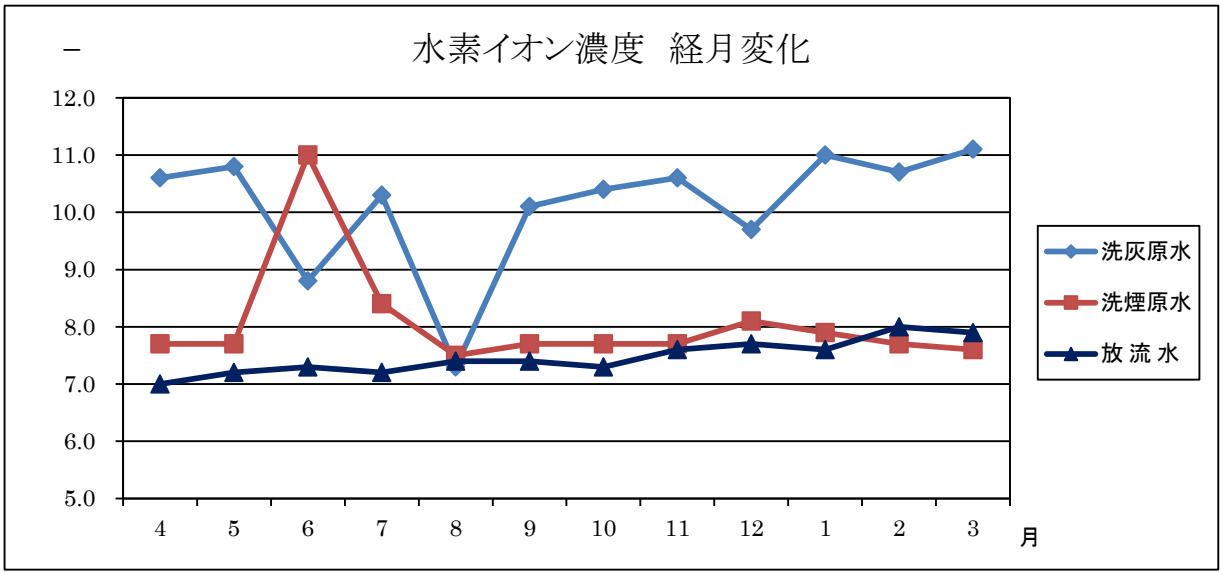

（単位:－）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	10.6	10.8	8.8	10.3	7.3	10.1	10.4	10.6	9.7	11.0	10.7	11.1
洗煙原水	7.7	7.7	11.0	8.4	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1	7.9	7.7	7.6
放 流 水	7.0	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	8.0	7.9

放流水の基準値:5～9

④水銀濃度の経月変化

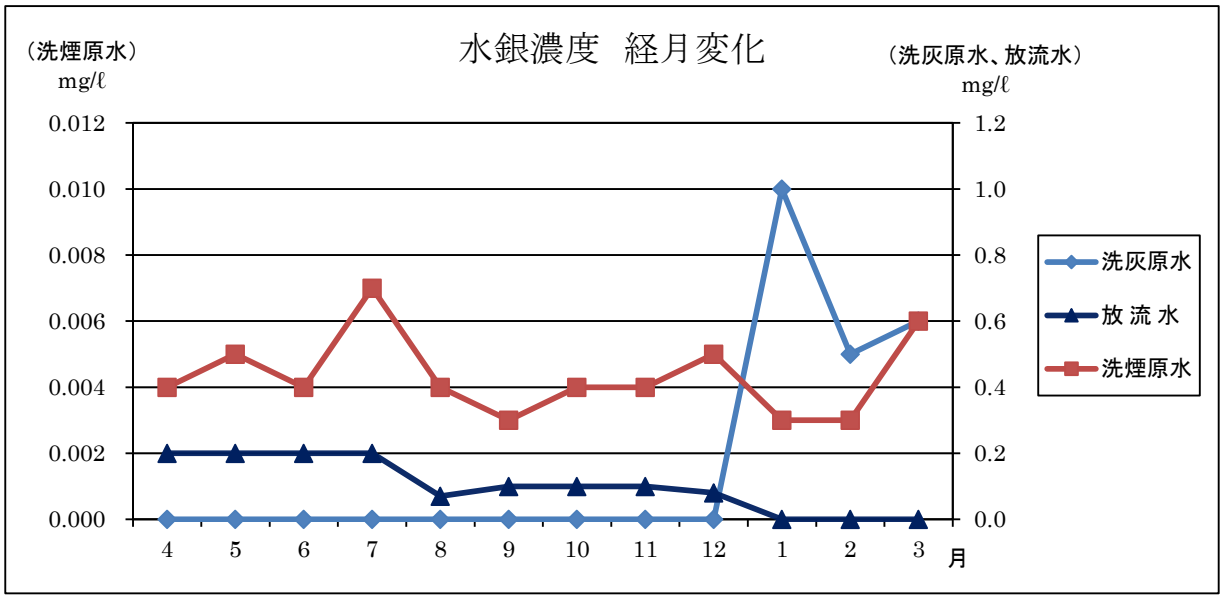

（単位:mg/ℓ）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.005	0.006
洗煙原水	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6
放 流 水	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0007	0.001	0.001	0.001	0.0008	N.D.	N.D.	N.D.

放流水の基準値:0.005mg/ℓ

⑤鉛濃度の経月変化

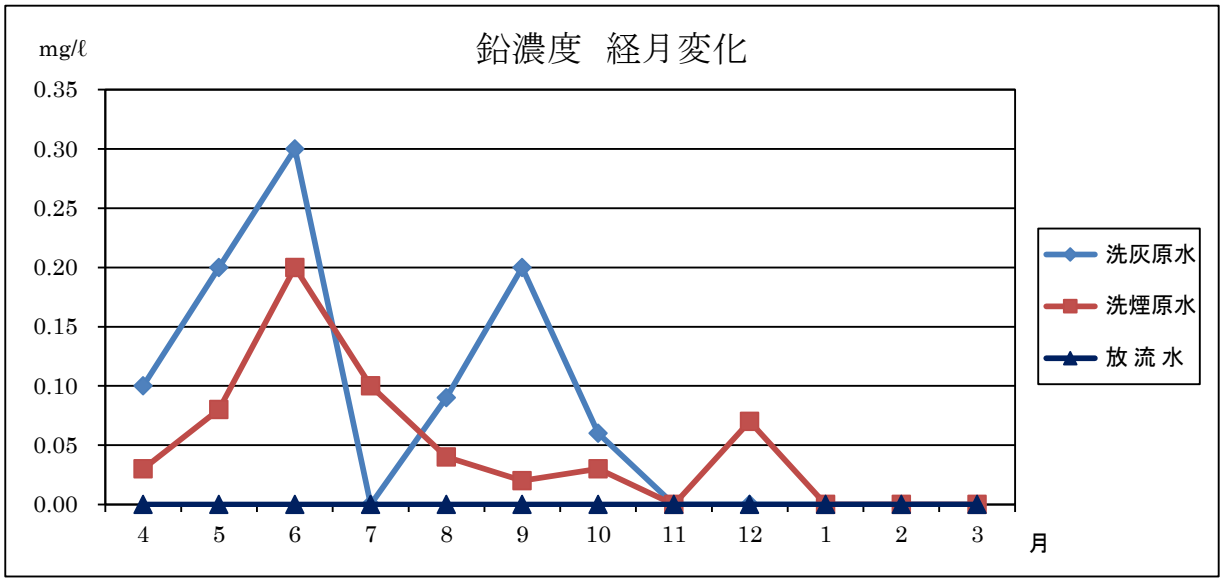

（単位:mg/ℓ）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.1	0.2	0.3	N.D.	0.09	0.2	0.06	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
洗煙原水	0.03	0.08	0.2	0.1	0.04	0.02	0.03	N.D.	0.07	N.D.	N.D.	N.D.
放 流 水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

放流水の基準値:0.1mg/ℓ

⑥亜鉛濃度の経月変化

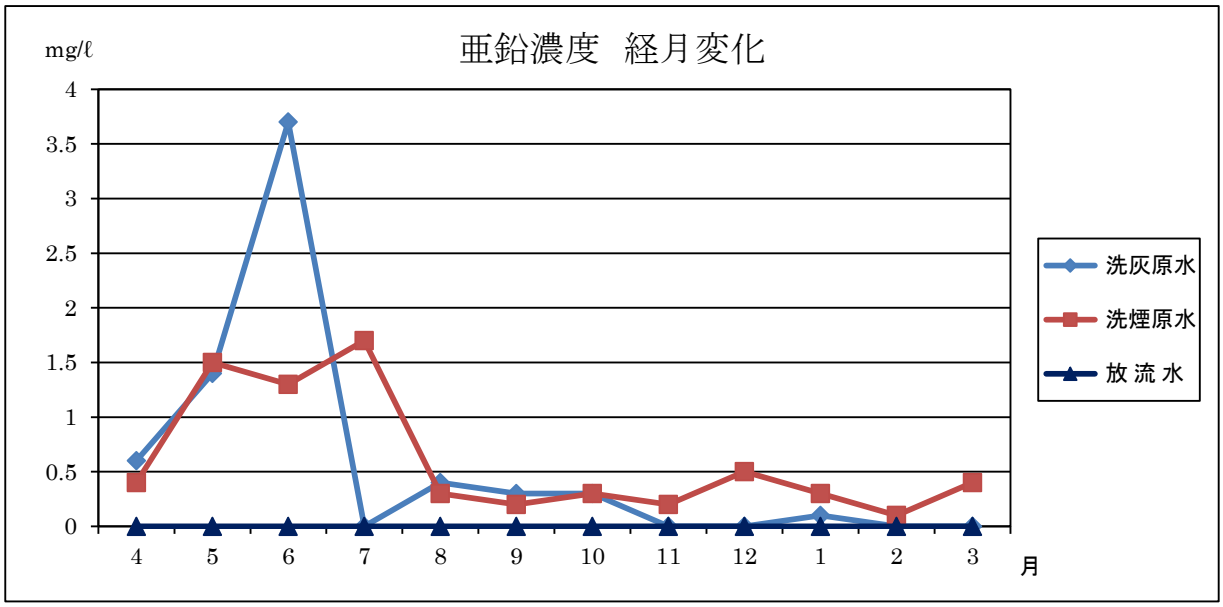

（単位:mg/ℓ）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
洗灰原水	0.6	1.4	3.7	N.D.	0.4	0.3	0.3	N.D.	N.D.	0.1	N.D.	N.D.
洗煙原水	0.4	1.5	1.3	1.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4
放 流 水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

放流水の基準値:2mg/ℓ

11. 維持管理経費の状況

11－1. 処理経費

区分 ＼ 年度			平成26年度（円）	平成25年度（円）	前年比（%）
	人件費		650,191,437	660,409,479	98.5
	物件費		1,027,981,810	972,599,764	105.7
	内訳	消耗品費	189,756,589	158,219,839	119.9
		光熱水費	86,387,733	87,697,524	98.5
		工事・修繕料	414,504,049	425,665,680	97.4
		残灰処分委託料	238,365,637	225,137,603	105.9
		その他	98,967,802	75,879,118	130.4
合計			1,678,173,247	1,633,009,243	102.8
処理経費	総可燃ごみ搬入量(t)		149,634	151,227	98.9
	トン当り処理経費(円)		11,215	10,798	103.9
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,593	1,489	107.0
	焼却量(t)		158,867	159,484	99.6
	トン当り処理経費(円)		10,563	10,239	103.2
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,500	1,412	106.3
人口（10月1日現在）			592,563	591,642	100.2
市民一人当り負担額			2,832	2,760	102.6

11－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費（円）	可燃ごみ搬入量（t）	搬入量トン当り処理経費（円）	焼却量（t）	焼却量トン当り処理経費（円）
12	2,279,856,950	208,327	10,944	218,101	10,453
13	2,363,998,879	205,876	11,483	215,930	10,948
14	2,312,448,257	202,922	11,396	210,632	10,979
15	2,247,159,678	196,260	11,450	207,472	10,831
16	1,953,146,295	188,328	10,371	204,441	9,554
17	1,925,753,315	182,420	10,557	195,785	9,836
18	2,084,674,962	181,106	11,511	196,246	10,623
19	2,013,723,060	164,927	12,210	180,524	11,155
20	1,932,179,682	158,017	12,228	173,771	11,119
21	1,803,016,236	151,441	11,906	167,729	10,750
22	1,822,763,160	148,333	12,288	164,992	11,048
23	1,715,062,686	149,430	11,477	169,789	10,101
24	1,741,725,448	152,702	11,406	160,784	10,833
25	1,633,009,243	151,227	10,798	159,484	10,239
26	1,678,173,247	149,634	11,215	158,867	10,563

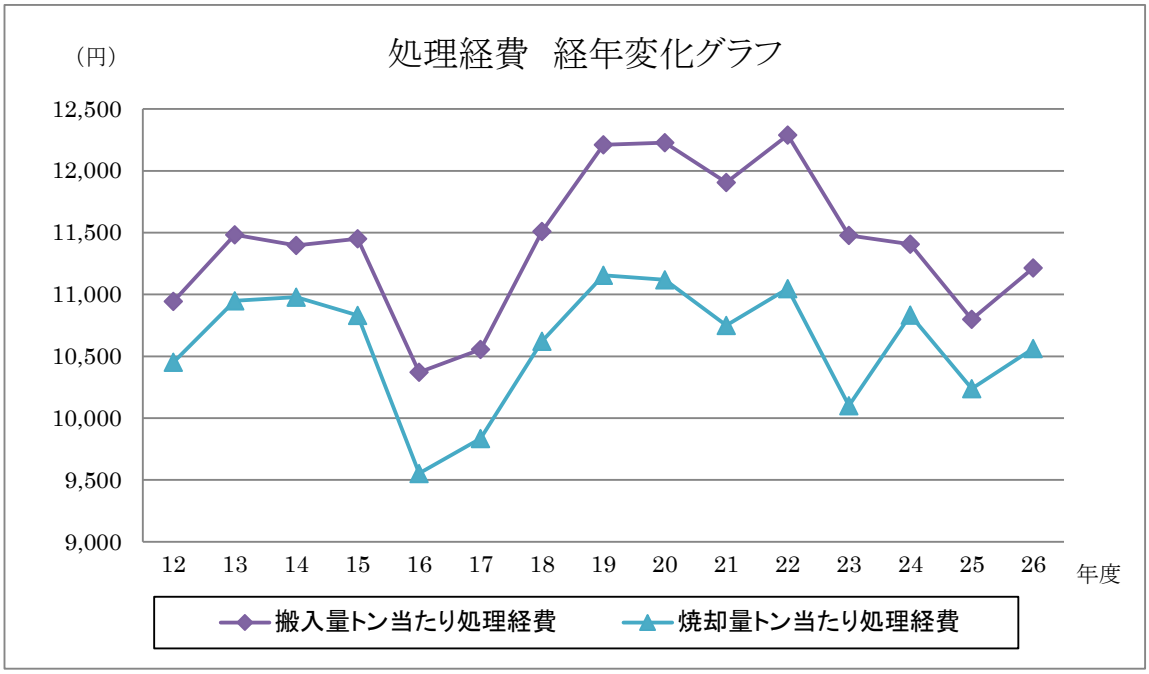
処理経費　経年変化グラフ
（円）
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
年度
搬入量トン当たり処理経費
焼却量トン当たり処理経費

Ⅲ. リサイクルプラザ処理状況
（豊中伊丹スリーR・センター）

1. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績

1－1. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（両市合計）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		ビン類		ペットボトル	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	727.89	2,504	26.43	181	258.68	523	76.77	411
5	730.30	2,605	22.82	165	275.66	526	92.67	427
6	650.58	2,172	23.86	166	268.49	518	97.41	427
7	707.29	2,393	23.43	164	266.09	522	112.08	470
8	714.33	2,397	23.81	168	287.45	520	125.33	463
9	722.05	2,281	21.83	162	265.28	515	109.15	452
10	696.70	2,345	24.09	206	262.49	522	95.68	452
11	640.76	2,182	24.99	190	252.11	521	79.61	408
12	763.85	2,473	27.40	186	276.44	554	72.47	387
1	653.06	2,036	18.18	143	307.60	463	74.69	393
2	574.21	2,033	21.00	160	263.11	513	63.16	366
3	667.52	2,427	22.96	161	248.51	507	70.07	388
計	8,248.54	27,848	280.80	2,052	3,231.91	6,204	1,069.09	5,044
月平均	687.38	2,321	23.40	171	269.33	517	89.09	420

項目	プラスチック製容器包装		缶類		古紙・古布		合計	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	457.79	1,191	44.29	399	262.77	399	1,854.62	5,608
5	466.33	1,190	43.71	400	248.99	400	1,880.48	5,713
6	437.06	1,152	43.31	402	197.42	395	1,718.13	5,232
7	480.18	1,236	42.32	397	191.82	390	1,823.21	5,572
8	440.47	1,143	48.99	398	219.13	397	1,859.51	5,486
9	450.81	1,205	41.81	397	178.13	395	1,789.06	5,407
10	466.89	1,234	39.24	396	175.56	397	1,760.65	5,552
11	400.02	1,080	37.56	400	221.09	399	1,656.14	5,180
12	466.04	1,175	43.71	424	244.86	413	1,894.77	5,612
1	481.41	1,105	36.02	346	229.86	380	1,800.82	4,866
2	401.22	1,046	36.72	389	173.10	388	1,532.52	4,895
3	449.16	1,193	33.73	392	197.40	392	1,689.35	5,460
計	5,397.38	13,950	491.41	4,740	2,540.13	4,745	21,259.26	64,583
月平均	449.78	1,163	40.95	395	211.68	395	1,771.61	5,382

1－2. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（豊中市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		ビン類		ペットボトル	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	264.27	1,765	22.14	142	177.95	430	48.51	323
5	278.35	1,843	19.96	138	193.75	434	61.19	336
6	246.43	1,494	20.87	137	190.69	430	63.22	335
7	246.81	1,640	20.11	131	178.90	425	69.24	360
8	277.60	1,666	20.15	137	206.57	432	83.81	360
9	264.66	1,585	18.59	133	185.09	425	70.80	353
10	248.33	1,622	20.34	166	180.18	426	60.80	356
11	248.73	1,524	21.54	157	183.23	440	55.30	333
12	299.54	1,724	23.78	153	199.08	468	48.99	319
1	218.25	1,335	15.96	116	204.03	357	47.48	317
2	217.93	1,392	18.44	139	188.79	430	41.80	304
3	245.66	1,715	20.05	131	168.26	416	45.16	315
計	3,056.56	19,305	241.93	1,680	2,256.52	5,113	696.30	4,011
月平均	254.71	1,609	20.16	140	188.04	426	58.03	334

項目	プラスチック製容器包装		缶類		古紙・古布		合計	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	328.65	951	44.29	399	262.77	399	1,148.58	4,409
5	339.26	955	43.71	400	248.99	400	1,185.21	4,506
6	318.26	926	43.31	402	197.42	395	1,080.20	4,119
7	345.59	987	42.32	397	191.82	390	1,094.79	4,330
8	318.92	917	48.99	398	219.13	397	1,175.17	4,307
9	327.66	973	41.81	397	178.13	395	1,086.74	4,261
10	333.87	983	39.24	396	175.56	397	1,058.32	4,346
11	287.31	862	37.56	400	221.09	399	1,054.76	4,115
12	345.33	961	43.71	424	244.86	413	1,205.29	4,462
1	336.31	866	36.02	346	229.86	380	1,087.91	3,717
2	286.53	828	36.72	389	173.10	388	963.31	3,870
3	322.94	960	33.73	392	197.40	392	1,033.20	4,321
計	3,890.63	11,169	491.41	4,740	2,540.13	4,745	13,173.48	50,763
月平均	324.22	931	40.95	395	211.68	395	1,097.79	4,230

1－3. 不燃・粗大・資源ごみの搬入量実績（伊丹市分）

項目	不燃ごみ		粗大ごみ		ビン類		ペットボトル	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	463.62	739	4.29	39	80.73	93	28.26	88
5	451.95	762	2.86	27	81.91	92	31.48	91
6	404.15	678	2.99	29	77.80	88	34.19	92
7	460.48	753	3.32	33	87.19	97	42.84	110
8	436.73	731	3.66	31	80.88	88	41.52	103
9	457.39	696	3.24	29	80.19	90	38.35	99
10	448.37	723	3.75	40	82.31	96	34.88	96
11	392.03	658	3.45	33	68.88	81	24.31	75
12	464.31	749	3.62	33	77.36	86	23.48	68
1	434.81	701	2.22	27	103.57	106	27.21	76
2	356.28	641	2.56	21	74.32	83	21.36	62
3	421.86	712	2.91	30	80.25	91	24.91	73
計	5,191.98	8,543	38.87	372	975.39	1,091	372.79	1,033
月平均	432.67	712	3.24	31	81.28	91	31.07	86

項目	プラスチック製容器包装		缶類		古紙・古布		合計	
	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数	搬入量	搬入台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	129.14	240	0.00	0	0.00	0	706.04	1,199
5	127.07	235	0.00	0	0.00	0	695.27	1,207
6	118.80	226	0.00	0	0.00	0	637.93	1,113
7	134.59	249	0.00	0	0.00	0	728.42	1,242
8	121.55	226	0.00	0	0.00	0	684.34	1,179
9	123.15	232	0.00	0	0.00	0	702.32	1,146
10	133.02	251	0.00	0	0.00	0	702.33	1,206
11	112.71	218	0.00	0	0.00	0	601.38	1,065
12	120.71	214	0.00	0	0.00	0	689.48	1,150
1	145.10	239	0.00	0	0.00	0	712.91	1,149
2	114.69	218	0.00	0	0.00	0	569.21	1,025
3	126.22	233	0.00	0	0.00	0	656.15	1,139
計	1,506.75	2,781	0.00	0	0.00	0	8,085.78	13,820
月平均	125.56	232	0.00	0	0.00	0	673.82	1,152

2. 運転・管理実績

2－1. 不燃・粗大ごみ処理・運転実績

項目 / 月	処理実績 クレーン投入量 (t)	処理運転時間（試運転含む） (時間)	(分)	稼働日数 (日)
4	748.19	73	42	18
5	723.87	72	36	22
6	692.02	76	20	20
7	707.95	75	35	20
8	710.92	75	23	20
9	721.69	74	20	18
10	724.86	77	58	21
11	650.47	69	45	19
12	776.60	82	20	22
1	683.75	74	15	19
2	584.12	63	37	18
3	635.61	68	43	19
計	8,360.05	884	34	236
月平均	696.67	73	43	20
実日平均	35.42	3	45	

2－2. プラスチック製容器包装処理・運転実績

項目 / 月	処理実績 クレーン投入量 (t)	処理運転時間（試運転含む） (時間)	(分)	稼働日数 (日)
4	439.12	72	19	18
5	462.58	74	31	22
6	446.26	74	34	20
7	462.20	76	44	20
8	445.57	70	46	20
9	435.13	70	55	19
10	454.26	82	9	21
11	422.02	82	0	19
12	472.52	83	55	21
1	462.31	80	59	18
2	398.93	70	1	18
3	419.04	70	34	19
計	5,319.94	909	27	235
月平均	443.33	75	47	20
実日平均	22.64	3	52	

2－3. 不燃･粗大搬出実績

項目	処理選別物搬出量							
	可燃物		不燃物		鉄類		非鉄類	
		台数		台数		台数		台数
月	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)	(t)	(台)
4	639.45	491	138.80	17	79.42	30	8.26	4
5	605.83	479	148.59	19	77.77	33	8.18	4
6	576.42	470	131.54	16	68.91	31	9.26	5
7	641.69	474	142.12	18	69.67	35	8.92	5
8	630.09	461	149.36	19	67.56	32	8.48	6
9	620.65	488	132.27	16	71.00	31	9.65	8
10	588.42	521	180.79	21	76.54	35	10.19	9
11	543.49	479	157.85	19	72.40	30	9.32	8
12	669.18	561	171.71	21	85.45	36	9.08	7
1	600.62	499	159.67	20	72.99	34	10.20	7
2	511.63	406	139.91	17	55.93	29	8.08	6
3	563.12	434	140.22	17	62.95	31	9.50	7
計	7,190.59	5,763	1,792.83	220	860.59	387	109.12	76
月平均	599.22	480	149.40	18	71.72	32	9.09	6
実日平均	30.47	24	7.60	1	3.65	2	0.46	0

※ 実日＝236日

2－4. 資源ごみ処理・再商品化実績

項目 / 月	ビン類					
	再商品化 (t)				残渣 (t)	搬出台数 (台)
		無色	茶色	その他		
4	233.66	71.20	47.79	114.67	11.43	28
5	275.39	76.82	55.06	143.51	13.47	31
6	263.99	79.08	54.42	130.49	12.91	30
7	246.02	62.99	43.81	139.22	12.03	31
8	264.03	67.01	47.63	149.39	12.91	32
9	282.67	70.95	53.38	158.34	4.24	33
10	247.29	63.69	42.99	140.61	11.09	31
11	238.79	68.53	45.20	125.06	10.96	30
12	252.27	74.35	45.53	132.39	9.84	30
1	315.93	86.24	55.92	173.77	7.93	37
2	238.76	72.30	46.32	120.14	11.46	28
3	233.85	68.33	45.12	120.40	10.29	28
計	3,092.65	861.49	583.17	1,647.99	128.56	369
月平均	257.72	71.79	48.60	137.33	10.71	31
色別混入率	100.00%	27.86%	18.86%	53.29%		

項目 / 月	ペットボトル			プラスチック製容器包装(白色トレイ含む)		
	再商品化 (t)	残渣 (t)	搬出台数 (台)	再商品化 (t)	残渣 (t)	搬出台数 (台)
4	60.39	9.90	7	359.54	97.05	44
5	78.60	16.95	9	400.12	86.91	48
6	87.35	9.52	10	349.32	70.04	42
7	96.22	15.32	11	369.35	101.53	44
8	106.56	23.27	12	387.33	75.09	47
9	95.96	3.83	11	343.76	95.95	41
10	87.19	14.61	10	390.42	95.67	47
11	69.85	15.16	8	343.48	55.04	42
12	61.42	2.41	7	372.35	76.59	46
1	70.28	11.79	8	401.53	101.18	50
2	52.48	12.12	6	310.54	79.58	38
3	61.49	7.68	7	343.77	111.99	42
計	927.79	142.56	106	4,371.51	1,046.62	531
月平均	77.32	11.88	9	364.29	87.22	44

項目 / 月	缶類				
	再商品化 (t)			残渣 (t)	搬出台数 (台)
		スチール	アルミ		
4	27.90	23.11	4.79	2.50	4
5	47.90	38.35	9.55	5.12	7
6	32.36	23.28	9.08	4.97	5
7	40.92	31.10	9.82	3.90	6
8	39.22	32.61	6.61	8.09	5
9	32.85	25.62	7.23	3.90	4
10	41.48	34.13	7.35	5.50	5
11	36.09	25.74	10.35	8.99	5
12	30.76	25.75	5.01	2.48	4
1	30.56	25.57	4.99	3.78	4
2	30.51	25.59	4.92	8.26	4
3	38.38	30.09	8.29	4.15	6
計	428.93	340.94	87.99	61.64	59
月平均	35.74	28.41	7.33	5.14	5

項目 / 月	古紙・古布			計		
	再商品化 (t)	残渣 (t)	搬出台数 (台)	再商品化 (t)	残渣 (t)	搬出台数 (台)
4	269.20	16.30	125	950.69	137.18	208
5	246.82	2.17	111	1,048.83	124.62	206
6	196.27	1.15	92	929.29	98.59	179
7	188.68	3.14	87	941.19	135.92	179
8	209.48	9.65	93	1,006.62	129.01	189
9	186.18	1.97	84	941.42	109.89	173
10	170.68	1.41	77	937.06	128.28	170
11	213.70	3.06	95	901.91	93.21	180
12	221.19	2.54	99	937.99	93.86	186
1	243.54	3.24	106	1,061.84	127.92	205
2	181.03	1.41	81	813.32	112.83	157
3	199.52	1.85	87	877.01	135.96	170
計	2,526.29	47.89	1,137	11,347.17	1,427.27	2,202
月平均	210.52	3.99	95	945.60	118.94	184

2－5. 用水・電力・蒸気使用量実績

項目 / 月	処理量	電気使用量		下水使用量		蒸気使用量	
			処理量トン当り使用量		処理量トン当り使用量		処理量トン当り使用量
	(t)	(kWh)	(kWh)	(m³)	(m³)	(t)	(t)
4	1,844.42	95,310	51.67	210.30	0.11	36.70	0.02
5	1,862.13	103,150	55.39	175.30	0.09	29.00	0.02
6	1,765.38	108,550	61.49	158.90	0.09	72.10	0.04
7	1,796.25	112,210	62.47	173.40	0.10	88.70	0.05
8	1,856.12	113,420	61.11	189.40	0.10	91.90	0.05
9	1,776.98	111,810	62.92	162.10	0.09	83.40	0.05
10	1,779.14	108,670	61.08	186.80	0.10	80.60	0.05
11	1,684.28	93,760	55.67	152.10	0.09	75.40	0.04
12	1,899.25	102,300	53.86	173.10	0.09	99.30	0.05
1	1,817.43	98,510	54.20	154.00	0.08	98.70	0.05
2	1,519.14	89,620	58.99	142.90	0.09	99.90	0.07
3	1,604.36	95,000	59.21	170.30	0.11	99.60	0.06
計	21,204.88	1,232,310		2,048.60		955.30	
月平均	1,767.07	102,693		170.72		79.61	
暦日平均	58.10	3,376.19		5.61		2.62	
実日平均	89.85	5,221.65		8.68		4.05	

※ 実日＝236日

3. 不燃・粗大ごみの処理残渣等の状況

3－1. 不燃・粗大ごみの処理残渣の処分実績

項目 / 月	フェニックス大阪基地			フェニックス尼崎基地		
	処分量	台数	割合	処分量	台数	割合
	(t)	(台)	(%)	(t)	(台)	(%)
4	95	11	68.3	44	6	31.7
5	108	14	73.0	40	5	27.0
6	90	11	68.7	41	5	31.3
7	93	12	66.4	47	6	33.6
8	96	12	64.9	52	7	35.1
9	89	11	68.5	41	5	31.5
10	122	13	67.0	60	7	33.0
11	109	13	69.0	49	6	31.0
12	84	11	48.8	88	10	51.2
1	116	15	73.4	42	5	26.6
2	116	13	82.9	24	3	17.1
3	90	11	64.7	49	6	35.3
計	1,208	147	67.7	577	71	32.3
月平均	101	12		48	6	

項目 / 月	合　計			前年度処分量	前年比
	処分量	台数	割合		
	(t)	(台)	(%)	(t)	(%)
4	139	17	100.0	156	89.1
5	148	19	100.0	149	99.3
6	131	16	100.0	139	94.2
7	140	18	100.0	144	97.2
8	148	19	100.0	139	106.5
9	130	16	100.0	141	92.2
10	182	20	100.0	149	122.1
11	158	19	100.0	129	122.5
12	172	21	100.0	140	122.9
1	158	20	100.0	144	109.7
2	140	16	100.0	119	117.6
3	139	17	100.0	121	114.9
計	1,785	218	100.0	1670	106.9
月平均	149	18		139	

※ フェニックスにて計量を行ったデータのため、工場搬出時の数値と差がある。

3－2. 不燃・粗大ごみ選別有価物等の処分実績

項目 / 月	鉄類			非鉄(アルミ)類			合計			前年度処分量	前年比
	処分量	台数	割合	処分量	台数	割合	処分量	台数	割合		
	(t)	(台)	(%)	(t)	(台)	(%)	(t)	(台)	(%)	(t)	(%)
4	79.42	30	90.6	8.26	4	9.4	87.68	34	100.0	98.51	89.0
5	77.77	33	90.5	8.18	4	9.5	85.95	37	100.0	86.22	99.7
6	68.91	31	88.2	9.26	5	11.8	78.17	36	100.0	83.08	94.1
7	69.67	35	88.6	8.92	5	11.4	78.59	40	100.0	82.40	95.4
8	67.56	32	88.8	8.48	6	11.2	76.04	38	100.0	78.07	97.4
9	71.00	31	88.0	9.65	8	12.0	80.65	39	100.0	78.67	102.5
10	76.54	35	88.3	10.19	9	11.7	86.73	44	100.0	82.69	104.9
11	72.40	30	88.6	9.32	8	11.4	81.72	38	100.0	94.44	86.5
12	85.45	36	90.4	9.08	7	9.6	94.53	43	100.0	98.11	96.4
1	72.99	34	87.7	10.20	7	12.3	83.19	41	100.0	85.61	97.2
2	55.93	29	87.4	8.08	6	12.6	64.01	35	100.0	72.30	88.5
3	62.95	31	86.9	9.50	7	13.1	72.45	38	100.0	84.66	85.6
計	860.59	387	88.7	109.12	76	11.3	969.71	463		1,024.76	94.6
月平均	71.72	32		9.09	6		80.81	39		85.40	

3－3. 適正処理困難物処分量実績

項目 / 月	バッテリー	消火器	塗料・廃液	マットレス	強靭物	プロパンボンベ	その他ボンベ
	(kg)	(本)	(缶)	(㎥)	(㎥)	(本)	(本)
4	0	0	0	104	13	0	0
5	0	0	0	88	13	0	0
6	0	0	0	82	13	0	0
7	0	0	0	106	13	0	0
8	0	0	0	69	0	0	0
9	0	0	0	81	13	0	0
10	0	0	0	72	13	0	0
11	0	0	0	68	0	0	0
12	0	0	0	75	13	0	0
1	0	0	0	65	13	0	0
2	0	0	0	63	13	0	0
3	430	0	16	76	13	0	0
計	430	0	16	949	130	0	0
月平均	36	0	1	79	11	0	0

4. 維持管理経費の状況

4－1. 処理経費

区分 ＼ 年度			平成26年度（円）	平成25年度（円）	前年比（%）
物件費			615,149,999	581,477,227	105.8
内訳	消耗品費		0	1,500	皆減
	不燃物等処分委託料		25,141,791	24,116,358	104.3
	運営業務委託料		580,521,827	550,640,418	105.4
	負担金補助及び交付金		3,782,186	3,154,296	119.9
	その他		5,704,195	3,564,655	160.0
合計			615,149,999	581,477,227	105.8
処理経費	リサイクルプラザ搬入量(t) ※1		21,259	22,048	96.4
	トン当り処理経費(円)		28,936	26,373	109.7
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,183	1,094	108.1
	リサイクルプラザ搬出量(t) ※2		21,300	21,878	97.4
	トン当り処理経費(円)		28,880	26,578	108.7
	トン当り最終処分経費[再掲](円)		1,180	1,102	107.1
人口（平成26年10月1日現在）			592,563	591,642	100.2
市民一人当り負担額			1,038	983	105.6

※1 搬入量は不燃、粗大、ビン類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、缶類、古紙・古布の合計。
※2 搬出量は不燃・粗大の処理選別物搬出量及び資源ごみ処理・再商品化量の合計。

4－2. 処理経費の経年変化

区分 ＼ 年度	処理経費（円）	不燃・粗大ごみ搬入量（t）	搬入量トン当り処理経費（円）	ごみ処理施設処理量（t）	搬出量トン当り処理経費（円）
24	582,164,968	23,311	24,974	22,746	25,594
25	581,477,227	22,048	26,373	21,878	26,578
26	615,149,999	21,259	28,936	21,300	28,880

Ⅳ. 資源化、リサイクル等の状況

1. 家電四品目搬入・搬出実績

1－1. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）搬入実績

（両市合計）

項目／月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	15	4	0	19	0.73
5	0	13	11	1	25	1.19
6	0	18	7	4	29	1.15
7	0	20	3	1	24	0.84
8	0	9	3	2	14	0.54
9	0	17	7	0	24	1.00
10	0	23	7	4	34	1.30
11	0	6	1	0	7	0.25
12	1	30	4	1	36	1.26
1	0	11	3	1	15	0.57
2	0	9	1	3	13	0.43
3	0	24	3	0	27	0.93
合計	1	195	54	17	267	10.19

（豊中市）

項目／月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	9	2	0	11	0.41
5	0	5	6	1	12	0.60
6	0	6	4	1	11	0.49
7	0	14	2	0	16	0.56
8	0	3	3	2	8	0.36
9	0	7	3	0	10	0.42
10	0	15	3	1	19	0.69
11	0	3	1	0	4	0.16
12	0	17	2	0	19	0.65
1	0	8	1	0	9	0.31
2	0	7	1	2	10	0.34
3	0	13	2	0	15	0.53
合計	0	107	30	7	144	5.52

（伊丹市）

項目／月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	6	2	0	8	0.32
5	0	8	5	0	13	0.59
6	0	12	3	3	18	0.66
7	0	6	1	1	8	0.28
8	0	6	0	0	6	0.18
9	0	10	4	0	14	0.58
10	0	8	4	3	15	0.61
11	0	3	0	0	3	0.09
12	1	13	2	1	17	0.61
1	0	3	2	1	6	0.26
2	0	2	0	1	3	0.09
3	0	11	1	0	12	0.40
合計	1	88	24	10	123	4.67

※ 重量換算は、エアコン1台=0.05t、テレビ1台=0.03t、冷蔵庫・冷凍庫=0.07t、洗濯機・乾燥機=0.03tで計算

1－2. 家電四品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）搬出実績

（両市合計）

項目 / 月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	0	0	0	0	0.00
5	2	29	7	2	40	1.52
6	0	0	0	0	0	0.00
7	0	23	15	2	40	1.80
8	0	0	0	0	0	0.00
9	0	29	6	5	40	1.44
10	0	30	10	0	40	1.60
11	0	0	0	0	0	0.00
12	0	28	8	4	40	1.52
1	0	0	0	0	0	0.00
2	1	32	5	2	40	1.42
3	0	0	0	0	0	0.00
合計	3	171	51	15	240	9.30

（豊中市）

項目 / 月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	0	0	0	0	0.00
5	0	17	5	1	23	0.89
6	0	0	0	0	0	0.00
7	0	6	7	0	13	0.67
8	0	0	0	0	0	0.00
9	0	17	5	3	25	0.95
10	0	19	4	0	23	0.85
11	0	0	0	0	0	0.00
12	0	12	5	1	18	0.74
1	0	0	0	0	0	0.00
2	0	22	2	0	24	0.80
3	0	0	0	0	0	0.00
合計	0	93	28	5	126	4.90

（伊丹市）

項目 / 月	エアコン（台）	テレビ（台）	冷蔵庫・冷凍庫（台）	洗濯機・乾燥機（台）	合計（台）	合計 重量換算(t)
4	0	0	0	0	0	0.00
5	2	12	2	1	17	0.63
6	0	0	0	0	0	0.00
7	0	17	8	2	27	1.13
8	0	0	0	0	0	0.00
9	0	12	1	2	15	0.49
10	0	11	6	0	17	0.75
11	0	0	0	0	0	0.00
12	0	16	3	3	22	0.78
1	0	0	0	0	0	0.00
2	1	10	3	2	16	0.62
3	0	0	0	0	0	0.00
合計	3	78	23	10	114	4.40

※ 重量換算は、エアコン1台=0.05t、テレビ1台=0.03t、冷蔵庫・冷凍庫=0.07t、洗濯機・乾燥機=0.03tで計算

2. その他品目のリサイクル実績

2－1.搬入廃木材・剪定枝の薪・剪定枝チップ化によるリサイクル実績

区分 / 月	薪引取り申込件数（件）	薪提供量（kg）
4	1	48
5	0	0
6	9	438
7	5	250
8	3	150
9	2	93
10	4	155
11	3	162
12	3	130
1	0	0
2	0	0
3	0	0
計	30	1,426
月平均	2.5	119

区分 / 月	剪定枝チップ搬出量（kg）
4	11,990
5	18,060
6	17,700
7	10,770
8	11,180
9	26,210
10	19,980
11	20,160
12	14,900
1	15,340
2	21,690
3	17,150
計	205,130
月平均	17,094

2－2. リサイクルBOXによる古紙類の資源化実績

区分 / 月	新聞（kg）	雑誌（kg）	ダンボール（kg）	合計（kg）	前年度合計（kg）	前年度比（%）
4	930	2,900	2,620	6,450	6,910	93.3
5	0	1,930	1,280	3,210	7,180	44.7
6	510	1,430	1,430	3,370	3,190	105.6
7	940	1,470	1,710	4,120	4,000	103.0
8	0	980	1,280	2,260	3,110	72.7
9	450	1,730	1,320	3,500	2,390	146.4
10	440	1,530	1,630	3,600	5,050	71.3
11	0	740	1,120	1,860	6,050	30.7
12	650	1,720	1,200	3,570	5,600	63.8
1	460	1,440	1,960	3,860	5,210	74.1
2	270	1,290	1,460	3,020	4,680	64.5
3	0	1,820	1,160	2,980	3,190	93.4
計	4,650	18,980	18,170	41,800	56,560	73.9
月平均	388	1,582	1,514	3,483	4,713	

Ⅴ．予算・決算

1. 予算・決算の状況

1－1. 共通経費勘定の予算・決算状況

[歳入]

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	240,899,000	240,899,000	100.0	0
豊中市負担金	140,324,000	140,324,000	100.0	0
伊丹市負担金	100,575,000	100,575,000	100.0	0
使用料及び手数料	4,396,000	4,279,664	97.4	△ 116,336
繰越金	20,000,000	19,564,011	97.8	△ 435,989
諸収入	100,000	1,244,594	1,244.6	1,144,594
組合預金利子	100,000	249,765	249.8	149,765
雑入	0	994,829	－	994,829
歳入合計	265,395,000	265,987,269	100.2	592,269

※ 共通経費勘定における両市負担金は1／2を人口割、1／2を均等割としている。

[歳出]

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
議会費	1,441,000	1,405,475	97.5	35,525
議会費	1,441,000	1,405,475	97.5	35,525
議会費	1,441,000	1,405,475	97.5	35,525
報酬	1,016,000	1,016,000	100.0	0
職員手当等	313,875	313,875	100.0	0
交際費	15,000	0	0.0	15,000
需用費	10,000	0	0.0	10,000
役務費	4,000	0	0.0	4,000
使用料及び賃借料	82,125	75,600	92.1	6,525
総務費	263,854,000	247,512,755	93.8	16,341,245
総務管理費	254,053,000	240,893,441	94.8	13,159,559
一般管理費	224,593,000	214,634,430	95.6	9,958,570
報酬	5,044,000	4,280,952	84.9	763,048
給料	86,472,000	84,094,331	97.3	2,377,669
職員手当等	59,938,000	57,304,744	95.6	2,633,256
共済費	29,105,000	28,808,582	99.0	296,418
旅費	24,000	12,050	50.2	11,950
交際費	15,000	0	0.0	15,000
需用費	1,031,752	767,572	74.4	264,180
役務費	1,709,600	1,675,047	98.0	34,553
委託料	37,570,612	34,506,463	91.8	3,064,149
使用料及び賃借料	2,987,036	2,945,736	98.6	41,300
備品購入費	10,000	0	0.0	10,000
負担金補助及び交付金	686,000	238,953	34.8	447,047
総務管理退職負担金	29,460,000	26,259,011	89.1	3,200,989
負担金補助及び交付金	29,460,000	26,259,011	89.1	3,200,989
監査委員費	26,000	25,000	96.2	1,000
公平委員会費	39,000	36,000	92.3	3,000

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
余熱利用施設費	9,736,000	6,558,314	67.4	3,177,686
管理費	9,736,000	6,558,314	67.4	3,177,686
報酬	901,600	901,600	100.0	0
需用費	4,256,400	1,596,676	37.5	2,659,724
役務費	138,000	77,918	56.5	60,082
委託料	4,050,000	3,843,120	94.9	206,880
償還金利子及び割引料	390,000	139,000	35.6	251,000
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	265,395,000	248,918,230	93.8	16,476,770

［歳入歳出差引額　　17,069,039 円］

1－2. ごみ処理施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	1,084,620,000	1,084,620,000	100.0	0
豊中市負担金	725,665,000	725,665,000	100.0	0
伊丹市負担金	358,955,000	358,955,000	100.0	0
使用料及び手数料	553,839,000	544,801,134	98.4	△ 9,037,866
財産収入	1,060,000	1,468,043	138.5	408,043
繰越金	140,000,000	384,610,428	274.7	244,610,428
諸収入	207,809,000	258,696,879	124.5	50,887,879
売電収入	162,155,000	213,474,476	131.6	51,319,476
雑入	45,654,000	45,222,403	99.1	△ 431,597
組合債	7,100,000	7,100,000	100.0	0
歳入合計	1,994,428,000	2,281,296,484	114.4	286,868,484

※ ごみ処理施設勘定における両市負担金は1／2を人口割、1／2を処理量割としている。

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	1,863,700,000	1,767,565,036	94.8	96,134,964
ごみ処理施設費	1,863,700,000	1,767,565,036	94.8	96,134,964
管理費	1,771,833,000	1,678,173,247	94.7	93,659,753
報酬	13,883,832	12,759,079	91.9	1,124,753
給料	301,063,115	296,956,221	98.6	4,106,894
職員手当等	251,727,120	235,306,064	93.5	16,421,056
共済費	105,196,594	105,170,073	100.0	26,521
賃金	11,011,700	11,011,700	100.0	0
報償費	50,000	0	0.0	50,000
旅費	351,450	344,190	97.9	7,260
需用費	346,508,171	294,044,035	84.9	52,464,136
消耗品費	220,405,743	189,756,589	86.1	30,649,154
燃料費	7,017,000	6,772,640	96.5	244,360
食糧費	48,000	38,880	81.0	9,120
印刷製本費	315,000	18,144	5.8	296,856
光熱水費	104,974,000	86,387,733	82.3	18,586,267
修繕料	13,748,428	11,070,049	80.5	2,678,379
役務費	8,610,204	8,375,095	97.3	235,109
委託料	293,686,624	282,932,927	96.3	10,753,697
灰最終処分委託料	186,964,000	181,131,552	96.9	5,832,448
灰搬送委託料	59,036,000	57,234,085	96.9	1,801,915
その他	47,686,624	44,567,290	93.5	3,119,334
使用料及び賃借料	22,609,000	19,700,419	87.1	2,908,581
工事請負費	408,670,610	403,434,000	98.7	5,236,610
原材料費	116,000	72,900	62.8	43,100
備品購入費	2,274,580	2,224,994	97.8	49,586
負担金補助及び交付金	3,641,000	3,408,750	93.6	232,250
補償補填及び交付金	2,400,000	2,400,000	100.0	0
公課費	33,000	32,800	99.4	200
ごみ処理施設退職負担金	81,327,000	79,044,961	97.2	2,282,039
負担金補助及び交付金	81,327,000	79,044,961	97.2	2,282,039

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
ごみ処理整備費	544,000	474,000	87.1	70,000
負担金補助及び交付金	544,000	474,000	87.1	70,000
新ごみ処理施設整備費	9,996,000	9,872,828	98.8	123,172
報償費	20,000	0	0.0	20,000
旅費	57,000	0	0.0	57,000
需用費	36,000	18,144	50.4	17,856
委託料	241,000	240,450	99.8	550
使用料及び賃借料	182,000	157,164	86.4	24,836
工事請負費	9,450,000	9,450,000	100.0	0
備品購入費	10,000	7,070	70.7	2,930
公債費	130,628,000	130,627,191	100.0	809
公債費	130,628,000	130,627,191	100.0	809
元金	119,753,000	119,752,452	100.0	548
利子	10,875,000	10,874,739	100.0	261
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	1,994,428,000	1,898,192,227	95.2	96,235,773

［歳入歳出差引額　　383,104,257　円］

１－３. リサイクル施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	680,446,000	680,446,000	100.0	0
豊中市負担金	411,251,000	411,251,000	100.0	0
伊丹市負担金	269,195,000	269,195,000	100.0	0
使用料及び手数料	33,595,000	31,216,557	92.9	△ 2,378,443
財産収入	46,322,000	75,437,981	162.9	29,115,981
繰越金	1,000	108,109,172	10,810,917.2	108,108,172
諸収入	46,153,000	46,152,950	100.0	△ 50
歳入合計	806,517,000	941,362,660	116.7	134,845,660

※ リサイクル施設勘定における両市負担金は建設費を計画量割、運営費を処理量割としている。

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	546,703,000	498,225,912	91.1	48,477,088
リサイクル施設費	546,703,000	498,225,912	91.1	48,477,088
管理費	546,703,000	498,225,912	91.1	48,477,088
報償費	56,031,000	17,136,606	30.6	38,894,394
旅費	44,000	0	0.0	44,000
役務費	553,000	552,025	99.8	975
委託料	485,923,000	476,755,095	98.1	9,167,905
負担金補助及び交付金	4,152,000	3,782,186	91.1	369,814
公債費	259,714,000	259,712,570	100.0	1,430
公債費	259,714,000	259,712,570	100.0	1,430
元金	229,972,000	229,971,557	100.0	443
利子	29,742,000	29,741,013	100.0	987
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	806,517,000	757,938,482	94.0	48,578,518

［歳入歳出差引額　　183,424,178　円］

1－4. ごみ焼却施設勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	797,583,000	797,583,000	100.0	0
豊中市負担金	535,816,000	535,816,000	100.0	0
伊丹市負担金	261,767,000	261,767,000	100.0	0
国庫支出金	2,923,914,000	2,923,914,000	100.0	0
繰越金	10,324,000	57,107,703	553.2	46,783,703
諸収入	1,000	3,840	384.0	2,840
組合債	4,061,800,000	4,061,800,000	100.0	0
歳入合計	7,793,622,000	7,840,408,543	100.6	46,786,543

※ ごみ焼却施設勘定における両市負担金は建設費を計画量割、運営費を処理量割としている。

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	7,571,356,000	7,571,067,016	100.0	288,984
ごみ焼却施設費	7,571,356,000	7,571,067,016	100.0	288,984
ごみ焼却施設整備費	7,571,356,000	7,571,067,016	100.0	288,984
給料	8,603,106	8,314,500	96.6	288,606
職員手当等	7,524,578	7,524,578	100.0	0
共済費	3,078,316	3,078,316	100.0	0
旅費	453,790	453,790	100.0	0
委託料	45,435,210	45,434,832	100.0	378
工事請負費	7,506,261,000	7,506,261,000	100.0	0
公債費	222,166,000	222,164,921	100.0	1,079
公債費	222,166,000	222,164,921	100.0	1,079
元金	201,958,000	201,957,564	100.0	436
利子	20,208,000	20,207,357	100.0	643
予備費	100,000	0	0.0	100,000
歳出合計	7,793,622,000	7,793,231,937	100.0	390,063

［歳入歳出差引額　47,176,606　円］

1－5. 単独品目勘定の予算・決算状況

［歳入］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
分担金及び負担金	84,988,000	84,988,000	100.0	0
豊中市負担金	84,988,000	84,988,000	100.0	0
伊丹市負担金	0	0	－	0
財産収入	35,678,000	65,906,229	184.7	30,228,229
歳入合計	120,666,000	150,894,229	125.1	30,228,229

※ 単独品目勘定における負担金は豊中市のみ。

［歳出］

	予算現額（円）	決算額（円）	執行率（％）	残額（円）
衛生費	120,666,000	120,496,017	99.9	169,983
リサイクル施設費	120,666,000	120,496,017	99.9	169,983
管理費	120,666,000	120,496,017	99.9	169,983
役務費	90,000	89,089	99.0	911
委託料	120,576,000	120,406,928	99.9	169,072
歳出合計	120,666,000	120,496,017	99.9	169,983

［歳入歳出差引額　30,398,212　円］

2. 歳入歳出決算の状況

2－1. 共通経費勘定

[歳入]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	240,899,000	249,497,000	96.6	△ 8,598,000
豊中市負担金	140,324,000	145,332,000	96.6	△ 5,008,000
伊丹市負担金	100,575,000	104,165,000	96.6	△ 3,590,000
使用料及び手数料	4,279,664	0	皆増	4,279,664
総務管理使用料	4,279,664	0	皆増	4,279,664
繰越金	19,564,011	18,800,514	104.1	763,497
諸収入	1,244,594	3,151,961	39.5	△ 1,907,367
組合預金利子	249,765	76,619	326.0	173,146
雑入	994,829	3,075,342	32.3	△ 2,080,513
歳入合計	265,987,269	271,449,475	98.0	△ 5,462,206

※ 共通経費勘定における両市負担金は1／2を人口割、1／2を均等割としている。

[歳出]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
議会費	1,405,475	1,368,000	102.7	37,475
議会費	1,405,475	1,368,000	102.7	37,475
議会費	1,405,475	1,368,000	102.7	37,475
報酬	1,016,000	1,035,000	98.2	△ 19,000
職員手当等	313,875	266,400	117.8	47,475
使用料及び賃借料	75,600	66,600	113.5	9,000
総務費	247,512,755	250,517,464	98.8	△ 3,004,709
総務管理費	240,893,441	236,526,324	101.8	4,367,117
一般管理費	214,634,430	206,205,843	104.1	8,428,587
報酬	4,280,952	992,000	431.5	3,288,952
給料	84,094,331	76,093,581	110.5	8,000,750
職員手当等	57,304,744	54,513,555	105.1	2,791,189
共済費	28,808,582	27,120,044	106.2	1,688,538
賃金	0	5,888,607	皆減	△ 5,888,607
旅費	12,050	107,450	11.2	△ 95,400
交際費	0	13,000	皆減	△ 13,000
需用費	767,572	710,083	108.1	57,489
役務費	1,675,047	1,533,810	109.2	141,237
委託料	34,506,463	36,505,794	94.5	△ 1,999,331
使用料及び賃借料	2,945,736	2,100,406	140.2	845,330
負担金補助及び交付金	238,953	627,513	38.1	△ 388,560

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
総務管理退職負担金	26,259,011	30,320,481	86.6	△ 4,061,470
負担金補助及び交付金	26,259,011	30,320,481	86.6	△ 4,061,470
監査委員費	25,000	22,000	113.6	3,000
公平委員会費	36,000	35,000	102.9	1,000
余熱利用施設費	6,558,314	13,934,140	47.1	△ 7,375,826
管理費	6,558,314	13,934,140	47.1	△ 7,375,826
報酬	901,600	736,000	122.5	165,600
共済費	0	171,563	皆減	△ 171,563
需用費	1,596,676	3,877,214	41.2	△ 2,280,538
役務費	77,918	75,063	103.8	2,855
委託料	3,843,120	5,699,400	67.4	△ 1,856,280
工事請負費	0	2,039,100	皆減	△ 2,039,100
償還金利子及び割引料	139,000	1,335,800	10.4	△ 1,196,800
歳出合計	248,918,230	251,885,464	98.8	△ 2,967,234

2－2.ごみ処理施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成26年度決算額（円）	平成25年度決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	1,084,620,000	1,347,104,000	80.5	△ 262,484,000
豊中市負担金	725,665,000	899,025,000	80.7	△ 173,360,000
伊丹市負担金	358,955,000	448,079,000	80.1	△ 89,124,000
使用料及び手数料	544,801,134	553,927,086	98.4	△ 9,125,952
財産収入	1,468,043	2,071,572	70.9	△ 603,529
繰越金	384,610,428	286,477,902	134.3	98,132,526
諸収入	258,696,879	211,805,712	122.1	46,891,167
売電収入	213,474,476	168,331,060	126.8	45,143,416
雑入	45,222,403	43,474,652	104.0	1,747,751
組合債	7,100,000	448,500,000	1.6	△ 441,400,000
歳入合計	2,281,296,484	2,849,886,272	80.0	△ 568,589,788

※ ごみ処理施設勘定における両市負担金は1／2を人口割、1／2を処理量割としている。

[歳出]

項目＼年度	平成26年度決算額（円）	平成25年度決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	1,767,565,036	2,365,949,049	74.7	△ 598,384,013
ごみ処理施設費	1,767,565,036	2,365,949,049	74.7	△ 598,384,013
管理費	1,678,173,247	1,633,009,243	102.8	45,164,004
報酬	12,759,079	29,990,497	42.5	△ 17,231,418
給料	296,956,221	293,345,886	101.2	3,610,335
職員手当等	235,306,064	232,497,933	101.2	2,808,131
共済費	105,170,073	104,575,163	100.6	594,910
賃金	11,011,700	1,469,200	749.5	9,542,500
旅費	344,190	328,040	104.9	16,150
需用費	294,044,035	268,932,582	109.3	25,111,453
消耗品費	189,756,589	158,219,839	119.9	31,536,750
燃料費	6,772,640	8,062,657	84.0	△ 1,290,017
食糧費	38,880	18,900	205.7	19,980
印刷製本費	18,144	279,982	6.5	△ 261,838
光熱水費	86,387,733	87,697,524	98.5	△ 1,309,791
修繕料	11,070,049	14,653,680	75.5	△ 3,583,631
役務費	8,375,095	7,866,990	106.5	508,105

項目＼年度	平成26年度決算額（円）	平成25年度決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
委託料	282,932,927	260,297,924	108.7	22,635,003
灰最終処分委託料	181,131,552	171,070,095	105.9	10,061,457
灰搬送委託料	57,234,085	54,067,508	105.9	3,166,577
その他	44,567,290	35,160,321	126.8	9,406,969
使用料及び賃借料	19,700,419	17,749,461	111.0	1,950,958
工事請負費	403,434,000	411,012,000	98.2	△ 7,578,000
原材料費	72,900	208,985	34.9	△ 136,085
備品購入費	2,224,994	857,430	259.5	1,367,564
負担金補助及び交付金	3,408,750	3,836,752	88.8	△ 428,002
補償補填及び賠償金	2,400,000	0	皆増	2,400,000
公課費	32,800	40,400	81.2	△ 7,600
ごみ処理施設退職負担金	79,044,961	116,185,067	68.0	△ 37,140,106
負担金補助及び交付金	79,044,961	116,185,067	68.0	△ 37,140,106
ごみ処理整備費	474,000	1,967,000	24.1	△ 1,493,000
負担金補助及び交付金	474,000	1,967,000	24.1	△ 1,493,000
新ごみ処理施設整備費	9,872,828	614,787,739	1.6	△ 604,914,911
需用費	18,144	17,640	102.9	504
委託料	240,450	21,128,100	1.1	△ 20,887,650
使用料及び賃借料	157,164	175,416	89.6	△ 18,252
工事請負費	9,450,000	593,460,000	1.6	△ 584,010,000
備品購入費	7,070	6,583	107.4	487
公債費	130,627,191	99,326,795	131.5	31,300,396
公債費	130,627,191	99,326,795	131.5	31,300,396
元金	119,752,452	90,513,737	132.3	29,238,715
利子	10,874,739	8,813,058	123.4	2,061,681
歳出合計	1,898,192,227	2,465,275,844	77.0	△ 567,083,617

2－3. リサイクル施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	680,446,000	758,683,000	89.7	△ 78,237,000
豊中市負担金	411,251,000	545,944,000	75.3	△ 134,693,000
伊丹市負担金	269,195,000	212,739,000	126.5	56,456,000
使用料及び手数料	31,216,557	30,592,158	102.0	624,399
財産収入	75,437,981	135,387,772	55.7	△ 59,949,791
繰越金	108,109,172	14,753,009	732.8	93,356,163
諸収入	46,152,950	9,883,027	467.0	36,269,923
歳入合計	941,362,660	949,298,966	99.2	△ 7,936,306

※ リサイクル施設勘定における両市負担金は建設費を計画量割、運営費を処理量割としている。

[歳出]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	498,225,912	581,477,227	85.7	△ 83,251,315
リサイクル施設費	498,225,912	581,477,227	85.7	△ 83,251,315
管理費	498,225,912	581,477,227	85.7	△ 83,251,315
報償費	17,136,606	0	皆増	17,136,606
需用費	0	1,500	皆減	△ 1,500
役務費	552,025	633,565	87.1	△ 81,540
委託料	476,755,095	577,687,866	82.5	△ 100,932,771
負担金補助及び交付金	3,782,186	3,154,296	119.9	627,890
公債費	259,712,570	259,712,567	100.0	3
公債費	259,712,570	259,712,567	100.0	3
元金	229,971,557	227,690,185	101.0	2,281,372
利子	29,741,013	32,022,382	92.9	△ 2,281,369
歳出合計	757,938,482	841,189,794	90.1	△ 83,251,312

2－4. ごみ焼却施設勘定

[歳入]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	797,583,000	516,896,000	154.3	280,687,000
豊中市負担金	535,816,000	347,251,000	154.3	188,565,000
伊丹市負担金	261,767,000	169,645,000	154.3	92,122,000
国庫支出金	2,923,914,000	2,008,983,000	145.5	914,931,000
繰越金	57,107,703	648,821	8,801.8	56,458,882
諸収入	3,840	3,985	96.4	△ 145
組合債	4,061,800,000	2,812,600,000	144.4	1,249,200,000
歳入合計	7,840,408,543	5,339,131,806	146.8	2,501,276,737

※ごみ焼却施設勘定における両市負担金は建設費を計画量割、運営費を処理量割としている。

[歳出]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	7,571,067,016	5,256,613,034	144.0	2,314,453,982
ごみ焼却施設費	7,571,067,016	5,256,613,034	144.0	2,314,453,982
ごみ焼却施設整備費	7,571,067,016	5,256,613,034	144.0	2,314,453,982
給料	8,314,500	8,458,662	98.3	△ 144,162
職員手当等	7,524,578	7,047,495	106.8	477,083
共済費	3,078,316	3,012,742	102.2	65,574
旅費	453,790	354,700	127.9	99,090
委託料	45,434,832	36,849,750	123.3	8,585,082
工事請負費	7,506,261,000	5,010,999,000	149.8	2,495,262,000
負担金補助及び交付金	0	189,890,685	皆減	△ 189,890,685
公債費	222,164,921	25,411,069	874.3	196,753,852
公債費	222,164,921	25,411,069	874.3	196,753,852
元金	201,957,564	23,319,804	866.0	178,637,760
利子	20,207,357	2,091,265	966.3	18,116,092
歳出合計	7,793,231,937	5,282,024,103	147.5	2,511,207,834

2－5. 単独品目勘定

[歳入]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
分担金及び負担金	84,988,000	0	皆増	84,988,000
豊中市負担金	84,988,000	0	皆増	84,988,000
伊丹市負担金	0	0	－	0
財産収入	65,906,229	0	皆増	65,906,229
歳入合計	150,894,229	0	皆増	150,894,229

※ 単独品目勘定における負担金は豊中市のみ。

[歳出]

項目＼年度	平成26年度 決算額（円）	平成25年度 決算額（円）	前年比（%）	増減額（円）
衛生費	120,496,017	0	皆増	120,496,017
リサイクル施設費	120,496,017	0	皆増	120,496,017
管理費	120,496,017	0	皆増	120,496,017
役務費	89,089	0	皆増	89,089
委託料	120,406,928	0	皆増	120,406,928
歳出合計	120,496,017	0	皆増	120,496,017

VI. その他

1. 啓発活動の状況

1－1. 施設見学者実績

区分 / 月	幼稚園・保育所		小学校・中学校		両市市民等		他市市民等		その他		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	1	46	8	696	7	56	1	6	22	192	39	996
5	0	0	20	1,695	6	34	0	0	9	25	35	1,754
6	0	0	30	2,247	1	1	0	0	5	67	36	2,315
7	0	0	6	458	14	184	4	12	10	30	34	684
8	2	85	0	0	14	94	4	6	12	62	32	247
9	1	25	0	0	6	29	3	3	4	10	14	67
10	0	0	5	233	7	49	3	9	11	44	26	335
11	0	0	3	140	20	264	3	26	7	34	33	464
12	2	64	1	5	8	117	1	2	1	34	13	222
1	0	0	0	0	2	8	0	0	3	7	5	15
2	2	61	0	0	6	56	1	2	3	5	12	124
3	0	0	0	0	10	65	2	27	7	31	19	123
計	8	281	73	5,474	101	957	22	93	94	541	298	7,346
月平均	1	23	6	456	8	80	2	8	8	45	25	612

※ 「小学校・中学校」の見学者数には、中学生による職場体験学習を含む。

※ 小学校の大規模校で、午前及び午後に分かれて見学する場合、2件として計上している。

※ 「両市市民等」「他市市民等」は、個人での見学のほか、自治会・老人クラブ・婦人会・PTA等の団体を含む。

※ 「その他」は両市職員の見学者、行政視察、小学校の下見、企業による視察等。

1－2. 体験学習受入れの実績

実施日	受入団体名	日数	人数	内容	備考
10月28日～10月30日	豊中市立第三中学校	3	3	○排水管理・分析 ○ボイラー・炉の点検 ○焼却施設中央制御室運転監視 ○焼却施設車両誘導 ○リサイクルプラザ資源化業務	CUL地域体験
10月28日～10月30日	豊中市立第四中学校	3	3		CUL地域体験
11月11日～11月13日	豊中市立第十二中学校	3	3		CUL地域体験
11月11日～11月13日	豊中市立第十五中学校	3	3		CUL地域体験
12月3日～12月5日	豊中市立第一中学校	3	5		CUL地域体験
計 5 校	延べ日数 15 日			人数計 17 人	

1－3. 出前講座の実績

実 施 内 訳		件数	参加人数
クリーンランド単独での実施	保 育 所	3	164
	そ の 他	2	78
	計	5	242
クリーンランドと両市収集部門等との協同実施	保 育 所	7	562
	小 学 校	10	819
	中 学 校	1	64
	そ の 他	7	199
	計	25	1,644
合 計	保 育 所	10	726
	小 学 校	10	819
	中 学 校	1	64
	そ の 他	9	277
	計	30	1,886

1－4. リユースコーナー開催状況

開催期間	抽 選 日	開 催 場 所	出品数（点）	応募者数（人）
6月4日～7月3日	7月4日	豊中市環境交流センター	10	41
10月1日～11月9日	11月9日	リサイクルプラザ	13	33
10月25日	10月25日	伊丹市立労働福祉会館(スワンホール)	9	49
11月21日～11月22日	11月22日	豊中市立豊島体育館	10	28
2月7日～2月21日	2月21日	伊丹市立図書館（ことば蔵）	10	49
計　　5 回			52	200

1－5. 搬入ごみ検査状況

検 査 日	検 査 結 果	処　　置
6月18日 9月19日 11月21日 12月9日 3月16日	両市からクリーンランドへ搬入される車両に対して、平成26年度では計5回の搬入物の展開検査を実施しました。 概ね悪質な違反物等は無かったものの、可燃物の中に資源ごみや不燃物の混入が見受けられました。	産業廃棄物等のごみは、持ち帰らせ適正な処理をするよう指導を行いました。 また、排出先の特定ができた不適正搬入物においては、両市を通じて指導・啓発へとつなげています。

１－６. イベント等の実績

実　施　日	イベント名 目　　的	内　　容	人数	主　催
8月 2日	豊中まつり2014 市民との協働イベントを通して、持続可能な地域社会づくりをめざす。	・ごみ分別輪投げ ・パネル展示 ・禁忌品の展示 ・施設案内パンフレット配布 ・クリーンランドフェスティバル案内チラシ配布 ・ごみぶくろう出演	978	豊中まつり実行委員会
9月14日	伊丹市シルバーフェスティバル クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	・パネル展示 ・施設案内パンフレット配布 ・クリーンランドフェスティバル案内チラシ配布	200	伊丹市シルバーフェスティバル実行委員会
10月 18日	第9回とよっぴー祭り 市民との協働をとおして、「クリーンランドのPR」を推進する。	・ごみ分別輪投げ ・パネル展示 ・クリーンランドフェスティバル案内チラシ配布 ・ごみぶくろう出演	400	NPO花と緑のネットワーク
10 月25日	いたみ環境＆リサイクルフェア2014 「3Rの啓発」と「クリーンランドPR」を推進する。	・ごみ分別輪投げ ・パネル展示 ・リユースコーナー ・クリーンランドフェスティバル案内チラシ配布	400	エコロジーマーケット実行委員会
11月 9日	第9回クリーンランドフェスティバル 「やっていますか環境にやさしいこと」をテーマにクリーンランドから3R推進を発信する。	・パネル展示 ・禁忌品展示 ・施設見学 ・ごみ分別輪投げ等 各種体感ゲーム ・各種ステージ催し ・ごみぶくろう出演	694	クリーンランドフェスティバル実行委員会
11 月21日 ～22日	とよなか市民環境展2014 クリーンランドでの市民協働の取組みをPRする。	・ごみ分別輪投げ ・パネル展示 ・リユースコーナー ・ごみぶくろう出演	958	NPOとよなか市民環境会議アジェンダ21

1－7. 企画講座実施状況

実　施　日	講　座　名 目　　的	内　　容	人 数
4月29日	クリーンランド発　猪名川自然観察会 近辺の河川敷で昆虫採集を通して、猪名川の自然に触れる。	あいにくの雨だったため、予定を変更して昆虫のスライド鑑賞と、実物の昆虫に触れていただきながらの講座を開催。	26
8月 2日	かまぼこ板でキーフックをつくろう 市民がごみ問題について深く考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	かまぼこ板と、かぼちゃやスイカの種、麻紐などを使用して「キーフック」を作成する。	17
8月 9日	牛乳パックでサッカーボールをつくろう 市民がごみ問題について深く考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	牛乳パック6個で実物そっくりの「サッカーボール」を作成する。	20
8月23日	ダンボールとCDケースで写真立てをつくろう 市民がごみ問題について深く考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	ダンボールとCDケース、麻紐を使用して「写真立て」を作成する。	22
8月27日	ダンボールとCDケースで写真立てをつくろう 市民がごみ問題について深く考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	ダンボールとCDケース、麻紐を使用して「写真立て」を作成する。	25
11月 9日	ひょうたん飾りを作ろう 市民がごみ問題について考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	緑のカーテンとして役目を終えた伊丹市特産のひょうたんに、ちぎり絵で飾り付けをする。	30
12月23日	クリスマス飾りをつくろう 市民がごみ問題について考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	枝やチラシ、毛糸などを使用して、クリスマス飾りを作成する。	30
2月 7日	かまぼこ板やペットボトルを使って遊ぼう 市民がごみ問題について考え、自分の住むまちを大切に思う心を育む。	かまぼこ板でキーフック、ペットボトルで、花瓶やけん玉を作成する。	31
2月21日	おもちゃ病院 市民がごみ問題について考え、物を大切にする心を育む。	こわれた「おもちゃ」を無料で修理する。	42
	自転車「リキテレ」 人の力や自然の力のみで発電することで、省エネの大切さの理解を深める。	自転車発電で、テレビをつける体験をする。	12
3月18日	フォーラム「ごみ減量のすすめ」 新焼却の処理量が、現在の搬入量を上回っているため、可燃ごみの減量について考える。	家庭でも取り組める可燃ごみ減量の方法に関する講演会。	82

※ 全てリサイクルプラザ見学等業務委託先であるNPO法人豊中・伊丹環境政策フォーラムが主催。

2. 組織及び職員数

2－1. 組織図（平成27年 3月31日現在）

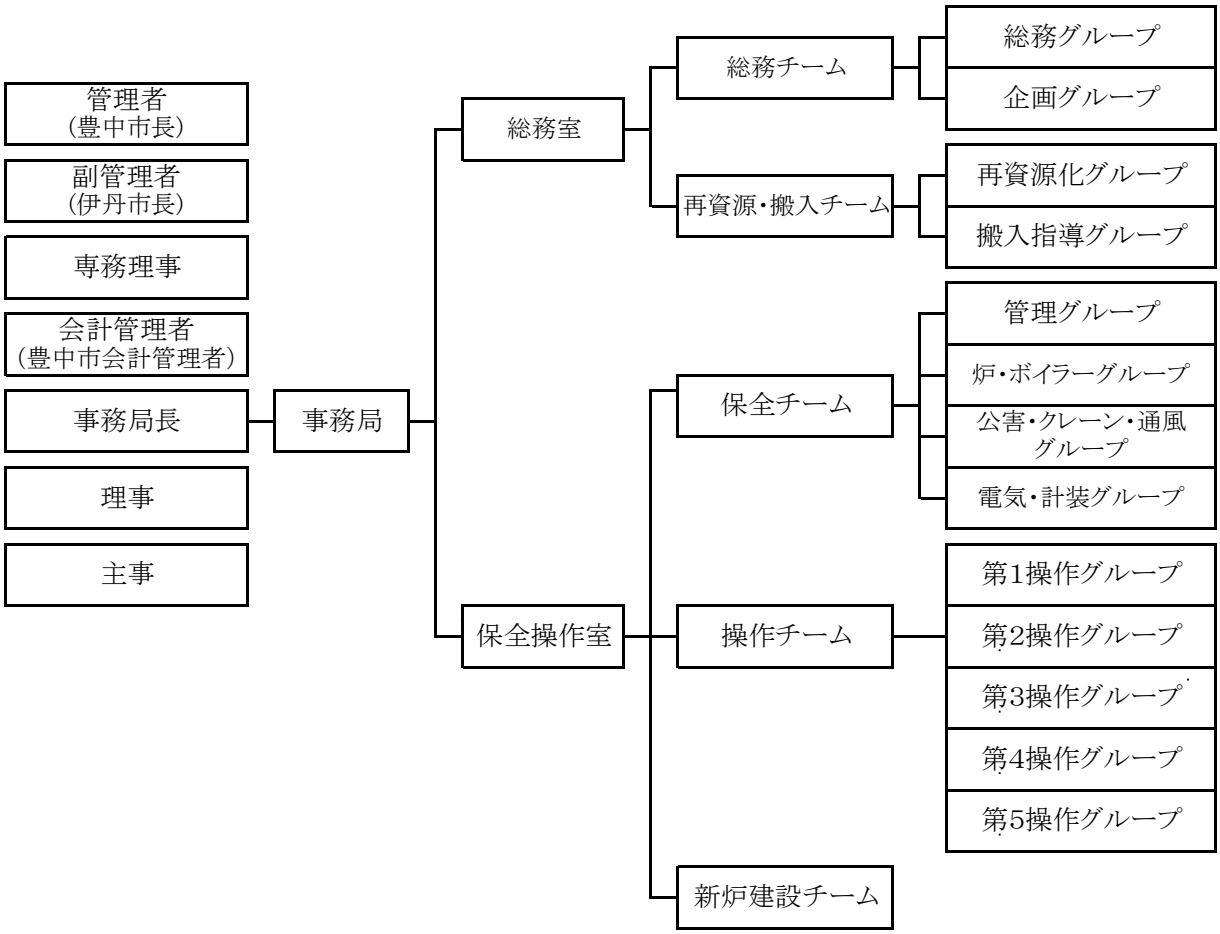

2－2. 職種別人員配置（平成27年3月31日現在）

単位（人）

	事務職員	技術職員	技能職員	小計	再任用	非常勤	臨職	総計
総務室	15	3	4	22	8	6	2	38
総務チーム	11	1	2	14	1	1	0	16
総務グループ	7	1	2	10	0	1	0	11
企画グループ	4	0	0	4	1	0	0	5
再資源・搬入チーム	4	2	2	8	7	5	2	22
再資源化グループ	3	2	0	5	4	1	0	10
搬入指導グループ	1	0	2	3	3	4	2	12
保全操作室	0	34	33	67	17	1	3	88
保全チーム	0	7	9	16	5	1	1	23
管理グループ	0	3	2	5	2	0	1	8
炉・ボイラーグループ	0	0	3	3	1	0	0	4
公害・クレーン・通風グループ	0	0	4	4	1	1	0	6
電気・計装グループ	0	4	0	4	1	0	0	5
操作チーム	0	21	23	44	11	0	1	56
第1操作グループ	0	5	5	10	2	0	0	12
第2操作グループ	0	3	5	8	3	0	0	11
第3操作グループ	0	4	4	8	2	0	1	11
第4操作グループ	0	5	4	9	2	0	0	11
第5操作グループ	0	4	5	9	2	0	0	11
新炉建設チーム	0	6	1	7	1	0	1	9
合計	15	37	37	89	25	7	5	126

平成26年度(2014年度)ごみ処理事業年報

平成27年(2015年)11月発行

豊中市伊丹市クリーンランド
〒561-0806　豊中市原田西町２－１
TEL　06-6841-5395

編集　　総務課
