〔R7.2版〕

完了検査に必要な図書等一覧表（開発審査課以外は帰属施設または用地がある課のみ）

担当課 / 添付図書	都市計画推進部	都市基盤部	上下水道局	環境部	消防局	備　　考
	開発審査課	基盤管理課	下水道管理課	公園みどり推進課	予防課	
工事完了届出書	○					
委任状	○					委任者印、受任者印を押印
報告書	△					国道、府道、河川等の管理者(豊中市以外)に工事完了を確認された旨
道路占用の写し	△					表紙のみ 占用のある場合のみ
設計説明書	○	○	○	○	○	各担当課分は設計説明書が表紙
従前の公共施設一覧表	○	○	○	○	○	
新たに設置される公共施設一覧表	○	○	○	○	○	
位置図	○	○	○	○	○	
土地利用計画図	○	○	○	○	○	
造成計画平面図	○	○		○		
造成計画断面図	○	○		○		
排水計画平面図	○		※ ○			※新設人孔の公共座標リスト含む ２９条許可時の図面に竣工値を赤で記入（帰属する施設のみ） 記入方法は下水道管理課で確認のこと
排水施設縦断図	○		※ ○			
排水施設構造図	○		※ ○			
道路計画平面図	○	○				
道路計画横断図・縦断図	○	○				
道路構造図	○	○				
道路詳細図	○	○				
公園平面図	○			○		
公園遊具配置図	○			○		
公園詳細図				○		
消防関係図面	○				○	
構造資料	○					構造関係報告事項等指示書を参照
擁壁展開図（水抜穴出来高図）	○					展開図に設置した水抜き穴の位置を赤で記入し、必要個数を計算の上、設置個数を記入
工事写真	一式全部	道路関係	排水関係	公園関係	消防関係	各写真には説明を記入
		帰属部分	帰属部分	帰属部分	帰属部分	端部が切れないように撮影
		竣工写真	竣工写真	竣工写真	竣工写真	全景写真を何面か撮影
公共用地登記関係書類	開発審査課に提出	※	※	※	※	※用地の帰属がある場合 （管理者毎に帰属書類が必要） ①地積測量図（法務局の証明印要） ②公図（分筆後のもの　法務局の証明印要） ③登記原因証明情報兼登記承諾書 ④登記簿謄本 (帰属部分のみ、抵当権等抹消済のこと) ⑤印鑑証明書（３か月以内） ⑥資格証明書（３か月以内　法人の場合のみ） ⑦固定資産税減免申請書 ⑧官有地明示指令書の写し ⑨帰属手続用の土地利用計画図（帰属部分を着色） ⑩境界プレート毎の写真 ⑪帰属部分の竣工写真

29条許可（変更許可等）時と同じ図書とする。変更許可等の場合は、〝変更後〟の文言は削除する。

（図書の内容に変更が生じる場合は、事前に開発審査課に相談のこと。）

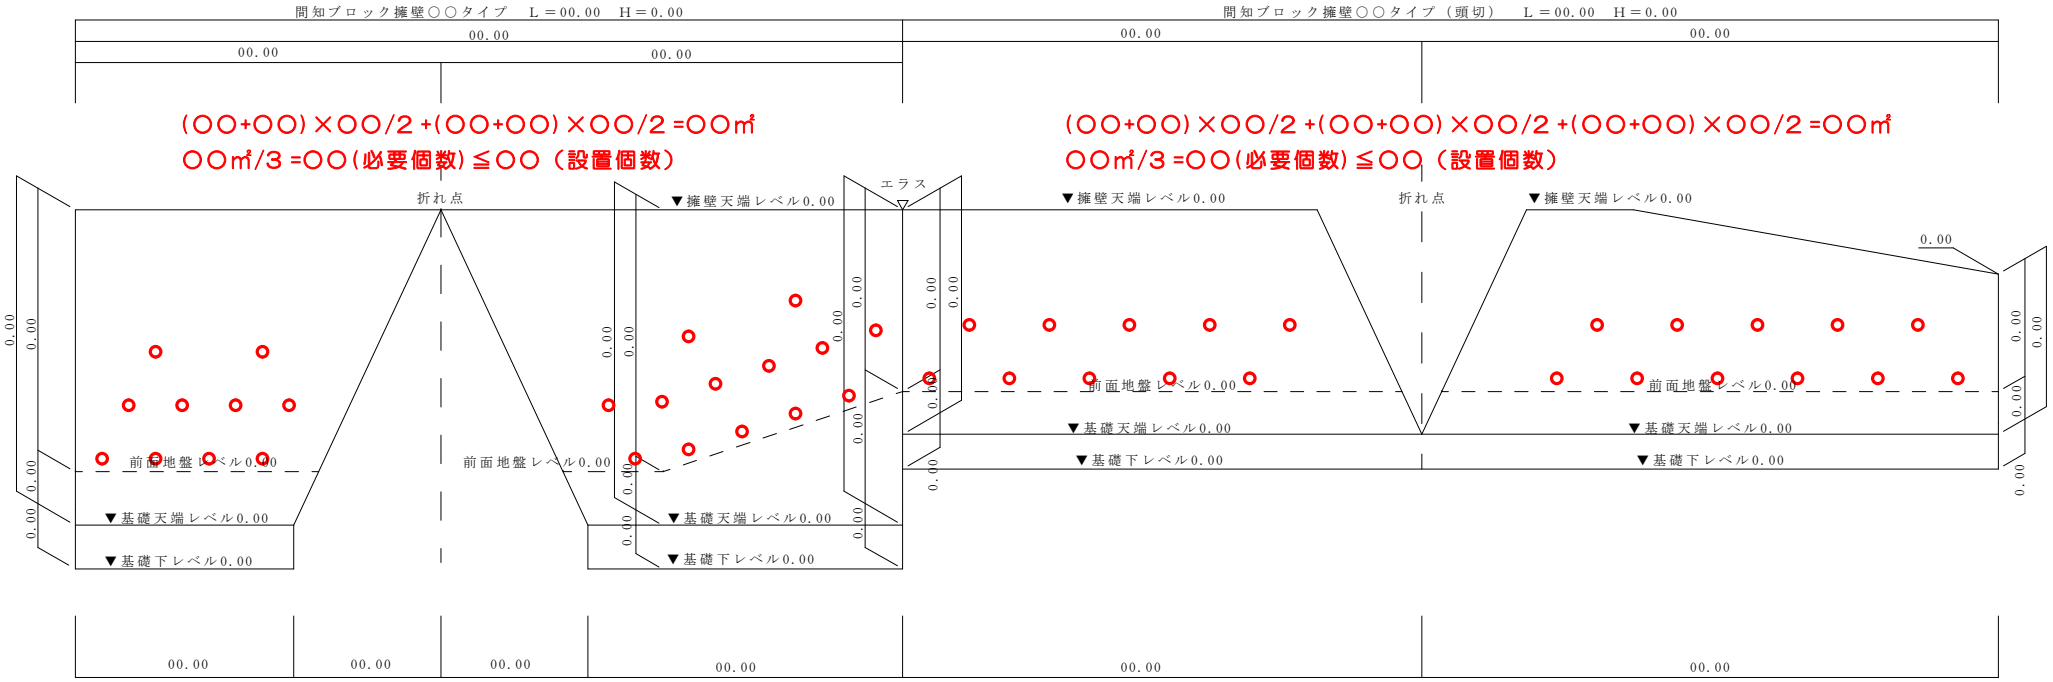

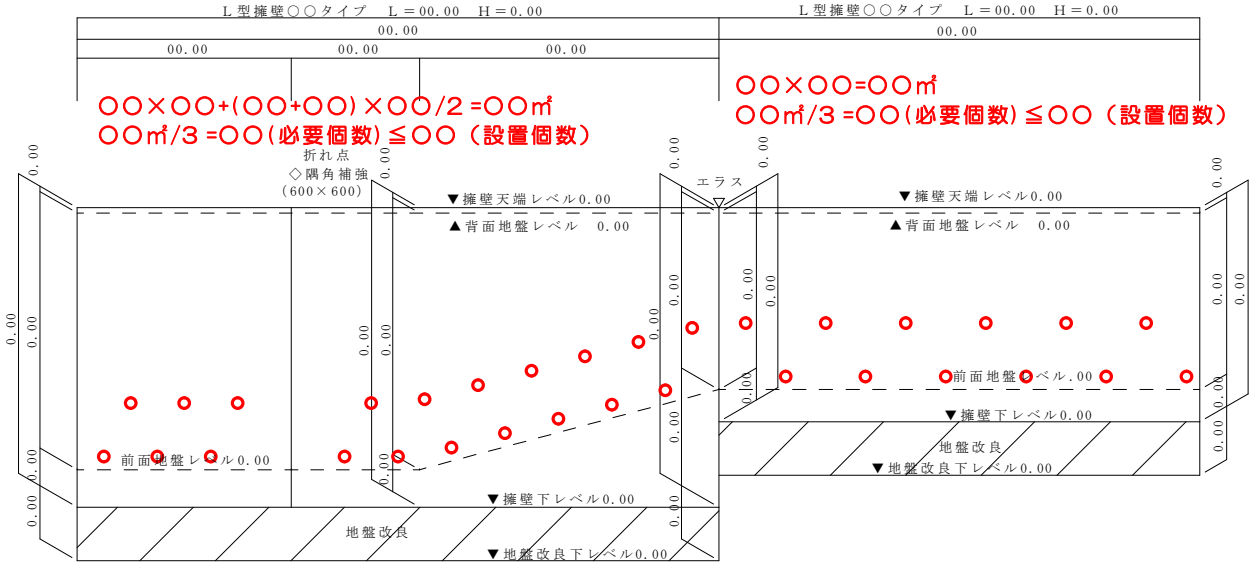

※水抜き穴の位置を赤で記入してください。

※必要個数は小数点以下切り上げで記入してください。

※水抜き穴（φ75）は3㎡に1箇所以上設置すること。
◇は隅角補強を表す

水抜き穴出来高図（参考）

コンクリート圧縮強度試験結果一覧

打設日	打設箇所	1週平均強度	4週平均強度
○年○月○日	擁壁①　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁①　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁②　底盤 擁壁③　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁②　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁③　竪壁 擁壁④　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁④　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑤　底盤 擁壁⑥　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑤　竪壁 擁壁⑥　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑦　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑦　竪壁 擁壁⑧　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑧　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑨　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑨　竪壁 擁壁⑩　底盤	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}
○年○月○日	擁壁⑩　竪壁	○○N/㎜^{2}	○○N/㎜^{2}

参考
